
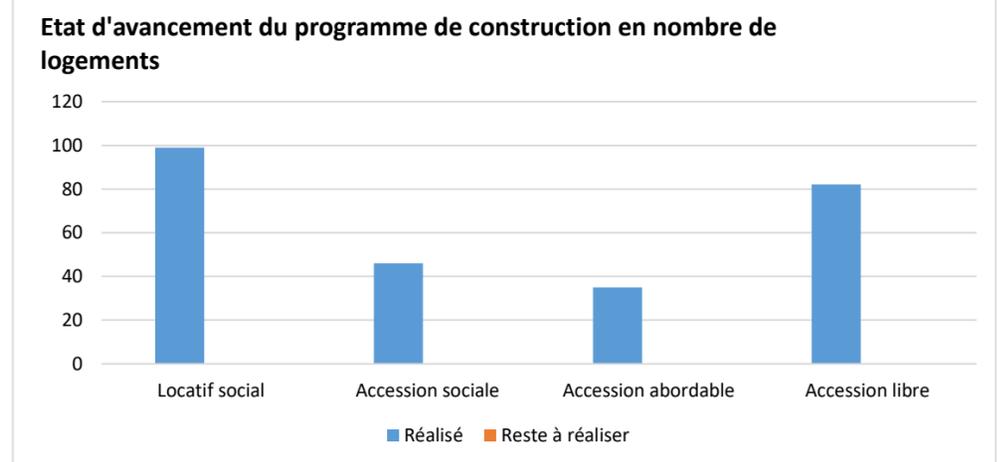


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	6379	35%	6 379	100%	0	0%
Accession sociale	3590	20%	3 590	100%	0	0%
Accession abordable	3161	17%	3 161	100%	0	0%
Accession libre	5273	29%	5 273	100%	0	0%
Sous total logements	18 403	100%	18 403	100%	0	0%
Commerces	1 181		1 181	100%	0	0%
Bureaux	3 333		3 333	100%	0	0%
Total	22 917		22 917	0%	0	0%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

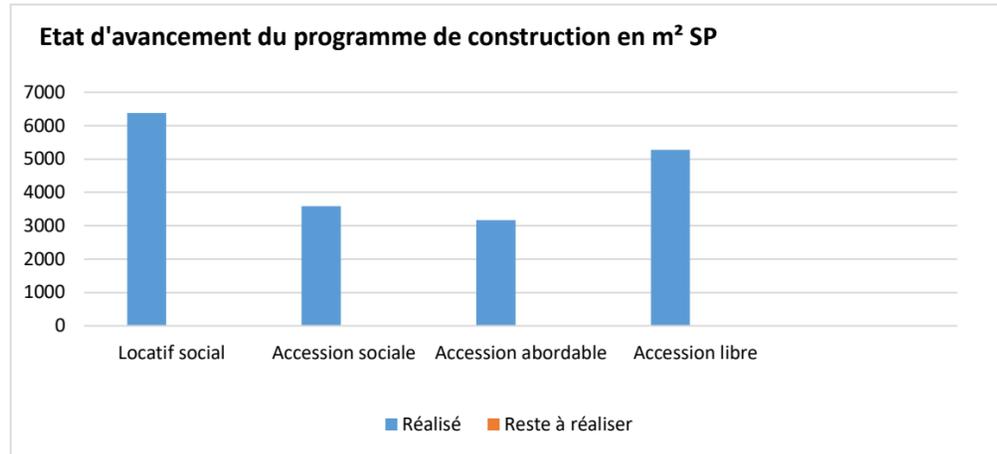

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Locatif social	99		99	100%	0	0%
Accession sociale	46		46	100%	0	0%
Accession abordable	35		35	100%	0	0%
Accession libre	82		82	100%	0	0%
Sous total logements	262		262	100%	0	0%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières
