




Le Haillan - ZAC Cœur de Ville - CRFA 2024
Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC					
Nature du programme	Programme actualisé 2024		Etat d'avancement		
			Réalisé		Reste à réaliser
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP %
Locatif social	11 261	35%	0	0%	11 261 100%
PLAI	4 504				4 504
PLUS	6 757				6 757
PLS	–	–	–	–	–
Accession sociale	7 224	23%	0	0%	7 224 100%
Accession abordable	0	0%			0 100%
Accession libre	13 453	42%	0	0%	13 453 100%
Sous total logements	31 938		0	0%	31 938 100%
Commerces et activités	885		0	0%	885 100%
Total	32 823		0	0%	32 823 100%

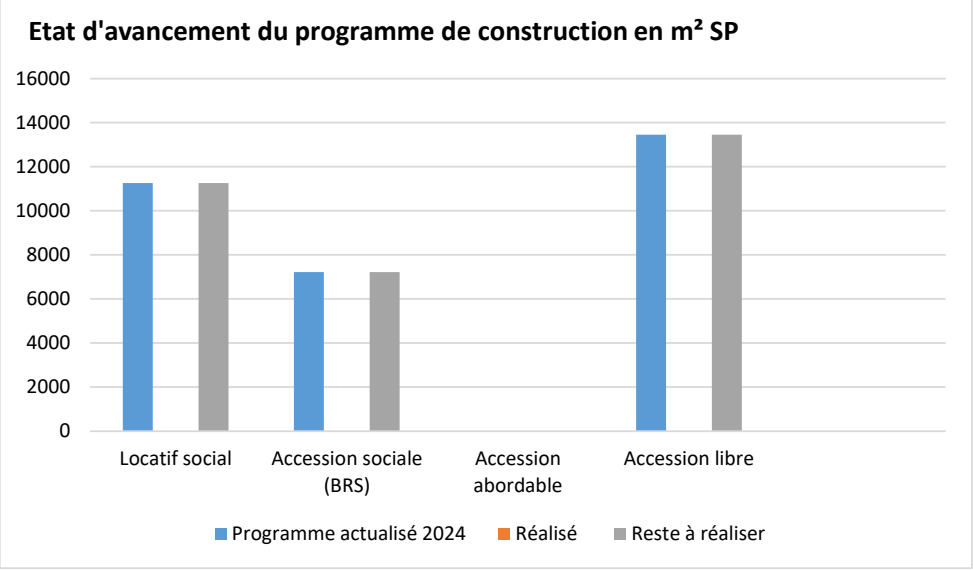

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC					
Nature du programme	Programme actualisé 2024		Etat d'avancement		
			Réalisé		Reste à réaliser
			m² SP	%	m² SP %
Locatif social	172		0	0%	172 100%
PLAI	69		0	0%	69 100%
PLUS	103		0	0%	103 100%
PLS	–	–	–	–	–
Accession sociale	111		0	0%	111 100%
Accession abordable	0				0 100%
Accession libre	200		0	0%	200 100%
Sous total logements	483		0	0%	483 100%

