




C0010 Mérignac Soleil - CRFA 2022

Annexe 4b Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
	m ² SP	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	73 500	35%	25 839	35%	47 661	65%
PLAI			-			
PLUS			-			
PLS	-	-				
Accession sociale et abordable	49 570	24%	5 170	10%	44 400	90%
BRS	2 930	1%	2 930	100%	-	0%
Accession libre	84 000	40%	26 139	31%	57 861	69%
Sous total logements	210 000		60 078	29%	149 922	71%
Commerces, activités et équ	90 000		5 003	5,6%	84 997	94,4%
Total	300 000		65 081	22%	234 919	78%

* PC obtenus et purgés

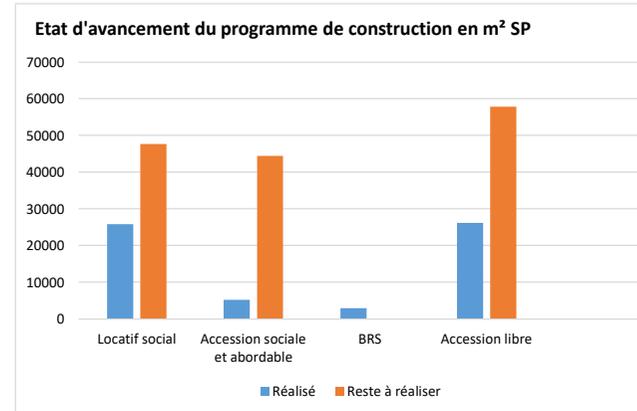

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2022	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		logts	%	logts	%
Locatif social	980	345	35%	635	65%
PLAI					
PLUS					
PLS	-				
Accession sociale et abordable	660	72	11%	588	89%
BRS	40	40	6%	0	0%
Accession libre	1 120	367	33%	753	67%
Sous total logements	2 800	784	28%	2 016	72%

* PC obtenus et purgés

