


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	26951	36%	12 979	48%	13972	52%
PLAI	9537	10%	3 894	41%	5643	59%
PLUS	17415	25%	9 085	52%	8329	48%
PLS	-	-	-	-	-	-
Accession sociale	11190	15%	4 940	44%	6250	56%
Accession abordable	6517	9%	3 914	60%	2603	40%
Accession libre	30782	41%	13 530	44%	17252	56%
Sous total logements	75 440		35363	47%	40077	53%
Commerces et activités	16 567		4465	27%	12102	73%
Total	92 008		39828	43%	52179	57%

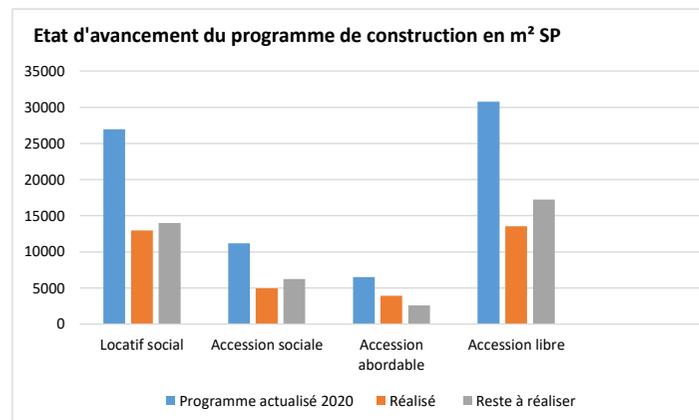

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

Nature du programme	Programme actualisé 2023	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	
Locatif social	401	175	44%	226	56%
PLAI	115	53	46%	62	54%
PLUS	268	123	46%	146	54%
PLS	-	-	-	-	-
Accession sociale	156	68	43%	88	57%
Accession abordable	83	47	57%	35	43%
Accession libre	429	188	44%	241	56%
Sous total logements	1 069	478	45%	590	55%

