



bordeaux
euratlantique

Opération
d'Intérêt National

Bordeaux,
le 23/10/2024

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST
Etablissement Aquitaine
10 rue Toussaint Catros
CS10006
33187 LE HAILLAN

BORDEREAU D'ENVOI

N/réf : 2024-0849-GE-PJ
Affaire suivie par : Pierre JALLET

Objet : ZAC Garonne-Eiffel – Requalification du pont Saint-Jean – Marché
n°202200035 – EXE 6


Lettre recommandée avec avis de réception n°2C 182 854 7174 3

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :

DESIGNATION DE LA PIECE	NOMBRE D'EXEMPLAIRES	COMMENTAIRES
EXE 4-5-6 + annexes	1	Exemplaire à conserver

Vous en souhaitant bonne réception.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.


Valérie LASEK
Directrice Générale



140, rue des Terres de Borde - CS 41717 - 33081 Bordeaux Cedex
tél. 05 57 14 44 80 / fax. 05 81 09 63 60 / contact@bordeaux-auratlantique.fr
Siret : 52174744400037 / APE : 4299Z / www.bordeaux-auratlantique.fr

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250711-lmc1109296-DE-1-1
Date de télétransmission : 17/07/2025
Date de réception préfecture : 17/07/2025
Publié le : 17/07/2025



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX

DECISION DE RECEPTION

A - Identification du pouvoir adjudicateur

EPA Bordeaux-Euratlantique
140 rue des Terres de Borde
Immeuble "Le Prélude"
CS 41717
33081 Bordeaux

B - Identification du titulaire du marché public.

GROUPEMENT EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST / SOL TP / SACAN / CORROSPRAY

Mandataire solidaire du
groupement conjoint :
EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST

Adresse de l'établissement :
10 rue Toussaint Catros
CS 10006 – 33187 LE HAILLAN Cedex

Adresse du siège social :
Parc de Canteranne – Bâtiment 2
21 avenue de Canteranne
33608 PESSAC Cedex

Siret : 399 307 370 00292

Tél : 05 56 34 29 00
Mail : etude.nordgironde.travauxpublics@eiffage.com

Cotraitant 2 :
SOL TP

375 avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT

Siret : 479 064 735 00018

Cotraitant n°3 :
SACAN

9 rue Marc Seguin
ZA du Mamou
15130 ARPAJON SUR CERE

SIRET : 306 646 597 00022

Cotraitant n°4 :
CORROSPRAY

ZAC du Petit Rocher
7 avenue du Président Paul Seramy
77870 VULAINES SUR SEINE

SIRET : 532 004 918 00068

C - Identification du maître d'œuvre.

GROUPEMENT TVK / ECOUTIN / INGEROP

Mandataire : **TVK**
75 Boulevard Macdonald
75019 PARIS

Cotraitant : **ECOUTIN**
21 rue Fbg St Antoine
75011 PARIS

Cotraitant : **INGEROP**
5 impasse des muriers
CS 80012
33692 MERIGNAC CEDEX

D - Objet du marché public.

Requalification du Pont Saint-Jean

E - Objet de la décision de réception.

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Requalification du Pont Saint-Jean

F - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du **08/10/2024**, et des propositions présentées le **18/10/2024** par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du, par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

(Cocher la case correspondante.)

1. ☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au **30/08/2024**,

2. ☒ que la réception est prononcée ;
(Cocher la case correspondante.)

2.1. ☐ sans réserve.

2.2. ☒ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1. ☒ de l'exécution concluante des épreuves énumérées au document annexé (partie 1),

2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés au document annexé (partie 2),

2.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, 13/12/2024, aux imperfections et malfaçons indiquées au document annexé (partie 3).

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

.....


2.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

G - Signature du maître de l'ouvrage.

A BORDEAUX, le 22 octobre 2024

Signature
(maître de l'ouvrage)



Date de mise à jour : 25/02/2011.

REPROFILAGE DU PONT SAINT JEAN - EXE6 - ANNEXE

Référence	Réf. rapport ING. 08/10	Thématique	Réserves
Partie 1			
1.1	51	Contrôle extérieur	Sous réserve de la conformité des mesures au gammadensimètre des enrobés réalisés par le contrôle extérieur après étalonnage de l'appareil via pesée hydrostatique des matériaux
1.2	52	Contrôle technique	Sous réserve de la levée des observations figurant dans les avis du contrôleur technique concernant l'étanchéité
Partie 2			
2.1	17	Voirie	Remplir en enrobés la zone située dans le prolongement du TPC, à la jonction entre la dalle portée du pont Saint Jean et le boulevard Joliot Curie
2.2	21	Joints	Poser le capot du joint WM80 au niveau de la bordure côté amont et réaliser un joint souple
2.3	22	Joints	Poser le capot du joint WM80 au niveau du muret VL + plaques sur trottoir amont
2.4	26	Joints	Poser les capots du joint WD160 dans le prolongement du muret VL situé entre les voies bus et les voies de circulation générale
2.5	27 / 44	Joints	Reposer la plaque du joint longitudinal situé à proximité de la traversée piétonne côté aval et combler le trou
2.6	32	Joints	Couper les vis présentes au niveau du joint longitudinal situé au droit de la déchetterie côté amont, poser une plaque de protection en urgence et poser les plaques définitives
2.7	42 / 46	Joints	Reprendre le capot du joint rive gauche réalisé au niveau de la bordure côté aval et l'évacuation des eaux, supprimer l'écoulement présent au droit du joint au niveau du caisson aval
2.8	25	Garde-corps	Poser l'élément de garde-corps au droit de l'escalier provisoire du parc aux Angéliques
2.9	19	Eclairage	Fournir la clé des mâts solaires
2.10	/	Mobilier	Fourniture et pose des bancs
2.11	50	DOE	Remise du DOE
Partie 3			
3.1	18	Voirie	Supprimer l'excroissance présente au niveau du trottoir à la jonction entre le pont Saint Jean et le boulevard Joliot Curie en rechargeant le long de la longrine du caniveau gaz
3.2	37	Voirie	Reboucher le trou présent au niveau des voies de circulation générale au droit du mât 57309
3.3	41	Voirie	Comblent le trou présent sur trottoir aval en extrémité rive gauche du pont Saint-Jean
3.4	45	Voirie	Nettoyer l'enrobé présent au niveau du caisson aval pile 4
3.5	47	Voirie	Traiter les faces vues des bordures en extrémité du TPC (côté rive droite)
3.6	48	Voirie	Traiter les faces vues des bordures en extrémité du TPC (côté rive gauche)
3.7	53	Voirie	Supprimer les traces de colle / résine présentes au niveau des balises provisoires posées en cours de chantier
3.8	/	Voirie	Reprendre les flashes présents au niveau de la voie bus sens rive droite vers rive gauche
3.9	/	Signalisation	Passer la signalisation horizontale en définitif au niveau de la traversée piétons / cycles
3.10	20	Joints	Recharger la longrine du joint WM80
3.11	23	Garde-corps	Reprise de peinture à prévoir au niveau de la main courante d'un garde-corps situé côté aval, en surplomb du quai Deschamps
3.12	24	Garde-corps	Nettoyer les traces de résine présentes en partie basse des garde-corps aval (remarque générale)
3.13	30	Garde-corps	Nettoyer les chutes de béton présente au pied de l'un des gardes-corps amont situé côté déchetterie, à proximité du support SLT
3.14	30	Garde-corps	Reprendre le chanfrein réalisé en pied des garde-corps côté amont (partie manquante côté trottoir)
3.15	39	Garde-corps	Reprendre la peinture de l'un des garde-corps situé à proximité du mât 57303
3.16	28 / 32	Assainissement	Ouvrir et nettoyer l'ensemble des grilles de collecte des eaux pluviales située au niveau du trottoir amont
3.17	29	Eclairage	Revoir l'alimentation du mât 57316
3.18	34	Eclairage	Reprendre le béton en pied des mâts d'éclairage côté amont pour inclure l'arrière de la platine côté Garonne et éviter que les bouchons de protection des tiges d'ancrage ne sortent du béton

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20250711-lmc1109296-DE-1-1
 Date de télétransmission : 17/07/2025
 Date de réception préfecture : 17/07/2025
 Publié le : 17/07/2025

3.19	35 / 43	Eclairage	Remplacer les plaques donnant accès à la corniche qui sont abîmées (exemple : plaque située au pied du mât 57319)
3.20	49	Eclairage	Recharger le socle béton du mât 57315 pour cacher les capuchons des tiges d'ancrage
3.21	31	SLT	Reprendre le pied du support SLT côté amont et repeindre le pied du support (présence de rayures)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE5

**RECEPTION DES TRAVAUX
PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE**

A - Identification du pouvoir adjudicateur

EPA Bordeaux-Euratlantique
140 rue des Terres de Borde
Immeuble "Le Prélude"
CS 41717
33081 Bordeaux

B - Identification du titulaire du marché public.

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
ETABLISSEMENT AQUITAINE
Agence Nord Gironde
10 rue Toussaint Catros
CS 10006
33187 LE HAILLAN CEDEX

C - Identification du maître d'œuvre.

GROUPEMENT TVK / INGEROP / ON

Mandataire : TVK
75, boulevard Macdonald,
75019 Paris

Cotraitant : INGEROP
5 impasse des muriers
CS 80012
33692 MERIGNAC CEDEX

Cotraitant : ON
79 rue du Dessous des Berges
75013 Paris – France

D - Objet du marché public.

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU PONT SAINT JEAN

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08 octobre 2024**;

je soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ de prononcer la réception, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **30 août 2024**
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.1. ☐ sans réserve.
 - 1.2. ☒ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.2.1. ☒ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
 - 1.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe ci-jointe
 - 1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **13/12/2024** aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe ci-jointe.
 - 1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction) :
 - 1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le
 - 1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le
2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre.

A : BORDEAUX , le 18/10/2024

Signature
(maître d'œuvre)

KINGÉROP
5, Impasse des Mûriers - CS 80012
33692 MÉRIGNAC Cedex
Tél. 05.56.47.11.55 - Fax 05.56.13.00.27
SIRET 522 411 770 B 000 520 135

Date de mise à jour : 25/02/2011.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

A - Identification du pouvoir adjudicateur

EPA Bordeaux-Euratlantique
140 rue des Terres de Borde
Immeuble "Le Prélude"
CS 41717
33081 Bordeaux

B - Identification du titulaire du marché public.

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
ETABLISSEMENT AQUITAINE
Agence Nord Gironde
10 rue Toussaint Catros
CS 10006
33187 LE HAILLAN CEDEX

C - Identification du maître d'œuvre.

GROUPEMENT TVK / INGEROP / ON

Mandataire : TVK
23 rue Olivier Métra
75020 PARIS

Cotraitant : INGEROP
5 impasse des muriers
CS 80012
33692 MERIGNAC CEDEX

Cotraitant : ON
79 rue du Dessous des Berges
75013 Paris – France

D - Objet du marché public

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU PONT SAINT JEAN

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.

☒ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : **30 août 2024**

☒ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

(Cocher la case correspondante.)

☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes

☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, **Aurélien ASTEIX**, maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du
- ☒ en présence des exploitants ;
- ☐ en l'absence des exploitants dûment convoqué, par courrier en date du

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☒ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe ci-jointe ;
 - ☐ et sont concluantes ;
 - ☒ et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☐ ont été exécutés ;
- ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;
- ☐ n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;
- ☐ n'ont pas été remis en état.

Dressé le 17/10/2024

KINGEROP
(maître d'œuvre)

5, Impasse des Miroirs - CS 80012
33692 MERIGNAC Cedex
Tél. 05.56.47.48.94 - Fax 05.56.13.00.27
CS 40006
33157 LE HANLIAN Cedex

☐ J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le

Signature
(maître d'œuvre)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

Accepté le 18/10/24

Signature
(titulaire)

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
10 Rue Toussaint Catroa
CS 40006
33157 LE HANLIAN Cedex



UFO	
N°Affaire	SS433600
Description du projet	REQUALIFICATION DU PONT SAINT JEAN
Adresse du projet	Bordeaux, France
Date de fin	03/01/2024

Statistiques du rapport

📍 Observation MOE

SYNTHÈSE

Toutes les tâches

Nombre: 36

Pourcentage: 100%

36

100%

PAR ATTRIBUTION

LOT 1

Nombre: 29

Pourcentage: 81%

29

100%

matthias maradeix

Nombre: 30

Pourcentage: 83%

30

100%

Sans attribution

Nombre: 6

Pourcentage: 17%

6

100%

PAR PLAN

EIF-EXE-PLAN-NIV-001-O-C16 LE

02.08.2024 ind K

SIGNALISATION_annoté3.pdf

Nombre: 36

Pourcentage: 100%

36

100%

PAR CRÉATEUR

Aurelien ASTEIX

Nombre: 36

Pourcentage: 100%

36

100%

PAR TAG

Sans tag

Nombre: 36

Pourcentage: 100%

36

100%



Plans > EIF-EXE-PLAN-NIV-001-0-C16 LE 02.08.2024 ind K SIGNALISATION_annoté3.pdf



SANS TAG


17 - Remplir TPC en enrobé

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

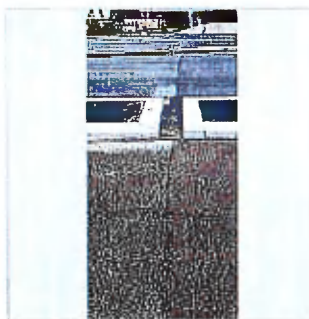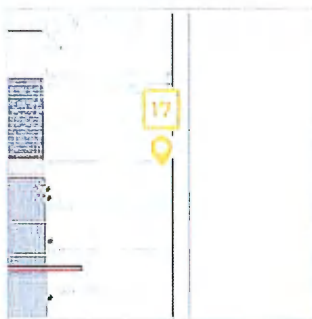


18 - Recharger longrine gaz

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

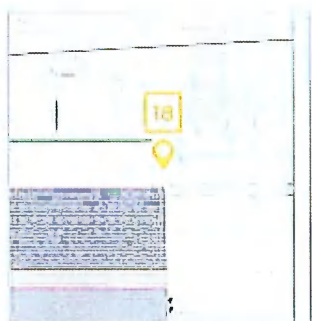

19 - Fournir clé mâât solaire

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

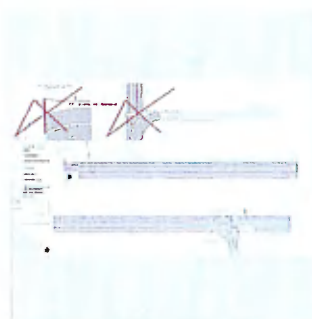



20 - Recharger longrine joint WM80

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

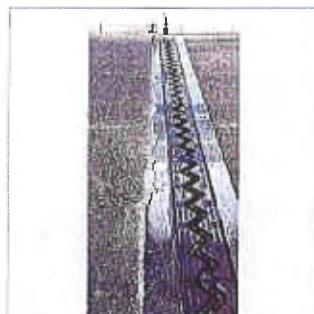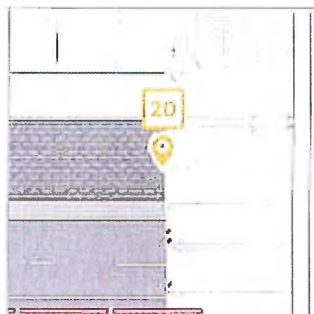


21 - Poser capot et réaliser joint souple

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

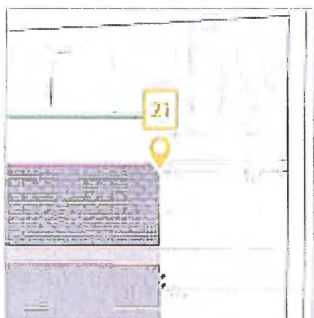



22 - Poser capot amont rd

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

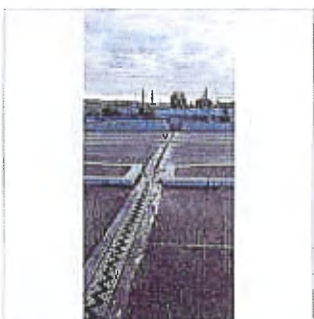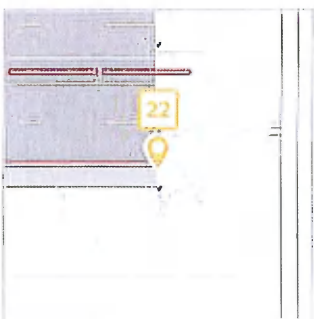


23 - Reprise peinture

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

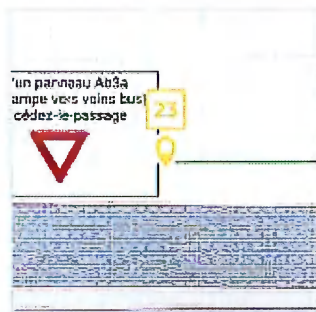


24 - Nettoyer résine sur garde corps

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

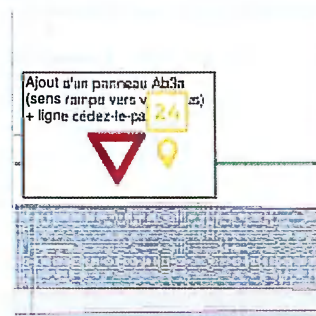


25 - Fermer garde corps

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

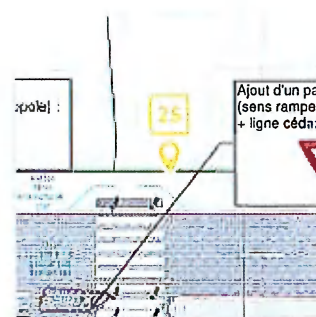

29 - Revoir alimentation 1er mat 57316

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1



30 - Nettoyer chute béton

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1



31 - Refaire pied de mat

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1



32 - Couper vise et mettre plaque prov, puis def

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1




33 - Rouvrir et nettoyer les grilles

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

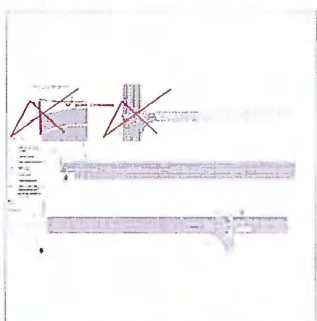


34 - Fermer arrière platine 57313 et tous les mâts amont

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

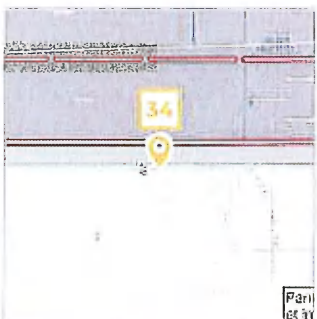


35 - Changer plaques abîmées

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

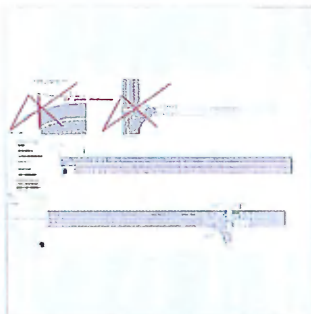


36 - Mat 57310 ras

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

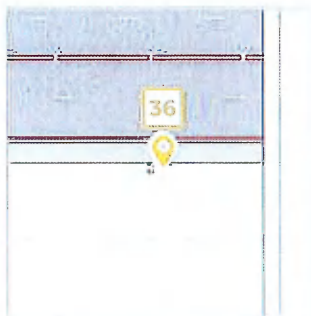


37 - Boucher trou enrobé en face mat 57309

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

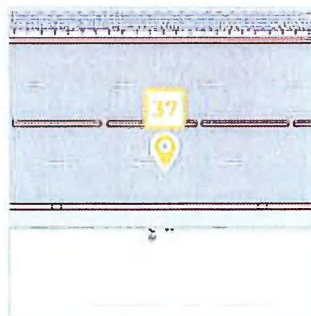


38 - Reprendre chanfrein pied de garde corps côté amont

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

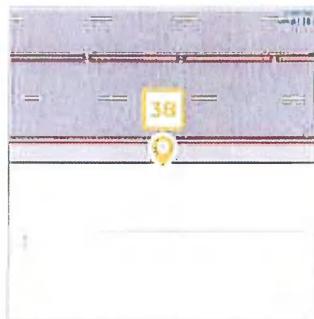


39 - Reprendre peinture vers mat 57303

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

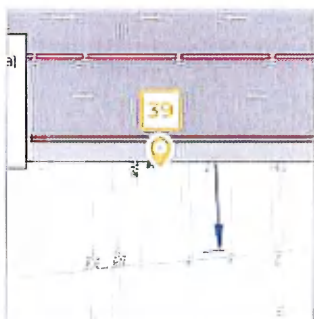


40 - Reprendre capot et évacuation d'eau

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX


matthias maradeix

LOT 1

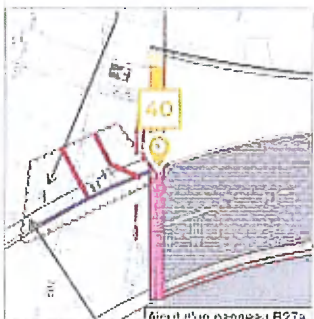


41 - Combler trou

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

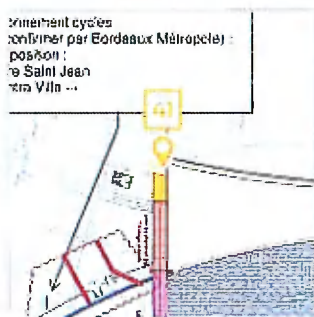


43 - Changer plaque pied de mat 57319

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

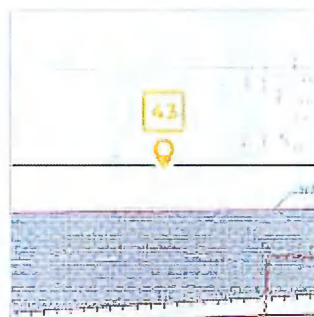

44 - Combler trou joint

Statut : **Observation MOE**
Créateur: Aurelien ASTEIX
matthias maradeix
LOT 1

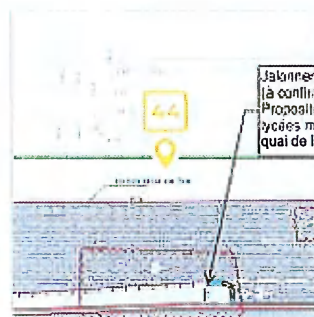


45 - Nettoyer enrobé caisson aval pile 4

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1

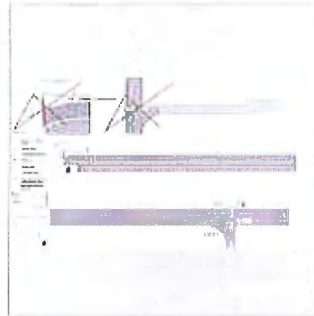

46 - Supprimer écoulement joint rca caisson aval

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

matthias maradeix

LOT 1



47 - traiter les faces vues des bordures

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX


matthias maradeix



48 - Traiter les faces vues

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

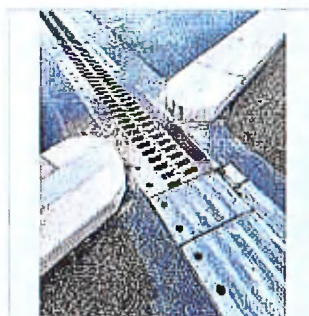

49 - recharger le socle béton pour cacher les capuchons des tiges d'ancrage

Statut : **Observation MOE**


Créateur: Aurelien ASTEIX



50 - Fournir DOE

Statut : **Observation MOE**


Créateur: Aurelien ASTEIX

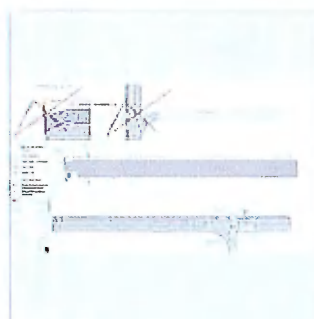

51 - sous réserve avis contrôle extérieur sur l'étanchéité et les gammadensimètre

Statut : **Observation MOE**


Créateur: Aurelien ASTEIX

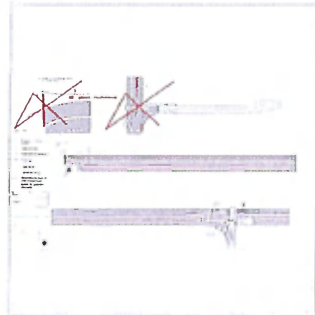

52 - sous réserve avis contrôle technique

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

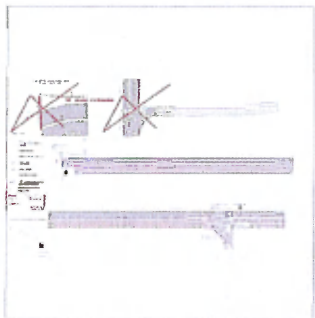

53 - supprimer les traces de colle/résine des balises provisoires

Statut : **Observation MOE**

Créateur: Aurelien ASTEIX

