

Compte-rendu financier et d'activités Année 2024

MERIGNAC Mérignac Soleil

SOMMAIRE

1	Pré	sentation de l'opération d'aménagement3
	1.1	Préambule3
	1.2	Cadre juridique de l'intervention3
	1.3	Périmètre de la concession d'aménagement4
	1.4	Programme prévisionnel de construction4
	1.5	Programme prévisionnel des équipements publics5
2	Act	ions menées au 31 décembre 20247
	2.1	Procédures administratives7
	2.2	Etudes9
	2.3	Acquisitions foncières
	2.4	Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens15
	2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur 15
	2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières16
	2.7	Accompagnement des projets immobiliers
	2.8. N	1édiation / Communication / Information
3	Act	ions à mener en 202522
	3.1	Procédures administratives22
	3.2	Etudes
	3.3	Acquisitions foncières et libération des sols24
	3.4	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise
	d'ouv	rage de l'aménageur24
	3.5	Commercialisation des terrains : cessions foncières24
	3.6	Accompagnement des projets immobiliers24
	3.7	Communication, concertation, médiation et animation du projet urbain25
4	Ana	alyse financière26
	4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 202426
	4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 202527
	4.3	Participation du concédant28
	4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie28
	4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts28

Présentation de l'opération d'aménagement 1

1.1 Préambule

Le projet urbain Mérignac Soleil vise à faire muter un site stratégique d'entrée de ville de près de 69 hectares entre l'aéroport et le cœur historique de Bordeaux.

Tout en veillant à conforter et valoriser l'activité commerciale en place sur ce secteur, l'opération d'aménagement s'attache à la mise en œuvre d'une programmation mixte mêlant habitat, équipements et services. Cette diversification programmatique s'inscrit dans la dynamique de restructuration et de densification urbaine liée au projet d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport, et dans les objectifs métropolitains de mise en œuvre d'une offre de logements accessible économiquement et attractive en termes d'usage.

Par ailleurs le projet s'appuie sur une stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols, de développement des mobilités douces et des perméabilités entre tissus pavillonnaires mitoyens et équipements publics majeurs environnants, d'optimisation et de mutualisation des stationnements; contribuant à créer les conditions nécessaires pour « habiter Mérignac Soleil – Chemin Long ».

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n°2018-449 en date du 6 juillet 2018, Bordeaux Métropole a :

- Approuvé les modalités financières prévisionnelles de l'opération d'aménagement,
- Approuvé le programme global des équipements publics et des constructions,
- Confié la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,
- Approuvé les termes du Traité de Concession de l'opération Mérignac Soleil avec la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, et autorisé le Président à signer ledit Traité,
- Délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins du traité de concession,
- Délégué l'exercice du droit d'expropriation à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins de l'exécution du traité de concession,
- Fixé le montant de la participation métropolitaine prévisionnelle à l'opération.

Le traité de concession « Mérignac Soleil » a été notifié à l'aménageur le 30 août 2018 pour une durée de 15 ans.

- Un premier avenant portant sur l'augmentation des participations communales et métropolitaines a été adopté par la délibération 2021-05 du 29 janvier 2021
- Un deuxième avenant redéfinissant le cadencement de la participation métropolitaine a fait l'objet de la délibération 2022-604 lors du conseil métropolitain du 6 décembre 2024
- L'avenant n°3 portant sur l'augmentation des participations communales et métropolitaines a été adopté par la délibération 2024-653 du 6 décembre 2024

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement



Mérignac Soleil

Périmètre du projet urbain actualisé suite aux enquêtes publiques DUP, MECDU et Parcellaire (68,9 ha)







1.4 Programme prévisionnel de construction

Le programme global des constructions issu du plan guide approuvé en 2018 qui fixait la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 210 000 m² environ pour les logements (soit environ 2 800 logements) et 90 000 m² environ pour les commerces, bureaux, activités et équipements, à été actualisé en 2024 à 206 711m² SDP logement (soit l'équivalent d'environ 2 978 logements avec un peu plus de petites typologies) et 70 707 m² pour les commerces, bureaux, activités et équipements.

Le travail d'actualisation du plan guide mené en 2024 a permis de prendre en compte les évolutions du contexte (arrivée du tramway en mai 2023, évolution des modèles économiques pour certaines enseignes, évolutions des attentes sur les formes urbaines du plan guide, évolutions des prix du foncier...) tout en réaffirmant les ambitions de désimperméabilisation et de refertilisation des sols et la reconstitution d'un paysage de nature dense sur le périmètre.

Le plan guide actualisé a été présenté en comité de projet le 23 octobre 2024.

Tableau récapitulatif des évolutions programmatiques (cf Annexe 4A) :

Natura du programmo	Programmation in	nitiale	Prévisions actualisé	Variation %	
Nature du programme	m² SP	%	m² SP	%	Variation 70
Locatif social	73 500	35,00%	73 363	35%	-0,19%
PLAI	22 050	10,50%	22 009	30%	-0,19%
PLUS	51 450	24,50%	42 697	58%	-0,19%
PLS			8 657	12%	-0,1976
Accession sociale et abordable	52 500	25,00%	5 170	3%	-4,38%
BRS			45 032	22%	-4,30/0
Accession libre	84 000	40,00%	83 851	40%	-0,18%
Sous total logements	210 000	100,00%	207 416		-1%

Total	300 000	100%	278 123		-7%
Commerces, activités, bureaux et équ	90 000	30%	70 707	25%	-21%
Logements	210 000	70%	207 416	75%	-1%

Nature du programme	Programmation initiale	%	Programmation actualisée 2024	%	Variation%
Locatif social	980	35%	1 046	35%	7%
PLAI	294	10,5%	314	30,0%	6,7%
PLUS	686	24,5%	609	58,2%	-11,2%
PLS	0		123	11,8%	
Accession sociale et abordable	700	25%	72	2%	-90%
BRS	0		659	22%	
Accession libre	1 120	40%	1 201	40%	7%
Sous total logements	2 800	100%	2 978		6%

Une mixité programmatique à l'îlot est toujours systématiquement recherchée.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme métropolitain « habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature », il vise notamment à la diversification et à l'accessibilité économique de l'offre de logements développée selon la répartition suivante actualisée : 35% de locatif social, 22% de BRS (bail réel solidaire), en lieu et place de l'accession sociale et abordable ramenée à 3%, 40% d'accession libre dont les logements en LLI (logement locatif intermédiaire).

1.5 Programme prévisionnel des équipements publics

Le projet urbain Mérignac Soleil s'appuie sur une stratégie paysagère extrêmement volontariste, qui vise à renaturer un secteur aujourd'hui imperméabilisé à 80% et dévolu à l'automobile, en conservant au maximum le patrimoine végétal existant.

L'actualisation du plan guide a maintenu ce niveau d'exigence et a permis d'optimiser l'aménagement des espaces publics en développant une stratégie paysagère s'appuyant sur :

- Une redéfinition des acquisitions foncières nécessaires aux aménagements afin de diminuer les impacts sur les propriétés privées
- Une inscription des aménagements paysagers dans la trame d'espaces verts existants aux abords du site Mérignac Soleil, en particulier le parc du Château;
- La requalification de l'ensemble des voies comprises dans le périmètre de l'opération, en systématisant les plantations d'alignements et en confortant, sécurisant, créant ou développant les linéaires cyclables,

et en proposant systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager et arboré;

La création de nouveaux espaces publics, des voies et venelles nouvelles pour faciliter la desserte des futurs programmes, ainsi que d'espaces uniquement dévolus aux piétons, en particulier trois parcs dont un d'environ un hectare.

Par ailleurs, afin d'accompagner l'arrivée de nouveaux habitants induits par l'opération, un nouveau groupe scolaire sera construit et la création ou la réhabilitation de trois classes dans un groupe scolaire préexistant en dehors du périmètre opérationnel a également été prévu.

a) Les espaces publics

Autour des principaux axes de circulation, dont les avenues de la Somme, J.F. Kennedy et Matosinhos, le projet consiste à réaliser des aménagements d'espaces publics visant à favoriser l'usage des modes alternatifs à l'automobile. Le projet peut pour cela s'appuyer sur l'offre de transport nouvelle que constitue le tramway et va également permettre de créer, développer, conforter et sécuriser des linéaires cyclables, et proposer systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager arboré plus dense.

Trois typologies d'espaces publics requalifiés, aménagés ou créés sont prévus par l'opération :

- Les « allées métropolitaines » : il s'agit de requalifier l'avenue Kennedy et l'avenue de la Somme afin d'accompagner l'arrivée du tramway, de permettre plus de confort d'usage pour les modes doux piétons et cyclables et composer des alignements d'arbres de première hauteur ;
- Les « rues transversales » : elles irrigueront et desserviront les différents programmes du quartier. Il peut s'agir de requalification de voiries existantes comme de création de voies nouvelles permettant la desserte d'îlots. Elles seront également généreusement plantées ;
- Les « espaces publics de sociabilité » : il s'agit de futures places publiques, placettes, parvis piétons et d'espaces verts emblématiques de type parc ou square, à créer, qui viendront participer à renouveler la qualité urbaine et paysagère du site et participer à l'animation du quartier.

En outre, les réseaux nécessaires à la desserte des programmes immobiliers seront dévoyés, créés ou renforcés dans le cadre des travaux réalisés par l'aménageur sur les futurs espaces publics.

Dans le cadre de l'actualisation du plan guide, le programme d'aménagement des espaces publics a été mis à jour (cf Avenant 3).

b) Les équipements de superstructure

Le programme des équipements publics prévoit également la création d'un nouvel équipement scolaire de 17 classes associé à une crèche et une salle multisports dans le périmètre de l'opération d'aménagement mais sous maitrise d'ouvrage Bordeaux-Métropole, et l'extension/réhabilitation de 3 classes répondant aux besoins de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil, réalisé en dehors du périmètre de l'opération d'aménagement, sur des groupes scolaires existants.

Actions menées au 31 décembre 2024 2

2.1 Procédures administratives

a) Arrêté de cessibilité

Dans la continuité de l'arrêté de DUP délivré par le préfet le 28 novembre 2023. Un dossier de demande d'arrêté de cessibilité et de procédure d'urgence a été déposé au début de l'année 2024.

L'arrêté de cessibilité, accompagné de la procédure d'urgence (valable 6 mois) a été délivré par la Préfecture le 24 avril 2024. Les premières ordonnances d'expropriations ont été reçues en juin 2024.

Au 31 décembre 2024, 3 jugements définitifs et 6 jugements provisionnels ont été rendus.


b) Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire des propriétés privées (loi 1892)

En accompagnement de la procédure d'expropriation des fonciers Carrefour et pour pouvoir respecter le calendrier prévisionnel des travaux engagés dans le cadre de la phase 1 des aménagements des espaces publics, une demande d'arrêté loi 1892 a été adressée à la Préfecture en octobre 2024. L'arrêté a été délivré le 16 octobre, permettant la continuité du chantier avec l'installation de la base vie sur une partie du parking Stokomani.


c) Préparation de l'avenant n°3 au traité de concession


L'actualisation du plan guide a permis de remettre à niveau l'ensemble des objectifs et leurs coûts associés.

La mise à niveau des coûts d'études, la mise à jour des besoins d'acquisitions foncières et leurs évaluations, la mise à jour du programme d'aménagement des espaces publics ont nécessité de réévaluer le bilan d'opération en augmentant la participation financière de Bordeaux Métropole de 14 986 713 €.

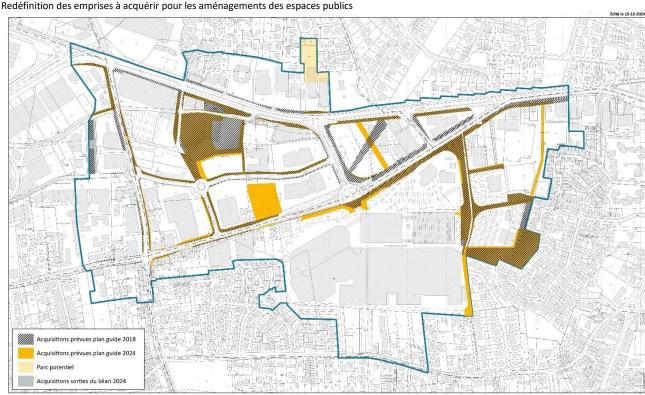

Redéfinition des emprises à acquérir pour permettre la mutation des îlots de constructions

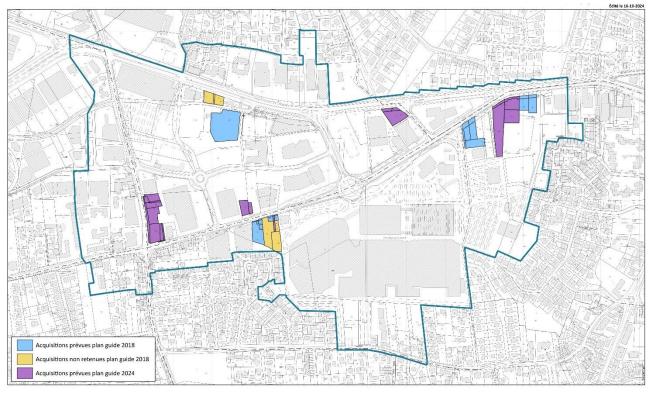

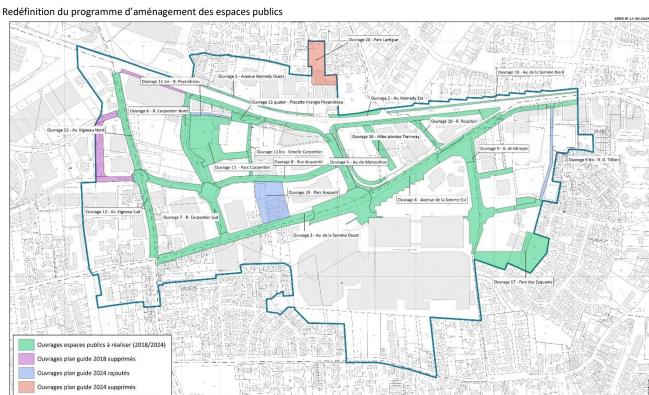

L'avenant n° 3 au traité de concession Mérignac Soleil a fait l'objet de la délibération n°2024 653 au conseil métropolitain du 6 décembre 2024.

2.2 Etudes

a) Plan guide et CPAUPE

Le plan guide initial finalisé en 2017 et les CPAUPE (global et à l'échelle de chaque voisinée) finalisés en 2018 ont fait l'objet d'une actualisation en 2024.



Plan guide de Mérignac Soleil - Source : OMA - MDP - Alto Step 8'18, mars 2020



Plan guide Mérignac Soleil 2024 – source LIST- MDP – Altostep – 8'18

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Cette actualisation du plan guide a été menée sous forme d'ateliers avec la Ville et Bordeaux Métropole afin de faire évoluer chaque voisinée/plaque. Ce travail a permis de mettre à jour les « duretés » foncières et de redéfinir les formes urbaines en adéquation avec des assiettes foncières « cohérentes ». Le travail de mise à jour du CPAUPE s'est engagé en fin d'année 2024 et se poursuit sur l'année 2025.

b) Etudes urbaines – volet accompagnement des projets immobiliers

Des missions ont été confiées en 2024 à l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pour accompagner la mutation de différents îlots (avis sur permis de construire, faisabilité et fiche de lot) et actualiser les études d'aménagements de certains espaces publics. Il s'agit notamment de :

- Avis sur le permis de construire de l'agrandissement de la pharmacie et du centre médical « Lachèze »
- Avis sur le permis modificatif 4 de l'opération Parc de Mirepin
- Avis sur le permis de construire de la réhabilitation de la station-service Carrefour
- Echanges avec les opérateurs et reprises des faisabilités sur l'ilot Stokomani, Flunch, Orlac
- Réalisation de la fiche de lot pour l'ilot Alinéa/Saint Maclou

c) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial

Dans le cadre de la mission complémentaire passée en 2023, le bureau d'étude Bérénice a accompagné l'équipe de maitrise d'œuvre urbaine afin de coordonner l'actualisation du plan guide et l'actualisation du schéma directeur de la stratégie commerciale.

Un atelier de travail rassemblant différentes enseignes du secteur s'est tenu le 30 janvier 2024. Celui-ci a permis de présenter les ambitions du projet urbain et d'aborder les pistes d'évolutions envisageables sur différentes thématiques sensibles (stationnement, logistique, déploiement en étage...)







d) Etudes de maitrise d'œuvre des espaces publics :

Dans le cadre du déroulement des travaux de la 1ere phase d'aménagement des espaces publics, des reprises d'études ont été faites afin de pouvoir prendre en compte le fonctionnement transitoire des aménagements avec l'existant et accompagner les négociations foncières toujours en cours. Ainsi, le profil du barreau Est Ouest de la rue Germaine Tillion dite « voie Mac Do » a été repris pour permettre la conservation d'un double sens de circulation jusqu'au parking arrière du Mac Donald.

D'autre part, la mission AVP pour le projet d'aménagement du parc « Carpentier » a été lancée en juin 2024.

e) Etudes techniques et environnementales

Les études techniques sont menées au fur et à mesure de l'avancement du projet et de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation des travaux en cours. En particulier :

- Missions géomètre
- Etudes géotechniques
- Dossiers de sécurité liés à la gestion trafic et au tramway

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Des études environnementales ont également été lancées et/ou réalisées en 2024 :

- Préparation du dossier de Demande de Dérogation Espèces Protégées (DDEP) accompagnant le projet d'aménagement du parc Carpentier et le projet du groupe scolaire, comprenant également l'analyse de l'éligibilité des fonciers de compensation et les projets de travaux et de plan de gestion correspondants.
- Une étude biodéchet à l'échelle des opération Marne et Soleil sur l'estimation des gisements et l'opportunité d'une valorisation par micro-méthanisation.
- Développement de l'outil « bilan carbone » par Nobatek/INEF4 à l'échelle de Mérignac Soleil
- Fin de l'actualisation de l'étude 4 saisons à l'échelle du périmètre de l'opération (à partir de septembre 2023 - achèvement à l'été 2024) afin d'accompagner la mise à jour des CPAUPE.
- Différents types d'analyses de sols, pour accompagner le traitement de différents types de pollution (pollution de surface pour un des sites de compensation de l'opération Parc/groupe Scolaire, pollution aux hydrocarbures sur un des secteurs en travaux de la rue Mirepin...).

f) Mission d'OPC interchantier et mission CSPS

Le nouveau marché associant l'OPC interchantier (OPCiC) et la mission d'OPC VRD sur les phases 0 et 1 des aménagements des espaces publics a été attribué à la société SETEC en mai 2023. Il a suivi son cours en 2024.

Un avenant de prolongation de la mission SPS a pu être fait jusqu'au 31/12/2025, prenant en compte l'interruption de travaux en 2021.

g) Poursuite de la phase d'incubation France 2030

Deux comités de suivi se sont tenus en juillet et novembre 2024. Les différentes études programmées dans la phase incubation ont toutes été engagées. Elles ont permis d'alimenter l'actualisation du plan guide et d'aider à la préfiguration des actions à présenter en 2025 pour rechercher des financements en phase réalisation. Ainsi, les études suivantes ont été finalisées ou engagées :

- Evaluation socio-économique et livret de synthèse des conclusions
- Lancement de la définition d'une stratégie économie circulaire à l'échelle de Mérignac Soleil, avec la réalisation d'un diagnostic des flux
- Restructuration de l'offre commerciale avec les grands comptes
- Articulation des mobilités du commerce de destination et résidentielles
- Evaluation des gaz à effet de serre de l'opération d'aménagement
- Evaluation de la mise en œuvre et des surcoûts des différents seuils de la réglementation environnementale RE 2020
- Etudes environnementales et démarche bâtiment durable de Nouvelle-Aquitaine pour le futur groupe scolaire
- Lancement d'une mission d'AMO en vue de la refonctionnalisation des sols
- Lancement de la plateforme participative Welcooom proposant la participation citoyenne dès la phase programmation des projets sur la plaque Pouchon
- Modélisation de l'ilot de chaleur urbain avant / après le nouveau plan guide

2.3 Acquisitions foncières

a) Acquisitions amiables

Aménagement de l'avenue Matosinhos :

2 promesses de vente ont été signées :

- 410m² pour un montant de 4100€ et 820€ d'indemnités remploi en juillet 2024
- 856m² pour un montant de 8560€ et 1534€ d'indemnités remploi en septembre 2024

Aménagement de l'avenue de la Somme et de la rue Mirepin :

Deux acquisitions amiables ont été réalisées :

- 44m² pour un montant de 2 200€, en juillet 2024,
- 111m² pour un montant de 7 770€ et 51 416€ pour l'ensemble des indemnités annexes et d'éviction en novembre 2024

Ilot P8-3:

Une promesse de vente a été conclue pour un bien de :

973m² au montant de 788 450€ et 134 550€ pour l'ensemble des indemnités annexes et d'éviction en février 2024.

Espaces publics

Afin de pouvoir réaliser les travaux d'assainissement sur le secteur de la rue Germaine Tillion, un protocole travaux a été signé avec Carrefour et Immofi Soleil en février 2024, complété par un avenant en juillet 2024.

Un protocole d'accord contenant promesse de vente, autorisation de travaux et mise en place d'une Obligation Réelle Environnementale (ORE) avec l'indivision Mérignac Soleil, représentée par la société Klépierre a été signé en décembre 2024.

La délibération métropolitaine 2024-650 permettant la finalisation de la convention d'ORE avec l'indivision Mérignac Soleil a été prise lors du conseil métropolitain du 6 décembre.

b) acquisitions par voie d'expropriation

Dans le cadre de la procédure d'expropriation en lien avec la phase 1 des travaux d'espaces publics et l'acquisition de certains îlots, plusieurs jugements provisionnels ont été rendus sur plusieurs emprises :

Aménagement de l'avenue de la Somme et de la rue Mirepin :

- 10 544m² pour un montant en principal de 340 700€ et de 35 070€ au titre des indemnités de remploi en octobre 2024
- 1 090m² pour un montant en principal de 14 500€ en décembre 2024

- 3 000m² pour un montant en principal de 263 480€ et de 267 348€ toutes indemnités accessoires confondues en octobre 2024
- 1 565m² pour un montant en principal de 30 750€ et de 67 075 toutes indemnités accessoires confondues en octobre 2024
- 711m² pour un montant en principal de 33 050€ et de 2 500€ au titre des indemnité de remploi en mai
- 402m² pour un montant en principal de 166 144€ et de 20 314 € toutes indemnités accessoires confondues en novembre 2024

Ilot P8-7 (et aménagements avenue de la Somme et rue Mirepin) :

- 936m² pour un montant de 466 290€ et de 48 879€ toutes indemnités accessoires confondues en juillet 2024
- 922m² pour un montant de 1 272 000€ et de 451 680€ toutes indemnités accessoires confondues en juillet 2024

2 jugements définitifs ont été rendus :

Ilot P8-4 (et aménagements avenue de la Somme) :


- 829m² pour un montant de 893 050€ et de 251 221€, toutes indemnités accessoires confondues, en septembre 2024
- 926m² pour un montant de 598 153€ et de 63 315 €, toutes indemnités accessoires confondues, en septembre 2024

c) Contentieux

Au cours de l'année :

- 1 recours gracieux, sans suite, et 1 recours contentieux, en attente de jugement ont été déposés contre l'arrêté de DUP.
- 1 recours gracieux, sans suite, et 1 recours contentieux, qui a donné lieu à un désistement, ont été déposés contre l'arrêté de cessibilité.
- 1 requête en référé suspensif contre l'arrêté de cessibilité a été rejetée en septembre 2024
- 1 requête en annulation contre l'arrêté de cessibilité déposée en septembre 2024 est en cours d'instruction

Synthèse des acquisitions foncières

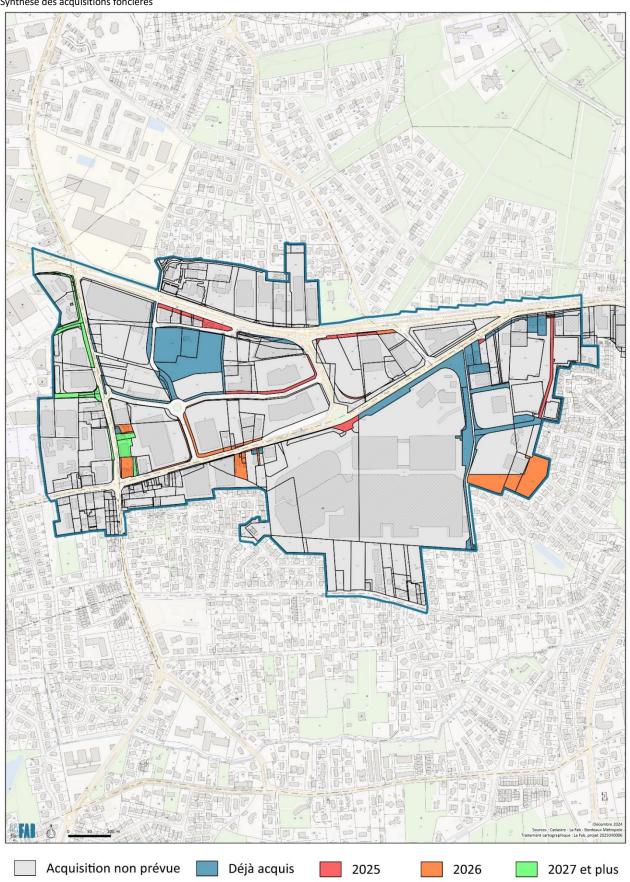

Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

a) Expertises immobilières

Une expertise immobilière a été menée en 2024 afin de permettre de mener à bien les négociations pour l'achat d'un immeuble et l'éviction de son occupant au 51 chemin de Mirepin – parcelle AY 742 d'une surface de 973m².

b) Assistance juridique

Les principales missions d'assistances juridiques menées en 2024 ont porté sur l'accompagnement de la procédure de cessibilité, sur l'accompagnement des négociations amiables de cessions foncières et sur l'accompagnement des procédures de préemption engagées en 2021 dont les appels sont en cours d'instruction.

c) Mise en état et libération des sols

Dans le cadre de la préparation des futures démolitions et afin d'alimenter les réflexions pour la mise en place d'une stratégie d'économie circulaire sur le projet urbain, des diagnostics ressources ont été effectués sur les magasins Keria, Memphis, Saint Maclou et Orchestra.

d) Gestion des biens

L'ensemble des biens propriété de La Fab sont équipés d'alarme et de dispositifs de sécurisation des accès au fur et à mesure des acquisitions. Un entretien des différents espaces verts et des interventions pour assurer la propreté des sites occupés sont également assurés tout au cours de l'année.

2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur


a) Conception des espaces publics

L'actualisation du plan guide a fait évoluer le programme des équipements publics, au stade études préliminaires espaces publics (en dehors de la phase 1), avec l'objectif de préserver au maximum les arbres existants.

Dans le cadre des travaux en cours de la phase 1 des espaces publics, des adaptations de certaines séquences ont été demandées afin de prendre en compte le fonctionnement de l'existant appelé à muter dans un futur plus lointain et de commencer à tester de nouveaux matériaux pour améliorer la désimperméabilisation des espaces publics.

b) Travaux sous maîtrise d'ouvrage aménageur

Pour faire suite à la livraison en 2023 des tronçons 1.1 (sans la partie venelle) et 1.1 bis, 1.3 et du premier tronçon de la nouvelle rue Germaine Tillion, en 2024 ce sont les travaux d'aménagement des secteurs 1.4, 1.5 et 1.7 qui ont été réalisé ainsi qu'une partie des travaux d'assainissement sur le secteur 1.8.

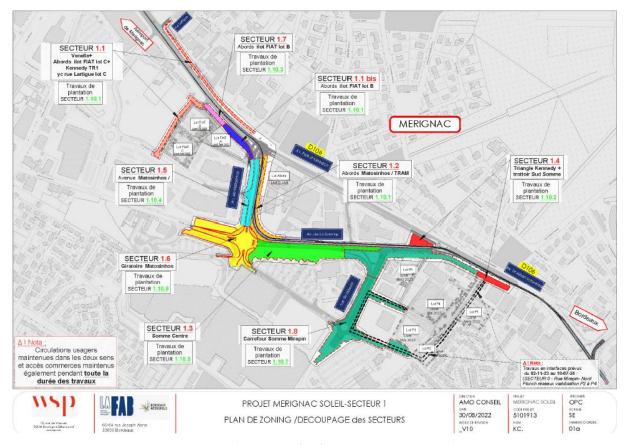

Organisation des travaux d'aménagement des espaces publics phase 1

c) Réalisation des travaux hors maîtrise d'ouvrage aménageur

Des adaptations réseaux via les concessionnaires (Régie de l'eau, Enedis notamment) ont été nécessaires pour la réalisation des travaux de la phase 1. Une coordination avec les services de Bordeaux Métropole a également été menée pour permettre l'installation des nouveaux arrêts de bus sur les secteurs livrés.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession de terrain n'a été réalisée en 2024.

Publié le : 03/10/2025

SPL La Fab - CRFA 2024 – Mérignac Soleil

2.7 Accompagnement des projets immobiliers



Récapitulatif des PC purgés et chantiers en cours fin 2024 – 824 logts et 5 166m² activités

a) <u>Îlot 8.12 Parc Mirepin/Oasis Urbaine P1, P2, P3, P4 (ex Castorama) et 8.5 résidence Corylus/P5 (ex Castorama)</u>

A l'issue d'une consultation lancée par La Fab et le propriétaire, Castorama, a été retenu le groupement Aqprim/Sogeprom et Clairsienne pour la maîtrise d'ouvrage, La nouvelle Agence, BLP et Two architects pour la maîtrise d'œuvre.

Le permis de construire, Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4), valant division a été délivré le 10 août 2018, comme le permis de construire du P5.

Le permis modificatif n°4 pour le Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4) a été déposé en décembre 2023 et délivré en mars 2024.

La société Aqprim ayant déposé le bilan en 2024, c'est la société Sogeprom qui a repris l'opération afin de pouvoir la mener à son terme.

Concernant les plots P1 à P4, la programmation de l'îlot représente 28 040 m² SDP, soit 350 logements et 1478 m² de commerces et services en rez-de-chaussée. La programmation logement se répartit comme suit :

- 53 % de logements sociaux, représentant 186 logements,
- 3 % de logements en accession sociale ou abordable, représentant 10 logements,
- 5 % de logements en BRS, représentant 18 logements,
- 39 % de logements en accession libre, représentant 136 logements.

Concernant le plot P5, la programmation représente 3 608,66 m² SDP soit 31 logements et 3 cellules commerciales. La programmation logement se répartie comme suit :

- 74 % de logements en accession sociale et abordable représentant 23 logements,

Publié le : 03/10/2025

- 26 % de logements en accession libre représentant 8 logements

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

En 2023, la résidence Corylus (P5) a été livrée au mois de mai 2024.





Photo chantier îlot 8.5 – Corylus/P5 (ex CASTORAMA) -

septembre 2023

© Sabine Delcour

La résidence Charme (P1) a été livrée au mois de septembre 2024.





Photo chantier îlot 8.10 – Charme/P1 (ex CASTORAMA) -octobre 2023

© Sabine Delcour

Le Bâtiment P3 (Euphorbia), sous maitrise d'ouvrage Aqprim, dont le chantier a démarré en février 2022 est en cours de gros œuvre pour une livraison prévue en juin 2025.





Photo chantier îlot 8.10 – Euphorbia/P3 ex CASTORAMA) -septembre 2023

septembre 2024

©Sabine Delcour

Les travaux du bâtiment P4 (Tamaris), sous maîtrise d'ouvrage de Clairsienne, ont démarré en décembre 2022 et la résidence doit être livrée en septembre 2025.





Photos chantier îlot 8.10- Tamaris (P4) (ex CASTORAMA) - septembre 2023 septembre 2024

© Sabine Delcour

b) <u>Îlot 4.3 Fiat – Park Avenue</u>

Les opérateurs Pichet et Clairsienne ont acquis le foncier de l'ex-concession automobile Fiat auprès du propriétaire. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à l'agence BLP.

La programmation de l'opération est la suivante, à l'issue des dernières modifications :

- 290 logements représentant 20 938 m² SDP, soit :
 - 50 % de logements sociaux (103 logements),
 - 7,5 % logement en BRS (22 logements),
 - 7 % logement abordable (21 logements) et
 - 35,5 % de logement en accession libre (144 logements)
- 2 268 m² de surfaces commerciales.

Le permis de construire a été délivré en octobre 2018.

En 2022, le permis modificatif validant les évolutions du programme sur le bâtiment Clairsienne a été délivré.

Par ailleurs, les bâtiments A et C, sous maîtrise d'ouvrage de Pichet, ont été livrés respectivement en octobre 2022 et mai 2023. Les travaux se poursuivent sur le bâtiment C, sous maîtrise d'ouvrage Clairsienne, pour une livraison prévue en juin 2025.







Photos îlot 4.3 - Park Avenue (ex FIAT) - septembre 2023© Sabine Delcour







Photos îlot 4.3 - Park Avenue (ex FIAT) - novembre 2024© Sabine Delcour

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

c) Ilot P6-1 P6-2 (ex Alinéa St Maclou)

L'opérateur Nhood, via la foncière Plenosol, est d'ores et déjà propriétaire du foncier Ex Alinéa depuis 2019. En 2024, via la foncière Ceetrus, il a entrepris l'acquisition du foncier de St Maclou, en vue de la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble.

Dans ce contexte, il s'est rapproché de Bordeaux Métropole, La Fab et la Ville en vue de la définition d'une programmation et d'une constructibilité validée par l'ensemble des acteurs, en vérifiant sa faisabilité économique. Un travail partenarial s'est engagé permettant d'arrêter la programmation suivante:

- Logements locatifs sociaux : 35% (5.390 m² environ) se répartissant ainsi :

LLS familial PLAI: 30% soit environ 23 logements LLS familial PLUS: 16% soit 12 logements environ LLS étudiants PLS: 54 % soit 105 logements environ,


- Accession sociale (BRS): 20% soit 40 logements environ, représentant 3.080 m² de SDP
- Accession libre (dont LLI): 45% soit 102 logements environ (6.930 m² de SDP environ)
- Programmation commerciale: pour un total 5.260 m² de SDP comprenant les transferts de St Maclou et de Boulanger a minima.

Sur cette base, les négociations en vue de la passation d'une convention de partenariat entre Nhood et La Fab ont été engagées et une fiche de lot réalisée par la maîtrise d'œuvre urbaine. Une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en décembre 2024 en vue du choix d'une équipe d'architectes en avril 2025.

d) <u>Ilot P4.2b Leroy Merlin/Carpentier</u>

En avril 2024, la fiche de lot pour la construction du groupe scolaire, de la crèche et de la salle multi-sports a été complétée afin que Bordeaux Métropole puisse alimenter le concours de maitrise d'œuvre.

Accusé de réception en préfecture $\mathsf{SPL}\,\mathsf{La}\,\mathsf{Fab}\,\mathsf{-}\,\mathsf{CRFA}\,\mathsf{2024}\,\mathsf{-}\,\mathsf{M\acute{e}rignac}\,\mathsf{Soleil}\,\,\Big|\,033-243300316-20250926\,\mathsf{-}\mathsf{Imc}1110109\,\mathsf{-}\mathsf{DE}-1-1$ Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

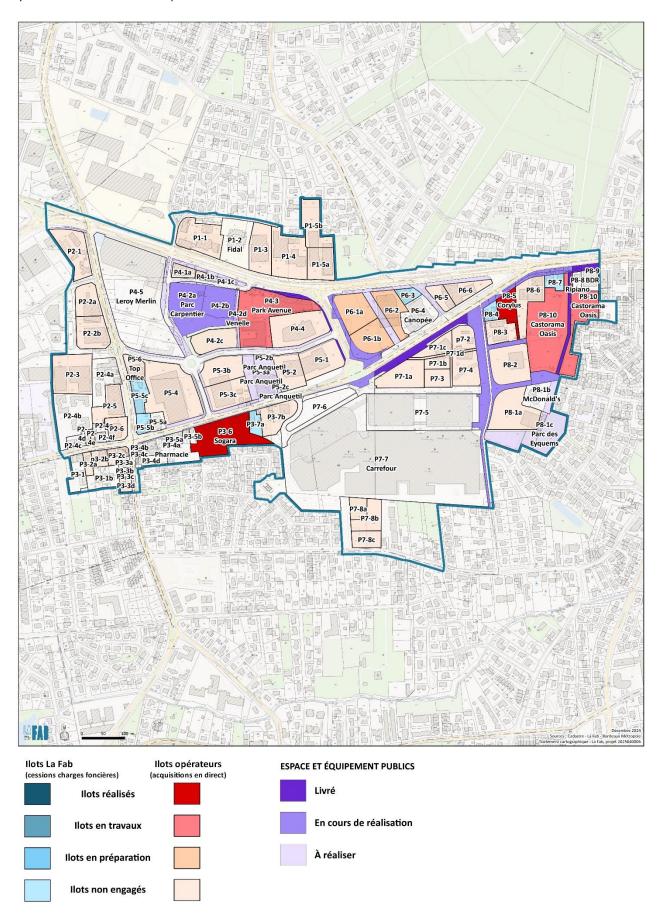

2.8. Médiation / Communication / Information

a) AMO communication, participation et animation du projet urbain

Dans le cadre du nouveau marché attribué à l'équipe Garluche/Alga/2 degrés en décembre 2023, la phase diagnostic a été remise en février 2024 et un plan d'actions a été présenté en mai 2024.



En termes de communication, la charte graphique a été reprise et simplifiée avec notamment la mise en place d'un nouveau logo identifiant l'opération Marne Soleil.

Un modèle de lettre info chantier a été mis en place et 5 lettres infos chantier ont été distribuées au cours de l'année.

Une lettre info projet a été éditée et distribuée en décembre et un principe de newsletter a été mis en place afin de permettre de mieux faire circuler l'ensemble des informations des projets urbains.

Un atelier de concertation autour du projet d'aménagement du parc Carpentier s'est tenu le 12 juin sur le site.







Des permanences mensuelles à la maison du projet au sein de la base du réemploi ont été remises en place à partir du mois de septembre. Au-delà de l'information sur le projet urbain, l'équipe a accompagné les habitants pour qu'ils puissent faire des propositions d'actions/projets sur lesquelles ils puissent s'investir et être acteur de leur mise en œuvre. Les résultats de ces « projets habitants » sont attendus pour 2025.

Pour mémoire, la base du réemploi (BDR) est portée par la concession Mérignac Soleil.

3 Actions à mener en 2025

3.1 Procédures administratives

a) Procédures foncières

En 2025, il s'agira de terminer les procédures d'expropriation en cours et de finaliser une nouvelle demande d'arrêté de cessibilité portant sur les dernières emprises foncières dont l'acquisition avait été programmée dans l'enquête parcellaire de 2023.

La convention d'ORE liant Bordeaux Métropole et l'indivision Mérignac Soleil devra être signée avant le 30 juin.

Afin de préparer la deuxième phase d'aménagement des espaces publics et maitriser les fonciers nécessaires aux travaux, une nouvelle enquête parcellaire devra être mise en oeuvre.

b) PLU

Dans le cadre de la préparation de la prochaine modification du PLU, une modification des règles de hauteur sur certains zonage couvrant le projet urbain sera demandée.

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

3.2 Etudes

a) Mission de maitrise d'œuvre urbaine

L'équipe de maitrise d'œuvre urbaine doit finaliser l'actualisation du CPAUPE.

En parallèle, l'équipe devra également assurer l'accompagnement de certains projets immobiliers :

- participation au jury de concours de l'ilot P6-1/P6-2 Alinéa/Saint Maclou et suivi de la préparation du permis de construire,
- participation au jury de sélection du projet d'architecture du groupe scolaire
- reprise de la faisabilité et fiche de lot ilot P4-2 Sud friche Leroy Merlin
- reprise de la faisabilité des ilots P7-1/7-2/7-3/7-4 secteur drive et station-service de Carrefour
- reprise de la faisabilité et fiche de lot de l'ilot P3-7 Orlac
- fiche de lot pour l'Ilot P6-5/P6-6 Orchestra

Par ailleurs, l'accord cadre du marché existant se terminant en octobre 2025, un nouveau marché devra être attribué avant la fin de l'année.

b) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial

En 2025, le marché d'accompagnement à la stratégie commerciale devra être renouvelé afin d'accompagner la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre urbaine dans les échanges à venir avec les enseignes, leurs mutations et leurs repositionnements.

c) Etudes techniques et environnementales

Les études techniques, en lien avec la réalisation des travaux de la phase 1 des espaces publics seront poursuivies, ainsi que celles nécessaires au lancement des travaux des phases suivantes.

En cohérence avec les engagements pris dans l'évaluation environnementale et dans la continuité des études 2024 :

- Dans le cadre de la convention recherche-action Qanopea, suite du développement des outils environnementaux « qualité de l'air », « ICU », « SFN » à l'échelle de l'opération
- Dans le cadre de France 2030, suite de l'évaluation « bilan Carbone » sur le plan guide actualisé et actualisation de l'outils « Fabnest » au regard de la réglementation RE 2020, des objectifs de réemploi, des types de végétalisation, etc...
- L'actualisation de l'étude qualité de l'air est programmée pour le premier semestre 2025
- Les dossiers réglementaires loi sur l'eau et Demande de Dérogation Espèces Protégées en lien avec les projets d'espace (Parc Carpentier et venelle) et d'équipements publics (groupe scolaire/crèche/salle multisports) de la Friche Leroy Merlin devront être finalisés et déposés.

d) Mission d'OPC, de CSPS et de sécurité tram

Le travail de coordination OPC VRD et OPC inter chantier se poursuivra en 2025.Le travail du coordinateur SPS se poursuivra également en 2025.

Le travail de MOE sécurité et d'OQA en lien avec le STRMTG (sécurité tram) se poursuivra également en 2025.

e) Etudes France 2030

En 2025, le dossier de demande de subvention pour 7 nouvelles actions en phase réalisation devra être déposé le 17 février 2025. L'audition aura lieu le 11 mars 2025 et le comité d'engagement - le 3 avril. A l'issue de cette étape, le niveau de subvention obtenu pour la phase de réalisation sera connu et les premières actions de terrain pourront être engagées.

En parallèle, les études de la phase incubation se poursuivront : finalisation de la stratégie d'économie circulaire de l'opération, études et actions permettant d'entreprendre à grande échelle la restauration écologique des sols désimperméabilisés, ainsi que la gouvernance collaborative avec les acteurs commerciaux.

3.3 Acquisitions foncières et libération des sols

En 2025, l'ensemble des dossiers engagés dans le cadre de la première procédure d'expropriation devra être finalisé soit par l'aboutissement des négociations amiables sous forme de traité d'adhésion, soit par le rendu des jugements définitifs du tribunal, soit encore 11 dossiers en cours (acquisition des murs, éviction des occupants).

Des négociations à l'amiable et l'acquisition d'un maximum d'emprises foncières nécessaire à la phase 2 des travaux d'espaces publics, devront être engagées en parallèle de la préparation de la 2eme enquête parcellaire.

3.4 Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

a) Etudes de maîtrise d'œuvre des espaces publics

Les études AVP pour l'aménagement du parc public sur la friche Leroy Merlin (dit « parc Carpentier ») seront menées par La Fab afin de permettre la coordination avec le projet de construction du nouveau groupe scolaire/crèche/salle multisports sous maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole et notamment le dépôt du dossier conjoint de Demande de Dérogation Espèce Protégées (DDEP) afin de valider et de réaliser les mesures de compensations préalables aux travaux.

b) Réalisation des travaux

Les travaux des réseaux d'assainissement de la phase 0 se poursuivront jusqu'en juin sur les rues Tillion et Mirepin.

Les travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1 seront poursuivis sur les avenues Matosinhos, Somme et les ruesGermaine Tillion et Mirepin.

Des travaux concessionnaires sont également prévus début 2025 pour permettre le développement réseau du secteur Mirepin (ENEDIS et GAZ).

Enfin des travaux de démolition sont prévus à l'été 2025 (4 maisons) suites à l'expropriation en 2024.

3.5 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession foncière n'est prévue en 2025.

3.6 Accompagnement des projets immobiliers

a) Fonciers Carrefour / Immofi Soleil / SCI Maklouf

La Fab a convenu avec les partenaires Carrefour, Klépierre, Immofi Soleil et la SCI Maklouf de travailler ensemble sur les prochaines années à des scénarios de valorisation des fonciers aux abords du centre commercial, qui puissent s'intégrer dans les grandes orientations d'aménagement du projet urbain.

En 2025, il est prévu une série de réunions de travail, avec l'appui de la maîtrise d'œuvre urbaine, dans le cadre des ateliers de projet (réunissant également la Ville et la Métropole) afin de rendre les scénarios du plan guide les plus opérationnels possible et valider une programmation avec ces acteurs.

b) Ilot P8.10 et P8.6 Parc Mirepin/Oasis Urbaine – Castorama

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Les travaux se poursuivront sur l'îlot Castorama en vue de la livraison des îlots P3 (Euphorbia) et P4 (Tamaris) prévus en juin et septembre 2025. La Fab sera amenée à retravailler la programmation de ses travaux d'espaces publics afin d'assurer les raccordements définitifs d'assainissement et la desserte des îlots P3, P4 et P5.

c) <u>Ilot P4.3 Park Avenue - Fiat</u>

Les travaux se poursuivront sur le bâtiment B en vue de la livraison sous maîtrise d'ouvrage Clairsienne prévue pour septembre 2025.

d) <u>Îlots P6.1 et P6.2 – Alinéa/Saint Maclou</u>

Suite au lancement du concours d'architectes fin 2024, l'équipe de maitrise d'œuvre urbaine participera au jury et accompagnera la mise au point du projet préalable au dépôt du permis de construire.

a) <u>Ilots P6-5 et P6-6 Orchestra</u>

Les échanges sur la programmation de cet îlot devront se poursuivre avec la SAS Repenser la Ville afin de trouver l'identité spécifique attendue qui constituera un marqueur d'identité à l'échelle du projet urbain. Une fois cette programmation stabilisée et un équilibre économique validé par la SAS Repenser la Ville, le travail de la fiche de lot pourra être réalisé.

b) Ilot P8.3 - Kéria

Sur la base du plan guide actualisé, les négociations pourront être relancées avec les propriétaires afin d'envisager la passation d'une convention de partenariat et la réalisation d'une fiche de lot d'ici la fin de l'année 2025.

c) Ilot P4.2 Leroy Merlin/Carpentier

La Fab et la maitrise d'œuvre urbaine participeront à l'analyse du concours du projet d'architecture porté par Bordeaux Métropole.

La Fab poursuivra également les échanges avec les opérateurs Pichet et Nhood sur la base d'une étude de faisabilité urbaine mise à jour et intégrant les conclusions de l'étude environnementale menée sur ce secteur. La validation d'un scénario de programmation sur cet îlot constituera le préalable au lancement de toute consultation de maîtrise d'œuvre.

Communication, concertation, médiation et animation du projet urbain 3.7

En accompagnement du lancement de la mission AVP du parc Carpentier, un deuxième atelier de concertation avec les habitants sera réalisé.

Afin de pouvoir présenter l'actualisation du plan guide Soleil et l'avancement des projets urbains Marne et Soleil, une réunion publique sous forme de forum urbain sera organisée en mai 2025.

Des panneaux à destination d'une exposition dans l'espace public seront à mettre en place début 2025 afin de présenter les actions du double projet Marne-Soleil. La mise à jour de la maquette de la maison des projets devra être réalisée.

Des supports de communication seront à prévoir comme en 2024 pour préciser l'avancement des travaux (lettre chantier) et du projet (lettre projet) auprès des habitants et des commerçants du secteur.

SPL La Fab - CRFA 2024 - Mérignac Soleil

Page 25 sur 30

4 Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2024

Les Dépenses pour l'année 2024 correspondent à :

ETUDES:

Le poste Etude représente 833 811 € TTC.

- Actualisation du plan guide du projet urbain
- Fiche de lot du groupe scolaire
- Fiche de lot llot P6-1 P6-2
- Etudes de géomètre, géotechniques, actualisation des diagnostics écologiques du secteur Carpentier et à l'échelle du périmètre de projet
- Mission de coordination par l'OPC interchantier

FONCIER:

Le poste Foncier représente 5 504 177 € TTC.

- Acquisitions foncières
- Suivi de la procédure de DUP et de cessibilité
- Frais d'expertises foncières et d'assistance juridique
- Gestion des biens maitrisés

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES:

Le poste Frais d'aménagement représente 4 957 399 € TTC.

- Honoraires de la maîtrise d'œuvre, du SPS et de l'OPC
- Travaux de la phase 0 des espaces publics
- Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des concessionnaires
- Travaux de la phase 1 des espaces publics

HONORAIRES CONCESSION:

Le poste Honoraires de concession représente 400 000 € TTC.

COMMUNICATION:

Le poste Médiation/Communication représente 82 048 € TTC.

 Mission réalisée par l'AMO médiation communication : lettres d'information ; gestion du site internet ; organisation d'évènementiels

FRAIS DIVERS:

Le poste Frais divers s'élève à 194 846 € TTC

Imputation des frais liés aux travaux de la Base Du Réemploi (maison des projets Marne Soleil)

Les dépenses en 2024 s'élèvent à un montant global de 13 137 129 € TTC.

Les Recettes pour l'année 2024

SUBVENTIONS

Le poste Subventions représente 49 982 € TTC.

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Subventions perçues au titre de France 2030 (350 000 €) et de l'Ademe pour la BDR (5 276 €)

PARTICIPATIONS:

Le poste Participation métropolitaine représente 8 800 000 € TTC.

PRODUITS DIVERS: produits divers, refacturation et produits financiers

Le poste autres produits représente 102 641 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 8 952 624 TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2025

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2025 correspondent à :

ETUDES GENERALES:

- Actualisation du CPAUPE
- Mission d'accompagnement des projets immobiliers et réalisation de fiches d'îlots et/ou faisabilités urhaines
- Mission de coordination des maîtrises d'ouvrage par l'OPCIC
- Les missions géomètre
- Etudes techniques
- Etudes environnementales
- Mission AMO commerces/activités/équipements
- Mission AMO Mobilité

FONCIER:

- Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du programme prévisionnel des équipements publics
- Mise en œuvre de la procédure de cessibilité
- Assistance juridique sur les procédures d'expropriation

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES:

- Maitrise d'œuvre : suivi de chantier
- Travaux de viabilisation de l'îlot Oasis urbaine (phase 0) et poursuite des travaux de la phase 1

HONORAIRES CONCESSION

• Rémunération forfaitaire dont le montant est recalé en fonction de l'avancement de l'opération

FRAIS DE COMMUNICATION:

 Mission d'animation, concertation, médiation et communication : réalisation de lettres info chantier et lettre info projet, mise à jour site internet et diffusion newsletter, atelier concertation parc « Carpentier », Forum des projets urbains, mise à jour maquette

FRAIS DIVERS:

- Frais divers et frais financiers.
- Participation aux frais liés à la maison des projets : frais liés à la gestion de la maison des projets

Les dépenses s'élèvent prévisionnellement à 15 315 997 € TTC.

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2025 :

PARTICIPATION METROPOLITAINE : il est prévu le versement d'une participation à l'équilibre et à la remise d'ouvrage

PARTICIPATION VILLE : il est prévu le versement d'une participation à la remise d'ouvrage de la Ville de Mérignac

Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2025 sont de 9 221 337 € TTC.

4.3 Participation du concédant

L'avenant 3 au traité de concession fixe le montant de la participation du concédant à 70 774 200 € HT (TVA due en sus) dont 53 253 135 € HT au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 17 521 064 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement et le montant de la participation du concédant sont modifiés, selon l'échéancier suivant :

- 2025: 6 000 000 € TTC - 2026: 3 900 000 € TTC - 2027: 9 035 963 € TTC - 2028: 6 800 000 € TTC - 2029: 4 850 000 € TTC - 2030: 6 051 135 € TTC - 2031: 3 897 798 € TTC - 2032: 2 503 471 € TTC - 2033: 206 459 € TTC

4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2024, la trésorerie présente un solde positif de 11 375 890 € et un solde prévisionnel cumulé positif de 10 281 231 € au 31 décembre 2025.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

FONCIER: Au global, ce poste prévisionnel augmente de 1 123 516 € HT comprenant l'augmentation des couts des terrains acquis en 2024 (toutes indemnités incluses) pour un montant de 1 893 167 € et la diminution des aléas foncier pour un montant de 649 651 €.

FRAIS FINANCIERS ET ACTUALISATION : ces postes sont ajustés (en fonction de l'avancement de l'opération) à la baisse pour un montant respectif de 212 000 € et 708 453 €.

AUTRES PRODUITS : ces postes constitués des loyers et des produits financiers encaissés en 2024 s'élèvent à +183 062 €

Le bilan prévisionnel demeure donc à l'équilibre et n'a pas d'impact sur le montant de la participation du concédant.

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Point de vigilance :

L'estimation prévisionnelle du montant des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet urbain reste soumis à une part d'aléas non négligeables. En effet de nombreux facteurs restent imprécis au stade des évaluations tels les prétentions des propriétaires, l'évolution des valeurs foncières, l'état de santé des activités présente sur ces sites, la réalité des surfaces bâties... Ces données impactent significativement la fixation des prix notamment par le juge de l'expropriation.

Si la tendance à la hausse des valeurs foncières et des prétentions des propriétaires se poursuit, comme observée lors de l'exercice 2024, malgré le travail d'actualisation mené dans le cadre de l'avenant 3, un nouvel arbitrage serait à réaliser en 2025 pour prioriser les acquisitions foncières et de manière générale les dépenses.

Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de l'opération d'aménagement

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des heures d'insertion



MERIGNAC SOLEIL CRFA 2024 Bilan consolidé

Annexe 1

DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC	RECETTES			€ HT	€TVA	€ TTC
					Bilan origine	CRFA 2024			
Études de définition et de suivi de l'opération	5 195 160	992 548	6 187 708	Cession Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	9 648 445	1 597 482	11 245 927
Accompagnement projets immobiliers	2 230 000	399 528	2 629 528	Accession libre	450	4 590	5 232 053	1 046 411	6 278 464
Autres études	2 965 160	593 020	3 558 180	Accession abordable	130	1 170	0	0	0
				Locatif social	215	1 935	1 715 520	171 552	1 887 072
Frais d'acquisition et de libération des sols	32 436 337	3 824 198	36 260 534	Accession sociale	213	1 917	0	0	0
Acquisitions foncières	23 200 093	3 534 128	26 734 220	BRS		2 187	1 107 964	60 938	1 168 902
- détail acquisitions	0	0	0	Commerces	260	2 340	844 708	168 942	1 013 650
* dont foncier métropolitain		0	0	Bureaux		2 340	0	0	0
* dont foncier communal	0	0	0	Activités	200	2 015	748 200	149 640	897 840
* dont foncier privé	23 200 093	3 534 128	26 734 220		Bilan origine	CRFA 2024			
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	7 672 170	149 402	7 821 572	Participation constructeurs	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	0	0	0
Libération des terrains	700 000	140 668	840 668	Accession libre		0	0	0	0
Aléas	864 074	0	864 074	Accession abordable		0	0	0	0
				Locatif social		0	0	0	0
Frais d'aménagement (*)	42 000 186	8 356 741	50 356 927	Accession sociale		0	0	0	0
Maîtrise d'œuvre	4 014 642	787 258	4 801 901	Commerces			0	0	0
Travaux et aléas	33 792 554	6 744 984	40 537 538	Bureaux			0	0	0
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	4 192 990	824 498	5 017 488	Activités		0	0	0	0
Participation aux equipements publics	0	0	0	Participation équipements d'intérêt	général réalisés	par l'aménage	eur (superstruc	tures)	
	0	0	0						
				Subventions			581 571	0	581 571
Honoraires concession	3 950 000	0	3 950 000	-					
	3 950 000	0	3 950 000	Participation métropolitaine			70 774 200	10 650 627	81 424 827
		95 335	00= 00=	Participation équilibre			17 521 065	0	17 521 065
Frais de communication	530 000	95 808	625 808	Participation remise d'ouvrages			53 253 135	10 650 627	63 903 762
				Participation complément prix			0	0	0
Frais divers	928 000	169 703	1 097 703	Dentisia stiene seemal			2.554.044	740.000	4.207.000
Frais financiers	0	0	0	Participation communale			3 554 941	710 988	4 265 929
Frais divers (Assurance, Taxes)	928 000	169 703	1 097 703	Ville de Mérignac			3 554 941	710 988	4 265 929
A sk. aliantia.	200.224	70.647	477.000	Atusa vasattas			070.700	160.456	1 020 046
Actualisation Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	398 234 398 234	79 647	477 880 477 880	Autres recettes Autres produits			878 760	160 156	1 038 916
Havada et 1010 - 110 Fr (1701. augmentation moyenne 2,73% par any 1015 folicier, Reiff et F.Fi	398 234	79 047	4// 880	'			801 881	160 156	962 038
	0	200.204	200 204	Produits financier			76 879	0	76 879
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	-399 391	-399 391						
TOTAL DES DEPENSES	85 437 916	13 119 254	98 557 170	TOTAL DES RECETTES			85 437 916	13 119 254	98 557 170
I TOTAL DES DEPENSES	03 43/ 916	13 119 254	20 22 / 1/0	TOTAL DES RECETTES			05 43 / 916	13 119 254	28 22/ 1/0

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1


Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025



Autres produits Produits financier

TOTAL DES RECETTES


intropole	(1) Bilan initi valeur	al %	(2) CRFA 2024 valeur S	
EPENSES EN TTC €				
tudes de définition et de suivi de l'opération	1 980 000	3%	6 187 708	6%
ccompagnement projets immobiliers	1 440 000	2%	2 629 528	3%
utres études	540 000	1%	3 558 180	4%
rais d'acquisition et de libération des sols	23 586 523	30%	36 260 534	37%
Acquisitions foncières	18 947 572	24%	26 734 220	27%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%
* dont foncier privé	18 947 572	24%	26 734 220	27%
rais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	4 638 951	6%	7 821 572	8%
ibération des terrains	0	0%	840 668	1%
utres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	0	0%	864 074	1%
rais d'aménagement (*)	42 823 039	55%	50 356 927	51%
1aîtrise d'œuvre (10%)	4 055 474	5%	4 801 901	5%
ravaux et aléas	38 623 565	50%	40 537 538	41%
utres frais	144 000	0%	5 017 488	5%
	•	-		
articipation aux equipements publics	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%
onoraires concession	3 950 000	5%	3 950 000	4%
	3 950 000	5%	3 950 000	4%
	3 330 000	3,0	3 330 000	.,,,
ais de communication	660 000	1%	625 808	1%
rais divers	1 519 000	2%	1 097 703	1%
rais financiers	1 425 000	2%	0	0%
rais divers (Assurance, Taxes)	94 000	0%	1 097 703	1%
ada a Brandina	4 000 171	201	477.000	00/
ctualisation	1 831 474	2%	477 880	0%
avaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	1 831 474	2%	477 880	0%
		444	-399 391	0%
VA encaissée (-) / reversée (+)	1 123 077	1%	-333 331	0,0

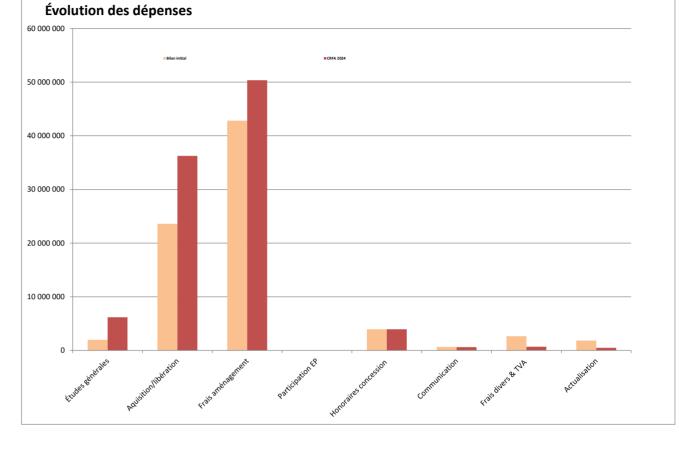


RECETTES EN TTC €

	Bilan origine	CRFA 2024					
Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	13 717 848	18%	11 245 927	11%	-18%
Accession libre	450	4 590	7 329 960	9%	6 278 464	6%	-14%
Accession abordable	130	1 170	661 733	1%	0	0%	-100%
Locatif social	215	1 935	1 778 733	2%	1 887 072	2%	6%
Accession sociale	213	1 917	1 860 022	2%	0	0%	-100%
BRS		2 187		0%	1 168 902	1%	0%
Commerces	260	2 340	1 271 400	2%	1 013 650	1%	-20%
Bureaux	0	2 340	0	0%	0	0%	0%
Activités	200	2 015	816 000	1%	897 840	1%	10%
			1				
	Bilan origine	CRFA 2024					
Participation constructeurs	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	0	0%	0	0%	0%
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures			0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général			U	0%	U U	0%	0%
Tarticipation equipements a interest general			<u> </u>	070		070	070
Subventions				0%	581 571	1%	0%
Participation métropolitaine			61 115 010	79%	81 424 827	83%	33%
Participation équilibre			1 469 047	2%	17 521 065	18%	1093%
Participation remise d'ouvrages			59 645 963	77%	63 903 762	65%	7%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0%
Participation communale			2 640 256	3%	4 265 929	4%	62%
Ville de Mérignac			2 640 256	3%	4 265 929	4%	62%
The de menghav			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				4275


Date de réception préfecture : 03/10/2025



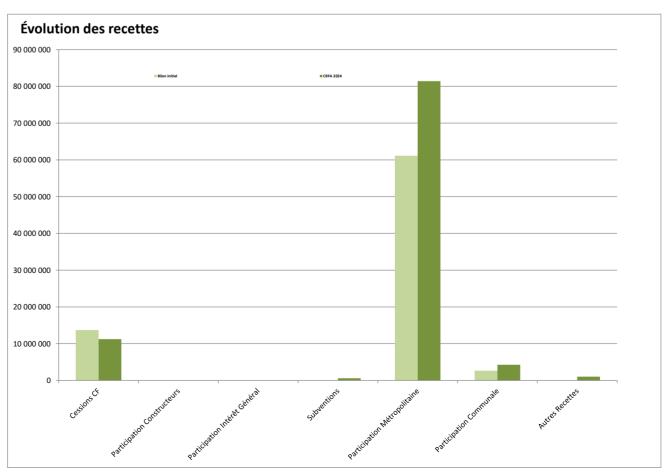




				Etat d'avar	ancement		
	CRF 2024		Réalisé à fin	2024	Reste à réali	iser	
	valeur 9	6	valeur	%	valeur 9	%	
DEPENSES EN TTC €							
Études de définition et de suivi de l'opération	6 187 708	6%	2 370 846	38%	3 816 862	629	
Accompagnement projets immobiliers	2 629 528	3%	1 091 892	42%	1 537 636	589	
Autres études	3 558 180	4%	1 278 954	36%	2 279 226	649	
Frais d'acquisition et de libération des sols	36 260 534	37%	8 498 629	23%	27 761 906	775	
Acquisitions foncières	26 734 220	27%	6 696 338	25%	20 037 882	759	
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0	
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0	0	
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0	0	
* dont foncier privé	26 734 220	27%	6 696 338	25%	20 037 882	759	
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	7 821 572	8%	1 744 053	22%	6 077 519	789	
Libération des terrains	840 668 864 074	1% 1%	58 238	7% 0%	782 430	939	
Aléas	864 074	1%	U	0%	864 074	100	
Frais d'aménagement (*)	50 356 927	51%	9 239 505	18%	41 117 421	829	
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 801 901	5%	1 193 574	25%	3 608 327	759	
Travaux et aléas	40 537 538	41%	7 679 298	19%	32 858 239	819	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	5 017 488	5%	366 633	7%	4 650 855	939	
Participation aux equipements publics	0	0%	0	0%	0	0	
	0	0%	0	0%	0	0	
Honoraires concession	3 950 000	4%	1 957 258	50%	1 992 742	509	
	3 950 000	4%	1 957 258	50%	1 992 742	509	
Frais de communication	625 808	1%	372 648	60%	253 160	409	
Frais divers	1 097 703	1%	893 385	81%	204 318	199	
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0	
Frais divers (Assurance, Taxes)	1 097 703	1%	893 385	81%	204 318	19	
Actualisation	477 880	0%	0	0%	477 880	1009	
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	477 880	0%	0	0%	477 880	100	
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-399 391	0%	4 032 422	-1010%	-4 431 813	1110	
TOTAL DES DEPENSES	98 557 170	100%	27 364 694	28%	71 192 476	729	

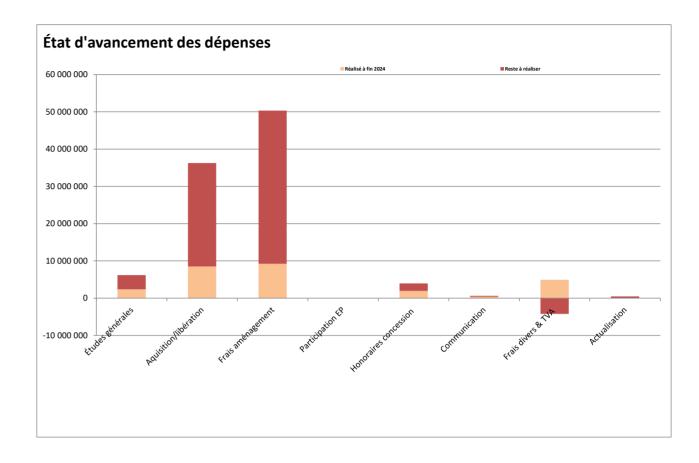

RECETTES EN TTC €

RECEITES EN TIC C	_		•					
	Bilan origine		<u> </u>					
Charges foncières	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	11 245 927	11%	0	0%	11 245 927	100%
Accession libre	450	4 590	6 278 464	6%	0	0%	6 278 464	100%
Accession abordable	130	1 170	0	0%	0	0%	0	0%
Locatif social	215	1 935	1 887 072	2%	0	0%	1 887 072	100%
Accession sociale	213	1 917	0	0%	0	0%	1 4 50 000	0%
BRS	360	2 187 2 340	1 168 902	1% 1%	0	0% 0%	1 168 902	100% 100%
Commerces	260 0	2 340	1 013 650	0%	٥	0%	1 013 650	0%
Bureaux Activités	200	2 340	897 840	1%	0	0%	897 840	100%
Activites	200	2 013	037 040	1/0	<u> </u>	070	037 040	100%
	Bilan origine	CRFA 2024	Ī					
Participation constructeurs	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	0	0%	0	0%	0	
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageu	(aa.a.a.a.a.a.a.a.a.		0	0%	01	0%	01	0%
Participation équipements d'intérêt général	ir (superstructures)		U	0%	U	0%	U	0%
Participation equipements d interet general			· · · · · · · · ·	070		070		0,0
Subventions			581 571	1%	419 077	72%	162 494	28%
Participation métropolitaine			81 424 827	83%	38 180 000	47%	43 244 827	53%
Participation équilibre			17 521 065	18%	1 070 000	6%	16 451 065	94%
Participation remise d'ouvrages			63 903 762	65%	37 110 000	58%	26 793 762	42%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0	0%
Participation communale			4 265 929	4%	01	0%	4 265 929	100%
Ville de Mérignac			4 265 929	4%	0	0%	4 265 929	100%
				-				*
Autres recettes			1 038 916	1%	141 507	14%	897 409	86%
Autres produits			962 038	1%	64 629	7%	897 409	93%
Produits financier			76 879	0%	76 879	100%	0	0%
				0%	l	0%		0%
				0%	l	0%		0%
				0%	l	0%		0%
				0% 0%		0% 0%		0% 0%
Accusé de	réception en préfecture			U%		U/0		υ%
TOTAL DES RECETTES 033-24330	00316-20250926-lmc11101	09-DE-1-1	98 557 170	100%	38 740 584	39%	59 816 586	61%

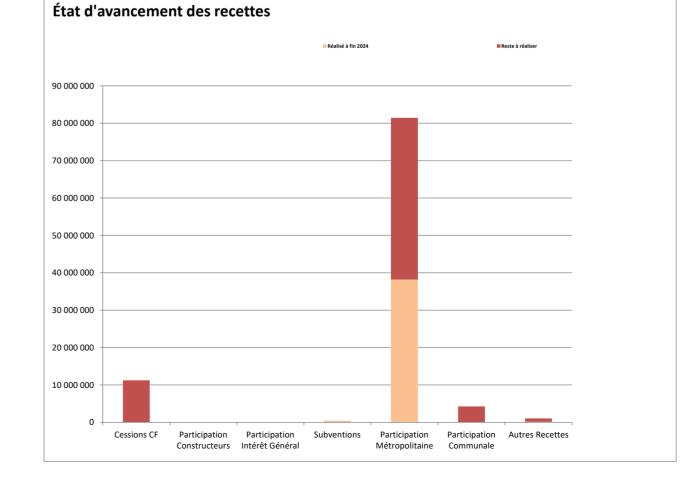

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025



MERIGNAC SOLEIL CRFA 2024 Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

de holdens willrogen																	Annexe 2c
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	TOTAL %
DEPENSES EN TTC €			1,	,	,		,			,				,	,,,,,,,		
Études de définition et de suivi de l'opération Accompagnement projets immobiliers	0 0	127 967 11	% 45 890 4%	299 246 8' 153 598 13'	% 131 627 11%	696 368 11 268 384 10	% 305 510 129	% 420 000	0% 467 584 8% 16% 248 584 10%	6 387 000 6% 6 192 000 7%	174 000 7%	156 000 6%	266 789 0% 138 000 0%	6 222 000 0 6 90 000 0	% 191 051 0% % 65 051 0%	152 931 0% 54 000 0%	6 187 708 100% 2 570 611 100%
Autres études	0 0	76 427 3		145 648 5	% 52 458 2%	427 984 12	% 528 301 159		28% 219 000 6%	195 000 5%	201 751 6%	168 997 5%	128 789 0%	132 000 0	% 126 000 0%	98 931 0%	3 617 097 100%
Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières	176 957 1'	% 0 0	% 70 351 0% % 0 0%	119 995 0 88 967 0	% 2 329 341 8%	194 555 1 19 756 0	% 4 098 275 159	% 2 364 527	9% 3 212 518 12%	7 605 848 21% 6 6 654 722 25%	1560 937 4% 877 146 3%	7 390 761 20% 4 900 872 18%	2 124 097 0% 2 028 097 0%	6 62 430 0 6 0 0	% 0 0%	0 0%	36 260 534 100% 26 734 220 100%
- détail acquisitions * dont foncier métropolitain	0 0	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 09 % 0 09	% 0	0% 0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
* dont foncier communal * dont foncier privé	160 000 1	.% 0 0	% 0 0%	88 967 O	% 0 0% % 2 329 341 8%	19 756 0	% 0 09 % 4 098 275 159	% 2 364 527	9% 3 212 518 12%	6 654 722 25%	877 146 3%	4 900 872 18%	2 028 097 09	6 0 0	% 0 0%	0 0%	26 734 220 100%
Frais (notariés 2%. frais de gestion des terrains. indemnités de transfert) Libération des terrains	16 957 0' 0 0'		% 13 714 0% % 56 636 9%	31 028 1 0 0	% 87 961 2% % 0 0%	174 799 2 0 0	% 1 404 301 189 % 1 601 09	% 96 000	17% 1 372 379 18% 11% 120 000 14%	6 631 126 8% 6 120 000 14%	415 420 5% 120 000 14%	2 321 889 30% 168 000 20%	96 000 0%	62 430 0		0 0%	7 821 572 100% 840 668 100%
Aléas	0 0	9% 0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09	% 215 703	25% 300 000 35%	200 000 23%	148 371 17%	0 0%	0 0%	6 0 0	% 0 0%	0 0%	864 074 100%
Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre (10%)	0 0		% 86 874 0% % 86 874 2%	573 805 2 369 103 9	% 144 627 3%	2 726 989 5 279 530 6	% 313 440 79	% 884 020	21% 3 766 316 7% 18% 341 453 7%	8 709 977 17% 749 646 16%	482 602 10%	447 102 9%	3 410 008 0% 312 032 0%	391 472 0	% 0 0% % 0 0%	0 0%	4 801 901 100%
Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	0 0	9% 0 0 9% 0 0	% 0 0% % 0 0%	204 703 1' 0 0'	% 749 811 2% % 0 0%	2 408 834 6 38 625 1	% 4 359 151 119 % 284 808 69	% 8 719 774 % 733 597	21% 3 084 041 8% 15% 340 823 7%	6 6 818 563 17% 6 1 141 768 23%	4 302 017 11% 691 158 14%	3 904 708 10% 694 044 14%	2 617 963 0% 480 012 0%	3 411 174 0 569 453 0	% 0 0% % 0 0%	0 0% 0 0%	40 580 738 100% 4 974 288 100%
Participation aux equipements publics	0 0			0 0		0 0		% 0	0% 0 0%	6 0 0% 6 0 0%	0 0%			6 0 0		0 0%	0 0%
Honoraires concession	37 258 1	.% 200 000 5	% 230 000 6%	350 000 9	% 370 000 9%	370 000 9	% 400 000 103	% 380 000	10% 260 000 7%	260 000 7%	260 000 7%	230 000 6%	230 000 0%	150 000 0	% 150 000 0%	72 742 0%	3 950 000 100%
Fortish as a supplied to	37 258 1	% 200 000 5 % 68 618 10				370 000 9 0 29 201 0			10% 260 000 7%				230 000 0%	150 000 0	% 150 000 0% % 0 0%	72 742 0%	3 950 000 100% 625 808 100%
Frais de communication	0 0	*		219 0		591 584 0	*		12% 16 400 1%	6 16 400 1%	•		•	1200 0		0 0%	1 097 703 100%
Frais divers Frais financiers Frais fivers (Assurance, Taxes)	0 0					0 0 591 584 0			0% 0 0% 12% 16 400 1%	6 0 0% 6 16 400 1%	0 0% 16 400 1%		0 0% 1200 0%	0 0 1 200 0		0 0% 0 0%	0 0% 1 097 703 100%
Actualisation Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	0 0					0 0 0 0			0% 24 000 5% 0% 24 000 5%						% 60 000 0% % 60 000 0%	117 880 0% 117 880 0%	477 880 100% 477 880 100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0 0	% 513 785 0	% 0 0%	0 0	% 2 353 789 0%	0 0	% 1 164 848 -2929	% -1 076 217 2	-463 913 116%	-1 316 276 330%	-148 632 37%	-1 098 169 275%	-331 925 0%	-284 467 0	% 314 790 0%	-27 003 0%	-399 391 100%
TOTAL DES DEPENSES	214 215 0	1 002 289 0	% 621 693 0%	1 429 221 0	% 6 351 450 0%	4 608 696 0	% 13 137 129 139	% 15 315 997	16% 9 135 284 9%	15 758 949 16%	7 624 233 8%	11 978 836 12%	5 761 754 0%	4 583 263 0	% 717 610 0%	316 551 0%	98 557 170 100%
RECETTES EN TTC €																	
Charges foncières Accession libre	0 0	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09	% 897 840 ×	8% 721 462 6% 0% 414 752 7%	2 649 320 24% 1 658 682 26%	4 000 251 36% 2 470 063 39%	0 0%	1 101 860 0% 575 256 0%	758 409 0 439 814 0	% 1116 785 0% % 719 896 0%	0 0%	11 245 927 100% 6 278 464 100%
Accession abordable	0 0		% 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 09 % 0 09	% 0	0% 414 / 32 / 79 0% 0 0% 0% 124 660 7%	0 0% 498 538 26%	0 0% 742 409 39%	0 0%	0 0% 172 900 0%	439 814 0 0 0 132 191 0	% 0 0%	0 0%	0 0% 1 887 072 100%
Locatif social Accession sociale	0 0	96 0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09	% 0	0% 0 0% 0% 77 218 79	6 0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	6 0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
BRS Commerces	0 0	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09 % 0 09	% 0 % 0	0% 104 832 10%	183 293 18%	327 912 32%	0 0%	107 099 0% 246 605 0%	81 883 0 104 520 0	% 46 488 0%	0 0%	1 013 650 100%
Bureaux Artivités	0 0	1% 0 0 1% 0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 09 % 0 09	% 897 840 :	0% 0 0% 100% 0 0%	6 0 0% 6 0 0%	0 0% 0 0%	0 0%	0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0%	0 0% 897 840 100%
Participation constructeurs	0 0	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09	% 0	0% 0 0%	0 0%		0 0%	0 0%	0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
Accession libre Accession abordable	0 0	1% 0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 09	% 0	0% 0 0%	0 0%	0 0% 0 0% 0 0%	0 0%	0 0%	0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
Locatif social Accession sociale	0 0	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0%	0 0	% 0 09	% 0	0% 0 0%	0 0%	0 0%			6 0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
Commerces Bureaux	0 0		% 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 09	% 0	0% 0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0		0 0%	0 0%
Activités Participation équipements d'intérêt général	0 0	1% 0 0	% 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 03	% U	0% 0 0%	6 0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	6 0 0	% 0 0%	0 0%	0 0%
Participation équipements d'intérêt général	0		% 0%						0% 0%	6 0%	0%	0%			% 0%	0%	0 0%
Subventions	0	9% 0	% 0%	0'	% 13 819 0%	355 276 0	% 49 982 9 9	60 000	10% 102 494 18%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0	% 0 0%	0 0%	581 571 100%
Participation métropolitaine Participation équilibre	0 0		% 0 0% % 0 0%	8 600 000 13° 200 000 4°	% 8 200 000 12% % 0 0%	9 400 000 0 200 000 53	% 8800 000 119 % 600 000 39	% 6 000 000 % 0	7% 3 900 000 5% 0% 0 0%	6 9 035 963 11% 6 3 600 000 21%	6 800 000 8% 4 100 000 23%		6 051 135 0% 3 201 135 0%	3 897 798 0 1 890 000 0		206 459 0% 206 459 0%	81 424 827 100% 17 521 065 100%
Participation remise d'ouvrages Participation complément prix	0 0		% 0 0% % 0 0%	8 400 000 14 0 0	% 8 200 000 13% % 0 0%	9 200 000 0	% 8 200 000 139 % 0 09	6 000 000 6 0	9% 3 900 000 6% 0% 0 0%	5 435 963 9% 0 0%	2 700 000 4% 0 0%	2 700 000 4%	2 850 000 0%	2 007 798 0	% 1 200 000 0% % 0 0%	0 0% 0 0%	63 903 762 100% 0 0%
Participation communale Ville de Mérignac	0 0	% 0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0	% 0 0% % 0 0%	0 0 0	0 % 0 09 % 0 09	% 1 366 088 % 1 366 088	32% 496 804 12% 32% 496 804 12%	536 336 13% 536 336 13%	67 662 2% 67 662 2%	1 241 480 29% 1 241 480 29%	72 461 0%	6 361 076 0 361 076 0	% 15 228 0% % 15 228 0%	108 793 0% 108 793 0%	4 265 929 100% 4 265 929 100%
Autres recettes	0 0	•				0	. 0	•	86% 0 0%		0 0%	•	0 0%	6 0 0	•	0 0%	1 038 916 100%
Autres oroduits Produits financier	0 0	9% 0 0	% 6 759 1%	10 071 1	% 6 647 2%	2 610 0	% 38 542 49	% 897 409	93% 0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0	% 0 0%	0 0%	962 038 100% 76 879 100%
Produits illiancier	0'			0 0	% 3839 20% % 0%	0 0	% 04 100 837 % 09		0% 0% 0% 0%	6 0% 6 0%	0%		0% 0%	0		0% 0%	0 0% 0 0%
TOTAL DES RECETTES	•	3 181 603 4							9% 5 220 760 5%							315 252 0%	98 557 170 100%
RECETTES - DEPENSES Balance cumulée	-214 215 -214 215	2 179 314 1 965 099	-612 342 1 352 757	7 181 953 8 534 710	1 872 854 10 407 564	5 152 832 15 560 396	-4 184 506 11 375 890	-6 094 659 5 281 231	-3 914 524 1 366 706	-3 537 329 -2 170 623	3 243 680 1 073 057	-5 887 355 -4 814 298	1 463 702 -3 350 597	434 020 -2 916 576	2 917 875 1 298	-1 298 0	0 0
Avances versées par la Métropole Remboursement Avance versées par la Métropole	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	6 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	2 500 000	2 000 000	1 000 000	11 000 000 11 000 000
Avance en interne	214 215	-214 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRESORERIE	0	1 965 099	1 352 757	8 534 710	10 407 564	15 560 396	11 375 890	10 281 231	12 366 706	7 329 377	8 573 057	685 702	2 149 403	83 424	1 001 298	0	0

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025



CRFA Merignac Soleil 2024 Annexe 3 - Tableau des acquisitions et des cessions

Promesses
Actes
Jugement

ACQUISITIONS/EXPROPRIATION EN 2024

llot	Parcelles	Surface terrain en m²	Date Promesse	Date acte	Jugement provisionnel	Jugement définitif	Prix HT hors remploi
6.1	AW 544, 555, 563, 566	856	01/09/2024				8 560 €
6.2	AW 127, 553, 553, 560	410	23/07/2024				4 100 €
7	AX 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514	10544	néant	néant	01/10/2024		340 700 €
7.6	AX 501, 503	1090	02/12/2024				14 500 €
8	AY 790, 795	3000	néant	néant	01/10/2024		263 480 €
8.1 b	AY 790	1565	néant	néant	01/10/2024		30 750 €
8.3	AY 742	973	20/02/2024				788 450 €
8.3	AY 807, 815	44	néant	05/07/2024			2 200 €
8.3	AY 792	111	néant	08/11/2024			7 770 €
	AY 77 et DI 941	711	néant	néant	13/05/2024		33 050 €
8.4	AY 1	829	néant	néant	13/05/2024	26/09/2024	893 050 €
8.4	AY 2	926	néant	néant	13/05/2024	26/09/2024	598 153 €
8.6	AY 801, 802, 806	402	néant	néant	13/05/2024	14/11/2024	166 144 €
8.7	AY 796, 797	936	néant	néant	29/07/2024		466 290 €
8.7	AY 798, 799	922	néant	néant	29/07/2024		1 272 000 €

CESSION: AUCUNE CESSION FONCIERE EN 2024

llot	Parcelles	Surface terrain en m²	Programme	SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025




C0010 Mérignac Soleil - CRFA 2024 Annexe 4 A Programme global de construction actualisé

Description du programme de construction (en m² SP et %)


	cription ad programme d		(0 0 0)		
Nature du programme	Programmation in	nitiale	Prévisions actualisé	es 2024	Variation %
Nature du programme	m² SP	%	m ² SP	%	Variation 76
Locatif social	73 500	35,00%	73 363	35%	-0,19%
PLAI	22 050	10,50%	22 009	30%	-0,19%
PLUS	51 450	24,50%	42 697	58%	-0,19%
PLS			8 657	12%	0,1370
Accession sociale et abordable	52 500	25,00%	5 170	3%	-4,38%
BRS			45 032	22%	-4,36/0
Accession libre	84 000	40,00%	83 851	40%	-0,18%
Sous total logements	210 000	100,00%	207 416		-1%

Total	300 000	100%	278 123		-7%
Commerces, activités, bureaux et équipeme	90 000	30%	70 707	25%	-21%
Logements	210 000	70%	207 416	75%	-1%



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale	%	Programmation actualisée 2024	%	Variation%
Locatif social	980	35%	1 046	35%	7%
PLAI	294	10,5%	314	30,0%	6,7%
PLUS	686	24,5%	609	58,2%	-11,2%
PLS	0		123	11,8%	
Accession sociale et abordable	700	25%	72	2%	-90%
BRS	0		659	22%	
Accession libre	1 120	40%	1 201	40%	7%
Sous total logements	2 800	100%	2 978		6%



Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025



C0010 Mérignac Soleil - CRFA 2024

Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

	Programme ac	tualisé 2024		Etat d'av	ancement	
Nature du programme			Réalis	é	Reste à ré	aliser
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	73 363	35%	22 041	30%	51 322	70%
PLAI	21 779	10,5%	8 001	36,7%	13 777	63%
PLUS	42 313	20,4%	12 681	30%	29 632	70%
PLS	8 504	4,1%	1 359	16%	7 145	84%
Accession sociale et						
abordable	5 170	3%	5 170	100%	-	0%
BRS	45 032	22%	2 930	7%	42 102	93%
Accession libre	83 851	40%	29 937	36%	53 914	64%
Sous total logements	207 416		60 078	29%	147 338	71%
Commerces, activités et équi	70 707		5 166	7,3%	65 541	92,7%
Total	278 123		65 244	23%	212 879	77%

^{*} PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

			Etat d'ava	ancement		
Nature du programme	Programme actualisé 2024	Réa	lisé	Reste à réaliser		
		logts	%	logts	%	
Locatif social	1 046	292	28%	754	72%	
PLAI	314	106	34%	208	66%	
PLUS	609	168	28%	441	72%	
PLS Accession sociale et	123	18	15%	105	85%	
abordable	72	72	100%	0	0%	
BRS	659	40	56%	619	94%	
Accession libre	1 201	420	35%	781	65%	
Sous total logements	2 978	1 116	37%	1 862	63%	

^{*} PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

160 000,00

140 000,00

120 000,00


80 000,00

40 000,00

20 000,00

Locatif social Accession sociale et abordable

Réalisé Reste à réaliser



Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

C0010 Mérignac Soleil - CRFA 2024

Annexe 4c Programme de construction échelonné dans le temps*

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

Nature du programme	Programmation	Programmation		Echelonnement prévisionnel**														
	initiale	actualisée 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	73 500	73 363	22 041							5 076	7 228	7 963	6 157	5 621	6 915	4 506	5 555	2 301
Accession sociale et																		
abordable	52 500	5 170	5 170							0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		45 032	2 930							2 901	5 386	4 550	4 387	3 845	5 882	3 862	4 555	1 451
Accession libre	84 000	83 851	29 937							6 526	8 037	10 238	7 048	6 594	7 097	4 728	5 851	2 822
Sous total logements	210 000	207 416	60 078	0	0	0	0	0		14 503	20 651	22 752	17 592	16 060	19 894	13 096	15 961	6575
Commerces, activités et																		
équipements	90 000	70 707	5 166	0						11 172	10 686	6 560	5 447	12 115	4 507	5 045	7 118	2 440
Total	300 000	278 123	65 244	0	0	0	0	0	0	25 675	31 337	29 312	23 039	28 175	24 401	18 141	23 079	9 015

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

-																		
Nature du programme	Programmation	Programmation		Echelonnement prévisionnel**														
	initiale	actualisée 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	980	1046	292	0	0	0	0	0	0	72	106	113	88	99	99	64	79	33
Accession sociale et																		
abordable	700	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		659	40							41	79	65	63	71	84	55	65	21
Accession libre	1 120	1201	420	0	0	0	0	0	0	93	117	146	101	113	99	64	82	40
Sous total logements	2 800	2 978	824	0	0	0	0	0	0	207	302	324	251	284	282	184	227	93

^{*} PC purgés

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110109-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025

^{**} de 2018 à 2025 : échelonnement sur la base des projets en cours d'études, au-delà, hypothèse de programmation en fonction des "maturités" foncières

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

DEPENSES	€HT	CRFA 2023 € TVA	€ TTC	€HT	CRFA 2024 € TVA	€TTC	Ecarts € HT	Commentaires
Études de définition et de suivi de l'opération Accompagnement projets immobiliers Autres études	5 195 160 2 050 000 3 145 160	992 548 363 528 629 020	6 187 708 2 413 528 3 774 180	5 195 160 2 230 000 2 965 160	992 548 399 528 593 020	6 187 708 2 629 528 3 558 180	180 000 -180 000	Réaffectation poste à postes études commerciales
Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières - détail acquisitions	31 312 821 21 957 386 0	4 433 266 4 105 241 0	35 746 087 26 062 627 0	32 436 337 23 200 093 0	3 824 198 3 534 128 0	36 260 534 26 734 220 0	1 123 516 1 242 707	
* dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert) Libération des terrains Aléas	21 957 386 7 021 710 820 000 1 513 725	0 4 105 241 163 357 164 668	0 26 062 627 7 185 067 984 668 1 513 725	23 200 093 7 672 170 700 000 864 074	3 534 128 149 402 140 668	0 26 734 220 7 821 572 840 668 864 074	1 242 707 650 460 -120 000 -649 651	
Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre (10%)	42 000 186 4 014 642	8 363 161 787 258	50 363 347 4 801 901	42 000 186 4 014 642	8 356 741 787 258	50 356 927 4 801 901	0	
Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	33 792 555 4 192 989	6 739 258 836 645	40 531 813 5 029 634	33 792 555 4 192 989	6 744 984 824 498	40 537 538 5 017 488	0 0	
Participation aux equipements publics	0	0	0	0	0	0	0	
Honoraires concession	3 950 000 3 950 000	0	3 950 000 3 950 000	3 950 000 3 950 000	0	3 950 000 3 950 000	0	
Frais de communication	550 000	101 335	651 335	530 000	95 808	625 808	-20 000	
Frais divers Frais financiers Frais divers (Assurance, Taxes)	1 140 000 270 000 870 000	163 762 0 163 762	1 303 762 270 000 1 033 762	928 000 0 928 000	169 703 0 169 703	1 097 703 0 1 097 703	-212 000 -270 000 58 000	Ajustement du poste compte tenu de l'avance obtenue
Actualisation	1 106 687 1 106 687	221 337 221 337	1 328 024 1 328 024	398 234	79 647	477 880	-708 453 -708 453	Ajustement du poste en fonction de l'avancement de l'opé
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	-1 180 250	-1 180 250	0	-399 391	-399 391	0	
TOTAL DES DEPENSES	85 254 854	13 095 159	98 350 013	85 437 916	13 119 254	98 557 170	183 062	
RECETTES	€HT	€TVA	€TTC	€HT	€TVA	€TTC	€HT	€TTC
Bilan origine CRFA 2024 Cession Charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP Accession libre 450 4590 Accession abordable 130 1170 Locatif social 215 1 935		1 597 482 1 046 411 0 171 552	11 245 927 6 278 464 0 1 887 072	9 648 445 5 232 053 0 1 715 520	1 597 482 1 046 411 0	11 245 927 6 278 464 0 1 887 072	0	
Locatif social 215 1 935 Accession sociale 213 1 917 BRS 2 187 Commerces 260 2 340 Bureaux 2 340	1 713 320 0 1 107 964 844 708	0 60 938 168 942	1 887 072 0 1 168 902 1 013 650	1 713 320 0 1 107 964 844 708	171 552 0 60 938 168 942 0	1 168 902 1 1013 650 0	0	
Activités 200 2 015 Bilan origine CRFA 2024 Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP		149 640	897 840	748 200	149 640	897 840	0	
Accession lore	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Bureaux Activités 0 0	0	0	0	0	0	0	0	
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstrue Participation équipements d'intérêt général	ct 0	0	0	0	0	0	0	
Subventions	581 571	0	581 571	581 571	0	581 571	0	
Participation métropolitaine Participation équilibre Participation remise d'ouvrages Participation complément prix	70 774 200 17 521 065 53 253 135 0	10 650 627 0 10 650 627 0	81 424 827 17 521 065 63 903 762 0	70 774 200 17 521 065 53 253 135 0	10 650 627 0 10 650 627 0	81 424 827 17 521 065 63 903 762 0	0 0 0 0	
Participation communale Ville de Mérignac	3 554 941 3 554 941	710 988 710 988	4 265 929 4 265 929	3 554 941 3 554 941	710 988 710 988	4 265 929 4 265 929	0 0	
Autres recettes Autres produits	695 697 680 697	136 062 135 618	831 759 816 315	878 760 801 881	160 156 160 156	1 038 916 962 038	0 183 062 121 184	
Produits financiers	15 000	444	15 444	76 879	0	76 879	61 879	
•	1							
Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1 TOTAL DES RECETTEDate de télétransmission : 03/10/2025	85 254 854	13 095 159	98 350 013	85 437 916	13 119 254	98 557 170	183 062	

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
1 DEPENSES	Date Facture	Numero		11 972 281,37	
A ETUDES GENERALES			1 537 035,22	833 811,24	2 370 846,46
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			714 423,38	304 520,24	1 018 943,62
23-06542 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - OBRAS			6 000,00		6 000,00
018746 AC1	19/09/2023	FA 2023-MER-	6 000,00		6 000,00
23-06543 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - LIST			6 000,00		6 000,00
018763 AC1	23/09/2023	FA 23/64	6 000,00		6 000,00
M2015-025/BDC2 Accompagnement projet Tram - FABRIQUE DE LA VILLE			1 530,00		1 530,00
010235 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00		1 530,00
M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - ALTO STEP	20/11/2000		17 544,00	41 142,97	58 686,97
019385 AC1	30/11/2023	FA	17 544,00	12.674.00	17 544,00
020528 AC2	19/02/2024	FA FA		13 674,90	13 674,90
020640 AC3 022782 AC4	31/03/2024 18/11/2024	FA		18 296,88 9 171,19	18 296,88 9 171,19
M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - DESVIGNE MICHEL	16/11/2024	FA	24 039,00	86 963,49	111 002,49
019388 AC1	30/11/2023	FA 326646	24 039,00	80 303,43	24 039,00
020116 AC2	19/02/2024	FA 326787	2.333,30	28 933,34	28 933,34
020483 AC3	28/03/2024	FA 326867		38 539,32	38 539,32
022786 AC4	18/11/2024	FA 327263		19 490,83	19 490,83
M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - LIST			30 000,00	92 248,80	122 248,80
019388 AC1	30/11/2023	FA 326646	30 000,00		30 000,00
020116 AC2	19/02/2024	FA 326787		30 691,80	30 691,80
020483 AC3	28/03/2024	FA 326867		40 881,60	40 881,60
022786 AC4	18/11/2024	FA 327263		20 675,40	20 675,40
M2016-004/MS13/BDC1 COORD° URBAINE - BDC1 : Abords voie MacDo - ALTO				11 915,64	11 915,64
020391 AC1	14/03/2024	FA		11 915,64	11 915,64
M2016-004/MS13/BDC1 COORD° URBAINE - BDC1 : Abords voie MacDo -				12 637,80	12 637,80
020328 AC1	11/03/2024	FA 326831		12 637,80	12 637,80
M2016-004/MS13/BDC10 COORD° URBAINE - BDC10 : Accomp. concertat° Parc	02/40/2024	54		510,00	510,00
022315 AC1 M2016-004/MS13/BDC10 COORD° URBAINE - BDC10 : Accomp. concertat° Parc	02/10/2024	FA		510,00 2 400,00	510,00 2 400,00
022308 AC1	30/09/2024	FA 327175		2 400,00	2 400,00
M2016-004/MS13/BDC2 France 2030 COORD° URBAINE - BDC2 : Comité de Suivi		17(327173		841,68	841,68
020438 AC1	21/03/2024	FA 24/29		841,68	841,68
M2016-004/MS13/BDC3 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier -	, ,	, -		3 526,04	3 526,04
020527 AC1	22/03/2024	FA		3 526,04	3 526,04
M2016-004/MS13/BDC3 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier -				2 584,61	2 584,61
020392 AC1	18/03/2024	FA 326838		2 584,61	2 584,61
M2016-004/MS13/BDC3 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier -				5 651,28	5 651,28
020481 AC1	22/03/2024	FA 24/31		5 651,28	5 651,28
M2016-004/MS13/BDC4 COORD° URBAINE - BDC4 : Pharmacie Lachèze - LIST				1 563,12	1 563,12
020439 AC1	21/03/2024	FA 24/30		1 563,12	1 563,12
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine - ALTO				665,65	665,65
020641 AC1	10/04/2024	FA		665,65	665,65
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine -	28/02/2024	FA 226971		1 202,40	1 202,40
020485 AC1 M2016-004/M513/RDC5 COORD® LIRRAINE - RDC5 · PC M4 Oasis urbaine - LIST	28/03/2024	FA 326871		1 202,40	1 202,40
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine - LIST 020485 AC1	28/03/2024	FA 326871		1 563,12 1 563,12	1 563,12 1 563,12
M2016-004/MS13/BDC6 COORD® URBAINE - BDC6 : PC Carrefour Station-Service	23/03/2024	17.3200/1		600,00	600,00
023150 AC1	12/12/2024	FA 327329		600,00	600,00
M2016-004/MS13/BDC6 COORD° URBAINE - BDC6 : PC Carrefour Station-Service	, -,			900,00	900,00
023150 AC1	12/12/2024	FA 327329		900,00	900,00
M2016-004/MS13/BDC7 COORD° URBAINE - BDC7 : Réunion réemploi 29-01-				1 415,64	1 415,64
020642 AC1	10/04/2024	FA		1 415,64	1 415,64
M2016-004/MS13/BDC7 COORD° URBAINE - BDC7 : Réunion réemploi 29-01-				722,16	722,16
020311 AC1	08/03/2024	FA 326830		722,16	722,16
M2016-004/MS13/BDC8 COORD° URBAINE - BDC8 : Reprise secteur MacDo -				2 192,20	2 192,20
021819 AC1	31/07/2024	FA		2 192,20	2 192,20
M2016-004/MS13/BDC8 COORD° URBAINE - BDC8 : Reprise secteur MacDo -				2 672,68	2 672,68
021820 AC1	05/08/2024	FA 327118		2 672,68	2 672,68
M2016-004/MS13/BDC9 COORD° URBAINE - BDC9 : Accomp. éco Parc	OF /12 /2024	EA 227240		240,00	240,00
023079 AC1 M2016-004/MS14 DADC CARDENTIED (VENELLE QUIEST : ED. AVD. DLE - RMINUTES	05/12/2024	FA 327310		240,00 1 518 05	240,00
M2016-004/M514 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - 8MINUTES 021415 AC1	28/06/2024	FA		1 518,05 1 518,05	1 518,05 1 518,05
Accusó do récontion	<u> </u>	1.4		1 310,03	1 310,03

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			_	-	
/		/	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - ALTO STEF				10 373,33	10 373,33
021525 AC1	02/07/2024	FA		10 373,33	10 373,33
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - DESVIGNE 021435 AC1	02/07/2024	FA 327028		18 469,58 18 469,58	18 469,58 18 469,58
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - ALTO STEP	02/07/2024	FA 327028	2 947,09	16 409,36	2 947,09
008301 SOLDE BDC 19	21/06/2019	FA	2 947,09		2 947,09
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - DESVIGNE MICHEL	21/00/2015	177	2 792,56		2 792,56
008296 SOLDE BDC 19	24/06/2019	FA 324396	2 792,56		2 792,56
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - OMA	,,		11 559,60		11 559,60
008446 SOLDE BDC 19	27/06/2019	FA V7569	11 559,60		11 559,60
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/llot 4.2 Friche Leroy Merlin - ALTO STEP			2 590,56		2 590,56
008306 AC 1	25/06/2019	FA	2 331,50		2 331,50
009000 SOLDE	19/09/2019	FA	259,06		259,0
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/llot 4.2 Friche Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL			1 727,04		1 727,04
008297 AC 1	24/06/2019	FA 324397	1 554,34		1 554,34
008988 SOLDE	26/09/2019	FA 324500	172,70		172,70
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - OMA			10 794,00		10 794,00
008449 AC 1	27/06/2019	FA V7569	9 714,60		9 714,60
008985 SOLDE	25/10/2019	FA V7729	1 079,40		1 079,40
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a llot Alinea - ALTO STEP	0.15-1-		2 019,39		2 019,39
008303 AC 1	21/06/2019	FA	302,90		302,90
008998 SOLDE	19/09/2019	FA	1 716,49		1 716,49
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a llot Alinea - DESVIGNE MICHEL	24/05/2040	FA 334300	2 205,71		2 205,71
008298 AC 1	24/06/2019	FA 324398	330,85		330,85
008987 SOLDE	26/09/2019	FA 324501	1 874,86		1 874,86
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a llot Alinea - OMA 008450 AC 1	27/06/2019	FA V7569	5 495,51 824,40		5 495,51 824,40
009120 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 671,11		4 671,11
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - ALTO STEP	23/ 10/ 2013	17723	1 980,00		1 980,00
009006 SOLDE	25/09/2019	FA	1 485,00		1 485,00
010998 SOLDE BDC 22	17/09/2020	FA	495,00		495,00
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - DESVIGNE MICHEL			1 320,00		1 320,00
008989 AC1	26/09/2019	FA 324502	990,00		990,00
010991 SOLDE	17/09/2020	NH 324869	330,00		330,00
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/llot 1.4 Palau - OMA			8 250,00		8 250,00
009121 AC 1	25/10/2019	V7729	6 187,50		6 187,50
010986 SOLDE	17/09/2020	FA V8140	2 062,50		2 062,50
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/llots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupe scolaires-			1 980,00		1 980,00
009007 AC1	25/09/2019	FA	297,00		297,00
010093 AC2	25/03/2020	FA	1 683,00		1 683,00
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupe scolaires-			1 320,00		1 320,00
008990 AC1	26/09/2019	FA 324503	198,00		198,00
010095 AC2	27/03/2020	FA 324711	1 122,00		1 122,00
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupe scolaires-	25 /40 /2040	\(\pi = \pi \)	8 250,00		8 250,00
009122 AC 1	25/10/2019	V7729	1 237,50		1 237,50
010086 AC2	09/04/2020	FA V7976	7 012,50		7 012,50
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - ALTO STEP 009008 AC1	25/09/2019	FA	1 440,00		1 440,00
010999 SOLDE BDC 24	14/09/2020	FA	360,00		360,00
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - DESVIGNE MICHEL	17/00/2020		960,00		960,00
008991 AC1	26/09/2019	FA 324504	720,00		720,00
010992 SOLDE	14/09/2020	NH 324865	240,00		240,00
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - OMA	1		6 000,00		6 000,00
009123 AC 1	25/10/2019	V7729	4 500,00		4 500,00
011114 SOLDE	17/09/2020	V8140	1 500,00		1 500,00
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/llot P5 Castorama - ALTO STEP			1 009,07		1 009,07
008999 SOLDE	20/09/2019	FA	1 009,07		1 009,07
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/llot P5 Castorama - DESVIGNE MICHEL			1 102,85		1 102,85
008992 SOLDE	26/09/2019	FA 324505	1 102,85		1 102,8
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/llot P5 Castorama - OMA			4 313,88		4 313,88
009124 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 313,88		4 313,88
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisa - ALTO STEP			2 648,52		2 648,52
010094 AC1	25/03/2020	FA	1 986,38		1 986,38
011000 SOLDE BDC26	14/09/2020	FA	662,14		662,14
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisa - DESVIGNE MICHEL			1 765,68		1 765,68
010096 AC1	31/03/2020	FA 324712	1 324,26		1 324,26
010993 SOLDE	14/09/2020	FA 324866	441,42		441,42
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisa - OMA			11 035,50		11 035,50

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
010107 AC1	09/04/2020	FA V7976	8 276,63		8 276,6
011115 SOLDE	17/09/2020	V8140	2 758,87		2 758,8
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et			3 026,88		3 026,88
011001 AC1	14/09/2020	FA	1 513,44		1 513,4
012241 AC2	19/03/2021	FA	756,72		756,7
013322 SOLDE	10/09/2021	FA	756,72		756,7
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et			2 017,92		2 017,92
010994 AC1	14/09/2020	FA 324867	1 008,96		1 008,9
012236 AC2	19/03/2021	FA 325158	504,48		504,4
013312 SOLDE	15/09/2021	FA 325389	504,48		504,4
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et			12 612,00		12 612,0
011116 AC 1	17/09/2020	V8140	6 306,00		6 306,0
012233 AC2	20/03/2021	FA V8508	3 153,00		3 153,0
013306 AC3	15/09/2021	FA V8699	3 153,00		3 153,0
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - ALTO STEP	17/00/2020		1 513,20		1 513,20
011002 AC1 011591 AC2	17/09/2020	FA	378,30		378,3
012242 SOLDE	01/01/2021 19/03/2021	FA FA	756,60		756,6
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - DESVIGNE MICHEL	13/03/2021	1.4	378,30 1 008,00		378,3 1 008,0 0
010995 AC1	17/09/2020	FA 324870	252,00		252,0
011593 AC2	01/01/2021	FA 324995	504,00		504,0
012237 SOLDE	19/03/2021	FA 324993	252,00		252,0
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - OMA	15/05/2021	177 323133	6 306,00		6 306,00
011117 AC 1	17/09/2020	V8140	1 576,50		1 576,5
011596 AC2	01/01/2021	FA V8245	3 153,00		3 153,0
012341 SOLDE	20/03/2021	FA V8508	1 576,50		1 576,5
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/llot Kéria Clairsienne - ALTO STEP			1 519,20		1 519,20
013323 SOLDE	10/09/2021	FA	1 519,20		1 519,2
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairsienne - DESVIGNE MICHEL			1 012,80		1 012,80
013313 SOLDE	15/09/2021	FA 325390	1 012,80		1 012,8
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairsienne - OMA			6 330,00		6 330,00
013361 SOLDE	15/09/2021	FA V8699	6 330,00		6 330,0
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/llot Fiat - ALTO STEP			2 073,66		2 073,66
013324 AC 1	10/09/2021	FCA2210430	1 555,25		1 555,2
014656 SOLDE	28/02/2022	FA	518,41		518,4
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/llot Fiat - DESVIGNE MICHEL			2 576,99		2 576,99
013314 AC 1	15/09/2021	FA 325391	1 932,30		1 932,3
016068 SOLDE	05/09/2022	NH 325861	644,69		644,6
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/llot Fiat - OMA			3 707,55		3 707,55
013362 AC 1	15/09/2021	V8699	2 781,00		2 781,0
014650 SOLDE	02/03/2022	FA V8931	926,55		926,5
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - ALTO STEP	10/00/0001	=======================================	396,43		396,43
013325 AC 1	10/09/2021	FCA2210431	396,43		396,4
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - DESVIGNE MICHEL 013315 AC1	15/00/2021	FA 225202	577,80		577,80
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - OMA	15/09/2021	FA 325392	577,80 10 381,14		577,8 10 381,1 4
013504 AC1	15/09/2021	FA V8699	5 190,50		5 190,5
018644 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	5 190,64		5 190,6
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - ALTO STEP	07/03/2023	DECLIE	1 571,04		1 571,04
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Hot Kerid etaligi - ALTO 31EF	12/10/2021		2 37 1,04	-157,10	-157,1
M2016-004/MS2/BDC 33 Avance	12/10/2021			157,10	157,1
014658 AC2	28/02/2022	FA	1 413,94	-2.,20	1 413,9
016078 SOLDE	26/08/2022	FA	157,10		157,1
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/llot Kéria élargi - DESVIGNE MICHEL			1 047,36		1 047,36
016069 SOLDE	05/09/2022	NH 325862	1 047,36		1 047,3
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/llot Kéria élargi - OMA			6 546,00		6 546,00
014651 AC1	02/03/2022	FA V8932	5 891,40		5 891,4
016024 SOLDE	31/08/2022	FA V9128	654,60		654,6
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/llot Thibeaudeau élargi - ALTO STEP			1 571,04		1 571,04
014659 AC1	28/02/2022	FA	471,31		471,3
016079 SOLDE	26/08/2022	FA	1 099,73		1 099,7
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/llot Thibeaudeau élargi - DESVIGNE MICHEL			1 047,36		1 047,3
016070 SOLDE	05/09/2022	NH 325863	1 047,36		1 047,3
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeaudeau élargi - OMA			6 546,00		6 546,0
014652 AC1	02/03/2022	FA V8933	1 963,80		1 963,8
016063 SOLDE	30/08/2022	FA V9129	4 582,20		4 582,2
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin			5 198,58		5 198,5
M2016-004/MS2/BDC35 Avance	28/02/2022			-1 463,42	-1 463,4

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2016-004/MS2/BDC35 Avance	28/02/2022	Numero	2023	1 463,42	1 463,43
016080 AC1	26/08/2022	FA	3 898,93	1 403,42	3 898,93
018713 AC2	14/09/2023	FA	1 299,65		1 299,65
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin -	11,03,2023	.,,	3 465,72		3 465,72
016071 AC1	05/09/2022	NH 325864	2 599,28		2 599,28
018714 AC2	06/09/2023	FA 326487	866,44		866,44
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin -			21 660,75		21 660,75
016064 AC1	26/08/2022	FA V9130	16 245,56		16 245,56
018649 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	5 415,19		5 415,19
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - 8MINUTES 18SECONDES			1 111,51		1 111,51
008308 SOLDE	20/06/2019	FA	1 111,51		1 111,5
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - ALTO STEP		<u></u>	5 557,57		5 557,57
008305 SOLDE	21/06/2019	FA	5 557,57		5 557,5
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - DESVIGNE MICHEL	24/05/2040	54.334400	11 485,65		11 485,65
008300 SOLDE	24/06/2019	FA 324400	11 485,65 3 396,29		11 485,65
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - OMA	27/06/2019	FA V7579	, .		3 396,29
008294 SOLDE M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - ALTO STEP	27/00/2019	1 A V / 3/3	3 396,29 2 442,00		3 396,29 2 442,00
009003 SOLDE	19/09/2019	FA	2 442,00		2 442,00
M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - DESVIGNE	,, 2010		2 628,00		2 628,00
008995 SOLDE	26/09/2019	FA 324508	2 628,00		2 628,00
M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - OMA			3 770,00		3 770,00
009116 SOLDE	25/10/2019	V7730	3 770,00		3 770,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - ALTO STEP			1 164,00		1 164,00
009004 SOLDE	19/09/2019	FA	1 164,00		1 164,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - DESVIGNE			966,00		966,00
008996 SOLDE	26/09/2019	FA 324509	966,00		966,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - OMA			9 080,00		9 080,00
009117 SOLDE	25/10/2019	V7730	9 080,00		9 080,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - ALTO			960,00		960,00
009005 SOLDE	19/09/2019	FA	960,00		960,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est -	0.5 /0.0 /0.0 + 0.		657,00		657,00
008997 SOLDE	26/09/2019	FA 324510	657,00		657,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - OMA 009118 SOLDE	25/10/2019	V7730	1 510,00 1 510,00		1 510,00
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - ALTO STEP	23/10/2019	V7730	3 510,00		3 510,00
009150 SOLDE	25/11/2019	FA	3 510,00		3 510,00
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - DESVIGNE	23/11/2013	174	5 876,40		5 876,40
009148 SOLDE	25/11/2019	FA 324598	5 876,40		5 876,40
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - OMA	-, , -		1 890,00		1 890,00
009147 SOLDE	26/11/2019	FA V7780	1 890,00		1 890,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - ALTO			3 084,00		3 084,00
009151 SOLDE	25/11/2019	FA	3 084,00		3 084,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin -			966,00		966,00
009149 SOLDE	25/11/2019	FA 324599	966,00		966,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - OMA			1 130,00		1 130,00
009177 SOLDE	26/11/2019	V7780	1 130,00		1 130,00
M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama -	47/00/05		4 410,00		4 410,00
011003 SOLDE BDC 8	17/09/2020	FA	4 410,00		4 410,00
M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama -	17/00/2020	EA 1/01/40	190,00		190,00
010989 SOLDE M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - ALTO STEP	17/09/2020	FA V8148	190,00 12 132,00		190,00 12 132,00
011590 SOLDE	01/01/2021	FA	12 132,00		12 132,00
M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - OMA	31, 31, 2021		565,00		565,00
011595 SOLDE	01/01/2021	FA V8246	565,00		565,00
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - 8MINUTES			7 611,36		7 611,36
012248 SOLDE	23/03/2021	FA	7 611,36		7 611,36
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - ALTO STEP			23 870,34		23 870,34
012243 SOLDE	19/03/2021	FA	23 870,34		23 870,34
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - DESVIGNE			13 880,44		13 880,44
012238 SOLDE	19/03/2021	FA 325160	13 880,44		13 880,44
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - OMA			12 150,30		12 150,30
012234 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	12 150,30		12 150,30
M2016-004/MS9/BDC11 Suivi de réalisation d'une maquette d'urbanisme du			3 797,60		3 797,60
012342 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	3 797,60		3 797,60
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans	10/02/2021	 FA	539,34		539,34
012244 SOLDE	19/03/2021	FA	539,34		539,34
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans			624,18		624,18

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
012239 SOLDE	19/03/2021	FA 325161	624,18	2021	624,18
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans	15/05/2021	1 A 323101	6 857,90		6 857,90
012343 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	6 857,90		6 857,90
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - ALTO STEP	.,,		29 354,64		29 354,64
012245 AC1	19/03/2021	FA	14 677,34		14 677,34
013318 SOLDE	10/09/2021	FA	14 677,30		14 677,30
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - OMA			2 272,50		2 272,50
012344 AC1	20/03/2021	FA V8509	1 136,25		1 136,25
013405 AC2	15/09/2021	FA V8700	1 136,25		1 136,25
M2016-004/MS9/BDC16 Eude capacité pavillonaire Sud Carrefour - OMA			5 342,90		5 342,90
013507 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90		5 342,90
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - ALTO STEP			11 623,08		11 623,08
013359 AC1	27/09/2021	FCA2210458	8 717,32		8 717,32
014662 SOLDE	28/02/2022	FA	2 905,76		2 905,76
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - DESVIGNE MICHEL			1 248,36		1 248,36
013358 AC1	30/09/2021	FA 325414	936,28		936,28
016072 SOLDE	06/09/2022	NH 325866	312,08		312,08
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - OMA 013357 AC1	29/09/2021	V8726	8 321,14		11 094,85
013357 AC1 018645 SOLDE		DECPTE	· · ·		8 321,14
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot	07/09/2023	PLCTIE	2 773,71 21 898,94		2 773,71 21 898,94
014663 SOLDE	28/02/2022	FA	21 898,94		21 898,94
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot	20,02,2022		2 580,77		2 580,77
016073 SOLDE	06/09/2022	NH 325869	2 580,77		2 580,77
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot	00,00,2022	1111323003	2 359,44		2 359,44
014654 SOLDE	02/03/2022	FA V8929	2 359,44		2 359,44
M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot	, , .		40 167,70		40 167,70
018502 AC1	29/05/2023	FA	32 134,16		32 134,16
018712 AC2	14/09/2023	FA	8 033,54		8 033,54
M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot			829,50		829,50
018496 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9609	829,50		829,50
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - ALTO STEP			23 020,20		23 020,20
014664 AC1	28/02/2022	FA	19 567,18		19 567,18
016081 SOLDE	26/08/2022	FA	3 453,02		3 453,02
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - DESVIGNE MICHEL			1 290,38		1 290,38
016074 SOLDE	06/09/2022	NH 325867	1 290,38		1 290,38
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - OMA			2 359,44		2 359,44
014655 AC1	02/03/2022	FA V8930	2 005,61		2 005,61
016065 SOLDE	30/08/2022	FA V9131	353,83		353,83
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet /			5 236,70		5 236,70
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 236,70		5 236,70
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet /	22/44/2022	FA 1/0252	5 888,16		5 888,16
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 888,16		5 888,16
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / 016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	14 554,58 14 554,58		14 554,58
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anquetil -	22/11/2022	FA V9232	5 909,86		5 909,86
018503 AC1	29/05/2023	FA	5 909,86		5 909,86
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anquetil -	23/03/2023		13 122,68		13 122,68
018497 AC 1 SOLDE	05/05/2023	FA 326265	13 122,68		13 122,68
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anguetil -	03/03/2023	177 320203	4 573,31		4 573,31
018495 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9608	4 573,31		4 573,31
M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - 8MINUTES			4 992,41		4 992,41
018799 AC1	27/09/2023	FA	4 992,41		4 992,41
M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - ALTO STEP			19 117,73		19 117,73
018708 AC1	13/09/2023	FA	19 117,73		19 117,73
M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - DESVIGNE			8 042,98		8 042,98
018715 AC1	06/09/2023	FA 326488	8 042,98		8 042,98
M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - OMA			2 359,44		2 359,44
018646 SOLDE	30/09/2023	DECPTE	2 359,44		2 359,44
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux			1 393,56		1 393,56
018795 AC1	27/09/2023	FA	1 393,56		1 393,56
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux			14 818,19		14 818,19
018709 AC1	13/09/2023	FA	14 818,19		14 818,19
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux			1 751,90		1 751,90
018716 AC1	06/09/2023	FA 326489	1 751,90		1 751,90
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux			1 659,00		1 659,00
018647 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	1 659,00		1 659,00
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal			1 950,98		1 950,98

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
018797 AC1	27/09/2023	FA		2024	
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal	27/09/2023	FA	1 950,98 8 467,54		1 950,98 8 467,54
018710 AC1	13/09/2023	FA	8 467,54		8 467,54
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal	25, 55, 2525		4 645,20		4 645,20
018717 AC1	06/09/2023	FA 326490	4 645,20		4 645,20
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal			829,50		829,50
018648 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	829,50		829,50
M2021-010/BDC18 Audit projet urbain, accompagnement MOE urbain -			7 520,70		7 520,70
019677 AC1	21/07/2023	FA 088-23	7 520,70		7 520,70
A102 Etude commerciale			71 958,55	990,00	72 948,55
M2018-032/BDC 6 M2 Accompagnement secteur fonciers autour de Carrefour -			6 975,36		6 975,36
013050 AC1	30/07/2021	FA 2017-	6 975,36		6 975,36
M2018-032/BDC10 M2 Diagnostic et préconisation à l'échelle de secteurs			5 601,18		5 601,18
014548 AC1	22/02/2022	FA 2202-	1 523,52		1 523,52
015290 REGUL AC1	22/02/2022	FA 2202-	-609,41		-609,41
015622 AC2	30/06/2022	FA 2206-150	2 359,15		2 359,15
018253 AC3	01/01/2023	FA 2212-280	2 327,92		2 327,92
M2018-032/BDC12 France 2030 - M2 Accompagnement stratégique pour le PAE		FA 2000 := :	9 600,00	-9 600,00	
018230 AC1	30/06/2023	FA 2306-424-	9 600,00		9 600,00
019618 AC2	01/01/2024	FA 2312-578-		12 000,00	12 000,00
020381 AC3	15/03/2024	FA 2403-650-		9 600,00	9 600,00
021483 AC4	28/06/2024	FA 2406-731		4 195,20	4 195,20
022882 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424		-9 600,00 13 000 00	-9 600,00
022885 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2312-578		-12 000,00 -9 600,00	-12 000,00 -9 600,00
022887 ANNUL ERR IMPUT 022889 ANNUL ERR IMPUT	15/03/2024	FA 2403-650 FA 2406-731			-9 600,00
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE	28/06/2024	FA 2400-731	16 991,78	-4 195,20	16 991,78
008977 AC1	31/10/2019	FA 1910-224	10 594,43		10 594,43
009951 AC2	28/02/2020	FA 2002-042	6 397,35		6 397,35
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO DEVELOPPEMENT	20/02/2020	1 A 2002 042	12 999,53		12 999,53
008980 AC1	30/10/2019	FA 19-10-134	8 423,08		8 423,08
009956 AC2	09/03/2020	FA 2003166	4 576,45		4 576,45
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA VILLE	12,72,72		9 775,03		9 775,03
008979 AC1	31/10/2019	FA 2019,10,59	3 963,80		3 963,80
009954 AC2	06/03/2020	FA 20200308	5 811,23		5 811,23
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE			5 220,11		5 220,11
008983 AC1	30/10/2019	FA 20191030	1 486,43		1 486,43
009953 AC2	09/03/2020	FA 20200309A	3 733,68		3 733,68
M2018-032/BDC7 M2 Accompagnement secteur Pichet et Clairsienne -			4 795,56		4 795,56
013049 SOLDE	30/07/2021	FA 2017-	4 795,56		4 795,56
M2023-048/BDC1 Commercialisation locaux d'activités - BERENICE				10 590,00	10 590,00
020779 AC1	26/04/2024	FA 2404-672-		10 590,00	10 590,00
A103 Coordination OPC urbain			145 107,80	116 643,75	261 751,55
M2019-009/BDC1 Etablisst dossier OPC initial missions 6.1.1 & 6.1.3 à 6.1.5 -			26 051,29		26 051,29
008928 AC 1	23/10/2019	FA 911019406	12 153,95		12 153,95
009805 AC 2	13/02/2020	FA 911029961	10 783,03		10 783,03
010259 SOLDE	30/04/2020	FA 911037169	3 114,31		3 114,31
M2019-009/BDC2 Missions 6.1.2, 6.3.1 et 6.3.2 - Missions AMO et réunions de	00/0:/		4 248,14		4 248,14
010257 AC1	30/04/2020	FA 911037166	1 086,48		1 086,48
010738 AC2	31/07/2020	FA 911044701	3 161,66		3 161,66
M2019-009/BDC3 Validation PIC et fiche suivi travaux ilot Castorama - ARTELIA	21/07/2020	FA 011044703	718,56		718,56
010739 SOLDE	31/07/2020	FA 911044702	718,56		718,56
M2019-009/BDC4 OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP	01/01/2021	EA 0110F42F2	10 570,28		10 570,28
011538 AC1 M2019-009/BDC5 Suivi OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP	01/01/2021	FA 911054353	10 570,28 40 128,04		10 570,28
012289 AC1	31/03/2021	FA 911066172	12 191,04		40 128,04 12 191,04
012269 AC1 012978 AC2	23/07/2021	FA 911006172 FA 911076095	9 169,13		9 169,13
014432 AC3	31/01/2022	FA 911076093 FA 911093207	16 693,90		16 693,90
015357 AC4	20/06/2022	FA 911106103	2 073,97		2 073,97
M2019-009/BDC6 Mission OPC-IC_05.22 / 08.22_phase réalisation trvx_ilots	5,11,2022		11 182,46		11 182,46
016116 SOLDE	22/09/2022	FA 911113910	11 182,46		11 182,46
M2019-009/BDC7 Mission OPC-IC_09.22 / 12.22_phase réalisation trvx_ilots	, ,	1	10 536,14		10 536,14
017611 AC1	20/03/2023	FA 911131194	9 739,82		9 739,82
018402 AC2	27/07/2023	FA 911143652	796,32		796,32
M2019-009/BDC8 Mission OPC-IC_01.23 / 03.23_phase réalisation trvx_ilots	. , .==		9 783,67		9 783,67
017879 SOLDE	28/04/2023	FA 911135737	9 783,67		9 783,67
M2019-009/BDC9 Mission OPC-IC_04.23 / 06.23_phase réalisation trvx_ilots	· ·		9 774,83		9 774,83
Wizo13-003/DDC3 Wission OFC-IC_04.23 / 00.23_phase realisation tive hots			3777,03		

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		1	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2023-018/BDC1 OPCIC / Juillet à Décembre 2023 - SETEC OPENCY (ex	Date Facture	Numero			
018954 AC1	29/09/2023	FA 23F0643	22 114,39 22 114,39	34 961,99	57 076,38 22 114,39
019770 AC2	01/01/2024	FA 23F0934	22 114,39	34 961,99	34 961,99
M2023-018/BDC2 OPCIC / Janvier à Juin 2024 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)	01/01/2021	177.257.555		42 740,09	42 740,09
020631 AC1	29/03/2024	FA 24F0206		21 327,91	21 327,91
022381 AC2	28/06/2024	FA 24F0428		21 412,18	21 412,18
M2023-018/BDC3 OPCIC / Juillet à Décembre 2024 - SETEC OPENCY (ex				17 375,45	17 375,45
022382 AC1	30/09/2024	FA 24F0720		17 375,45	17 375,45
M2023-018/BDC4 OPCIC / Juillet à Décembre 2024 complément - SETEC OPENCY				21 566,22	21 566,22
022803 AC1	31/10/2024	FA 24F0817		21 566,22	21 566,22
A104 Concertation Animation			6 192,00	15 617,04	21 809,04
M2021-010/BDC6 Assistance s/ marché communication médiation et animation			6 192,00	3 906,00	10 098,00
019682 AC1	18/07/2023	FA 2307-00858	6 192,00	2 000 00	6 192,00
019638 AC2 - SOLDE	01/01/2024	FA 2312-00966		3 906,00	3 906,00
M2024-004 Installation urbaine temporaire Ilot P5 - CANCAN 020147 AC1	01/03/2024	FA 24-192-013		11 711,04 3 599,71	11 711,04 3 599,71
020597 AC2	08/04/2024	FA 24-192-013		8 111,33	8 111,33
021021 FRANCE 2030 - AC1	28/05/2024	FA F2024-07		13 851,00	13 851,00
022880 ANNUL ERR IMPUT	28/05/2024	FA F2024-07		-13 851,00	-13 851,00
A105 Etudes environnementales	-,,,,		244 048,55	29 643,13	273 691,68
21-04706 AMO volet paysager, score ICU et arbres en ville - COLIN & POLI			3 000,00	,	3 000,00
013329 AC1	28/07/2021	FA00000988	3 000,00		3 000,00
22-05437 France 2030 Convention Recherche ICU- 20K€ sur C0010 France 2030 -			24 000,00	-20 000,00	4 000,00
019476 FR2030 ICU AC1	30/11/2023	FA FA2300407	24 000,00		24 000,00
022891 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA FA2300407		-20 000,00	-20 000,00
23-06147 France 2030 Conv Perf eco et environnementale Soleil - NOBATEK			79 200,00	-66 000,00	13 200,00
017731 AC1	31/03/2023	FA FA2300084	26 400,00		26 400,00
019374 AC2	28/11/2023	FA FA2300384	52 800,00		52 800,00
022893 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	AC1-AC2 FA		-66 000,00	-66 000,00
23-06655 Evaluation Energie Carbone - EFFICACITY			9 000,00		9 000,00
019544 AC1	12/12/2023	FA F23159	9 000,00		9 000,00
M2015-016/MS45-C SSP Diag enrobés - ARCAGEE	24 /05 /2010	FA 10 000	1 609,90		1 609,90
008159 AC2 008368 SOLDE	31/05/2019 28/06/2019	FA 19-099 FA FC11342	1 609,90 1 119,96		1 609,90 1 119,96
010232 REGUL ERR IMPUTATION	28/06/2019	REGUL	-1 119,96		-1 119,96
M2018-024/BDC 22 AMO DCE Dépollution - ARCAGEE	20,00,2013	REGOE	2 946,24		2 946,24
011505 SOLDE	27/11/2020	FA 20-233	2 946,24		2 946,24
M2018-024/BDC17 Diagnostic voierie Mirepin - ARCAGEE			2 316,48		2 316,48
010810 SOLDE	21/08/2020	FA 20-139	2 316,48		2 316,48
M2018-024/BDC18 Diagnostic Keria Flunch Mac Do - ARCAGEE			9 933,43		9 933,43
010811 SOLDE	21/08/2020	FA 20-140	9 933,43		9 933,43
M2018-024/BDC21 Investigations complementaires Mirepin - ARCAGEE			12 511,15		12 511,15
011616 AC1	01/01/2021	FA 20-268	6 816,25		6 816,25
011980 AC 2	05/02/2021	FA 21-024	5 694,90		5 694,90
M2018-024/BDC25 Suivi piézométrique - ARCAGEE			19 941,86		19 941,86
012224 AC1	22/03/2021	FA 21-064	8 651,45		8 651,45
013680 AC2	09/11/2021 17/02/2022	FA 21-261	6 291,93		6 291,93
014509 AC3 M2018-024/BDC26 Evaluation complémentaire espaces publics - ARCAGEE	1//02/2022	FA 22-040	4 998,48 27 822,81		4 998,48 27 822,81
012854 AC 1	30/06/2021	FA 21-167	27 822,81		27 822,81
M2018-024/BDC27 AMO travaux espaces publics - ARCAGEE	,,		1 801,44		1 801,44
017018 AC1	01/01/2023	FA 22-298	1 801,44		1 801,44
M2019-043 Actualisation ZH - NYMPHALIS	1		2 700,00		2 700,00
009102 SOLDE	19/11/2019	FA F1911094	2 700,00		2 700,00
M2020-065 Note actualisation enjeux écologiques - NYMPHALIS			1 200,00		1 200,00
011725 SOLDE	01/01/2021	FA F2012171	1 200,00		1 200,00
M2021-021 Test et Accompagnement avec outil « Arbre en Ville - E6			1 080,00		1 080,00
013057 SOLDE	04/08/2021	FA	1 080,00		1 080,00
M2021-029 Identification des arbres à conserver (150 arbres) - ENVOLIS			3 300,00		3 300,00
012497 SOLDE	06/05/2021	FA 21-05-655	3 300,00		3 300,00
M2021-078 Réalisation d'un bilan carbone - NOBATEK	04 /04 /2022	EA EAGAGGGG	6 240,00		6 240,00
014278 SOLDE	01/01/2022	FA FA2100291	6 240,00	35.045.04	6 240,00
M2022-007 Lot 1/BDC10 AMO Missions écologiques : 4 saisons+diag avant	28/00/2022	EA 22-00 2067	10 230,96	25 945,64	36 176,60
018808 AC1	28/09/2023	FA 23-09-2067 FA 23-10-2088	3 281,76 3 281,76		3 281,76 3 281,76
018904 AC2	05/10/2022				J 201,/0
018904 AC2 019002 AC3	05/10/2023				
018904 AC2 019002 AC3 019623 AC4	05/10/2023 20/10/2023 01/01/2024	FA 23-10-2114 FA 23-12-2268	3 667,44	3 188,40	3 667,44 3 188,40

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		I	_	-	
7.19.17	Data Fastania	NI f	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
020824 AC6	02/05/2024	FA 24-05-2489		1 958,12	1 958,12
020956 AC7 021256 AC8	15/05/2024 21/06/2024	FA 24-05-2533 FA 24-06-2617		3 319,92 3 319,92	3 319,92 3 319,92
021552 AC9	12/07/2024	FA 24-00-2017		3 319,92	3 319,92
021932 AC9 021983 AC10	30/08/2024	FA 24-08-2836		6 257,64	6 257,64
M2022-007 Lot 1/BDC14 AMO Missions écologiques : note friche Leroy Merlin -	30/00/2024	1A 24 00 2030		374,76	374,76
019721 AC1	04/01/2024	FA 24-01-2277		374,76	374,76
M2022-007 Lot 1/BDC15 AMO Missions éco : Friche Leroy Merlin - ENVOLIS	0 1,02,202 1			12 109,86	12 109,86
020359 AC1	13/03/2024	FA 24-03-2398		4 572,72	4 572,72
020828 AC2	02/05/2024	FA 24-05-2490		438,48	438,48
021587 AC3	18/07/2024	FA 24-07-2729		3 126,00	3 126,00
022227 AC4	27/09/2024	FA 24-09-2902		3 972,66	3 972,66
M2022-007 Lot 1/BDC18 AMO Missions éco : Friche Leroy Merlin - ENVOLIS				2 255,04	2 255,04
021047 AC1	30/05/2024	FA 24-05-2561		1 127,52	1 127,52
021213 AC2	14/06/2024	FA 24-06-2598		1 127,52	1 127,52
M2022-007 Lot 1/BDC2 AMO Missions écologiques - secteur géographique			2 455,20		2 455,20
016920 AC1	01/01/2023	FA 22-12-1601	2 455,20		2 455,20
M2022-007 Lot 1/BDC20 AMO Missions éco : Analyse 3 sites de compensation -				16 834,95	16 834,95
021366 AC1	28/06/2024	FA 24-06-2670		11 212,56	11 212,56
022425 AC2	17/10/2024	FA 24-10-2963		2 816,57	2 816,57
023084 AC3	05/12/2024	FA 24-12-3129		2 805,82	2 805,82
M2022-007 Lot 1/BDC22 AMO Missions éco: Analyse site de compensation -				5 622,40	5 622,40
022173 AC1	20/09/2024	FA 24-09-2875		5 622,40	5 622,40
M2022-007 Lot 1/BDC5 AMO Missions écologiques : études environnementales			9 743,90		9 743,90
018052 AC1	30/05/2023	FA 23-05-1846	1 310,40		1 310,40
018161 AC2	19/06/2023	FA 23-06-1878	1 362,24		1 362,24
018331 AC3	21/07/2023	FA23-07-1937	866,88		866,88
018385 AC4	25/07/2023	FA 23-07-1970	1 857,60		1 857,60
018725 AC5	15/09/2023	FA 23-09-2035	1 776,96		1 776,96
018827 AC6	29/09/2023	FA 23-09-2077	1 378,34		1 378,34
019001 AC6	20/10/2023	FA 23-10-2113	1 191,48	2 100 50	1 191,48
M2022-007/Lot 1/BDC19 AMO Missions éco : Etude chiroptères - ENVOLIS 021266 AC1	21/06/2024	FA 24-06-2620		3 190,68 1 127,52	3 190,68 1 127,52
021902 AC2	16/08/2024	FA 24-08-2792		2 063,16	2 063,16
M2022-034 Lot 1 S Ouest/BDC23 SSEP 3 : Investigat° sols excavés Rues	10/08/2024	1A 24-08-2732		14 845,05	14 845,05
022652 AC1	31/10/2024	FA 240648		14 845,05	14 845,05
M2022-034 Lot 1 S Ouest/BDC5 SSEP 3 : Diag amiante HAP sur enrobé parking	31/10/2024	177240040	3 187,12	14 043,03	3 187,12
017886 AC1	28/04/2023	FA 230270	3 187,12		3 187,12
M2022-034 Lot 1 S Ouest/BDC8 SSEP 3 : Carottages/diag HAP enrobé parking			4 134,06		4 134,06
018199 AC1	27/06/2023	FA 230393	4 134,06		4 134,06
M2023-042/BDC1 Assistance dossier Fonds verts-Biodéchets Soleil (Marne) -			5 694,00		5 694,00
019680 AC1	27/11/2023	FA 2023/19	5 694,00		5 694,00
M2023-055/BDC1 Gisements et gestion biodéchets : Missions 1 à 4 - ELCIMAI				15 024,75	15 024,75
021014 AC1	27/05/2024	FA EV-004017		3 729,73	3 729,73
021677 AC2	26/07/2024	FA EV-004363		7 497,35	7 497,35
022225 AC3	27/09/2024	FA EV-004633		1 368,55	1 368,55
022564 AC4	29/10/2024	FA EV-004838		2 429,12	2 429,12
M2024-006/Lot 1/BDC1 AMO missions arboricoles : Diag 131 arbres Friche LM -				10 980,00	10 980,00
021586 AC1	18/07/2024	FA 24-07-2728		7 844,28	7 844,28
021971 AC2	30/08/2024	FA 24-08-2833		3 135,72	3 135,72
M2024-007 Diagnostic phytosanitaire friche Leroy Merlin - ENVOLIS	<u> </u>			8 460,00	8 460,00
020433 AC1	21/03/2024	FA 24-03-2409		3 660,00	3 660,00
020819 AC2	02/05/2024	FA 24-05-2488		4 800,00	4 800,00
A106 Etude mobilité			111 841,83	149 966,12	261 807,95
M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - ALYCE	24/02/22:-	F4 26122=-	2 280,00		2 280,00
008728 SOLDE	24/09/2019	FA 2019372	2 280,00		2 280,00
M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - TRANSITEC	01/01/2020	FA 1040F	2 485,20		2 485,20
009619 SOLDE	01/01/2020	FA 19495	2 485,20		2 485,20
M2016-037/BDC11 Accessibilité futeur établissement scolaire ; appui analyse	00/01/2020	EA30003	4 765,20		4 765,20
009620 SOLDE M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks -	09/01/2020	FA20003	4 765,20 32 700,00		4 765,20 32 700,00
	02/06/2022	EV 3033366			32 700,00
019416 AC1	02/06/2023	FA 2023266	32 700,00	22 500,00	22 500,00
M2019-039 Lot 1/RDC10 SOL France 2020 Enquêtes Sunthèse Banches-vies	T. Control of the Con			-	6 900,00
M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks -	01/01/2024	FΔ 23 12 //1		E ann nni	
019843 France 2030 - AC1	01/01/2024	FA 23.12.41 FA 24.10.24		6 900,00 15 600.00	
019843 France 2030 - AC1 022472 FRANCE 2030 - AC2	01/01/2024 15/10/2024	FA 23.12.41 FA 24.10.24	19 425.03	15 600,00	15 600,00
019843 France 2030 - AC1			19 425,03 3 302,70		

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			3	-	
Intitulé	Date Facture	Numéro	A fin 2023	A fin 2024	A fin 2024
021434 FR2030 - AC2			2023		
M2019-039 Lot 1/BDC14 SOLEIL Enquete sur motorisation des habitants - NOVA	03/07/2024	FA 24421	12 597,00	8 274,99	8 274,99 12 597,00
019662 AC1	13/11/2023	FA 231105	12 597,00		12 597,00
M2019-039/Lot 2/BDC14 France 2030 Mission Mobilité Soleil - SCET	13/11/2023	1A 231103	12 337,00	13 020,30	13 020,30
019684 AC1	01/01/2024	FA F23-12-		13 020,30	13 020,30
M2019-039/Lot 2/BDC14 Bis France 2030 Mission mobilité Mérignac Soleil -	01,01,201	177.120 12		44 428,88	44 428,88
020083 AC1	01/01/2024	FA 503-2023		11 102,22	11 102,22
021829 AC2	24/07/2024	FA 263-2024		33 326,66	33 326,66
M2019-039/Lot 2/BDC19 Atelier de travail + production - AUXILIA				567,63	567,63
020167 AC1	16/02/2024	FA 041-2024		567,63	567,63
021671 FRANCE 2030 - AC1	25/07/2024	FA		3 399,66	3 399,66
022416 FRANCE 2030 - AC2	25/01/2024	FA		5 689,56	5 689,56
022895 ANNUL ERR IMPUT	25/07/2024	FA		-3 399,66	-3 399,66
022897 ANNUL ERR IMPUT	25/01/2024	FA		-5 689,56	-5 689,56
M2019-039/Lot 2/BDC9/FRANCE 2030 SOL France 2030 Etat des lieux Propo°			10 454,40	20 815,92	31 270,32
019413 AC1	29/09/2023	FA 328-2023	10 454,40		10 454,40
020085 AC2	01/01/2024	FA 512-2023		3 586,18	3 586,18
020889 AC3	29/04/2024	FA 130-2024		3 151,15	3 151,15
021830 AC4	24/07/2024	FA 264-2024	3 750 05	14 078,59	14 078,59
M2020-051 Expertise pour la DUP/MECDU - TRANSITEC	12/10/2020	EA 20474	2 760,00 2 760.00		2 760,00
011154 SOLDE M2020-068 Accompagnement dans la conception des espaces publics (phase	13/10/2020	FA 20474	2 760,00 8 400,00		2 760,00 8 400,00
011637 SOLDE	01/01/2021	FA 20 646	8 400,00		8 400,00
M2021-026 Finalisation de la conception des espaces publics (phase PRO) -	01/01/2021	FA 20 040	2 550,00		2 550,00
012453 SOLDE	29/04/2021	FA 21250	2 550,00		2 550,00
M2021-063 Expertise accessibilité école - TRANSITEC	25/04/2021	1A 21230	3 105,00		3 105,00
014464 SOLDE	02/02/2022	FA 22065	3 105,00		3 105,00
M2023-002 Rélisation dossier carrefours / Kennedy Matosinhos & avenue de la			6 450,00		6 450,00
017628 AC1	23/03/2023	FA 23191	6 450,00		6 450,00
M2023-012/BDC1 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour	1		1 290,00		1 290,00
017852 AC1	28/04/2023	FA 23291	1 290,00		1 290,00
M2023-012/BDC2 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour			2 580,00		2 580,00
018612 AC1 SOLDE	01/09/2023	FA 23578	2 580,00		2 580,00
M2023-052/BDC1 Soleil Atelier de lancement et réunion - VELIPRO (VIRAJ)				1 440,00	1 440,00
020369 AC1 SOLDE	18/03/2024	FA F350		1 440,00	1 440,00
M2023-052/BDC4 Soleil Expérimentation prêt vélo Soleil - VELIPRO (VIRAJ)				11 642,40	11 642,40
020664 AC1 SOLDE	16/04/2024	FA F-384		11 642,40	11 642,40
M2024-025 Etude de mobilité - plan guide 2024 - ALYCE				10 026,00	10 026,00
022326 AC1	24/09/2024	FA 202400559		10 026,00	10 026,00
M2024-025 Etude de mobilité - plan guide 2024 - TRANSITEC				17 250,00	17 250,00
022757 AC2	13/11/2024	FA 24738		17 250,00	17 250,00
A107 Sondages géotechniques			44 002,78		44 002,78
M2016-015/BDC18 Etudes et sondages Castorama/Mirepin - GEOTEC	11/00/2020	EA 204074	25 085,56		25 085,56
010762 SOLDE 010763 SOLDE	11/08/2020	FA 204974	2 421,60 22 663,96		2 421,60
M2020-052 LOT 1/BDC1 Voie Castorama Essais à la plaque - GINGER CEBTP	11/08/2020	FA 204972	1 233,79		22 663,96 1 233,79
012959 AC1	19/04/2021	FA	1 233,79		1 233,79
M2020-052 LOT 1/BDC2 Essais géotechniques G2 sur Espaces publics phase 1 -	15/04/2021		3 625,20		3 625,20
012808 SOLDE	29/06/2021	FA	3 625,20		3 625,20
M2020-052 LOT 1/BDC3 G1 PGC FRICHE LEROY MERLIN - GINGER CEBTP	23/00/2021	177	14 058,23		14 058,23
012847 AC1	30/06/2021	FA	13 068,85		13 068,85
015741 AC2	26/07/2022	FA	989,38		989,38
A108 Géomètre			78 811,17	8 094,94	86 906,11
M2016-003/BDC 49 Bornage, arpentage, copro - CARREFOUR - AX 70 et 385 -			2 002,82	,	2 002,82
008815 SOLDE	30/09/2019	FA FC11833	2 002,82		2 002,82
M2016-003/BDC41 Bornage Castorama - MAGEO			1 119,96		1 119,96
010233 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96		1 119,96
M2019-032/BDC3 Géomètre expert - Temporaire - MAGEO			2 092,56		2 092,56
008816 SOLDE	30/09/2019	FA FC11832	2 092,56		2 092,56
M2019-034 Lot 1/BDC 128 Levé, plan topo, MàJ PG OP, piquetage carrefour MC			3 726,87		3 726,87
019461 AC1	30/11/2023	FA FC20896	3 726,87		3 726,87
M2019-034 Lot 1/BDC 129 Levé , plan topo, piquetage, AV Kennedy PICHET -		1	2 657,87		2 657,87
019455 AC1	30/11/2023	FA FC20895	2 657,87		2 657,87
M2019-034 Lot 1/BDC 130 Piquetage Naga Ripiano BDR - MAGEO	20/4:/25	F. F. F. C.	1 276,42		1 276,42
019456 AC1	30/11/2023	FA FC20894	1 276,42		1 276,42
M2019-034 Lot 1/BDC 131 Piquetage Soleil SMJ - MAGEO	24 /05 /2024	FA 5622227		642,24	642,24
021223 AC1	31/05/2024	FA FC22287	4 227 05	642,24	642,24
M2019-034 Lot 1/BDC 132 Levé, plan topo, MAJ PG opé, polygone AV			1 237,86		1 237,86

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
019460 AC1	30/11/2023	FA FC20897		2024	
M2019-034 Lot 1/BDC10 Geodétection Chemin de Mirepin et voie d'accès	30/11/2023	FA FC20897	1 237,86 1 088,93		1 237,86 1 088,93
010716 SOLDE	31/07/2020	FA FC13496	1 088,93		1 088,93
M2019-034 Lot 1/BDC11 BDC11 Plan parcellaire et bornage LEROY MERLIN -	02/07/2020	7711 020 150	1 120,95		1 120,95
011048 AC1	28/09/2020	FA FC13714	1 120,95		1 120,95
M2019-034 Lot 1/BDC114 Piquetage emprises privées/publiques Somme Centre			2 083,70		2 083,70
018610 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20278	2 083,70		2 083,70
M2019-034 Lot 1/BDC115 Complément piquetage emprises privées/publiques			4 777,46		4 777,46
018878 SOLDE	30/09/2023	FA FC20433	4 777,46		4 777,46
M2019-034 Lot 1/BDC121 Etablissement DMPC SAINT MACLOU - MAGEO			2 440,72		2 440,72
019077 SOLDE	30/10/2023	FA FC20596	2 440,72		2 440,72
M2019-034 Lot 1/BDC126 Piquetage secteur Mirepin - MAGEO			7 397,81		7 397,81
019078 SOLDE	30/10/2023	FA FC20597	7 397,81		7 397,81
M2019-034 Lot 1/BDC22 Bornage et plan topo (Carrefour) - MAGEO 011956 AC1	31/01/2021	EA EC14E62	2 395,05		2 395,05
M2019-034 Lot 1/BDC27 Bornage ilôt Castorama - MAGEO	31/01/2021	FA FC14563	2 395,05 1 595,54		2 395,05 1 595,54
011584 SOLDE	01/01/2021	FA FC14269	1 595,54		1 595,54
M2019-034 Lot 1/BDC32 Plan topo Espaces publics et friche LM - MAGEO	,, -521	32.203	3 301,13		3 301,13
012476 AC1	30/04/2021	FA FC15044	3 301,13		3 301,13
M2019-034 Lot 1/BDC41 Plan friche Leroy Merlin - MAGEO			964,00		964,00
014880 AC1	31/03/2022	FA FC17156	964,00		964,00
M2019-034 Lot 1/BDC55 Doc arpentage division declaration préalable llots			1 606,17		1 606,17
014425 AC1	31/01/2022	FA FC16688	1 606,17		1 606,17
M2019-034 Lot 1/BDC55BIS Doc arpentage division declaration préalable llots			1 096,99		1 096,99
014424 AC1	31/01/2022	FA FC16682	1 096,99		1 096,99
M2019-034 Lot 1/BDC61 Report projet sur cadastre - MAGEO	24 /24 /222		15 026,30		15 026,30
017274 AC1	01/01/2023	FA FC18035	15 026,30		15 026,30
M2019-034 Lot 1/BDC62 Etabliss doc arpentage/plan de division LE MEMPHIS - 014881 AC1	31/03/2022	FA FC17154	234,72 234,72		234,72 234,72
M2019-034 Lot 1/BDC95 Géomètre : géo-détection Memphis - MAGEO	31/03/2022	FA FC17134	2 479,34		2 479,34
017441 AC1	27/02/2023	FA FC19056	2 479,34		2 479,34
M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - ODACE	27,02,2020	771 023030	1 920,00		1 920,00
012676 AC1	17/05/2021	FA 21-05-437	1 920,00		1 920,00
M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - SUEZ RV OSIS OUEST			15 168,00		15 168,00
010944 AC1	24/08/2020	FAI20080120	15 168,00		15 168,00
M2023-043 Lot 1/BDC2 Géomètre : Levée topo maison friche Leroy Merlin -				2 989,76	2 989,76
020477 AC1	27/03/2024	FA F24030610		2 989,76	2 989,76
M2023-043 Lot 3/BDC10 Levé topo limite propriété Boulanger/Rue Matosinhos				2 166,48	2 166,48
020837 AC1	30/04/2024	FA FC21953		2 166,48	2 166,48
M2023-043 Lot 3/BDC11 Géomètre : masterplan BDC antérieurs - MAGEO 020834 AC1	30/04/2024	FA FC21954		2 296,46 2 296,46	2 296,46 2 296,46
A110 Etude et expertise juridique	30/04/2024	TATC21334	3 144,32	2 2 9 0,40	3 144,32
19-02627 PV constats enquete publique - CASIMIRO (HUISSIER)			999,98		999,98
007548 SOLDE	12/02/2019	FA 54 493	999,98		999,98
M2021-001 Lot 1/BDC22 Prestation juridique Parking Art 40 Loi 10 mars 2023 -	, , , , ,		2 144,34		2 144,34
019534 AC1	30/11/2023	FA 202306785	2 144,34		2 144,34
A112 Autres			117 504,84	208 336,02	325 840,86
19-03244 Indemnisation concours maitrise d'oeuvre ilot Alinea - NADAU			13 500,00		13 500,00
009097 SOLDE	15/11/2019	FA 2019-11-	13 500,00		13 500,00
19-03245 Indemnisation concours maitrise d'oeuvre ilot Alinea - LAABO			13 500,00		13 500,00
009098 SOLDE	15/11/2019	FA 19-37	13 500,00		13 500,00
22-05437 France 2030 Convention Recherche ICU- 20K€ sur C0010 France 2030 -	04 /04 /000 :	FA FA222215		20 000,00	20 000,00
022892 FRANCE 2030 AC1 PART SOLEIL	01/01/2024	FA FA2300407		20 000,00	20 000,00
23-06147 France 2030 Conv Perf eco et environnementale Soleil - NOBATEK 022894 FRANCE 2030 AC1-AC2	01/01/2024	FA2300038		108 000,00 66 000,00	108 000,00 66 000,00
023000 FRANCE 2030 AC3	30/11/2024	FA 2400360		42 000,00	42 000,00
009323 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00	JUU,UU	1 530,00
010234 REGUL ERR IMPUTATION AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	-1 530,00		-1 530,00
M2018-032/BDC12 France 2030 - M2 Accompagnement stratégique pour le PAE		,	1 113,60	38 717,38	39 830,98
018230 AC1	30/06/2023	FA 2306-424-	1 113,60		1 113,60
019618 AC2	01/01/2024	FA 2312-578-		1 492,80	1 492,80
020381 AC3	15/03/2024	FA 2403-650-		1 274,40	1 274,40
021483 AC4	28/06/2024	FA 2406-731		554,98	554,98
022882 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424		-1 113,60	-1 113,60
022884 FRANCE 2030 AC1 REGUL IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424		10 713,60	10 713,60
022885 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2312-578		-1 492,80	-1 492,80
	04/0:/-:				
022886 FRANCE 2030 AC2 REGUL IMPUT 022887 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024 15/03/2024	FA 2312-578 FA 2403-650		13 492,80 -1 274,40	13 492,80 -1 274,40

			Dáglá gum TTC	Dáglá TTC	Dáglá gum TTC
			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
022888 FRANCE 2030 AC3 REGUL IMPUT	15/03/2024	FA 2403-650		10 874,40	10 874,40
022889 ANNUL ERR IMPUT	28/06/2024	FA 2406-731		-554,98	-554,98
022890 FRANCE 2030 AC4 REGUL IMPUT M2019-001/BDC8 France 2030 Lot 2 - Mission Eval Socioeconomique Mérignac	28/06/2024	FA 2406-731	47 400,00	4 750,18 8 616,00	4 750,18 56 016,00
017798 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC1	19/04/2023	FA F23-04-	20 940,00	8 010,00	20 940,00
018055 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC2	30/05/2023	FA F23-05-	26 460,00		26 460,00
019641 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE AC3	01/01/2024	FA F23-12-	20 100,00	5 136,00	5 136,00
021369 FR2030 EVAL SOCIOECO AC4	28/06/2024	FA 2024/02692		3 480,00	3 480,00
M2019-039/Lot 2/BDC9 SOL France 2030 Etat des lieux - Propos° actions - SCET				9 089,22	9 089,22
022896 FRANCE 2030 AC1	25/07/2024	FA		3 399,66	3 399,66
022898 FRANCE 2030 AC2	25/01/2024	FA		5 689,56	5 689,56
M2019-066/BDC43 France 2030 - Echange avec Plaine Commune sur méthodo -				332,70	332,70
022184 AC1	23/09/2024	FA 24-019-072		332,70	332,70
M2021-010/BDC12 SOL France 2030 AMO géné Phase Incubation matrice -			26 865,78		26 865,78
019420 AC1	01/01/2023	FA 226-22	13 345,25		13 345,25
019421 AC2	14/03/2023	FA 017-23	13 520,53	0 720 72	13 520,53
M2021-010/BDC17 SOL France 2030 AMO géné - Ordonnancement Outil 019422 AC1	21/07/2023	FA 087-23	15 125,46 8 114,10	9 729,72	24 855,18 8 114,10
019296 AC2	27/11/2023	FA NH 008	7 011,36		7 011,36
020783 AC3	29/04/2024	FA 052-24		6 188,40	6 188,40
022836 AC4	20/11/2024	FA 191-24		3 541,32	3 541,32
M2024-020 France 2030 - Expérimentation de la plateforme Welcooom -	<u> </u>			13 851,00	13 851,00
022881 FRANCE 2030 AC1 REGUL IMPUT	28/05/2024	FA F2024-07		13 851,00	13 851,00
B FONCIER			2 994 451,17	5 504 177,44	8 498 628,61
B101 Coût aquisition terrain			2 598 063,80	4 098 274,66	6 696 338,46
19-02497 Acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			160 000,00		160 000,00
007330 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	160 000,00		160 000,00
19-02896 Acquisition LEROY MERLIN AW 545 à 549 / AW 516 à 544 - LEBEAU-	00/05/0010		1 767 335,80		1 767 335,80
19-02896 Provision	20/06/2019		77 414,00		77 414,00
19-02896 Provision 19-02896 Provision	20/06/2019		11 553,00 1 572 962,40		11 553,00 1 572 962,40
19-02896 Provision	20/06/2019		249 213,00		249 213,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-79 606,60		-79 606,60
19-02896 Provision	20/06/2019		-28 500,00		-28 500,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-5 700,00		-5 700,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-30 000,00		-30 000,00
016866 ACQ° LEROY MERLIN AW 545-549	15/12/2022	ACTE 15/12/22			
016882 ACQ LEROY MERLIN AW 516 à 544	15/12/2022	ACTE 15/12/22			
22-05313 Consignation préemption SCI RUE ANDRE NAVAILLE AW 139 -			102 600,00		102 600,00
22-05313 Provision	28/04/2022		102 600,00		102 600,00
22-05314 Consignation préemption SCI PORTETS AW 356 - CONSIGNATION			280 950,00		280 950,00
22-05314 Provision	28/04/2022		280 950,00		280 950,00
22-05440/1 Acquisition BENTEJAC AY 743 - LEBEAU-CABANAC (NOT) 22-05440/1 Provision	20/06/2022		10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00
22-05717/1 Acquisition MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)	20/00/2022		195 822,00		195 822,00
22-05717/1 Provision	11/10/2022		195 822,00		195 822,00
22-05727/1 Acquisition SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-CABANAC	,, 2022		5 520,00		5 520,00
22-05727/1 Provision	18/10/2022		5 520,00		5 520,00
22-05863 Acquisition AVENUE KENNEDY (PICHET) AW435 à 513 - LEBEAU-			17 836,00		17 836,00
22-05863 Provision	15/12/2022		26 080,00		26 080,00
019113 ACQ SNC AV. KENNEDY (PICHET) AW435 à 512	27/10/2023	ACTE 27/10/23	-8 244,00		-8 244,00
23-06361/1 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			58 000,00		58 000,00
23-06361/1 Provision	08/06/2023		58 000,00		58 000,00
23-06693/1 Acquisition CLAIRSIENNE AY 807 815 44 avenue de la Somme -	0=14:1=:			2 200,00	2 200,00
23-06693/1 Provision	27/11/2023			2 200,00	2 200,00
24-07258 Consignation Expropriation ASL Mirepin - CONSIGNATION CAISSE DES	07/06/2024	07/06/24		33 050,00	33 050,00
021135 CONSIGNATION EXPRO ASL MIREPIN 24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX	07/06/2024	07/06/24		33 050,00 1 286 050,26	33 050,00 1 286 050,26
24-07402 Acquisition ONYX AY/98-799 Indemnite - CARPA BORDEAUX 24-07402 Provision	27/08/2024			1 286 050,26 1 286 050,26	1 286 050,26
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX	2.,30,2024			893 050,00	893 050,00
021967 ACQ INDEM EXPRO EYQUEMS AY1	29/08/2024	EX 29/08/24		720 000,00	720 000,00
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024		173 050,00	173 050,00
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX				598 153,40	598 153,40
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024		598 153,40	598 153,40
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité -				263 480,00	263 480,00
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024		263 480,00	263 480,00
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité -				30 750,00	30 750,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790	22/10/2024	DDE		30 750,00	30 750,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
24-07540 Acquisition MAC DONALD 17 rue de Mirepin Indemnité - MCDONALD'S		Trumero	2023	20 000,00	20 000,00
022438 INDEMN MAC DONALD	18/10/2024	FA181024		20 000,00	20 000,00
24-07542 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHES AX 507 508 510 511 512 513				340 700,00	340 700,00
022436 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHES TR2	18/10/2024	FA181024		340 700,00	340 700,00
24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33				7 770,00	7 770,00
24-07545 Provision	18/10/2024			7 770,00	7 770,00
24-07546 Acquisition SCI SMJ AY 801 802 806 - CARPA BORDEAUX	18/10/2024	FA130524		156 780,00 156 780,00	156 780,00
022432 INDEMN SCI SMJ 24-07548 Acquisition SCI IENG AY 796 797 - CARPA CHARENTE	18/10/2024	FA130524		466 290,00	156 780,00 466 290,0 0
022433 INDEMN SCI IENG	18/10/2024	FA290724		466 290,00	466 290,00
24-07549 Acquisition AB GROUPE AY 796 797 - CARPA CHARENTE	10, 10, 202 .			1,00	1,00
022434 INDEMN AB GROUPE	18/10/2024	FA290724		1,00	1,00
B201 Frais d'actes			52 991,58	-2 297,53	50 694,0
19-02498 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			162,43		162,43
007332 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	162,43		162,43
19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 883,43		3 883,43
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	3 883,43		3 883,4
19-02896/1 Frais acquisition LEROY MERLIN AW545-549 - LEBEAU-CABANAC 19-02896/1 Provision	27/12/2022		27 574,43 28 500,00		27 574,43 28 500,0
19-02896/1 Provision 19-02896/1 Provision	27/12/2022		-79,80		-79,80
19-02896/1 Provision	27/12/2022		-266,45		-266,4
19-02896/1 Provision	27/12/2022		266,45		266,4
016947 FRAIS S/ACQ LEROY MERLIN AW545-549	21/12/2022	FA 21/12/22	,		
017561 COMP F.ACQ LEROY MERLIN AW545-549	28/02/2023	FA 28/02/23	-845,77		-845,7
19-02896/2 Frais acquisition LEROY MERLIN AW516 à 544 - LEBEAU-CABANAC			6 560,60		6 560,60
19-02896/2 Provision	28/12/2022		5 700,00		5 700,00
017463 FRAIS ACQ S/LEROY MERLIN AW516 à 544	28/02/2023	FA 28/02/23	860,60		860,60
22-05440/2 Frais d'aquisitions BENTEJAC AY743 51 rue de Mirepin - LEBEAU-			1 133,93		1 133,93
22-05440/2 Provision	20/06/2022	FA 26 (00 (22	1 650,00		1 650,00
016147 FRAIS ACQ S/BENTEJAC AY743 22-05717/2 Frais d'aquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC	26/09/2022	FA 26/09/22	-516,07 4 927,86		-516,07 4 927,86
22-05717/2 Provision 22-05717/2 Provision	11/10/2022		3 459,59		3 459,59
22-05717/2 Provision	11/10/2022		1 052,29		1 052,29
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	415,98		415,98
22-05727/2 Frais d'aquisitions SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-			1 448,90		1 448,90
22-05727/2 Provision	18/10/2022		1 300,00		1 300,0
017462 FRAIS ACQ SCCV SOGARA AX 480 482 484	27/02/2023	FA 27/02/23	148,90		148,9
22-05863/2 Frais d'aquisitions AVENUE KENNEDY AW 435 à 513 - LEBEAU-			3 200,00	-947,30	2 252,70
22-05863/2 Provision	15/12/2022		2 000,00		2 000,0
22-05863/2 Provision	15/12/2022	FA 27/02/24	1 200,00	007.57	1 200,00
020160 FRAIS ACQ° AVENUE KENNEDY AW435-513 021119 FRAIS ACQ° COMP AV KENNEDY AW435-513	27/02/2024 27/05/2024	FA 27/02/24 FA 24/05/24		-937,57 -9,73	-937,5° -9,7
23-06361/2 Frais d'acquisition SCI SCHAJAR AY764 (621) - LEBEAU-CABANAC	27/03/2024	FA 24/03/24	4 100,00	-1 803,23	2 296,77
23-06361/2 Provision	02/10/2023		4 100,00	-1 003,23	4 100,00
020157 FRAIS ACQ SCI SHAJAR AY621	07/02/2024	FA 07/02/24	1 200,00	-1 803,23	-1 803,2
23-06693/2 Frais d'acquisition CLAIRSIENNE AY 807 815 44 av. de la Somme -				453,00	453,00
23-06693/2 Provision	22/04/2024			800,00	800,00
022160 FRAS S/ACQ CLAIRSIENNE AY807-815	10/09/2024	FA 10/09/24		-347,00	-347,0
B302 Géomètres foncier			12 001,21	10 956,40	22 957,63
M2019-034 Lot 1/BDC102 Levées topo localisation d'un ouvrage - MAGEO			1 250,75		1 250,75
018065 AC1	31/05/2023	FA FC19700	1 250,75		1 250,75
M2019-034 Lot 1/BDC108 Levées topographiques _site Kéria - MAGEO 018244 SOLDE	30/06/2023	FAFC19950	428,46 428,46		428,46
M2019-034 Lot 1/BDC113 Plan surface utile 50 av de la Somme - MAGEO	30/00/2023	i Wi C13330	1 382,10		1 382,10
018611 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20283	1 382,10		1 382,10
M2019-034 Lot 1/BDC117 Etablissement DMPC et plan de cession CLAIRSIENNE -	,		,,,,,,	914,06	914,06
019868 SOLDE	25/01/2024	FA FC21261		914,06	914,0
M2019-034 Lot 1/BDC118 Etablissement DMPC et plan de cession Aqprim -			386,91		386,91
019457 DMPC+ PLAN CESSION	30/11/2023	FA FC20900	386,91		386,9
M2019-034 Lot 1/BDC135 DMPC pour cessibilité - MAGEO				4 978,65	4 978,65
019875 AC1	25/01/2024	FA FC21267		4 978,65	4 978,6
M2019-034 Lot 1/BDC74 Etabliss docs en vue cession foncière - MAGEO	00/00/000		2 873,47		2 873,47
016218 AC1 M2019 024 Lot 1/RDC75 Etablisct DR Loroy Marlin - MAGEO	30/09/2022	FA FC18223	2 873,47		2 873,4
M2019-034 Lot 1/BDC76 Etablisst DP Leroy Merlin - MAGEO	22/07/2022	FA FC17795	1 588,70 1 588,70		1 588,70 1 588,70
ΙΟ15731 ΔC1	12210112022	1.1.01.133	1 300,70		
015731 AC1 M2019-034 Lot 1/BDC77 Piauetage partiel llot Alinéa - MAGEO	<u> </u>		2 535 38		2 525 28
M2019-034 Lot 1/BDC77 Piquetage partiel llot Alinéa - MAGEO 018879 SOLDE	30/09/2023	FA FC20434	2 535,38 2 535,38		2 535,38 2 535,38

			Dáglá sum TTC	Réglé TTC	Dáglá sum TTC
			Réglé cum TTC	<u> </u>	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
016569 SOLDE	31/10/2022	FA FC18405	1 555,44	4 542 00	1 555,44
M2023-043 Lot 3/BDC17 Géomètre : Plan piquetage parcelles Clairsienne - 021665 AC1	25 (07 (2024	FA FC22595		1 612,80	1 612,80
M2023-043 Lot 3/BDC2 DMPC cessibilité - MAGEO	25/07/2024	FA FC22595		1 612,80 3 450,89	1 612,80 3 450,8 9
020249 AC1	29/02/2024	FA FC21597		3 450,89	3 450,89
B303 Expertises foncières	23/02/2024	TATC21337	20 800,10	2 281,50	23 081,60
M2017-021/BDC26 Expertise parcelle AY n°1 - IPFEC			6 540,00	2 201,50	6 540,00
013393 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	6 540,00		6 540,00
M2017-021/BDC27 Expertise parcelle AY N° 2 - IPFEC			1 200,00		1 200,00
013562 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	1 200,00		1 200,00
M2017-021/BDC28 Expertise immobilière parcelle cadastrée N° AY58 - IPFEC			3 360,00		3 360,00
013565 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	3 360,00		3 360,0
M2017-021/BDC34 Préemption ilot Thibeaudau - IPFEC			4 440,00		4 440,00
014460 AC1	07/02/2022	FA 13/2022	4 440,00		4 440,0
M2020-043 Expertise Bijouterie ORLAC - SOCOTEC CONSTRUCTION			1 800,00		1 800,00
011220 SOLDE	12/10/2020	FA	1 800,00		1 800,0
M2020-050 Estimation valeur foncière Bijouterie Orlac - COLOMER			3 000,00		3 000,00
011080 SOLDE	01/10/2020	FA 2020/10-14	3 000,00		3 000,00
M2021-080/BDC1 Portets Soleil - SEGAT			230,05		230,05
016489 BDC 1 EXPERTISE PORTETS SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-	230,05		230,0
M2021-080/BDC18 Evaluation indemnités Bentajac LE MENPHIS - SEGAT				2 281,50	2 281,50
020194 AC1	29/02/2024	FA FC-24-02-		2 281,50	2 281,50
M2021-080/BDC5 Navaille Soleil - SEGAT			230,05		230,05
016486 BDC 5 EXPERTISE NAVAILLE SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-	230,05		230,05
B401 Indemnités de remploi				429 291,38	429 291,38
24-07258 Consignation Expropriation ASL Mirepin - CONSIGNATION CAISSE DES	07/05/2024	07/06/24		2 500,00	2 500,00
021135 CONSIGNATION EXPRO ASL MIREPIN	07/06/2024	07/06/24		2 500,00	2 500,00
24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX 24-07402 Provision	27/09/2024			129 255,58	129 255,58
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX	27/08/2024			129 255,58 90 305,00	129 255,58 90 305,0 0
021967 ACQ INDEM EXPRO EYQUEMS AY1	29/08/2024	EX 29/08/24		73 000,00	73 000,00
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024		17 305,00	17 305,00
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX	10/10/2024	17/101024		60 815,30	60 815,30
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024		60 815,30	60 815,30
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité -	,,			27 348,00	27 348,00
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024		27 348,00	27 348,00
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité -				4 075,00	4 075,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790	22/10/2024	DDE		4 075,00	4 075,0
24-07540 Acquisition MAC DONALD 17 rue de Mirepin Indemnité - MCDONALD'S				3 000,00	3 000,00
022438 INDEMN MAC DONALD	18/10/2024	FA181024		3 000,00	3 000,00
24-07542 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHES AX 507 508 510 511 512 513				35 070,00	35 070,00
022436 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHES TR2	18/10/2024	FA181024		35 070,00	35 070,0
24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33				1 415,50	1 415,50
24-07545 Provision	18/10/2024			1 415,50	1 415,5
24-07546 Acquisition SCI SMJ AY 801 802 806 - CARPA BORDEAUX				16 678,00	16 678,00
022432 INDEMN SCI SMJ	18/10/2024	FA130524		16 678,00	16 678,0
24-07548 Acquisition SCI IENG_ AY 796 797 - CARPA CHARENTE				48 879,00	48 879,00
022433 INDEMN SCI IENG	18/10/2024	FA290724		48 879,00	48 879,0
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX	00/4:/			9 950,00	9 950,00
24-07633 Provision	08/11/2024			9 950,00	9 950,0
B402 Indemnités d'évictions (résiliations)				111 000,00	111 000,0
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX	00/11/2001			111 000,00	111 000,00
24-07633 Provision	08/11/2024		73.000.00	111 000,00	111 000,0
B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers)			72 000,00	607 277,32	679 277,3
23-06361/3 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) INDEMNITE - SCI SHAJAR 23-06361/3 Provision	19/10/2023		72 000,00 72 000,00		72 000,00
23-06361/3 Provision 24-07385 Indemnité Transfert SARL Eltri 36 av de la Somme - ELTRI	13/10/2023		72 000,00	50 853,00	50 853,00
022429 INDEMN SARL ELTRI	18/10/2024	FA181024		50 853,00	50 853,00
24-07401 Indemnité Transfert SARL ADM 21 36 av de la Somme - ADM 21	10/10/2024	17101024		4 250,00	4 250,00
022430 INDEMN SARL ADM 21	18/10/2024	FA181024		4 250,00	4 250,00
24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX	, _0, _02			100 894,16	100 894,16
24-07402 Provision	27/08/2024			100 894,16	100 894,1
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX	,,			42 642,83	42 642,83
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024		42 642,83	42 642,8
24-07489 Indemnité Transfert Asso.GEIQ SAGE 36 Av. de la Somme - GEIG SAGE		1		11 658,00	11 658,00
022431 INDEMN GEIQ SAGE	18/10/2024	FA181024		11 658,00	11 658,0
24-07528 Indemnité Transfert SASU ADM RETAIL 36 av de la Somme - ADM				23 229,33	23 229,33
					<u> </u>

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX		_		2 500,00	2 500,00
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024		2 500,00	2 500,00
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité -				240 000,00	240 000,00
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024		240 000,00	240 000,00
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité -	22/10/2024	DDE		40 000,00	40 000,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790 24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33	22/10/2024	DDE		40 000,00 40 000,00	40 000,00
24-07545 Provision	18/10/2024			40 000,00	40 000,00
24-07547 Acquisition BE SENS AY801 802 806 _indemnité - BE SENS	1, 1,			200,00	200,00
022468 INDEMNITE BE SENS AY801 802 806	22/10/2024	FA22102024		200,00	200,00
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX				19 050,00	19 050,00
24-07633 Provision	08/11/2024			19 050,00	19 050,00
24-07703 Acquisition SAS KERIA LIVING HOME - KERIA	05/11/0001			10 000,00	10 000,00
24-07703 Provision	25/11/2024			10 000,00	10 000,00
24-07781 Indemnité transfert 50 AV. de la Somme - RAMIREZ DE RIBAS 023188 INDEMNITE GAN 50 AV.SOMME	13/12/2024	FA171224		18 000,00 18 000,00	18 000,00
24-07782 Indemnité transfert VISION DISPLAY AY1 - CARPA BORDEAUX	13/12/2024	TA171224		2 000,00	2 000,00
023294 INDEM TRANSFERT VISION DISPLAY	16/12/2024	JUG 16/12/24		2 000,00	2 000,00
24-07783 Indemnité transfert MAIF - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS	· ·			2 000,00	2 000,00
023296 INDEM TRANSFERT MAIF	16/12/2024	JUG 16/12/24		2 000,00	2 000,00
B404 Indemnités de trouble commercial				96 233,20	96 233,20
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX	10/1-7-			96 233,20	96 233,20
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024	22.052.04	96 233,20	96 233,20
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			22 963,04 108,00	17 247,28	40 210,32 108,00
21-04684 Dépannage fuite d'eau 60% - LOGIS ENERGIES 013481 AC1	01/09/2021	FC0973	108,00		108,00
24-07107 Nettoyage Rue Peyandreau - IDVERDE	01/03/2021	1 00373	100,00	10 074,00	10 074,00
020702 AC1	22/04/2024	FA		10 074,00	10 074,00
M2016-001 Lot 2/BDC10 OP Merignac Soleil : Diag avant demol OUDJANE -			5 409,96		5 409,96
M2016-001 Lot 2/BDC10 Avance	10/01/2019		5 216,40		5 216,40
007333 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	193,56		193,56
007420 GEST° TERRAIN 2016-2017	28/12/2018	FA 010118			
M2016-001 Lot 2/BDC12 OP Mérignac Soleil : Mise en gestion OUDJANE -	10/01/2010		7 109,85		7 109,85
M2016-001 Lot 2/BDC12 Avance 007337 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	10/01/2019 28/12/2018	28/12/18	4 478,71 1 613,04		4 478,71 1 613,04
007277 BDC12 TPS 11/18	20/12/2018	FA 2018/25	64,52		64,52
007421 GEST° TERRAIN 2016-2017	28/12/2018	FA 010118	0.1,52		0.,5.
007422 BDC12 TPS 12/18	21/01/2019	FA 2018/26	64,52		64,52
007561 BDC 12 TPS 01/19	12/02/2019	FA 2019/01	65,34		65,34
007714 BDC 12 TPS 02/19	11/03/2019	FA 2019/02	65,34		65,3
007731 GESTION TERRAIN 2018	01/01/2019	FA 010119			
007952 BDC12-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/09	65,34		65,34
008076 BDC 12-TPS 04/19 008213 BDC 12 - TPS 05/19	17/05/2019 14/06/2019	FA 04.2019/12 FA 05.2019/17	25,74 66,73		25,74 66,73
008213 BDC 12 - 173 03/19 008343 BDC 12-TPS 06/19	05/07/2019	06.2019/25	200,19		200,19
008669 BDC12 - TPS 08/19	16/09/2019	FA 08.2019/29	66,73		66,7
008868 BDC12 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/33	66,73		66,7
009088 BDC12 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/38	66,73		66,7
009443 BDC12 - TPS 11/19	01/01/2020	FA 11-2019/43	66,73		66,7
009598 BDC 12 - TPS 12/19	14/01/2020	FA	66,73		66,73
009779 BDC12- TPS 01/20	10/02/2020	FA	66,73		66,73
M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS	27/05/2010		6 876,61		6 876,61
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019 27/05/2019		2 441,06 153,86		2 441,00 153,80
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		629,65		629,65
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		115,27		115,2
008344 BDC 22-TPS 06/19	05/07/2019	FA 06.2019/26	266,92		266,92
008869 BDC 22-TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/34	133,46		133,4
009783 BDC22 - TPS 01/20	10/02/2020	FA	133,46		133,4
009965 BDC22 - TPS 02/20	10/03/2020	FA	400,39		400,39
010500 BDC22 - TPS 05/20	18/06/2020	DHC/GLS/HSIS/	333,66		333,60
010618 BDC22 TPS 06/2020	16/07/2020	FA	467,12		467,1
010787 BDC22 TPS 07/20 010921 TPS 08/20	17/08/2020 10/09/2020	FA FA	934,24 867,51		934,2 867,5
M2021-046 Lot 1/BDC30 Sécurisation maison Leroy Merlin - VPSITEX	10/03/2020	1.4	3 286,46		3 286,46
018919 SOLDE	22/09/2023	FA	3 286,46		3 286,4
M2021-046 Lot 1/BDC30Bis Sécurisation maison Leroy Merlin 06/2023 à	1		, -	1 684,55	1 684,55
020239 AC1	29/02/2024	FA		1 123,03	1 123,0

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		1	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
020575 AC2	26/03/2024	FA	2020	140,38	140,38
020867 AC3	24/04/2024	FA		140,38	140,38
021172 AC4	31/05/2024	FA		140,38	140,38
021430 AC5	30/06/2024	FA		140,38	140,3
M2021-046 Lot 1/BDC30ter Tôlage friche Leroy Merlin - VPSITEX				336,31	336,31
020870 AC1	24/04/2024	FA		336,31	336,3
M2021-046 Lot 1/BDC31 Sécurisation ancien fournil Madalozzo du 30/03/23 au				2 075,01	2 075,01
022120 SOLDE	11/09/2024	FA		1 877,87	1 877,8
022121 SOLDE	11/09/2024	FA		197,14	197,1
M2021-046 Lot 1/BDC31bis Prolongation Sécurisation ancien fournil Madalozzo				931,58	931,58
022327 SOLDE	11/09/2024	FA		931,58	931,5
M2021-077/BDC20 Diag termites et ERP _ 30 av. de la Somme - AED EXPERTISES			109,10		109,10
018200 SOLDE	27/06/2023	FAFA-243703	109,10		109,10
M2021-077/BDC27 Diag termites carport 30 Av. de la Somme - AED EXPERTISES	20/11/2000		63,06		63,06
019402 AC1 SOLDE	30/11/2023	FA	63,06	2 4 4 5 02	63,0
M2024-015 Nettoyage hebdomadaire BDR - MERIGNAC ASSO. SERVICES	21 /05 /2024	FA 2024 / 7F2		2 145,83	2 145,83
021116 AC1 021423 AC2	31/05/2024 30/06/2024	FA 2024/ 752 FA 2024/ 927		264,65 180,58	264,65 180,55
021423 AC2 022063 AC3	31/08/2024	FA 2024/ 927 FA 2024/ 1242		139,80	139,80
022008 AC4	31/08/2024	FA 2024/ 1242 FA 2024/ 1202		489,30	489,30
022293 AC5	30/09/2024	FA 2024/ 1202 FA 2024/ 1367		495,13	495,1
022667 AC6	31/10/2024	FA 2024/ 1507 FA 2024/ 1547		291,25	291,2
023081 AC7	30/11/2024	FA 2024/ 1726		285,12	285,12
B502 Gardiennage	., _,_,	,_,, _,_,	693,96	2 659,97	3 353,93
M2021-046 Lot 1/BDC 24 [BDR] Renouvell surveillance BDL 15/12/22 au			330,30	787,35	787,35
020236 AC1	29/02/2024	FA		524,90	524,90
020452 AC2	11/03/2024	FA		1 049,79	1 049,79
020730 AVOIR/AC2	23/04/2024	AV		-1 049,79	-1 049,79
020731 AC3	23/04/2024	FA		262,45	262,45
M2021-084/BDC 24 Rondes maisons 110 av Vigneau 9 au 16/08 - DRAKKAR			346,98		346,98
018747 AC1 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-	346,98		346,98
M2021-084/BDC25 Rondes fournil Madalozzo - DRAKKAR			346,98		346,98
018665 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-	346,98		346,98
M2024-002/BDC23-1 MS maison Leroy Merlin alarme et porte - VPSITEX				43,20	43,20
022291 SOLDE	30/09/2024	FA		43,20	43,20
M2024-002/BDC23-2 MS maison Leroy Merlin alarme et porte - VPSITEX				1 078,49	1 078,49
022276 AC1	30/09/2024	FA		649,94	649,94
022279 AC2	30/09/2024	FA		649,94	649,9
022294 AV/FA SEF102483464	30/09/2024	AV		-649,94	-649,9
022686 AC2	31/10/2024	FA		214,06	214,0
023097 AC3	30/11/2024	FA		214,49	214,49
M2024-002/BDC24-1 MS Fournil Madalozzo alarme du 02/06/24 au 30/06/24 -	25 /00 /2024	F.A.		121,81	121,81
022202 SOLDE M2024-002/BDC24-2 MS Fournil Madalozzo alarme - VPSITEX	25/09/2024	FA		121,81 629,12	121,8
022203 AC1	25/09/2024	FA		379,13	629,12 379,1
022692 AC3	31/10/2024	FA		124,87	124,8
023093 AC4	30/11/2024	FA		125,12	125,1
B503 Impots Foncier	30,11,202		4 477,25	12 397,00	16 874,2
18-02369 Taxe foncière OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			2 782,00		2 782,00
006961 TF 2018 - OUDJANE	16/10/2018	T	1 374,00		1 374,00
008608 TF 2019 - OUDJANE	12/08/2019	T 19 33	1 408,00		1 408,00
19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			35,75		35,75
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	35,75		35,75
20-03903 Taxe foncière 2020 OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			1 459,50		1 459,50
011089 TF 2020	23/09/2020	AV	1 459,50		1 459,50
22-05717/2 Frais d'aquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC			200,00		200,00
22-05717/2 Provision	11/10/2022		140,41		140,4
22-05717/2 Provision	11/10/2022		42,71		42,71
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	16,88		16,8
24-07443 TAXES FONCIERES 2024 - TRESOR PUBLIC (TF)				11 590,00	11 590,00
022077 TAXES FONCIERES 2024	12/08/2024	T 24 33		11 590,00	11 590,0
24-07689 Taxe sur les logements vacants 7 Ch de Peyandreau 2024 - TRESOR				807,00	807,00
022792 SOLDE	04/11/2024	FA 24 33		807,00	807,0
B601 Assistance Juridique			111 718,18	108 970,58	220 688,70
20-03906 Notifications préemption SCI MAKLOUF - CASIMIRO (HUISSIER)	10/10/2022	EA C4704	778,45		778,45
011188 NOTIFS PREEMPTION SCI MAKLOUF	16/10/2020	FA 64794	778,45		778,4
21-04349 Constat livraison ouvrage - 32 avenue de la somme - CASIMIRO	1	1	300,00		300,00
012557 AC1	18/05/2021	FA 68 925	300,00		300,0

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
22-05133 Notifications préemption SCI PORTET et SCI NAVAILLE - CASIMIRO	Dute i detaile	- Tunnero	836,85	202.	836,85
014484 AC1	14/02/2022	FA 73818	836,85		836,85
22-05155 Signification visite SCI SOPHIE ET MAGALIE - CASIMIRO (HUISSIER)	, , , ,		239,10		239,10
014527 AC1	18/02/2022	FA 73 905	239,10		239,10
22-05431 Signif dde de visite MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)			712,60		712,60
015241 AC1	20/05/2022	FA 75 540	712,60		712,60
22-05517 Signif préemption MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)			832,15		832,15
015714 AC1	21/07/2022	FA 76 068	832,15		832,15
23-06274 Constat des lieux aux abords du restaurant Memphis - CASIMIRO			310,00		310,00
018058 AC1	27/03/2023	FA 81 306	310,00		310,00
23-06340 Constat voie aux abords du P1 (voie Germaine Tillon) - CASIMIRO 018286 AC1	11/04/2023	FA81605	350,00 350,00		350,00
23-06342 Constat fin de travaux parking Memphis - CASIMIRO (HUISSIER)	11/04/2023	FA61003	270,00		270,00
018115 SOLDE	12/06/2023	FA 82622	270,00		270,00
23-06406 BDR - constat d'affichage 26 avenue de la Somme - CASIMIRO			291,00		291,00
018227 82556	06/06/2023	FA82556	291,00		291,00
23-06433 Honoraires mandataire ASL Chemin de Mirepin - AJILINK VIGREUX			2 000,00		2 000,00
23-06433 Avance	17/07/2023		2 000,00		2 000,00
23-06694 Signification AB GROUPE - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)				142,88	142,88
019947 SOLDE	01/01/2024	FA B1262283		71,44	71,44
022025 AC2	01/01/2024	FA B1266258		71,44	71,44
23-06781 BDR- Constat affichage 26 av. de la Somme 2nd passsage - CASIMIRO	0.4.40 : 15-5			390,00	390,00
019646 SOLDE	01/01/2024	FA 86115		390,00	390,00
24-06873 Honoraires mandataire ASL Chemin de Mirepin_lancement mission	10/01/2024	Di 2020		1 200,00	1 200,00
24-06873 Avance 24-06909 Signification SASU CHARTRONS INVEST - BOCCHIO-CLAVELEAU	18/01/2024	Dossier 3028		1 200,00 71,55	1 200,00 71,55
020051 SOLDE	08/02/2024	FA B1272580		71,55	71,55
24-07227 Significations jugements indem prov (Mirepin) - BOCCHIO-CLAVELEAU	00/02/2024	TA B1272300		577,44	577,44
021044 AC1	23/05/2024	FA B1286141		144,36	144,36
021045 AC2	24/05/2024	FA B1286142		144,36	144,36
021046 AC3	28/05/2024	FA B1286138		144,36	144,36
021054 AC4	30/05/2024	FA B1286140		144,36	144,36
24-07335 Actes d'huissier 2024 (constats piquetage transport sur les lieux) -				1 758,24	1 758,24
021531 AC1	10/06/2024	FA 90195		270,00	270,00
022116 SOLDE	28/08/2024	FA 92170		119,28	119,28
022532 SIGNIF CARREFOUR	25/10/2024	FA 93648		255,40	255,40
022533 SIGNIF CARREFOUR 022732 PV CONSTAT NON RECOURS TA	25/10/2024	FA 93643 FA 93812		243,56 270,00	243,56
022809 CONSTAT RUE MIREPIN	31/10/2024 14/11/2024	FA 94064		330,00	270,00 330,00
022952 CONSTAT NOE WINEL IN	13/09/2024	FA 92520		270,00	270,00
24-07336 Diverses significations jugements 2024 - BOCCHIO-CLAVELEAU	13, 63, 262 .	17132323		3 315,06	3 315,06
021577 J2407043365 TH	10/07/2024	FA B1292121		72,18	72,18
021578 J2407031391 TH	10/07/2024	FA B1292079		72,18	72,18
021579 J2407043357 TH	10/07/2024	FA B1292099		72,18	72,18
021580 J2407043374 TH	11/07/2024	FA B1292358		72,18	72,18
021581 J2407043377 TH	10/07/2024	FA B1292108		72,18	72,18
021582 J2407043361 TH	10/07/2024	FA B1292118		109,96	109,96
021583 J2407043364 TH	10/07/2024	FA B1292119		72,18	72,18
021584 J2407043360 TH	10/07/2024	FA B1292120		72,18	72,18
021593 J2407043359 TH	10/07/2024	FA B1292174		109,96	109,96
021636 J2407160144 TH 021637 J2407043373 TH	22/07/2024 10/07/2024	FA B1293419 FA B1292122		125,08 72,18	125,08 72,18
021638 J2407043373 TH 021638 J2407043362 TH	10/07/2024	FA B1292122 FA B1292123		72,18	72,18
021644 J2407160142 TH	22/07/2024	FA B1292123		152,08	152,08
021839 J2407290366 TH	01/08/2024	FA B1294650		125,84	125,84
021882 J2408091161 TH	12/08/2024	FA B1296114		76,04	76,04
021924 J2408073041 TH	21/08/2024	FA B1296826		74,26	74,26
021934 J2408091159 TH	23/08/2024	FA B1297111		73,18	73,18
021935 J2408073052 TH	23/08/2024	FA B1297114		74,26	74,26
022024 J23101822831352 TH	01/01/2024	FA B1259000		71,44	71,44
022163 SOLDE	02/09/2024	FA B1298167		112,04	112,04
022103 30101	17/09/2024	FA B1300238		74,26	74,26
022180 SOLDE				74.20	74,26
022180 SOLDE 022178 SOLDE	17/09/2024	FA B1300240		74,26	
022180 SOLDE 022178 SOLDE 022179 SOLDE	17/09/2024 17/09/2024	FA B1300239		74,26	74,26
022180 SOLDE 022178 SOLDE 022179 SOLDE 022731 SOLDE SIGNIF KIM HAK	17/09/2024 17/09/2024 12/11/2024	FA B1300239 FA B1306680		74,26 148,52	74,26 148,52
022180 SOLDE 022178 SOLDE 022179 SOLDE	17/09/2024 17/09/2024	FA B1300239		74,26	74,26 74,26 148,52 148,52

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
023112 J241202023191 TH	03/12/2024	FA B1309517	2023	186,34	186,34
023113 J241106004191	08/11/2024	FA B1309503		148,52	148,52
023134 SIGNIF° SAS PLENO	11/12/2024	FA B1309898		185,34	185,34
023135 SIGNIF° MAC DONALD'S	11/12/2024	FA B1309965		186,42	186,42
24-07367 Signification divers actes 2024 - ID FACTO				405,50	405,50
021585 MD:1915802-SVE92	18/07/2024	FA		44,63	44,63
021631 MD:1916234-EDM92	22/07/2024	FA		93,49	93,49
021837 MD:1819036-MG91	06/08/2024	FA 240876881		133,69	133,69
021838 MD:1915858-DC	06/08/2024	FA 240876882		133,69	133,69
021959 MD: 1915852 - ND78/2	28/08/2024	FA		44,63	44,63
022674 REMB /FA 24.07.68795	02/10/2024	DOSSIER		-44,63	-44,63
24-07372 signification acte Eglo France Luminaire - WEIBEL P SCP				42,73	42,73
021554 AC1	23/05/2024	FA A240836		42,73	42,73
M2016-039 Lot 1/BDC18 Presta juridique : Pollution découverte au chemin			5 964,84		5 964,84
012958 AC1	20/07/2021	FA	5 964,84		5 964,84
M2016-039 Lot 1/BDC18bis Presta juridique : Clause pollution protocole			1 704,24		1 704,24
014195 HONO CONSEIL AC1	01/01/2022	FA	1 704,24		1 704,24
M2016-039/BDC26 BDC26 Assistance juridique préemption SCI MAKLOUF -	0.1.10:1		2 207,10		2 207,10
011827 BDC26 AC 1	01/01/2021	FA	2 207,10		2 207,10
M2021-001 Lot 2/BDC4-1 analyse dossier EP préalable DUP - THOME	20/02/22-	EA 24 12 :=	4 794,77		4 794,77
013398 AC1	30/09/2021	FA 21-1247	4 794,77		4 794,77
M2021-001 Lot 2/BDC4-2 analyse modalités MECDU/PLUi - THOME HEITZMANN	20/00/2021	EA 24 4252	726,48		726,48
013399 AC1	30/09/2021	FA 21-1280	726,48		726,48
013838 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05		3 705,05
015152 REGUL ERREUR SAISIE AC2 CONCERNE BDC 4-4 ET NON 4-2	30/11/2021	FA 21-1361	-3 705,05		-3 705,05
M2021-001 Lot 2/BDC4-4 analyse compatibilité MECDU/PLUi + DUP - THOME	01/01/2022	FA 24 4427	4 892,81		4 892,81
014127 AC1 015153 AC 2	01/01/2022	FA 21-1437 FA 21-1361	1 187,76		1 187,76 3 705,05
	30/11/2021	FA 21-1301	3 705,05		
M2021-001 Lot 2/BDC4-5 Rédact° courrier en réponse + Consultation - THOME 014599 AC1	28/02/2022	FA 22-1540	5 702,12 1 855,00		5 702,12 1 855,00
014856 AC2	31/03/2022	FA 22-1540 FA 22-1608	3 847,12		3 847,12
M2021-001 Lot 2/BDC4-6 Rédact mémoire / représentat° en justice SCI RUE	31/03/2022	1 A 22-1008	5 704,84		5 704,84
015547 AC1	15/07/2022	FA 22-1812	1 578,53		1 578,53
017410 AC2	27/02/2023	FA 23-2217	1 487,37		1 487,37
017720 AC3	30/03/2023	FA 23-2255	2 638,94		2 638,94
M2021-001 Lot 2/BDC4-7 Rédact mémoire / représentat° en justice SCI PORTETS		177 22 2233	4 941,80		4 941,80
015557 AC1	27/06/2022	FA 22-1764	1 052,35		1 052,35
017409 AC2	27/02/2023	FA 23-2216	940,04		940,04
017719 AC3	30/03/2023	FA 23-2254	2 949,41		2 949,41
M2021-001 Lot 2/BDC4-8 Instances référé Navaille et Portets/Instance au fond -			9 398,88	1 182,60	10 581,48
015795 AC1	27/07/2022	FA 22-1825	7 779,38	,	7 779,38
016923 AC 2	01/01/2023	FA 22-2092	1 619,50		1 619,50
021694 AC3	30/07/2024	FA 24-3233		1 182,60	1 182,60
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-1 Accompagnement instauration SUP canalisation -			1 510,56		1 510,56
015782 AC1	27/07/2022	FA 22-1834	1 510,56		1 510,56
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-10 Analyse volumétrie Carrefour et étude nomination			2 385,12		2 385,12
018051 AC1	30/05/2023	FA 23-2394	963,48		963,48
018226 AC1	30/06/2023	FA23-2453	1 421,64		1 421,64
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-11 Rédaction d'une délibération - SEPT 2023 - THOME			825,60		825,60
018438 AC1	27/07/2023	FA 23-2495	825,60		825,60
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-12 Rédaction des offres phase 1 - THOME			6 400,44		6 400,44
018048 AC1	26/05/2023	FA 23-2374	4 249,73		4 249,73
018803 SOLDE	27/09/2023	FA 23-2569	2 150,71		2 150,71
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-13 Etablissement note/préconisations procédure			2 630,04		2 630,04
018047 AC1	26/05/2023	FA 23-2372	2 630,04		2 630,04
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-14 Analyse maintien espace vert parcelle AX70 -			3 328,20		3 328,20
018435 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2479	3 328,20		3 328,20
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-15 Désignation d'un administrateur provisoire ASL			1 986,60		1 986,60
018437 AC1	27/07/2023	FA 23-2484	1 986,60		1 986,60
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-16 Analyse possibilité retrocession - THOME			2 309,02		2 309,02
019142 SOLDE	27/10/2023	FA 23-2625	2 309,02		2 309,02
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-17 Rédaction offres phase 1 - THOME HEITZMANN			4 515,00		4 515,00
018436 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2483	4 515,00		4 515,00
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-2 Validation du dossier de MECDU - fusion - THOME			3 172,18		3 172,18
015801 AC1	27/07/2022	FA 22-1833	3 172,18		3 172,18
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-3 Préemption MADALOZZO - THOME HEITZMANN			755,28		755,28
015797 AC1	27/07/2022	FA 22-1832	755,28		755,28
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-4 Condition de mise en œuvre de la loi de 1892	I .		1 112,50		1 112,50

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		I		-	
Intitulé	Date Facture	Numéro	A fin 2023	A fin 2024	A fin 2024
017703 AC1	31/03/2023	FA 23-2266		2024	
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-5 Etablissement d'un mémoire en intervention	31/03/2023	FA 23-2200	1 112,50 3 204,00		1 112,50 3 204,00
016971 AC 1	01/01/2023	FA 22-2124	3 204,00		3 204,00
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-6 Négo désistement instance judiciaire Moreno -	01,01,2020		1 958,98		1 958,98
017478 AC1	28/02/2023	FA 23-2225	1 958,98		1 958,98
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-7 Validation réponse Fab à avis MRAe MECDU -			3 711,74		3 711,74
017393 AC1	22/02/2023	FA 23-2198	3 711,74		3 711,74
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-8 Etablisst mémoires complémentaires Naveilles et			1 940,40		1 940,40
017885 AC1	28/04/2023	FA 23-2312	1 940,40		1 940,40
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-9 Réunion en présentiel - THOME HEITZMANN			1 171,80		1 171,80
018049 AC1	26/05/2023	FA 23-2379	1 171,80		1 171,80
M2021-001 Lot 2/BDC9-1 Rédaction Convention Aqprim BM - FIDUCIAL LEGAL			3 075,84		3 075,84
016470 AC 1	30/09/2022	FA 202205347	959,40		959,40
016469 AC 2	30/09/2022	FA 202205349	2 116,44	1 672 70	2 116,44 1 672,70
M2021-001/Lot2//BDC4Ter-25 4Ter 25 protocole éviction les foulées - THOME 021975 AC1	30/08/2024	FA 24-3303		1 672,70 1 672,70	1 672,70
M2021-001/Lot2/4ter-17 Fixation judiciaire SCI SMJ - THOME HEITZMANN	30/00/2024	1A 24 3303		6 354,70	6 354,70
021089 AC1	31/05/2024	FA 24-3079		2 772,96	2 772,96
021500 AC2	01/07/2024	FA 24-3132		1 203,36	1 203,36
021973 AC3	30/08/2024	FA 24-3301		1 194,63	1 194,63
022266 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3351		1 183,75	1 183,75
M2021-001/Lot2/BDC4 Ter-1 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil -			2 427,46		2 427,46
018873 SOLDE	29/09/2023	FA 23-2616	2 427,46		2 427,46
M2021-001/Lot2/BDC4ter-12 Fixation judiciaire Onyx - THOME HEITZMANN				3 967,59	3 967,59
021091 AC1	31/05/2024	FA 24-3080		1 177,20	1 177,20
021715 AC1	31/07/2024	FA 24 -3249		1 588,13	1 588,13
021974 AC2	30/08/2024	FA 24-3302		1 202,26	1 202,26
M2021-001/Lot2/BDC4ter-13 Fixation judiciaire IENG - THOME HEITZMANN	00/01/0001			2 980,54	2 980,54
020791 AC1 021692 AC2	29/04/2024	FA 24-3017		1 177,20	1 177,20
M2021-001/Lot2/BDC4ter-14 Fixation judiciare ASL Mirepin - THOME	30/07/2024	FA 24-3231		1 803,34 3 319,44	1 803,34 3 319,44
020521 AC1	29/03/2024	FA 24-2965		1 175,04	1 175,04
021099 AC2	31/05/2024	FA 24-3100		1 597,92	1 597,92
022252 AC3	30/09/2024	FA 24-3359		546,48	546,48
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-14bis Audience ASL Mirepin - THOME HEITZMANN				1 080,00	1 080,00
022950 SOLDE	28/11/2024	FA 24-3517		1 080,00	1 080,00
M2021-001/Lot2/BDC4ter-15 Fixation judiciaire SCI Les Eyquems - THOME				4 631,04	4 631,04
020522 AC1	29/03/2024	FA 24-2973		1 175,04	1 175,04
021096 AC2	31/05/2024	FA 24-3099		1 597,92	1 597,92
021502 AC3	01/07/2024	FA 24-3135		1 569,60	1 569,60
022466 AC4	30/09/2024	FA24-3363		288,48	288,48
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-15bis Audience SCI Les Eyquems - THOME	01/01/2024	EA 24 2424		1 080,00	1 080,00
021501 AC1 SOLDE M2021-001/Lot2/BDC4ter-16 Fixation judiciaire SCI KIM HAK - THOME	01/01/2024	FA 24-3134		1 080,00 3 557,76	1 080,00 3 557,76
020826 AC1	30/04/2024	FA 24-3068		1 177,20	1 177,20
021094 AC2	31/05/2024	FA 24-3098		1 595,76	1 595,76
021504 AC3	01/07/2024	FA 24-3142		784,80	784,80
M2021-001/Lot2/BDC4ter-16Bis Audience SCI KIM HAK - THOME HEITZMANN	T			1 080,00	1 080,00
021503 AC1 SOLDE	01/07/2024	FA 24-3141		1 080,00	1 080,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-20 MEDA SCI PILOU - THOME HEITZMANN				1 128,00	1 128,00
021693 SOLDE	30/07/2024	FA 24-3232		1 128,00	1 128,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-21 Fixation judiciaire SCI Mérignac 33 98 - THOME				4 080,00	4 080,00
021702 AC1	30/07/2024	FA 24-3230		3 792,00	3 792,00
022556 AC2	29/10/2024	FA 24-3426		288,00	288,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-22 Prest jurid éviction partielle Kéria - THOME	01/07/2024	EA 24 2442		4 460,45	4 460,45
021505 AC1	01/07/2024	FA 24-3143		1 464,96	1 464,96
021701 AC2 022253 AC3	30/07/2024	FA 24-3229 FA 24-3360		1 173,96 1 269,65	1 173,96 1 269,65
022552 SOLDE	29/10/2024	FA 24-3300		551,88	551,88
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-24 4Ter 24 procédure éviction Ab groupe - THOME	25, 20, 2027	7 3-72-7		3 620,02	3 620,02
022257 AC1	30/09/2024	FA 24-3365		3 620,02	3 620,02
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-26 Protocole accord obligations environnementales	T			3 279,00	3 279,00
022256 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3364		3 279,00	3 279,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-27 Fixation judiciaire PLENO SOL - THOME				3 961,03	3 961,03
021711 AC1	31/07/2024	FA 24-3255		1 591,37	1 591,37
022254 AC2	30/09/2024	FA 24-3362		2 369,66	2 369,66
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-28 Fixation judiciaire St Maclou - THOME				1 721,81	1 721,81
021710 AC1	31/07/2024	FA 24-3254		1 721,81	1 721,81

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-29 Fixation judiciaire Epil Story - THOME HEITZMANN	Date : detaile	Tunner o	2020	3 942,00	3 942,00
022554 AC1	29/10/2024	FA 24-3425		3 942,00	3 942,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-3 Mémoires + représentat° Appel SCI NAVAILLES ET	., .,		4 054,75	801,94	4 856,69
019408 AC 1	29/11/2023	FA 23-2693	4 054,75		4 054,75
022261 AC2	30/09/2024	FA 24-3376		801,94	801,94
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-30 Fixation judiciaire Carrefour - THOME				2 780,59	2 780,59
021709 AC1	31/07/2024	FA 24-3253		1 591,37	1 591,37
022251 AC2	30/09/2024	FA 24-3358		1 189,22	1 189,22
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-31 Fixation judiciaire Macdonald - THOME				3 568,99	3 568,99
021708 AC1	31/07/2024	FA 24-3252		1 591,37	1 591,37
022267 AC2	30/09/2024	FA 24-3361		1 189,22	1 189,22
022560 AC3	29/10/2024	FA 24-3422		788,40	788,40
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-32 Fixation judiciaire Carrefour - THOME				2 780,59	2 780,59
021707 AC1	31/07/2024	FA 24-3251		1 591,37	1 591,37
022270 AC2	30/09/2024	FA 24-3356		1 189,22	1 189,22
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-33 Fixation judiciaire Indivision Mérignac Soleil -				2 780,59	2 780,59
021716 AC1	31/07/2024	FA 24-3250		1 591,37	1 591,37
022271 AC2	30/09/2024	FA 24-3357		1 189,22	1 189,22
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-34 Eviction GEIQ - THOME HEITZMANN				1 261,44	1 261,44
022563 AC1	29/10/2024	FA 24-3423		1 261,44	1 261,44
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-35 Eviction ADM RETAIL - THOME HEITZMANN				5 587,42	5 587,42
022268 AC1	30/09/2024	FA 24-3355		5 587,42	5 587,42
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-36 Immofi_référé suspension contre arrêté cessib -	20/05/227	F4 24 22		4 721,76	4 721,76
022318 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3388		4 721,76	4 721,76
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-37 Recours contentieux contre DUP Noël -2CS -	2 . / . 2 / 2 . 2			1 760,76	1 760,76
022593 AC1	31/10/2024	FA 24-3486		1 760,76	1 760,76
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-38 Immofi_recours contentieux contre arrêté cessib -	20/44/2024	FA 24 2525		786,96	786,96
022978 AC1	29/11/2024	FA 24-3535		786,96	786,96
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-39 Note sur csq modif DUP nouvelle acq° - THOME	20/44/2024	FA 24 2520		2 833,06	2 833,06
022988 SOLDE	29/11/2024	FA 24-3538	2 464 60	2 833,06	2 833,06
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-4 Analyse opportunité envoi courrier à l'exproprié -	20/10/2022	EA 22 2625	2 464,68		2 464,68
019144 SOLDE	30/10/2023	FA 23-2635	2 464,68	401.05	2 464,68
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-43 Timbres fiscaux appel Navailles et Portets - 023024 AC1	29/11/2024	FA 24-3546		491,85 491,85	491,85 491,85
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-45 Préparation défense CAA Navaille et Portets -	29/11/2024	FA 24-3340		2 911,75	2 911,75
022977 AC1	29/11/2024	FA 24-3536		2 911,75	2 911,75
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-5 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil -	23/11/2024	1 A 24-3330	2 495,23	2 911,73	2 495,23
019450 AC 1	30/11/2023	FA 23-2725	2 495,23		2 495,23
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-6 Suivi de négociations confidentielles avec Carrefour	30/11/2023	TA 23-2723	466,99	1 934,45	2 401,44
019143 AC1	30/10/2023	FA 23-2634	466,99	1 33-1,43	466,99
020518 AC2 SOLDE	27/03/2024	FA 24-2949	400,55	1 934,45	1 934,45
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-7 Suivi mensuel Mérignac Soleil - THOME	27,00,202	17.12.123.13	857,74	2 594,59	3 452,33
019407 AC 1	29/11/2023	FA 23-2689	857,74		857,74
019634 AC2	01/01/2024	FA 23-2752	337,71	860,11	860,11
020186 AC3	29/02/2024	FA 24-2881		868,03	868,03
022255 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3363		866,45	866,45
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-9 Protocole Bentejac - THOME HEITZMANN	, ,			3 423,82	3 423,82
020188 AC1	29/02/2024	FA 24-2893		3 423,82	3 423,82
M2021-001/Lot2/BDC4Ter10 Convention Carrefour Klépierre - THOME				2 947,94	2 947,94
019957 AC1	31/01/2024	FA 24-2834		2 947,94	2 947,94
B602 DUP, expro			40 478,54	8 284,40	48 762,94
19-02658 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU			797,00		797,00
007787 RSU	01/04/2019	FA 01/04/19	440,00		440,00
007788 COPIE ACTES	01/04/2019	FA 01/04/19	75,00		75,00
008163 COPIES ACTES	06/06/2019	FA 06/06/19	255,00		255,00
008225 COPIE ACTE	18/06/2019	20/06/19	15,00		15,00
012585 DMD DE RSU	28/05/2021	FA 28/05/21	12,00		12,00
21-04178 Concertation avis d'ouverture et clôture - SUD OUEST PUBLICITE			1 240,18		1 240,18
012053 PUB PRESSE CONCERT AVIS D'OUVERTURE	21/02/2021	FA	661,49		661,49
012209 CONCERT AVIS OUVERTURE	21/03/2021	FA	578,69		578,69
21-04842 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - BUREAU			870,00		870,00
013735 DMD RSU CARREFOUR	22/11/2021	FA 22/11/21	12,00		12,00
013786 DMD RSU ETAT PARCEL	24/11/2021	FA 24/11/21	816,00		816,00
013852 DMD RSU CARREFOUR	03/12/2021	FA 03/12/21	12,00		12,00
013981 DMD COPIE ACTE	13/12/2021	3304P02-	30,00		30,00
22-05113 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2022 - BUREAU			2 028,00		2 028,00
014490 DMD COPIES ACTES	16/02/2022	FA 16/02/22-	831,00		831,00
					60,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
015151 DMD RSU COPIES ACTES	18/05/2022	FA 18/05/22-	138,00		138,00
015285 DMD RSU COPIES ACTES	09/06/2022	FA 09/06/2022-	237,00		237,00
015559 DDE RSU COPIES ACTES PORTETS NAVAILLE	24/06/2022	FA 24/06/2022-	117,00		117,00
016045 DMD RSU-COPIES ACTES	16/09/2022	FA 16/09/22 -	645,00		645,00
23-05909 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2023 - BUREAU			1 323,00		1 323,00
016986 DMD RSU + ACTES	03/01/2023	FA 03/01/23-	603,00		603,00
018117 06/2023	01/06/2023	FA SPF BX1 T	180,00		180,00
018825 DMD RSU	29/09/2023	FA 29/09/2023	96,00		96,00
018842 DMD RSU AQPRIM	03/10/2023	FA 03/10/2023	48,00		48,00
019609 DEMANDE RSU CESSIB	20/12/2023	FA 20/12/2023	396,00		396,00
23-06010 Copies d'actes et RSU _ préemption Navailles et Portets - BUREAU	02/02/2023	FA 3236-SD	414,00 120,00		414,00 120,00
017223 DDE RSU COPIES ACTES NAVAILLE ET PORTETS 017739 DMD RSU ET ACTES	06/04/2023	FA 06/04/2023	294,00		294,00
23-06125 Mise en place registre numérique pour EP - PUBLILEGAL	00/04/2023	17 00/04/2023	254,00	700,80	700,80
020290 SOLDE	01/01/2024	FA FPU-23-		700,80	700,80
23-06211 2 insertions Sud Ouest Avis EP - SUD OUEST PUBLICITE			2 180,12	100,00	2 180,12
017893 AC1	30/04/2023	FA 230402432	1 100,60		1 100,60
018056 AC2	30/05/2023	FA 230502441	1 079,52		1 079,52
23-06218 Constat affichage 17 panneaux avis EP 4 passages - CASIMIRO			4 080,00		4 080,00
018103 AC1	05/06/2023	FA 82538	4 080,00		4 080,00
23-06266 2 insertions Les Echos judiciaires Avis EP - ECHOS JUDICIAIRES			2 062,47		2 062,47
017869 AC1	13/04/2023	F2023EJ17952	1 039,58		1 039,58
018128 SOLDE	04/05/2023	FA	1 022,89		1 022,89
23-06312 Signif huissier notif EP - CASIMIRO (HUISSIER)	45 (05 (2022	FA 02 144	651,35		651,35
017990 AC1	15/05/2023	FA 82 144	651,35		651,35 7 382,12
23-06445 Commissaire Enquêteur EP - JAKUBOWSKI MARC 018337 AC1 SOLDE	24/07/2023	TA	7 382,12 7 382,12		7 382,12
23-06696 Copies termes de référence - BUREAU HYPOTHEQUES	24/07/2023	10	60,00		60,00
019289 COPIES	27/11/2023	FA SPF BX1	60,00		60,00
23-06750 2 insertions Les Echos judiciaires Arrêté DUP - ECHOS JUDICIAIRES		-		191,02	191,02
019578 SOLDE	01/01/2024	FA		191,02	191,02
24-06866 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2024 - BUREAU				1 632,00	1 632,00
019828 DMD RSU CESSIB	17/01/2024	FA 17/01/2024-		144,00	144,00
019855 DMD RSU CESSIB	23/01/2024	FA 23/01/2024-		24,00	24,00
020430 DEMANDE RSU ET COPIES ACTES CESSIB	22/03/2024	FA 22/03/2024-		198,00	198,00
021125 DMD STATUTS AFUL	05/06/2024	FA 05/06/24-T		30,00	30,00
021570 DMD RSU POUR CDC	17/07/2024	FA 17/07/2024-		216,00	216,00
022215 DMD RSU AVANT PAIEMENT	27/09/2024	FA 27/09/2024-		1 056,00	1 056,00
022307 DMD RSU REMB TROP PERCU	03/10/2024	FA 03/10/2024		-36,00	-36,00
24-06884 Insertion presse Sud Ouest Arrêté DUP - SUD OUEST PUBLICITE 019862 SOLDE	01/01/2024	FA 231202745		262,18 262,18	262,18 262,18
24-07289 Signif arrêté cessibilité Bentejac et Coustaut - CASIMIRO (HUISSIER)	01/01/2024	TA 231202743		85,30	85,30
021333 AC1	25/06/2024	FA 90674		85,30	85,30
M2018-042 Dossier DUP mise en compatibilité - CITADIA CONSEIL		-	11 880,00	22,20	11 880,00
007480 REDACTION DOSSIER MECDU	29/01/2019	FA 19/5891	10 620,00		10 620,00
007642 REDACTION DOSSIER MECDU	25/02/2019	FA 19/6021	1 260,00		1 260,00
M2019-030 Lot 4/BDC6 50 Panneaux Avis EP - GRAPHI 33				1 439,76	1 439,76
021794 AC1 SOLDE 50 AVIS EP	02/08/2024	DGD BDC6		1 439,76	1 439,76
M2021-001/Lot2/BDC4ter-11 Préparation réponses à un recours gracieux NOËL				3 165,36	3 165,36
021152 AC1	31/05/2024	FA 24-3104		3 165,36	3 165,36
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-2 Prépa PV réponse à CE DUP-MECDU -parcel -	20/44/2000	EA 22 2722	5 510,30		5 510,30
019452 AC 1	30/11/2023	FA 23-2723	5 510,30	907.00	5 510,30
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-8 Courrier réponse ASL Mirepin sur manquement EP - 019695 SOLDE	01/01/2024	FA 23-2804		807,98 807,98	807,98 807,98
B603 Petits travaux - frais libération site	01/01/2024	1 A 23-2004	1 627,20	007,38	1 627,20
M2022-066 Défrichement parcelle et évacuation avant bornage - parcelle			1 627,20		1 627,20
016723 SOLDE	10/11/2022	FA	1 627,20		1 627,20
B702 Démolition - Désamiantage	. , .==		56 636,31	1 601,28	58 237,59
M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS			56 636,31		56 636,31
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		41 394,94		41 394,94
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 609,12		2 609,12
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		10 677,52		10 677,52
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		1 954,73		1 954,73
011706 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/20	0,01		0,01
M2019-066/BDC35 Réalisation diags ressources Keria - Memphis - Orchestra - St	20 /05 /22 - :	E4 24 245 5 11		1 601,28	1 601,28
	29/05/2024	FA 24-019-046		1 601,28	1 601,28
021219 AC1			4 202 425 25	4.057.300.00	0.330.505.55
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES D103 VRD			4 282 106,01 2 744 054,94	4 957 399,36 3 447 994,29	9 239 505 6 192 049

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
22-05112 Extension de réseaux 44-46 avenue de la Somme - Mérignac - ENEDIS			14 136,38		14 136,38
22-05112 Avance	16/02/2022	DC26/052092	5 414,23		5 414,23
017502 AC1	01/03/2023	FA 0326 -	8 722,15		8 722,15
018565 AC1BIS	01/03/2023	DC26/052092			
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - 2MTP			2 462,50		2 462,50
015805 07/22	26/07/2022	AC6	2 462,50		2 462,50
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - DUBREUILH			695 790,01	572 158,95	1 267 948,96
M2020-037-2/Lot 1 Avance	12/11/2020		23 445,04		23 445,04
013260 07/21	16/09/2021	AC1	94 154,09		94 154,09
014191 12/21	01/01/2022	AC2	46 003,56		46 003,56
015577 04/22	30/06/2022	AC3	261 842,99		261 842,99
015581 05/22 015630 06/22	30/06/2022	AC4 AC5	76 854,45 139 370,56		76 854,45 139 370,56
015805 06/22	26/07/2022	AC6 07	13 300,81		13 300,81
015055 07/22 016244 AC7-09/22	06/10/2022	FA 2209322	7 746,29		7 746,29
017671 AC8-03/23	29/03/2023	AC 8	8 983.55		8 983,55
018167 AC9-05/23	30/05/2023	FA328609591	24 088,67		24 088,67
020596 AC10-03/24	29/03/2024	FA2403337	325,27	220 329,00	220 329,00
020955 AC11-04/24	30/04/2024	FA2405305		196 039,34	196 039,34
021371 AC12-05/24	28/06/2024	FA2406323		148 400,07	148 400,07
022243 AC13-07/24	10/09/2024	FA2408318		7 390,54	7 390,54
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - SEIHE				79 138,38	79 138,38
020596 AC10-03/24	29/03/2024	FA2403337		68 375,90	68 375,90
021371 AC12-05/24	28/06/2024	FA2406323		10 762,48	10 762,48
M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - EIFFAGE ROUTE SO			375 966,81	217 314,90	593 281,71
012172 AC1-12/20	10/03/2021	FA	14 594,58		14 594,58
012173 AC2-01/21	10/03/2021	FA	64 657,97		64 657,97
013259 AC3-07/21	16/09/2021	FA	4 643,40		4 643,40
013450 AC4-09/21	30/09/2021	AC4	3 207,67		3 207,67
017311 AC5-01/23	10/02/2023	FA	20 091,61		20 091,61
017539 AC6-02/23 018166 AC7-03/23	10/03/2023	FA FA	94 955,51		41 676,42 94 955,51
018939 AC8-07/23	09/10/2023	FA	79 900,37		79 900,37
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA	52 239,28		52 239,28
019577 AC10-11/23	01/01/2024	FA	32 233,20	3 431,38	3 431,38
020559 AC11 - 03/24	29/03/2024	FA		9 292,96	9 292,96
021864 AC12 - 06/24	27/06/2024	FA		6 885,78	6 885,78
022244 AC13 - 07/24	09/08/2024	FA		14 801,71	14 801,71
022245 AC14 - 08/24	30/09/2024	FA		130 276,28	130 276,28
022697 AC15 - 09/24	26/09/2024	FA		52 626,79	52 626,79
023146 AC15 - 09/24 ANNULATION	26/09/2024	FA		-52 626,79	-52 626,79
023147 AC15 - 09/24 REGULARISATION	26/09/2024	FA		52 626,79	52 626,79
M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - SOP			9 902,00	16 876,20	26 778,20
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA 100000	9 902,00		9 902,00
022245 AC14 - 08/24	30/09/2024	FA		16 876,20	16 876,20
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - 021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	ΓΛ.		5 410,00	5 410,00
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 -	28/06/2024	FA	1 495 477,24	5 410,00 2 125 325,56	5 410,00 3 620 802,80
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		44 462,63	2 123 323,30	44 462,63
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		21 189,89		21 189,89
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA	75 421,26		75 421,26
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	315 966,19		315 966,19
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	324 211,88		324 211,88
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA	241 386,31		241 386,31
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	472 839,09		472 839,09
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA		174 697,32	174 697,32
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA		71 719,11	71 719,11
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA		390 797,54	390 797,54
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA		320 413,22	320 413,22
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA		210 896,46	210 896,46
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA		251 651,35	251 651,35
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA		311 078,18	311 078,18
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA		222 512,91	222 512,91
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA		70 477,21	70 477,21
022269 AC15 - 09/2024 022996 AC16 - 10/2024	30/09/2024 25/11/2024	FA 188-		85 766,13 15 316,14	85 766,13 15 316,14
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - FC BTP	23/11/2024	1 U 100-	19 367,60	21 246,70	40 614,30
,	1	I	13 307,00		70 017,30

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	12 235,60	202.	12 235,60
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	3 325,00		3 325,00
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA	0.020,00	540,00	540,00
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA		3 520,00	3 520,00
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA		3 646,70	3 646,70
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA		8 875,00	8 875,00
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA		3 715,00	3 715,00
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA		950,00	950,00
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 -			41 009,55	35 090,33	76 099,88
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	38 659,63		38 659,6
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	2 349,92		2 349,9
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA		7 583,25	7 583,2
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA		11 407,20	11 407,2
022996 AC16 - 10/2024	25/11/2024	FA 188-		16 099,88	16 099,8
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - SOLS			77 942,85	375 433,27	453 376,12
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	2 777,50		2 777,5
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	75 165,35		75 165,3
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA		62 872,86	62 872,8
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA		88 699,27	88 699,2
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA		34 189,11	34 189,1
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA		62 634,30	62 634,3
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA		100,95	100,9
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA		57 210,09	57 210,09
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA		47 379,81	47 379,8
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA		17 207,22	17 207,2
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA		5 139,66	5 139,6
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 -			12 000,00		12 000,00
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA	12 000,00		12 000,00
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			206 477,42	372 083,92	578 561,34
M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - DUBREUILH			28 815,00		28 815,00
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA	22 073,00		22 073,00
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA	4 764,00		4 764,0
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA	1 978,00		1 978,00
M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - LACIS-EHTP			164 325,04	89 508,09	253 833,13
015579 05/22-AC1	30/06/2022	FA	34 673,46		34 673,4
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA	54 704,74		54 704,7
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA	19 216,93		19 216,9
016239 09/22-AC4	06/10/2022	FA	18 182,96		18 182,9
017543 02/23-AC5	10/03/2023	FA	13 315,66		13 315,6
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA	6 052,93		6 052,9
018680 07/23-AC7	31/07/2023	FA	18 178,36		18 178,3
021175 05/24-AC8	31/05/2024	FA		44 050,48	44 050,4
022083 06/24-AC9	30/06/2024	FA		38 952,48	38 952,4
022984 07/24-AC10	29/08/2024	FA		6 505,13	6 505,1
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - CEPECA-			7 329,06	171 789,97	179 119,03
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	7 278,41		7 278,4
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	50,65		50,6
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA		33 982,76	33 982,7
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA		3 611,03	3 611,0
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA		66,96	66,9
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA		74 729,19	74 729,1
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA		32 557,25	32 557,2
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA		26 842,78	26 842,7
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 -	0.5 /0.5 /0.000		6 008,32	110 785,86	116 794,18
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		2 773,87		2 773,8
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		1 321,97		1 321,9
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	1 455,68		1 455,6
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA	456,80		456,8
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA		6 559,73	6 559,7
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA		13 496,86	13 496,8
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA		45 165,22	45 165,2
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA		-9 603,71	-9 603,7
•	30/04/2024	FA		20,88	20,8
020942 AC10 - 04/2024					23 655,7
020942 AC10 - 04/2024 021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA		23 655,76	
020942 AC10 - 04/2024 021137 AC11 - 05/2024 021421 AC12 - 06/2024	31/05/2024 28/06/2024	FA		8 174,10	8 174,1
020942 AC10 - 04/2024 021137 AC11 - 05/2024 021421 AC12 - 06/2024 021699 AC13 - 07/2024	31/05/2024 28/06/2024 26/07/2024	FA FA		8 174,10 8 265,34	8 174,1 8 265,3
020942 AC10 - 04/2024 021137 AC11 - 05/2024 021421 AC12 - 06/2024	31/05/2024 28/06/2024	FA		8 174,10	8 174,1

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
022996 AC16 - 10/2024	25/11/2024	FA 188-	2025	-234,44	-234,44
D105 Mobilier urbain	23/11/2024	1 A 100-	15,65	32 595,84	32 611,49
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 -			15,65	766,66	782,31
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		9,40	,	9,40
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		6,25		6,25
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA		766,66	766,66
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 -				31 829,18	31 829,18
020893 AC7b - 04/2024	06/05/2024	FA		7 911,38	7 911,38
021083 AC8b - 05/2024	28/05/2024	FA		12 990,88	12 990,88
021086 AC8a - 05/2024	28/05/2024	FA		2 949,73	2 949,73
021650 AC10b - 07/2024	22/07/2024	FA		4 853,65	4 853,65
021651 AC10c - 07/2024	22/07/2024	FA		248,59	248,59
022390 AC11b - 09/2024 022391 AC11c - 09/2024	01/10/2024	FA FA		1 201,57 1 673,38	1 201,57 1 673,38
D106 Arrosage - Espaces verts	01/10/2024	IA	369 599,34	506 476,85	876 076,19
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 -			100 858,22	187 611,80	288 470,02
018856 AC2 - 09/2023	27/09/2023	FA	10 354,48	10, 011,00	10 354,48
019484 AC3a - 11/2023	07/12/2023	FA 29	1 843,02		1 843,02
019546 AC3b - 11/2023	08/12/2023	FA	88 660,72		88 660,72
019993 AC4a - 01/2024	01/02/2024	FA		9 656,47	9 656,47
019994 AC4b - 01/2024	01/02/2024	FA		2 550,26	2 550,26
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA		6 421,06	6 421,06
020220 AC5b - 02/2024	28/02/2024	FA		43 295,10	43 295,10
020736 AC6a - 03/2024	22/04/2024	FA		5 977,27	5 977,27
020737 AC6b - 03/2024	22/04/2024	FA		119 711,64	119 711,64
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 -			268 741,12	110 779,41	379 520,53
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		4 614,31		4 614,31
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022	5.	3 066,17		3 066,17
018596 AC1 - 08/2023	01/09/2023	FA FA	144 432,35		144 432,35
018856 AC2 - 09/2023 019484 AC3a - 11/2023	27/09/2023 07/12/2023	FA 29	41 135,56 75 492,73		41 135,56 75 492,73
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA FA	73 432,73	110 779,41	110 779,41
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 -	20,02,2024	177		208 085,64	208 085,64
020843 AC7a - 04/2024	30/04/2024	FA		71 339,17	71 339,17
020893 AC7b - 04/2024	06/05/2024	FA		42 384,52	42 384,52
021083 AC8b - 05/2024	28/05/2024	FA		10 560,42	10 560,42
021086 AC8a - 05/2024	28/05/2024	FA		654,00	654,00
021195 AC8c - 05/2024	28/05/2024	FA		11 349,35	11 349,35
021413 AC9a - 06/2024	28/06/2024	FA		1 870,00	1 870,00
021422 AC9b - 06/2024	27/06/2024	FA		25 765,01	25 765,01
021412 AC9c - 06/2024	27/06/2024	FA		31 691,83	31 691,83
021651 AC10c - 07/2024	22/07/2024	FA		7 579,69	7 579,69
022390 AC11b - 09/2024	01/10/2024	FA		1 912,68	1 912,68
022391 AC11c - 09/2024	01/10/2024	FA		2 978,97	2 978,97
D203 Electricité			13 479,36	100 152,68	113 632,04
23-06409 Raccord. travaux Somme Centre - ENEDIS (EX : ERDF)	02/07/2022		3 952,50		3 952,50
23-06409 Avance	03/07/2023	EA	1 976,25		1 976,25
018372 AC1 019267 AC2	10/11/2023	FA 0326-	1 976,25		1 976,25
23-06783 Raccord. travaux 30, Av. de la Somme - ENEDIS (EX : ERDF)	10/11/2023	1 / 0320-	9 526,86		9 526,86
23-06783 Avance	18/12/2023		9 526,86		9 526,86
24-06857 Raccord. travaux Rue Germaine Tillon - ENEDIS (EX : ERDF)	,, -525		3 320,00	1 591,20	1 591,20
24-06857 Avance	16/01/2024			1 591,20	1 591,20
021016 AC1	17/05/2024	FA 0326-			_ 552,20
24-07052 Déplacement d'une armoire MANT - ETF	· ·			2 130,30	2 130,30
021050 AC1	30/05/2024	FA		2 130,30	2 130,30
24-07116 Raccordement armoire MANT - NGE ENERGIES SOLUTIONS (EX LACIS)				21 365,10	21 365,10
020773 AC1	19/04/2024	FA		21 365,10	21 365,10
24-07179 Déplacement armoire MANT - AXIMUM				47 049,12	47 049,12
020981 AC1	21/05/2024	FA		47 049,12	47 049,12
24-07182 Déplacement armoire MANT - INEO				7 305,14	7 305,14
021205 AC1	12/06/2024	FA		7 305,14	7 305,14
24-07370 Développement BT et HTA sur Somme et Mirepin - ENEDIS (EX : ERDF)	24 (0= /25 - :			20 711,82	20 711,82
24-07370 Avance	31/07/2024		05 500 05	20 711,82	20 711,82
D204 Eau potable			35 796,07	184 655,71	220 451,78
22-05535 Raccordement DN 150 - av de la Somme (Castorama) - devis	20/07/2022		11 990,66		11 990,66
22-05535 Avance 017433 AC1	29/07/2022 01/01/2023	FA 192203299	10 650,60 1 340,06		10 650,60
011432 MCI	01/01/2023	LW T35503538	1 340,06		1 340,06

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			-		
7.1.4.4.4.	Data Fastura	Ni. wa śwa	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
23-06216 [BDR]Eau conso 26 Av Somme Cpteur H22VA264157 - EAU BM (REGIE) 017762 AC1	04/04/2023	FA 380058	67,14 31,96	107,31	174,45 31,96
019209 AC2	03/11/2023	FA 800356	35,18		35,18
020754 AC3	19/04/2024	FA 800330	33,18	26,46	26,46
021911 AC4	09/08/2024	FA		80,85	80,85
23-06403 Branchement arrosage Av. de la Somme/Ch. Pouchon - EAU BM	03/08/2024	I A	23 738,27	856,40	24 594.67
23-06403 Avance	28/06/2023		14 495,21	550,10	14 495,21
018411 AC1	20/07/2023	FA BM2300869	2 : 100,22		
018765 AC2	18/09/2023	FA 699386	55,70		55,70
018739 AC3	15/09/2023	FA BM2301150	8 942,70		8 942,70
019208 AC4	03/11/2023	FA 800840	244,66		244,66
020755 AC5	19/04/2024	FA		236,10	236,10
021937 AC6	20/08/2024	FA		620,30	620,30
23-06790 Déplacement compteur 28 Av. de la Somme (BDR) - EAU BM (REGIE)				2 400,04	2 400,04
23-06790 Avance	20/12/2023			2 400,04	2 400,04
019940 DEPLACEMENT COMPTEUR	17/01/2024	FA BM2400090			
23-06791 Déplacement compteur 30 Av. de la Somme (Ripiano) - EAU BM				1 732,82	1 732,82
23-06791 Avance	20/12/2023			1 732,82	1 732,82
23-06798 Rue Mirepin : phase 0 = raccordement pour bouclage AEP oasis				11 787,00	11 787,00
23-06798 Avance	22/12/2023			11 787,00	11 787,00
23-06799 Rond-Point Mirepin : phase 0 = réalisation de la bayonette sur le rond				12 773,78	12 773,78
23-06799 Avance	22/12/2023			12 773,78	12 773,78
23-06800 Matosinhos ouest : phase 1 = devoiement réseaux sous trottoir - EAU				137 675,01	137 675,01
23-06800 Avance	22/12/2023			73 251,52	73 251,52
021519 AC1	10/07/2024	FA BM2401048		64 423,49	64 423,49
24-06821 Matosinhos ouest : phase 1 = raccordement AEP arrosage - EAU BM				13 854,16	13 854,16
24-06821 Avance	08/01/2024			9 353,40	9 353,40
021008 AC1	15/05/2024	FA BM2400737		4 133,27	4 133,27
021346 AC2	18/06/2024	FA		95,71	95,71
021961 AC3	26/08/2024	FA		271,78	271,78
24-07238 Raccordement DN150 de la venelle Castorama - EAU BM (REGIE)	24 /05 /2024			3 469,19	3 469,19
24-07238 Avance	31/05/2024		22 540 50	3 469,19	3 469,19
D205 Téléphonie/Fibre optique			32 549,50		32 549,50
22-05164 Travaux réseau rue de Peyandreau - Mérignac Soleil - ORANGE (LILLE) 016351 SOLDE	04/10/2022	FA	32 549,50		32 549,50 32 549,50
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)	04/10/2022	FA	32 549,50 633 528,43	304 286,23	937 814,66
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 -			5 003,05	887,52	5 890,57
011005 AC1	14/09/2020	FA	2 582,40	007,32	2 582,40
011588 AC2	01/01/2021	FA	861,30		861,30
012366 AC3	23/03/2021	FA	385,94		385,94
013327 AC4	08/09/2021	FA	118,60		118,60
016097 AC5	31/08/2022	FA	710,81		710,81
018796 AC6	27/09/2023	FA	344,00		344,00
020748 AC7	25/04/2024	FA	,,,,	323,90	323,90
021469 AC8	30/06/2024	Fa		402,29	402,29
022168 AC9	18/09/2024	FA		161,33	161,33
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 - ALTO			89 391,06	31 433,01	120 824,07
011004 AC1 PRO	26/08/2020	FAC2200500	25 836,00		25 836,00
011589 AC2	01/01/2021	FCA2200736	14 639,80		14 639,80
012246 AC3	19/03/2021	FCA2210150	7 463,96		7 463,96
012247 AC3 AV1	19/03/2021	FCA2210151	16 543,80		16 543,80
013321 AC4	10/09/2021	FCA2210421	3 321,74		3 321,74
016082 AC5	26/08/2022	FA	14 427,96		14 427,96
018500 AC6	29/05/2023	FA	7 157,80		7 157,80
020750 AC7	03/04/2024	FA		9 433,06	9 433,06
021480 AC8	28/06/2024	FA		11 439,91	11 439,91
022167 AC9	02/09/2024	FA		10 560,04	10 560,04
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 -			20 214,52	10 467,21	30 681,73
010996 AC1	14/09/2020	FA 324868	15 500,40		15 500,40
011592 AC2	01/01/2021	FA 324996	861,30		861,30
012240 AC3	19/03/2021	FA 325162	622,54		622,54
		FA 325393	402,51		402,5
013310 AC4	15/09/2021	AUL 22=25=			1 890,83
013310 AC4 016075 AC5	06/09/2022	NH 325868	1 890,81		
013310 AC4 016075 AC5 018718 AC6	06/09/2022 06/09/2023	FA 326491	1 890,81 936,96	4000	936,96
013310 AC4 016075 AC5 018718 AC6 020740 AC7	06/09/2022 06/09/2023 24/04/2024	FA 326491 FA 326907		1 848,67	936,96 1 848,6
013310 AC4 016075 AC5 018718 AC6 020740 AC7 021461 AC8	06/09/2022 06/09/2023 24/04/2024 04/07/2024	FA 326491 FA 326907 FA 327032		1 686,84	936,96 1 848,6 1 686,84
013310 AC4 016075 AC5 018718 AC6 020740 AC7	06/09/2022 06/09/2023 24/04/2024	FA 326491 FA 326907			936,9 1 848,6

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
010987 AC1 PRO	10/09/2020	FA V8141	6 458,00	2021	6 458,00
011594 AC2	01/01/2021	FA V8247	717,75		717,75
012235 //GZ 012235 AC3	20/03/2021	FA V8510	1 276,28		1 276,28
013308 AC4	09/09/2021	FA V8701	335,43		335,43
016066 AC5	30/08/2022	FA V9132	1 575,69		1 575,69
018492 AC6	30/07/2023	FA V9605	778,79		778,79
018643 SOLDE 50%VISA 33%DET	07/09/2023	DECPTE	1 459,96		1 459,96
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 -			12 959,28	7 408,94	20 368,22
013328 AC1	15/09/2021	FA	7 430,08		7 430,08
014667 AC2	28/02/2022	FA	363,65		363,65
016095 AC3	31/08/2022	FA	1 396,96		1 396,90
018504 AC4	30/04/2023	FA	2 107,01		2 107,01
018798 AC5	27/09/2023	FA	1 661,58		1 661,58
019604 AC6	01/01/2024	FA		2 054,69	2 054,69
020032 AC7	31/01/2024	FA		106,88	106,88
020316 AC8	29/02/2024	FA		1 132,68	1 132,68
020747 AC9	25/04/2024	FA		569,89	569,89
022521 AC10	24/10/2024	FA		3 544,80	3 544,80
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - AG	1		17 956,80	26 385,36	44 342,16
018499 AC3 SSTT	30/04/2023	FA FN 08-23	12 771,60		12 771,60
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	5 185,20		5 185,20
019624 AC5	01/01/2024	FA 326699		12 771,60	12 771,60
020037 AC6	09/02/2024	FA 326768		-709,92	-709,92
020309 AC7	08/03/2024	FA 326829		8 491,20	8 491,20
020739 AC8	24/04/2024	FA 326906		3 591,36	3 591,36
022531 AC9	25/10/2024	FA 327221		2 241,12	2 241,12
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - ALTO	4.5./00./2024	5643346446	210 398,63	126 255,82	336 654,45
013326 AC1	16/09/2021	FCA2210440	94 477,98		94 477,98
014666 AC2	28/02/2022	FA	10 836,13		10 836,13
016094 AC3	26/08/2022	FA	19 626,40		19 626,40
018501 AC4 018711 AC5	29/05/2023 14/09/2023	FA FA	51 353,17		51 353,17
0198711 ACS 019835 AC6	01/01/2024	FA	34 104,95	24 634,84	34 104,95 24 634,84
019635 AC6 019644 AC7	01/01/2024	FA			27 844,56
020376 AC8	01/01/2024	FA		27 844,56 12 741,06	12 741,06
020310 AC9	31/01/2024	FA		7 293,01	7 293,01
020312 AC10	28/02/2024	FA		37 283,53	37 283,53
020749 AC11	03/04/2024	FA		16 458,82	16 458,82
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 -	03/04/2024		175 347,21	65 688,37	241 035,58
013311 AC1	15/09/2021	FA 325388	96 024,30	00 000,07	96 024,30
016076 AC2	07/09/2022	FA 325870	23 574,12		23 574,12
018498 AC3	05/05/2023	FA 326266	39 374,67		39 374,67
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	16 374,12		16 374,12
019624 AC5	01/01/2024	FA 326699	,	24 593,04	24 593,04
020037 AC6	09/02/2024	FA 326768		507,64	507,64
020309 AC7	08/03/2024	FA 326829		13 770,41	13 770,41
020739 AC8	24/04/2024	FA 326906		6 544,88	6 544,88
022531 AC9	25/10/2024	FA 327221		20 272,40	20 272,40
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - OMA			51 255,43		51 255,43
013309 AC1	15/09/2021	FA V8706	30 293,74		30 293,74
014657 AC2	02/03/2022	FA V8934	2 128,92		2 128,92
016067 AC3	29/08/2022	FA V9135	5 827,98		5 827,98
018494 AC4	31/07/2023	FA V9606	6 161,41		6 161,41
018699 VISA 8% DET 7% AV2 50%	08/09/2023	DECOMPTE	5 926,57		5 926,57
019478 ANNUL AVCT VISA-DET-AV8	08/09/2023	FV9621	-5 926,57		-5 926,57
019480 VISA DET AV8	08/12/2023	DECPTE DEF	6 843,38		6 843,38
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - ALTO STEP			4 314,72		4 314,72
013319 SOLDE	10/09/2021	FCA2210410	4 314,72		4 314,72
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - DESVIGNE	1		1 248,36		1 248,36
013316 SOLDE	15/09/2021	FA 325394	1 248,36		1 248,36
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - OMA	1		9 150,60		9 150,60
013407 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	9 150,60		9 150,60
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - ALTO STEP	1		1 618,02		1 618,02
013320 SOLDE	10/09/2021	FA	1 618,02		1 618,02
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - DESVIGNE			975,66		975,66
013317 SOLDE	15/09/2021	FA 325395	975,66		975,66
NAZOLE DONAMICO (BDC1F Contour Flunch Cotalegram) MacDo ONAA	1		5 342,90		5 342,90
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - OMA 013451 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90		5 342,90

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2022-037 Dossier de sécurité - ARTELIA VILLE & TRANSP	Date Facture	Numero	2023	-	35 760,00
020964 AC1	17/05/2024	FA 911172634		35 760,00 24 960,00	24 960,00
022866 AC2	22/11/2024	FA 911192263		10 800,00	10 800,00
M2022-069/BDC1 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER	22/11/2024	177311132203	8 741,16	10 000,00	8 741,16
017938 AC1	28/04/2023	FA FS04230397	1 828,80		1 828,80
018545 AC2	31/07/2023	FA FS07230744	3 250,08		3 250,08
018949 AC3	30/09/2023	FA FS09230922	3 662,28		3 662,28
M2022-069/BDC2 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER	, ,		3 552,70		3 552,70
018544 AC1	31/07/2023	FA FS07230745	3 552,70		3 552,70
M2022-069/BDC3 Mission OQA - Mise à jour Note Secteur 1.3 - CERTIFER			3 456,43		3 456,43
018950 AC1	30/09/2023	FA FS09230923	3 456,43		3 456,43
D302 Coordonnateur SPS			11 025,51	9 153,84	20 179,35
M2019-026 Mission de CSPS niveau 2 - Espaces publics - VERITAS			11 025,51	9 153,84	20 179,35
009735 AC1	29/01/2020	FA 20213189	1 143,42		1 143,42
010000 AC2	29/01/2020	FA 20213189-2	1 147,98		1 147,98
011556 AC3	01/01/2021	FA 20702041	2 126,90		2 126,90
011824 AC4	11/01/2021	FA 21001773	760,57		760,57
012732 AC5	21/06/2021	FA 21078598	783,32		783,32
015247 AC6	01/06/2022	FA 22070732	805,50		805,50
018830 AC7	29/09/2023	FA 23125062	3 546,25		3 546,25
018974 AC8	13/10/2023	FA 23132850	711,57		711,57
019239 AC9	16/11/2023	FA 23148647		741,09	741,09
019551 AC10	01/01/2024	FA 23163120		713,48	713,48
019793 AC11	12/01/2024	FA 24006055		717,35	717,35
020045 AC12	09/02/2024	FA 24019185		715,42	715,42
020321 AC13	08/03/2024	FA 24032317		721,20	721,20
020691 AC14	19/04/2024	FA 24050615		1 708,67	1 708,67
021004 AC15	24/05/2024	FA 24064183		767,46	767,46
021242 AC16	19/06/2024	FA 24076895		767,46	767,46
021515 AC17	09/07/2024	FA 24087497		767,46	767,46
021918 AC18	19/08/2024	FA 24102842		761,28	761,28
022143 AC19	12/09/2024	FA 24113254		772,97	772,97
D303 OPC sur travaux			235 579,79		235 579,79
M2019-011/BDC1 M5.1 Etudes de conception (PRO) - BERGER LOUIS			12 876,00		12 876,00
009733 AC 1	21/01/2020	FA 5101913.01-	6 438,00		6 438,00
010254 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-	6 438,00		6 438,00
M2019-011/BDC10 M5.3 Phase préparation de chantier - ilot oasis urbaine (P1 à			14 072,94		14 072,94
015141 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-	14 072,94		14 072,94
M2019-011/BDC11 M5.4 phase de réalisation des travaux (voie Castorama) -			24 490,62		24 490,62
015892 SOLDE	16/08/2022	FA AC22-08-	24 490,62		24 490,62
M2019-011/BDC12 M5.3 phase prépa de chantier (concessionnaires) & M5.4			22 390,68		22 390,68
016340 AC1	10/10/2022	FA AC22-10-	11 387,68		11 387,68
017508 SOLDE	28/02/2023	FA AC23-02-	11 003,00		11 003,00
M2019-011/BDC13 M5.3 (11.22 à 01.23) & M5.4 (01.23 à 03.23) amgt espaces			39 466,68		39 466,68
016891 AC1	01/01/2023	FA AC22-12-	14 414,58		14 414,58
018175 AC2	20/06/2023	FA AC23-06-	22 560,14		22 560,14
018509 AC3 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-	2 491,96		2 491,96
442040 044 (DDC44 84F 2 mbm / / // / / / / / / / / / / / / / /			14 519,70		14 519,70
M2019-011/BDC14 M5.3 phase préparation de chantier 03.23 à 07.23 - WSP	10/00/2022	EA ACCC CC	7000 10		7 266,42
018174 AC1	16/06/2023	FA AC23-06-	7 266,42		7
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE	16/06/2023 08/08/2023	FA AC23-06- FA AC23-08-	7 253,28		7 253,28
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP	08/08/2023	FA AC23-08-	7 253,28 7 917,89		7 917,89
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE			7 253,28 7 917,89 7 917,89		7 917,89 7 917,89
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché -	08/08/2023 08/08/2023	FA AC23-08-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00		7 917,89 7 917,89 8 190,00
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020	FA AC23-08- FA AC23-08- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00		7 917,89 7 917,85 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020	FA AC23-08- FA AC23-08- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00		7 917,85 7 917,85 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 51091301	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,99
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 51091301	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01		7 917,85 7 917,85 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,91 22 888,01
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021 03/03/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 13 449,35		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER 012354 AC1	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021 03/03/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 13 449,35 4 888,55		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 3 449,35 4 888,55
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER 012354 AC1 012665 AC2	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021 03/03/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 13 449,35 4 888,55 8 560,80		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 3 449,35 4 888,55 8 560,80
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER 012354 AC1 012665 AC2 M2019-011/BDC7 M5.1 Etudes de conception (PRO) TRAM - BERGER LOUIS	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021 03/03/2021 14/04/2021 31/05/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 13 449,35 4 888,55 8 560,80 13 248,11		7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 3 449,35 4 888,55 8 560,80
018174 AC1 018510 AC2 SOLDE M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP 018511 AC1 SOLDE M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - 010387 SOLDE M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 010608 AC1 011143 SOLDE M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS 012047 SOLDE M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS 012139 SOLDE M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER 012354 AC1 012665 AC2	08/08/2023 08/08/2023 21/04/2020 15/07/2020 02/10/2020 01/01/2021 03/03/2021	FA AC23-08- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01- FA 5101913.01-	7 253,28 7 917,89 7 917,89 8 190,00 8 190,00 13 140,00 5 256,00 7 884,00 13 323,96 13 323,96 22 888,01 22 888,01 13 449,35 4 888,55 8 560,80		7 917,89 7 917,89 8 190,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
013595 AVOIR SUR BDC 7	28/10/2021	AV 5101913	-3 312,35	-	-3 312,35
014519 SOLDE	01/01/2022	FA 5101913.01-	3 320,71		3 320,71
M2019-011/BDC8 M5.4 Travaux Eté 2021 - BERGER LOUIS			7 415,85		7 415,85
013123 08/21 SOLDE	23/08/2021	FA 5101913.01	7 415,85		7 415,85
M2019-011/BDC9 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - phase			8 190,00		8 190,00
015140 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-	8 190,00		8 190,00
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			1 557 258,06	400 000,00	1 957 258,06
G101 Rémunération			1 557 258,06	400 000,00	1 957 258,06
18-02475 Rémunération aménageur 2018 - FAB			37 258,06		37 258,06
007258 REM 30/08-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-20	37 258,06		37 258,06
19-02799 Rémunération aménageur 2019 - FAB			200 000,00		200 000,00
008478 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-10	100 000,00		100 000,00
008709 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-20	50 000,00		50 000,00
009219 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-30	50 000,00		50 000,00
20-03718 Rémunération aménageur 2020 - FAB	20/05/2020	ND 2020 40	230 000,00		230 000,00
010430 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-10	115 000,00		115 000,00
011026 REM 01/07-30/09/20 011691 REM 01/10-31/12/20	30/09/2020 23/12/2020	ND 2020-21 ND 2020-32	57 500,00 57 500,00		57 500,00 57 500,00
21-04303 Rémunération aménageur 2021 - FAB	23/12/2020	140 2020-32	350 000,00		350 000,00
012219 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-10	87 500,00		87 500,00
012219 REM 01/01-31/03/21 012921 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-10 ND 2021-21	87 500,00 87 500.00		87 500,00
013473 REM 01/04-30/09/21	30/00/2021	ND 2021-21 ND 2021-32	87 500,00		87 500,00
014093 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-32 ND 2021-43	87 500,00		87 500,00
22-05229 Rémunération aménageur 2022 - FAB	,,	2021 73	370 000,00		370 000,00
014874 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-10	92 500,00		92 500,00
015363 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-21	92 500,00		92 500,00
016057 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-32	92 500,00		92 500,00
016851 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-43	92 500,00		92 500,00
23-06250 Rémunération aménageur 2023 - FAB			370 000,00		370 000,00
017810 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-10	92 500,00		92 500,00
018376 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-22	92 500,00		92 500,00
019503 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-34	92 500,00		92 500,00
019513 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-46	92 500,00		92 500,00
24-07310 Rémunération aménageur 2024 - FAB				400 000,00	400 000,00
021339 REM 01/01/24-30/06/24	25/06/2024	ND 2024-10		200 000,00	200 000,00
022575 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-21		100 000,00	100 000,00
023289 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-31		100 000,00	100 000,00
H FRAIS DIVERS			989 139,92	276 893,33	1 266 033,25
H101 Communication			290 600,65	82 047,79	372 648,44
19-03212 MDP "Citröen Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE			219,60		219,60
009165 SOLDE	26/11/2019	FA 096 011607	219,60		219,60
19-03262 MDP "Citröen Fayat" Maintenance porte automatique 1520 -			144,00		144,00
010502 MAINTENANCE PORTES MDP	17/06/2020	CEH825115920	144,00		144,00
19-03281 MDP "Citröen Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL	20/44/2040	54 50 4000	327,10		327,10
009250 REGUL AFFECT° MDP	30/11/2019	FA FC 1823	327,10		327,10
19-03299 MDP "Citröen Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - DEKRA	20/11/2010	EVISERESSE	122,40		122,40
009320 REGUL AFFECTATION MDP 19-03312 MDP "Citröen Fayat" Charges courantes - FAYAT	30/11/2019	FAI3566335	122,40 34 888,82		122,40 34 888,82
009350 REGUL AFFECTAT° - MDP	30/11/2019	031219	5 961,60		5 961,60
00939 APPEL PROV T2 2020	05/03/2020	FA 62 03 2020	2 980,80		2 980,80
010441 APPEL PROV T3 2020	01/06/2020	FA 95 06 2020	2 980,80		2 980,80
010660 REGULARISATION CHARGES 2019	30/06/2020	FA 33 00 2020	6 604,82		6 604,82
010878 APPEL PROV T4 2020	04/09/2020	FA	2 980,80		2 980,80
011818 APPEL PROV T1 2021	01/01/2021	FA 32.12.2021	2 980,80		2 980,80
011821 REGUL CHARGES REELLES	01/01/2021	AV 40.12.2021	-1 524,00		-1 524,00
012340 APPEL PROV T2 2021	03/03/2021	FA 68 03 3021	2 980,80		2 980,80
012769 APPEL PROV T3 2021	01/06/2021	FA 143 06 2021	2 980,80		2 980,80
013485 APPEL PROV T4 2021	01/09/2021	FA	2 980,80		2 980,80
014222 APPEL PROV T1 2022	01/01/2022	FA 37.12.2022	2 980,80		2 980,80
009671 ABONN 01/20	21/01/2020	FA	32,40		32,40
009713 REGUL AFFECTAT° ABONN 01/20	21/01/2020	FA	-32,40		-32,40
20-03466 MDP "Citröen Fayat" Pose d'un programmateur sur le chauffage -			612,00		612,00
009789 PROGRAMMATEUR MDP	12/02/2020	F 190071	612,00		612,00
20-03539 MDP "Citröen Fayat" Réparation porte d'entrée - THYSSENKRUPP			297,36		297,36
010501 REPARATION PORTE MDP	12/06/2020	CEH825115664	297,36		297,36
20-04003 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (à cpter 2520) + entrée			317,28		317,28
OAAOAA NAANNITENIANIGE DODTE GEGONDANDE	01/01/2021	FA	72,00		72,00
011814 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021		69,29		

		Réalé cum TTC	Réalé TTC	Réglé cum TTC
	1	-	_	
Data Fastura	Numafua			A fin
			2024	2024
06/07/2021	FA	-		175,99 3 600,00
13/10/2021	FA 20210037	-		3 600,00
13/10/2021	1A 20210037	-		180,00
01/02/2021	FA 2021 0102	,		180,00
		648,00		648,00
05/10/2021	FA0701	648,00		648,00
		10 200,00		10 200,00
13/10/2021	FA 2021-4067-	10 200,00		10 200,00
		235,20		235,20
15/12/2021	FA 190175	235,20		235,20
		74,37		74,37
10/01/2022	FA	149,56		149,56
11/07/2022	FA	149,56		149,56
	AV	-149,56		-149,56
08/09/2022	AV	-		-75,19
00/00/0000				957,60
23/03/2022	FB22000464			957,60
10/01/2022	EA E20220440			698,40
10/01/2023	PA F2U23U118-	-		698,40 10 532,00
09/08/2022	TITRE 23 22			10 532,00
03/00/2023	111NE 23 33	10 332,00	2 696 40	2 696,40
28/05/2024			-	2 696,40
20/03/2024			-	8 280,00
05/07/2024	FA F2024070		-	8 280,00
			-	1 841,80
09/08/2024			-	1 841,80
			415,00	415,00
10/12/2024			415,00	415,00
			600,00	600,00
16/12/2024	FA		600,00	600,00
		4 578,24		4 578,24
30/11/2019	FA 30112019	4 578,24		4 578,24
27/06/2019	NH 4	2 988,00		2 988,00
27/06/2019	NH 03_2	1 175,76		1 175,76
30/11/2019	FA 05122019	-4 163,76		-4 163,76
		4 032,00		4 032,00
27/09/2019	NH 5			4 032,00
0.1 /0.1 /0.00				2 016,00
	-	-		1 512,00
05/03/2020	NH 19			504,00
01/01/2020	NILI 11	-		5 292,00 3 969,00
		-		1 323,00
03/03/2020	INIT 20	-		2 736,00
27/09/2019	NH 6	-		2 736,00
,		16 305,00		16 305,00
15/10/2019	FA 19-069-002	16 305,00		16 305,00
,		8 647,78		8 647,78
27/09/2019	NH 7	6 048,00		6 048,00
20/02/2020	NH 17	2 599,78		2 599,78
		756,00		756,00
01/01/2020	FA 20190091	756,00		756,00
		4 044,10		4 044,10
20/02/2020	NH 16	4 044,10		4 044,10
		778,01		778,01
		770,01		
18/01/2021	FA 20210004	778,01		778,01
18/01/2021		778,01 3 386,61		3 386,61
	FA 20210004 FA 6917	778,01 3 386,61 3 386,61		3 386,61 3 386,61
18/01/2021	FA 6917	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01		3 386,61 3 386,61 2 631,01
18/01/2021 18/01/2021 21/10/2020	FA 6917 FA 20200071	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56		3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56
18/01/2021	FA 6917	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45		3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45
18/01/2021 18/01/2021 21/10/2020 05/03/2021	FA 6917 FA 20200071 FA 20200085	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45 1 013,04		3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45 1 013,04
18/01/2021 18/01/2021 21/10/2020	FA 6917 FA 20200071	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45 1 013,04		3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45 1 013,04
18/01/2021 18/01/2021 21/10/2020 05/03/2021	FA 6917 FA 20200071 FA 20200085	778,01 3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45 1 013,04		3 386,61 3 386,61 2 631,01 1 519,56 1 111,45
	13/10/2021 15/12/2021 10/01/2022 11/07/2022 08/09/2022 08/09/2022 23/03/2022 18/01/2023 09/08/2023 28/05/2024 05/07/2024 09/08/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 27/09/2019 01/01/2020 05/03/2020 27/09/2019 15/10/2019 27/09/2019	06/07/2021 FA 13/10/2021 FA 20210037 01/02/2021 FA 2021 0102 05/10/2021 FA 0701 13/10/2021 FA 2021-4067- 15/12/2021 FA 190175 10/01/2022 FA 11/07/2022 FA 08/09/2022 AV 08/09/2022 AV 23/03/2022 FB22000464 18/01/2023 FA F20230118- 09/08/2023 TITRE 23 33 28/05/2024 FA F2024070 09/08/2024 FA FA F2024070 09/08/2024 FA 10/12/2024 FA 30/11/2019 FA 30112019 27/06/2019 NH 4 27/06/2019 NH 5 01/01/2020 NH 10 05/03/2020 NH 17	175,99	Date Facture

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		1	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
011654 SOLDE	01/01/2021	FA 20200103		2024	
M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES	01/01/2021	FA 20200103	818,10 3 999,60		818,10 3 999,60
011655 SOLDE	01/01/2021	FA 20200102	3 999,60		3 999,60
M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes ouvertes -	01,01,2021	20200102	3 875,44		3 875,44
012116 AC1	01/01/2021	FA 20200087	823,77		823,77
013549 AC2	13/10/2021	FA 20210059	526,90		526,90
013548 SOLDE	13/10/2021	FA 20210059	2 524,77		2 524,77
M2017-036/MS3/BDC19 BDC 19 Permanence Maison du projet "Citröen Fayat" -			2 565,50		2 565,50
014543 SOLDE	01/01/2022	NH 48	2 565,50		2 565,50
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" -			3 528,00		3 528,00
012714 AC1	12/04/2021	FA 21-118-030	3 528,00		3 528,00
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" -			105,84		105,84
012714 AC1	12/04/2021	REV S/BDC20	105,84		105,84
M2017-036/MS3/BDC21 BDC 21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA			5 452,14		5 452,14
012389 SOLDE	22/03/2021	FA 6919	5 452,14		5 452,14
M2017-036/MS3/BDC22 BDC 22 lettre d'informations N° 3 - DEUX DEGRES			2 752,64		2 752,64
014541 SOLDE	01/01/2022	NH 42	2 752,64		2 752,64
M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 gestion des projets (semestre 1) - DEUX DEGRES	27/07/2024	EA 20240244	3 431,23		3 431,23
013283 SOLDE M2017 026 (M62 / RDC24 RDC 24 lettre chaptier 4 (queil 2021 costour Mironin)	27/07/2021	FA 20210044	3 431,23		3 431,23
M2017-036/MS3/BDC24 BDC 24 lettre chantier 4 (avril 2021 - secteur Mirepin) -	24/06/2021	EA 20210026	1 398,60		1 398,60
013556 SOLDE M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journéee de la mobilité : 16 oct	24/06/2021	FA 20210036	1 398,60 523,66		1 398,60 523,66
013555 SOLDE	13/10/2021	FA 20210054	523,66 523,66		523,66
M2017-036/MS3/BDC28 BDC 28 gestion de projets (semestre 2) - DEUX DEGRES	13/10/2021	1 A 20210034	2 848,18		2 848,18
014277 SOLDE	11/01/2022	FA 20220004	2 848,18		2 848,18
M2017-036/MS3/BDC29 BDC 29 lettre d'informations N° 4 - DEUX DEGRES	11/01/2022	17120220004	4 007,99		4 007,99
016601 SOLDE	15/11/2022	FA 20220071	4 007,99		4 007,99
M2017-036/MS3/BDC30 Lettre info n°5 Lettre chantier Actu site internet Marne-	-, , -		7 346,30		7 346,30
017085 AC1	01/01/2023	FA 20220085	3 916,08		3 916,08
017957 AC2	25/04/2023	FA F2300023	1 726,20		1 726,20
019427 AC3	28/11/2023	FA 2300068	1 704,02		1 704,02
M2017-036/MS3/BDC31 M3 : bilan / 5 années de médiation - DEUX DEGRES			1 262,20		1 262,20
018053 SOLDE	25/04/2023	FA F2300021	1 262,20		1 262,20
M2017-036/MS3/BDC32 M3 : lettre info travaux et gestion de projets - DEUX			2 276,07		2 276,07
019280 AC1	24/11/2023	FA F2300064	2 276,07		2 276,07
M2017-036/MS3/BDC33 M3 : info travaux et occupat° temporaire - DEUX			6 333,70	7 950,82	14 284,52
019281 AC1	24/11/2023	FA F2300065	6 333,70		6 333,70
020150 AC2	23/02/2024	FA F2400005		5 098,99	5 098,99
020766 AC3	26/04/2024	FA F2400015		2 392,18	2 392,18
022299 AC4	03/10/2024	FA F2400054	2 502 05	459,65	459,65
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - A6A 009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA20112010	3 583,95		3 583,95 3 583,95
	30/11/2019	FA30112019	3 583,95		
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - BALZA XAVIER 009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 030,40 2 030,40		2 030,40 2 030,40
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - CESMA	30/11/2019	1A30112019	1 572,48		1 572,48
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 572,48		1 572,48
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - ETBA THOMAS	,,,		1 087,63		1 087,63
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 087,63		1 087,63
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - GUIRAUD ANDRE		1	2 601,14		2 601,14
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 601,14		2 601,14
M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - VIVIEN (BET)			2 620,80		2 620,80
M2018-001 Avance	12/12/2019		-2 620,80		-2 620,80
M2018-001 Avance	12/12/2019		2 620,80		2 620,80
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 620,80		2 620,80
M2018-011 MDP "Citröen Fayat" Controle technique MDP - VERITAS			970,35		970,35
009340 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	970,35		970,35
M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISOIRE			14 378,40		14 378,40
010143 AC 1	21/04/2020	FA 20-014	3 610,80		3 610,80
010361 AC2	29/05/2020	FA NH 20-025	3 607,20		3 607,20
	29/06/2020	FA 20-031	3 607,20		3 607,20
010481 AC3	20/0=/22-	LEA 20 041	3 553,20		3 553,20
010481 AC3 010687 SOLDE	30/07/2020	FA 20-041		i	
010481 AC3 010687 SOLDE M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE			43 273,44		43 273,44
010481 AC3 010687 SOLDE M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE 010145 AC 1	21/04/2020	FA 20-016	43 273,44 4 320,00		4 320,00
010481 AC3 010687 SOLDE <i>M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE</i> 010145 AC 1 010363 AC2	21/04/2020 29/05/2020	FA 20-016 FA NH 20-027	43 273,44 4 320,00 4 328,64		4 320,00 4 328,64
010481 AC3 010687 SOLDE M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE 010145 AC 1 010363 AC2 011028 AC2	21/04/2020 29/05/2020 28/09/2020	FA 20-016 FA NH 20-027 NH 20-055	43 273,44 4 320,00 4 328,64 8 592,48		4 320,00 4 328,64 8 592,48
010481 AC3 010687 SOLDE <i>M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE</i> 010145 AC 1 010363 AC2	21/04/2020 29/05/2020	FA 20-016 FA NH 20-027	43 273,44 4 320,00 4 328,64		43 273,44 4 320,00 4 328,64 8 592,48 8 665,92 8 683,20

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
M2019-015/BDC 5 Actualisation des ilots Castorama (P5) et Sogara - ATELIER		100000	4 460,04		4 460.04
013624 AC1	29/10/2021	FA 21-081	2 600,64		2 600,64
014362 SOLDE	26/01/2022	FA 22-010	1 859,40		1 859,40
M2019-015/BDC 7 Actualisation des ilots Castorama P1 P2 P3 et P4 - ATELIER			3 708,00		3 708,00
013355 AC 1	28/09/2021	FA 21-069	3 708,00		3 708,00
M2019-015/BDC 8 Démontage et remontage de la maquette - BDL - ATELIER			1 129,68		1 129,68
015118 SOLDE	05/04/2022	NH 22-035	1 129,68		1 129,68
M2019-015/BDC 9 Réalisation des boîtes de transport de la maquette - ATELIER			2 580,19		2 580,19
016357 SOLDE	13/10/2022	NH 22-081 60%	2 580,19		2 580,19
M2019-015/BDC10 Montage de la maquette à la MDP & actualisation ilots Fiat				4 799,52	4 799,52
019701 AC1	01/01/2024	FA 23-077		4 799,52	4 799,52
M2019-021 MDP "Citröen Fayat" Aménagement intérieur - CONFORT HOME 33			11 228,76		11 228,76
009262 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA190027	9 942,12		9 942,12
009460 SOLDE AVENANT	01/01/2020	FA 190031	1 286,64		1 286,64
M2019-029 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage post chantier - DERICHEBOURG	20/44/2040	54.002/40	3 034,80		3 034,80
009302 REGUL AFFECT® MDP	30/11/2019	FA 002/19	3 034,80	54.03	3 034,80
M2019-030 Lot 1/BDC39 60% Impression lettre d'information et lettre de	13/01/2023	FA 39839	752,40	54,93	807,33
017066 AC1 017417 REGUL REV/AC1	13/01/2023	FA 39839 FA 39839	841,18 -88,78		841,18 -88,78
021311 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC39	-00,/8	54,93	-88,78 54,93
M2019-030 Lot 1/BDC49 Impresssion Kit projet Soleil - BLF IMPRESSION	30/01/2024	202 00033		750,48	750,48
019584 AC1	01/01/2024	FA 41190		636.00	636,00
021789 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC49		114,48	114,48
M2019-030 Lot 1/BDC51 Réimpression Kit projet Soleil 100 ex BLF IMPRESSION	02,00,202	505 550 15		819,94	819,94
019891 AC1	26/01/2024	FA 41372		702,00	702,00
021790 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC51		117,94	117,94
M2019-030 Lot 2/BDC3 1 PD format 0,80 x 1,20 m - MIPP			60,00	-0,24	59,76
009729 BDC3-AC1	31/01/2020	FA 200349	60,00		60,00
021276 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC3		-0,24	-0,24
M2019-030 Lot 2/BDC39 Palissades ex Alinéa coté Kennedy - MIPP				4 351,97	4 351,97
019738 PANNEAU ALINEA PALISSADES	01/01/2024	FA F233974		3 726,00	3 726,00
021758 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC39		625,97	625,97
M2019-033 MDP "Citröen Fayat" Sécurisation locaux - VPSITEX			1 061,28		1 061,28
009333 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	844,56		844,56
009645 09/11-08/12/19	01/01/2020	FA	216,72		216,72
M2019-057 MDP "Citröen Fayat" Travaux complémentaires - CONFORT HOME			813,60		813,60
009628 SOLDE	10/01/2020	FA 190058	813,60		813,60
M2020-001 MDP "Citröen Fayat" Travaux mise aux normes locaux - MODEX BTP			2 640,00		2 640,00
011398 SOLDE SOLEIL	02/10/2020	FA 02102020-	2 640,00		2 640,00
M2020-002 MDP "Citröen Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - VPSITEX	24 /04 /2020	NADE40200200	216,72		216,72
009760 AC 1 M2020-002/BDC1 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2020 -	31/01/2020	MPF10200399	216,72 2 600,64		216,72 2 600,64
009959 BDC1-ABONN 01/2020	29/02/2020	MPF10200757	216,72		216,72
010236 BDC1-ABONN 02/2020	31/03/2020	FA	216,72		216,72
010240 BDC1 ABONN 03/2020	27/04/2020	FA	216,72		216,72
010442 BDC1 ABONN 04/2020	01/06/2020	FA	216,72		216,72
010568 BDC1 ABONN 05/2020	30/06/2020	MPF10203917	216,72		216,72
010734 BDC1 ABONN 06/2020	31/07/2020	MPF10204685	216,72		216,72
010877 BDC1 ABONN 07/2020	31/08/2020	MPF10205391	216,72		216,72
011365 BDC1 ABONN 09/2020	31/10/2020	FA	216,72		216,72
011817 BDC1 ABONN-10/2020	01/01/2021	FA	216,72		216,72
011898 BDC1 ABONN 11/2020	01/01/2021	FA MPF	216,72		216,72
012103 BDC1 ABONN 12/2020	31/01/2021	FA	216,72		216,72
014240 BDC1 ABONN 08/2020	01/01/2022	FA	216,72		216,72
M2020-002/BDC2 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2021 -			2 600,64		2 600,64
012104 ABONN 01/2021	28/02/2021	FA MPF	216,72		216,72
012449 ABONN 02/2021	31/03/2021	FA	216,72		216,72
012480 ABONN 03/21	30/04/2021	FA	216,72		216,72
012739 ABONN 04/2021	31/05/2021	FA	216,72		216,72
013033 ABONN 05/2021	30/06/2021	FA	216,72		216,72
013101 ABONN 06/2021	31/07/2021	FA	216,72		216,72
013244 ABONN 07/2021	31/08/2021	FA MPF	216,72		216,72
1043EC0 ADONN 00/2024	30/09/2021	FA	216,72		216,72
013568 ABONN 08/2021			216 72		216,72
013776 ABONN 09/2021	31/10/2021	FA	216,72		
013776 ABONN 09/2021 014120 ABONN 10/2021	01/01/2022	FA	216,72		216,72
013776 ABONN 09/2021 014120 ABONN 10/2021 014224 ABONN 11/2021	01/01/2022 01/01/2022	FA FA	216,72 216,72		216,72 216,72
013776 ABONN 09/2021 014120 ABONN 10/2021	01/01/2022	FA	216,72		216,72

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		1	_		
* 10.1/	5. 5 .	N. /	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
014786 ABONN 01/2022	28/02/2022	FA	216,72		216,72
014899 ABONN 02-03/2022	31/03/2022	FA	433,44		433,44
M2021-046 Lot 2/BDC2 BDL Lieu ressources réemploi Gardiennage BDL -	20/00/2024	FA 24 F720	1 131,41		1 131,41
013569 AC1	30/09/2021	FA 21-5728	1 131,41		1 131,41
M2021-060 BDL Lieu ressources Réemploi Travaux déconstruction dépose 013853 AC1	22/11/2021	FA 2444077	4 559,50		4 559,50
	23/11/2021	FA 2111077	4 559,50		4 559,50
M2022-006 Diagnostic amiante avant travaux de réhabilitation ex-local 015274 AC1	31/05/2022	FA I6130561	2 151,60 2 151,60		2 151,60 2 151,60
M2023-020/Lot 1/BDC1 Impression lettres d'info et de chantier - IMPRIMERIE	31/03/2022	FA 10130301	2 131,00	1 066,80	1 066,80
020411 AC1	12/03/2024	FA 0103360		1 066,80	1 066,80
M2023-020/Lot 1/BDC10 60% Lettre présentation des permanences Marne-	12/03/2024	FA 0103300		645,12	645,12
022174 SOLDE	19/09/2024	FA 0106180B		645,12	645,12
M2023-020/Lot 1/BDC16 60% Lettre d'information Marne/Soleil décembre 2024		177 01001000		1 280,16	1 280,16
023166 SOLDE	13/12/2024	FA 0107523		1 280,16	1 280,10
M2023-020/Lot 1/BDC6 Concertation Finale Parc - IMPRIMERIE LAPLANTE	13/12/2021	1770207020		233,70	233,70
021042 AC1	30/05/2024	FA 0104579		233,70	233,70
M2023-020/Lot 4/BDC2 Lettres et affiches info travaux - GRAPHI 33	30/03/2024	177 010 4373		268,99	268,99
020307 AC1	07/03/2024	FA		268,99	268,99
M2023-020/Lot 4/BDC3 Lettre information chantier - GRAPHI 33	,,			163,80	163,80
020913 SOLDE	13/05/2024	FA		163,80	163,80
M2023-020/Lot 4/BDC4 Lettre chantier Mérignac Soleil - GRAPHI 33	,			50,40	50,40
021115 AC1	31/05/2024	FA		50,40	50,40
M2023-020/Lot 4/BDC6 Lettre info chantier - Travaux Mirepin - GRAPHI 33	, ,			50,40	50,40
022650 SOLDE	31/10/2024	FA		50,40	50,40
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - ALGA	, ,			8 674,56	8 674,56
021106 AC1	31/05/2024	FA 24-05-70		8 674,56	8 674,56
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX				1 084,32	1 084,32
021061 AC1	28/05/2024	FA F2400026		1 084,32	1 084,32
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE				813,24	813,24
020976 AC1	02/05/2024	FA 171		813,24	813,24
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat°-Animation Parc				845,88	845,88
022162 AC1	29/07/2024	FA 24-07-76		845,88	845,88
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat°-Animation Parc				2 048,16	2 048,16
021353 AC1	26/06/2024	FA F2400032		2 048,16	2 048,16
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat°-Animation Parc				5 346,30	5 346,30
021210 AC1	10/06/2024	FA 177		2 816,22	2 816,22
021356 AC2	26/06/2024	FA 182		2 530,08	2 530,08
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info travaux - DEUX DEGRES				792,79	792,79
020548 AC1	02/04/2024	FA F2400008		792,79	792,79
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info travaux - GARLUCHE				432,43	432,43
020537 AC1	03/04/2024	FA 164		432,43	432,43
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - DEUX				1 198,69	1 198,69
022579 AC1	30/10/2024	FA F2400065		1 198,69	1 198,69
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - GARLUCHE				399,56	399,56
022553 AC1	29/10/2024	FA 196		399,56	399,56
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX				578,30	578,30
021076 AC1	28/05/2024	FA F2400023		578,30	578,30
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE				2 313,22	2 313,22
020973 AC1	02/05/2024	FA 168		2 313,22	2 313,22
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - travaux - DEUX				2 734,90	2 734,90
020546 AC1	02/04/2024	FA F2400010		1 045,05	1 045,05
021062 AC2	28/05/2024	FA F2400027		424,81	424,83
021066 AC3	31/05/2024	FA F2400029		1 265,04	1 265,04
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - travaux -		1		1 693,69	1 693,69
020496 AC1	31/03/2024	FA 161		1 693,69	1 693,69
M2023-025/Lot2/MS2/BDC2 Lot 2 - MS2 / Concertat°-Programmat° Parc		<u> </u>		3 313,20	3 313,20
021073 AC1	31/05/2024	FA 176		3 313,20	3 313,20
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - GARLUCHE	24 /0= /22= :	EA 50.1.5-:-		10,80	10,80
020977 AC1	21/05/2024	FA F2416017		10,80	10,80
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - VAYSSETTES	24 /05 /202 :	EA F2446217		2 700,00	2 700,00
020977 AC1	21/05/2024	FA F2416017		2 700,00	2 700,0
M2023-025/Lot2/MS2/BDC4 Lot 2 - MS2 / Info travaux Ripiano-BDR-				2 530,08	2 530,08
020894 AC1	08/05/2024	FA 173		2 530,08	2 530,0
M2023-025/Lot2/MS2/BDC5 Lot 2 - MS2 / Façades Maison du Projet - DEUX	02/42/22=:	F. FO :00		616,28	616,28
022302 AC1	03/10/2024	FA F2400055		616,28	616,2
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 -	20/10/202	EA 53400353		508,54	508,54
022582 AC1	30/10/2024	FA F2400068		508,54	508,5
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 -				3 153,92	3 153,92

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
022550 AC1	29/10/2024	FA 195	2025	1 743,55	1 743,5
022995 AC2	29/11/2024	FA 209		1 410,37	1 410,3
M2023-038/BDC-SD-2 Suivi photographique et couverture événements 11/23-				3 900,44	3 900,44
020301 AC2	07/03/2024	FA 296_0324		770,00	770,0
020281 AC1	04/03/2024	FA 292_0324		385,00	385,0
021140 AC3	05/06/2024	FA 301-0624		772,70	772,70
021209 AC4	13/06/2024	FA 302_0624		386,93	386,9
021981 AC5	30/08/2024	FA 306-0824		790,79	790,79
022769 AC6	15/11/2024	FA 315-1124		795,02	795,0
M2023-038/BDC-SD-2 Suivi photographique et couverture événements 11/23-	07/02/2024	EA 20C 0224		38,50	38,50
020302 CONTRIBUT° S/AC2	07/03/2024	FA 296_0324		7,70	7,7
020284 CONTRIBUT° S/AC1 021227 CONTRIBUT° S/AC3	05/06/2024	FA 292_0324 FA 301 0624		3,85 7,70	3,8 7,7
021229 CONTRIBUT° 1.1% S/AC4	13/06/2024	FA 302_0624		3,85	3,8
021987 CONTRIBUT° 1.1%/AC5	30/08/2024	FA 306-0824		7,70	7,7
022770 CONTRIBUT° 1.1%/AC6	15/11/2024	FA 315-1124		7,70	7,7
H105 Divers (repro,AAPC,affichage)			2 558,69	1 967,49	4 526,1
19-02844 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			200,69		200,69
008066 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	20,24		20,2
008460 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	0,24		0,2
008922 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	180,21		180,2
20-03405 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			124,42		124,42
009581 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	35,33		35,3
010215 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	5,13		5,1
010561 COMM° GESTION 2TR20 011204 COMM° GESTION 3TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020 FA 01/01/2020	48,68 35,28		48,6 35,2
21-04125 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE	01/10/2020	FA 01/01/2020	375,33		375,33
011888 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21	48,57		48,5
012388 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	49,64		49,6
012941 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	52,53		52,5
013498 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	68,30		68,3
014342 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	156,29		156,2
22-05289 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE			508,46		508,46
014977 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	159,94		159,9
015685 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	183,13		183,1
016270 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	165,39		165,3
23-05973 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE			1 349,79		1 349,79
017126 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	909,30		909,3
017906 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	10,47		10,4
017932 REGUL COMM GESTION 1TR23 018355 COMM GESTION 2TR23	03/04/2023	FA 03/04/23 FA 03/07/23	-3,83 120,18		-3,8 120,1
018893 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 05/07/23 FA 06/10/23	313,67		313,6
24-06926 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE	00/10/2023	17 00/10/23	313,07	1 967,49	1 967,49
019924 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24		593,90	593,9
020628 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24		226,93	226,9
021615 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24		657,25	657,2
022516 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24		489,41	489,4
H106 Contentieux			581,58		581,5
M2021-001 Lot 1/BDC20 Rédaction résiliation contrat OMA - FIDUCIAL LEGAL			581,58		581,58
018158 SOLDE	30/05/2023	FA202302736	581,58		581,5
H107 Autres			695 399,00	192 878,05	888 277,0
2021-065 BDL Lieu ressource réemploi MOE Aménagement locaux - SCOURZIC			11 203,92		11 203,92
015225 SOLDE	27/04/2022	FA 2022-	11 203,92	7 400 34	11 203,9
2023-026 BDR - Alarme anti-intrusion couplée incendie - PRELECT	11/04/2024	EA 240126		7 199,34 7 199,34	7 199,3 4
021960 SOLDE 21-04864 BDL Lieu ressources réemploi Convention occupation-BM 21-25 -	11/04/2024	FA 240136	11 800,00	10 478,00	7 199,3 22 278,0 0
016693 EXERCICE 2022	29/11/2022	FA 10500-2022-	10 200,00	10 470,00	10 200,0
019106 EXERCICE 2023	18/10/2023	TIT 10500-2023-	1 600,00		1 600,0
020174 EXERCICE 2023 BIS	13/02/2024	TITRE 10500-	3-2-,2-0	8 003,00	8 003,0
022465 REDEVANCE 09/24	30/09/2024	T 10500-2024-		825,00	825,0
022904 REDEVANCE 11/24	05/11/2024	TITRE 4170		825,00	825,0
022967 REDEVANCE 10/24	02/10/2024	FA		825,00	825,0
21-04942 BDR Lieu ressources réemploi Conso Electricité - EDF			7 044,89	7 870,48	14 915,3
014373 ABO 11/12/21 - 31/01/22 & MES	09/01/2022	FA	498,96		498,9
014482 ABO + CONTRIBUT° 11/12/21 - 28/02/22	09/02/2022	FA	203,71		203,7
014641 ABO + CONTRIBUT° 11/03/22 - 31/03/22	09/03/2022	FA	187,76		187,7
014919 ABO 04/22 + CONTRIBUT° 08/03/22 - 08/04/22	11/04/2022	FA	203,71		203,7
015113 ABO 05/22 + CONTRIBUT° 08/04/22 - 07/05/22	10/05/2022	FA	198,40		198,4

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
015323 ABO 06/22 + CONTRIBUT° 08/05/22 - 07/06/22	09/06/2022	FA	40,85		40,85
015645 ABO 07/22 + CONTRIBUT° 08/06/22 - 07/07/22	09/07/2022	FA	376,09		376,09
015848 ABO 08/22 + CONTRIBUT° 08/07/22 - 07/08/22	09/08/2022	FA	227,09		227,09
016027 ABO 09/22 + CONTRIBUT° 08/08/22 - 07/09/22	09/09/2022	FA	222,32		222,32
016252 ABO 10/22 + CONTRIBUT° 08/09/22 - 07/10/22	09/10/2022	FA	221,33		221,33
016584 ABO 11/22 + CONTRIBUT° 08/10/22 - 07/11/22	09/11/2022	FA	230,72		230,72
016829 ABO 12/22 + CONTRIBUT° 08/11/22 - 07/12/22	09/12/2022	FA	302,53		302,53
017068 ABONN 01/23+CONTRIBUT° 08/12/22	10/01/2023	FA	317,03		317,03
017921 ABONN 04/23+CONTRIBUT°	09/04/2023	FA	348,24		348,24
017922 ABONN 05/23+CONTRIBUT°	09/05/2023	FA	235,15		235,15
017937 ABONN 02+03/23 +CONTRIBUT°	19/03/2023 09/06/2023	FA FA	910,36		910,36
018234 ABONN 06/23+CONTRIBUT° 018387 ABONN 07/23+CONTRIBUT°	09/00/2023	FA	251,65 243,05		251,65 243,05
018512 ABONN 08/23+CONTRIBU°	09/08/2023	FA	283,22		283,22
018669 ABO 09/23 + CONTRIB°	09/09/2023	FA	246,67		246,67
019022 ABONN 10/23+CONTRIBU°	10/10/2023	FA	263,38		263,38
019256 ABONN 11/23 + CONTRIBU°	09/11/2023	FA	316,86		316,86
019523 ABONNT 12/23	09/12/2023	FA	715,81		715,81
019768 ABONN 01/24	09/01/2024	FA		1 068,13	1 068,13
020371 ABONNT 02/24	09/02/2024	FA		1 352,30	1 352,30
020342 ABONNT 03/24	09/03/2024	FA		1 443,71	1 443,71
020634 ABONNT 04/24	09/04/2024	FA		663,43	663,43
020934 ABONNT 05/24	14/05/2024	FA		314,88	314,88
021237 ABONNT 06/24	09/06/2024	FA		308,12	308,12
021557 ABONNT 07/24	09/07/2024	FA		305,50	305,50
021878 ABONN 08/24 + CONSO	09/08/2024	FA		286,40	286,40
022118 ABONN 09/24 + CONSO 022444 ABONN 10/24	10/09/2024 09/10/2024	FA FA		291,61 157,55	291,61 157,55
022721 ABONN 11/24	09/10/2024	FA		683,20	683,20
023129 ABONN 12/24	10/12/2024	FA		995,65	995,65
22-05126 BDL Lieu ressources réemploi Conso Eau - LYONNAISE DES EAUX	10,12,202		172,02	333,63	172,02
014510 ABO + CONSO 10/12/21 - 31/12/21	17/01/2022	FA	57,90		57,90
015131 ABO + CONSO 01/01/22 - 18/03/22	23/03/2022	FA	97,91		97,91
016152 ABO + CONSO 19/03/22 - 19/09/22	20/09/2022	AV	-28,54		-28,54
017348 CONSO 09/22-12/22	08/02/2023	FA	44,75		44,75
22-05240 BDL Travaux de démolition d'un mur en béton cellulaire - lieu			1 471,00		1 471,00
016286 SOLDE	08/09/2022	FA 2209002	1 471,00		1 471,00
22-05740 BDL - Mise à dispostion de toilettes écologiques provisoires -			783,46		783,46
017304 SOLDE	01/01/2023	FA 2022-12-31-	783,46		783,46
22-05882 BDL Lieu ressources réemploi Changt serrure RM - GERAULT			180,00		180,00
017278 SOLDE	27/01/2023	FA F230156	180,00		180,00
23-06043 BDL - Mise à dispostion de toilettes écologiques provisoires - mi 11.22	04 /04 /2022	EA 2022 42 24	679,28		679,28
017370 AC1 017374 SOLDE	01/01/2023 30/01/2023	FA 2022-12-31- FA 2023-01-30-	389,61 289,67		389,61 289,67
23-06109 BDR Assurance DO sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)	30/01/2023	FA 2023-01-30-	6 063,30		6 063,30
017482 ASS DO BDR	10/02/2023	GFG2023/S/00	6 063,30		6 063,30
23-06110 BDR Assurance TRC sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)	10/02/2023	G1 G2023/3/00	3 214,40		3 214,40
017483 ASS TRC BDR	10/02/2023	FA	2 729,30		2 729,30
018532 COMP	22/08/2023	FA	485,10		485,10
23-06113 BDR Nettoyage sanitaires - ANDY NETT 33	<u> </u>		245,18		245,18
017828 SOLDE	25/04/2023	FA F2023-0202	245,18		245,18
23-06196 BDR Nettoyage sanitaires- complément de prestation - ANDY NETT 33			18,00		18,00
017829 SOLDE	25/04/2023	F2023-0202	18,00		18,00
23-06420 BDR - Dératisation du site - BUGS 3D			420,00	848,40	1 268,40
018407 AC1	26/07/2023	F33-23-00558	210,00		210,00
019053 AC2	25/10/2023	FA F33-23-	210,00	_	210,00
020181 AC3 02/24	25/01/2024	FA F33-24-		210,00	210,00
020476 AC4- DOUBLON AC3	25/01/2024	FA F33-24-		210,00	210,00
023200 AC4 - REGUL DOUBLON AC3 023199 AC4 04/24	18/12/2024 25/04/2024	FA F33-24-		-210,00 210,00	-210,00 210,00
023201 AC5 09/24	06/09/2024	FA F33-24-		210,00	210,00
023082 SOLDE 11/24	07/11/2024	FA F33-24-		214,20	214,20
23-06561 BDR Nettoyage fin de chantier - ANDY NETT 33	0., 11, 2027	33 2-7		947,28	947,28
019737 SOLDE	01/01/2024	FA F2023-0734		947,28	947,28
23-06640 [BDR] travaux étanchéité toiture - AVENIR ETANCHEITE			1 032,00	2 ,20	1 032,00
019433 SOLDE	24/11/2023	FA 12504-23	1 032,00		1 032,00
	1		100.10		100 10
23-06766 Plateaux repas - Déjeuners de travail 2023 - CLASS CROUTE			188,10	I	188,10

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		1	A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
24-06835 [BDR] Nettoyage fin de chantier - YULIYANOV KALOYAN	Date Factore	Numero	2023	1 008,00	1 008,00
020153 SOLDE	19/02/2024	FA 33000		1 008,00	1 008,00
24-06886 [BDR] Petits-déjs de travail 2024 / Banque territoires (France 2030) -	15,02,202			188,10	188,10
019949 AC1	30/01/2024	F2056-		188,10	188,10
24-06940 [BDR] Abonnement carte SIM alarme - SFR FIBRE				59,88	59,88
24-06940 Avance	01/02/2024			4,99	4,99
24-06940 Avance	01/02/2024			-4,99	-4,99
019797 ABONN 01/24	01/01/2024	FA B523-		4,99	4,99
020507 ABONN 02/24	28/01/2024	FA B524-			
020508 ABONN 03/24	28/02/2024	FA B524-		4,99	4,99
020743 ABONN 04/24	28/03/2024	FA B524-		4,99	4,99
020812 ABONN 05/24	28/04/2024	FA B524-		4,99	4,99
021406 ABONN 06/24	28/05/2024	FA B524-		4,99	4,99
021407 ABONN 07/24	28/06/2024	FA B524-		4,99	4,99
022072 ABONN 08/24	28/07/2024	FA B524-		4,99	4,99
022073 ABONN 09/24	28/08/2024	FA B524-		4,99	4,99
022250 ABONN 10/24	28/09/2024	FA B524-		9,98	9,98
022801 ABONN 11/24	28/10/2024	FA B524-		4,99	4,99
023214 ABONN 12/24	28/11/2024	FA B524-		4,99	4,99
24-07259 [BDR] Enlevement des déchets - PENA ENVIRONNEMENT	04 /02 /25 - :	FA 4=000		574,80	574,80
022319 AC1- ERREUR SAISIE	01/09/2024	FA 17862		296,40	296,40
022320 AC2	30/09/2024	FA 17864		296,40	296,40
022445 AC1- REGUL ERREUR SAISIE	01/09/2024	FA 17862		-296,40	-296,40
022446 AC1	01/09/2024	FA17862		138,00	138,00
022654 AC3	31/10/2024	FA 19199		140,40	140,40
24-07271 [BDR] Remplacement panneau vitré cassé - MIROITERIE SUD OUEST	12/05/2024			4 889,79	4 889,79
24-07271 Avance 021358 AC1	12/06/2024 25/06/2024	FA F24060152		2 444,90	2 444,90
021848 SOLDE		FA F24080032		2 444 90	2 444,89
24-07275 Plateaux-repas : Déjeuner-travail du 18-06-2024 - CLASS CROUTE	07/08/2024	FA F24080032		2 444,89 230,70	230,70
021330 AC1	18/06/2024	FA 2056-		230,70	230,70
24-07320 [BDR] Pose d'un rideau dans l'ERP - OFFICINE REEMPLOI	10/00/2024	1 A 2030		660,00	660,00
021465 SOLDE	04/07/2024	FA		660,00	660,00
24-07324 [BDR] Nettoyage extérieur - MEDI-PEINTURE	04/07/2024			2 280,00	2 280,00
021516 SOLDE	28/06/2024	FA 4488		2 280,00	2 280,00
24-07332 [BDR] Travaux d'enduit - LEAL CONCEPT&RENOVATION				1 176,00	1 176,00
021508 SOLDE	09/07/2024	FA 1113		1 176,00	1 176,00
24-07480 [BDR] Petit-déjeuner réunion prépa Copro du 20/09/2024 - CLASS				76,90	76,90
022181 AC1	20/09/2024	FA F2056-		76,90	76,90
24-07727 [BDR] F&P prise chauffage ERP - ENELEC				2 650,32	2 650,32
023076 SOLDE	05/12/2024	FA 24-12-0552-		2 650,32	2 650,32
M2017-025/BDC36 BDL Lieu ressources réemploi Diagnostic amiante - AED			582,32		582,32
013951 AC1	01/01/2022	FA 218777	582,32		582,32
M2017-025/BDC38 BDL Lieu ressources réemploi Diagnostic amiante - location			108,00		108,00
014480 SOLDE	14/02/2022	FA - 220429	108,00		108,00
M2019-023/BDC12 Reportage photographique - aménégements de la base du				550,00	550,00
019592 AC1	01/01/2024	FA 287-1223		550,00	550,00
M2019-023/BDC12 Reportage photographique - aménégements de la base du				5,50	5,50
019678 AC1	01/01/2024	FA 287-1223		5,50	5,50
M2019-030 Lot 2/BDC29 BDR Production et pose 2 Panneaux PC - MIPP			120,00	22,92	142,92
017244 BDC29 AC1	26/01/2023	FA 230187	120,00		120,00
021288 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC29		22,92	22,92
M2019-034 Lot 1/BDC73 BDL Dépôt permis réhabilitation 28av de la Somme	1		1 656,84		1 656,84
015302 AC1	31/05/2022	FA FC17511	1 656,84		1 656,84
M2019-066/BDC20 Rédaction d'une charte des usagers de la Base du Réemploi			3 963,60	687,00	4 650,60
017408 AC1	27/02/2023	FA 23-019-012	3 963,60		3 963,60
020112 AC2 SOLDE	19/02/2024	FA 24-019-010	2 4 - 2 - 2 - 2	687,00	687,00
M2020-071bis/BDC 7 SOLEIL BDL Lieu ressources réemploi Sécurisation	20/05/2022	FA	2 412,38		2 412,38
015617 AC1-09/21-03/22	30/06/2022	FA	2 412,38		2 412,38
M2021-046 Lot 1/BDC21 BDL Lieu ressources réemploi Sécurisation - VPSITEX	17/11/2022	EA	1 734,92		1 734,92
016627 BDC21-AC1	17/11/2022	FA	1 533,97		1 533,97
017010 BDC21-AC2 M2021-061 BDL Lieu ressources réemploi AMO Mise aux normes - BUREAU	01/01/2023	FA	200,95 4 542,00		200,95 4 542,00
014308 AC1	24/01/2022	FA 22000550	3 210,00		3 210,00
014642 AC2	09/03/2022	FA 22000550 FA 22002159	1 332,00		1 332,00
M2022-017 BDR_ Mission de CSPS niveau 3 - DEKRA	03,03,2022		3 072,99	145,72	3 218,71
=	22/05/2022	FA I6165469	588,24	143,72	588,24
015539 AC1	23/06/2022				

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
016465 AC3	24/10/2022	FA 16380985	157,25	202 .	157,25
016773 AC4	01/01/2023	FA I6418955	159,26		159,26
016960 AC5	01/01/2023	FA 16523955	157,68		157,68
017059 AC6	12/01/2023	FA 16553278	158,26		158,26
017481 AC7	27/02/2023	FA I6634318	159,11		159,11
017538 AC8	08/03/2023	FA 16655529	159,12		159,12
018144 AC9	09/06/2023	FA 16818705	160,85		160,85
019242 AC10	15/11/2023	FA I7111018	1 212,31		1 212,31
020400 SOLDE	11/03/2024	FA 17334493		145,72	145,72
M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de	06/00/2022		15 897,06	17 379,19	33 276,25
M2022-020/Lot 00 Avance M2022-020/Lot 00 Avance	06/09/2022			2,70 -2,70	2,70 -2,70
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	10 968,55	-2,70	10 968,55
017176 REGUL TVA/AC1	01/01/2023	AC1	10 300,33		10 300,33
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	4 859,87		4 859,87
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	68,64		68,64
020014 AC5 01/24	28/01/2024	FA 20230381		5 043,94	5 043,94
020460 AC6 01/24	25/03/2024	FA		32,90	32,90
020799 AC7 02/24	29/04/2024	FA		2,70	2,70
021956 AC8 SOLDE	28/08/2024	FA		12 299,65	12 299,65
M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de			15 096,00	2 700,00	17 796,00
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	5 413,50		5 413,50
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	5 634,00		5 634,00
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	4 048,50		4 048,50
020013 AC4 12/23	01/01/2024	AC4		1 080,00	1 080,00
020460 AC6 01/24	25/03/2024	FA		1 080,00	1 080,00
020799 AC7 02/24	29/04/2024	FA	14 579 40	540,00 7 330 36	540,00
M2022-020/Lot 01 BDR Lot 01 Démolition - BDL Lieu Ressources - travaux de 016099 AC1 09/22	20/09/2022	FA FD00338	14 578,40 5 661,33	7 330,26	21 908,66 5 661,33
018828 AC2 09/23	29/09/2023	FA FA01070	8 917,07		8 917,07
020447 AC3 02/24	25/03/2024	FA FA01038	8 917,07	7 330,26	7 330,26
022023 AC4 DGD	04/09/2024	DGD		22,84	22,84
023686 ANNUL AC4	04/09/2024	DGD		-22,84	-22,84
M2022-020/Lot 02 BDR Lot 02 Gros-oeuvre - BDL Lieu Ressources - travaux de			47 171,20	514,69	47 685,89
017835 AC1- 04/23	27/04/2023	FD00364	10 533,83	-	10 533,83
017965 AC2- 04/23	27/04/2023	FD00365	15 296,36		15 296,36
018221 AC3 06/23	30/06/2023	FA FA01046	3 098,42		3 098,42
018220 AC4 06/23	30/06/2023	FA FD00371	6 817,57		6 817,57
019389 AC5 11/23	30/11/2023	FA FA01075	11 425,02		11 425,02
021517 AC6 SOLDE	03/07/2024	FA 1149		514,69	514,69
M2022-020/Lot 03 BDR Lot 03 Charpente - BDL Lieu Ressources - travaux de	/0=/222		924,48	5 911,26	6 835,74
018398 AC1 06/23	11/07/2023	FA	924,48	5.044.26	924,48
021494 SOLDE 02/24	08/07/2024	FA	20.002.40	5 911,26	5 911,26
M2022-020/Lot 04 BDR Lot 04 Menuiserie extérieure ALU - BDL Lieu Ressources - 017334 AC1 12/22	01/01/2023	F-12.22.098-	30 083,49 12 172,48	13 531,14	43 614,63 12 172,48
017534 ACI 12/22 018542 AC2 07/23	18/07/2023	FA F-07.23.065	17 911,01		17 911,01
019728 AC3 12/23	01/01/2024	FA F-12.23.138	17 511,01	3 539,66	3 539,66
020800 AC4 02/24	29/04/2024	FA 12.23.130		6 705,58	6 705,58
021414 AC5 02/24	31/05/2024	F0524052		3 285,90	3 285,90
M2022-020/Lot 05 BDR Lot 05 Plomberie-Sanitaires - BDL Lieu Ressources -	,		29 632,52	486,76	30 119,28
017335 01/23	25/01/2023	AC1-	8 955,11	, 1	8 955,11
018998 AC2 02/23	20/10/2023	FA 204516	13 369,44		13 369,44
018999 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205103	6 463,10		6 463,10
019124 AC4 09/23	02/11/2023	Lot 05_EA_04	844,87		844,87
020787 SOLDE	29/03/2024	FA		486,76	486,76
M2022-020/Lot 06 BDR Lot 06 Ventilation - BDL Lieu Ressources - travaux de			44 223,58	7 020,68	51 244,26
016430 AC1- 10/22	28/10/2022	FA 203894	30 506,80		30 506,80
017587 01/23	31/01/2023	AC2	4 105,86		4 105,86
019000 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205104	9 610,92	2.255.45	9 610,92
020790 AC4 03/24	29/04/2024	FA		2 256,44	2 256,44
020792 AC5 03/24 M2022-020/Lot 07 RDR Lot 07 Electricité - RDL Lieu Ressources - travaux de	29/04/2024	IA	12/ /50 00	4 764,24 14 384 10	4 764,24 148 852,18
M2022-020/Lot 07 BDR Lot 07 Electricité - BDL Lieu Ressources - travaux de 016822 AC1-11/22	01/01/2023	FA 22.11.0321	134 468,08 25 820,29	14 384,10	25 820,29
017181 AC2-12/22	30/12/2022	FAC819838830	3 984,94		3 984,94
017206 AC3-01/23	30/12/2022	FA 304194378	15 774,56		15 774,56
018035 AC4 05/23	19/05/2023	FA 23050706	31 528,15		31 528,15
018033 AC4 03/23					,-0
018952 AC5 09/23	30/09/2023	F23-09-0222	46 372,56		46 372,56

Description				Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
Delie Parkane Number 2023 229 220 22			1	A fin	A fin	A fin
0.1990 A. 7. 10/12	Intitulé	Date Facture	Numéro			
202793 AC 9300F 228795 NUMU AC 9 2400/22021 24				2020	-	6 811,51
202393 AFAID ASSISTED ASSIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ ' '				7 572,59
MX202-200/Q10 08 BIR Lot Bill Deleter Sesources : troveus de 101755 AC 2 101755 AC 3 101757 AC 409774 101755 AC 3 101755 AC 3 101757 AC 409774 101755 AC 3 101755			DGD			29,42
101575 AC II 101558 AC II 101559 AC II 10155	023685 ANNUL AC9	24/09/2024	DGD		-29,42	-29,4
017558 AC 2 030898 AC 3107/32 030849 AC 1007/32 030859 AC 1007/32	M2022-020/Lot 08 BDR Lot 08 Désenfumage - BDL Lieu Ressources - travaux de			12 887,40	1 307,09	14 194,49
1889 Act 30/73	016756 AC1	23/11/2022	FA F2202095	9 290,77		9 290,7
2020084 AC 400/74 2020085 SCAIDE 310/20204 AF 24001938 51.00 50.00	017553 AC2	31/01/2023	FA F2300207	2 579,71		2 579,7
200515 SOLDE	018982 AC3 10/23	18/10/2023	FA F2302484	1 016,92		1 016,92
M2022 C00/Oct 10 BOR Lot 09 - Clokens - doublege - plefond - Solution - BOL BIRGIN ACT 107/3 10 18593 ACT 207/3 10 18593 ACT 107/3 10 18593 ACT 10	020446 AC4 03/24	+ ' '	FA F2400195B		616,38	616,38
1989 ACT (1973 3095 2023		31/03/2024	FA F2400642		690,71	690,7
138581 ACZ 107/23 30/09/2023 FA FADIOSS 40 696,93 40 096,93 50 19379 ACZ 107/23 30/09/2023 FADIOT7 55 592,86 55 9 10 19379 ACZ 11/23 70/09/2023 70/09/	• • •					143 622,22
1910F76 AC 310/73	·					15 211,5:
101373 Act 131/23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ ' '				40 696,93
M0021-200/Lot 10 BDR Lot 10 Menuiseries intérieures - BDL Lieu Ressources - 11/07/2023 FA 19 546/90 19 55 01953 AC 110/2023 FA 19 546/90 19 50 01953 AC 110/2023 FA 19 546/90 19 50 01953 AC 110/2023 FA 19 546/90 19 50 01953 AC 110/2024 FA 19 546/90 19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					55 952,86
1980 ACT 106723 1107/2023 FA 6560,80 65 65 65 65 65 65 65 6		30/11/2023	FA01083	,	22.000.00	31 760,92
101912 ACZ 1010203 101915 ACZ 10		11/07/2022	EA		22 069,00	65 867,34 19 546,90
2019317 ACC 3 L1/23	*	<u> </u>				6 566,08
2007878 ACC 104724 2004/2024 FA	·	+ ' '				17 685,36
03/07/2024 F.A.	·	+ ' '	-	17 003,30	13 524 60	13 524,60
MR022-020/Lot 11 BDR Lot 11 Cloisons BDL Lieu Ressources - travaux de 14/03/2023 FA 73 44,80 73 344,80 73 013823 AC2 06/23 11/07/2023 FA 2023071201 77 343,81 29 674,06 29 67 021496 50/24 70 12496 50/24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>				8 544,40
1017866 ACL 03/23	•	03,37,2024		15 088.11		44 762,17
108232A ACZ 06/23 1/07/2023 FA 202301201 7 743,31 2 77 70 1496 02/24 SOLDE FA 20 61/100	·	14/03/2023	FA		25 67 1,00	7 344,80
D21496 D2724 SQLDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			7 743,31
MARDIZA-200/Lot 12 BDR Lot 12 Carrelage - BDL Lieu Ressources - travaux de	<u> </u>	1 1		11.0,02	29 674.06	29 674,06
0.19155 ACL 11/23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,,				3 398,65
M2022-020/Lot 13 BDR Lot 13 Peinture de sol - BDL Lieu Ressources - travaux de 021497 SOIDE 88/06/2024 FA 4486 7125,07 7.125,07 7		01/01/2024	FA 4222		3 105,96	3 105,96
22,002,002,002,003,003,003,003,003,003,0	021498 SOLDE	28/06/2024	FA 4487		292,69	292,69
M2022-020/tot 14 BDR Lot 14 Bandes signalétiques - BDL Lieu Ressources 24/11/2023 FA F230063 9855,77 9855,77 98	M2022-020/Lot 13 BDR Lot 13 Peinture de sol - BDL Lieu Ressources - travaux de				7 125,07	7 125,07
19465 ACI 11/23	021497 SOLDE	28/06/2024	FA 4486		7 125,07	7 125,07
23/04/2024 FA Section Sectio	M2022-020/Lot 14 BDR Lot 14 Bandes signalétiques - BDL Lieu Ressources -			9 855,77	9 855,77	19 711,54
M2022-023 BDL MOE Lieu ressource - SCOURZIC ORIANNE 29/09/2022 Fa 2022- 5.562,03 5.56 5.	019465 AC1 11/23	24/11/2023	FA F230063	9 855,77		9 855,77
1016175 AC1	020794 AC2 04/24	23/04/2024	FA		9 855,77	9 855,77
1016448 AC2	M2022-023 BDL MOE Lieu resssource - SCOURZIC ORIANNE			52 001,78	6 645,20	58 646,98
1016714 AC3 30/11/2022 FA 2022-			-			5 562,03
1016921 AC4						5 763,31
17179 ACS 27/01/2023		+ ' '				4 185,70
02/03/2023 FA 2023- 4 19,42 4 1 01/656 AC7 28/03/2023 FA 2023- 3 024,82 3 0 01/07827 AC8 25/04/2023 FA 2023- 3 024,82 3 0 01/08041 AC9 30/05/2023 FA 2023- 2 140,84 2 1 018197 AC10 27/06/2023 FA 2023- 2 857,27 2 8 019005 AC11 20/10/2023 FA 2023- 2 857,27 2 8 019005 AC11 20/10/2023 FA 2023- 2 981,87 2 2 0199200 AC12 13/11/2023 FA 2023- 2 981,87 2 2 0195800 AC13 11/12/2023 FA 2023- 2 988,02 2 020753 SOLDE 26/04/2024 FA 2023- 2 988,02 2 020753 SOLDE 26/04/2024 FA 2023- 2 988,02 2 020753 SOLDE 26/04/2024 FA 2024- 6 6 645,20 6 6 02022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi - 4 102,56 41 015192 SOLDE 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 41 0165192 SOLDE 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 41 016642 AC2 22/11/2022 FA 1992,00 996,00 996,00 996,00 16642 AC2 22/11/2022 FA 1992,00 16730 AC3 10/10/12023 FA 1494,00 144 017283 AC4 07/02/2023 FA 1494,00 144 017515 AC5 07/03/2023 FA 1494,00 144 017515 AC5 07/03/2024 FA 1494,00 144 017515 AC5 07/03/						4 153,02
1017658 AC7		1				5 528,16
17827 AC8				-		4 190,42
1018041 AC9 30/05/2023 FA 2023- 2 140,84 2 1						3 024,82
18197 AC10 27/06/2023 FA2023- 2.857,27 2.85 2.85 2.95 2.		+ ' '				3 909,12 2 140,84
19005 AC11						2 857,27
13/11/2023 FA 2023- 2 981,87 2 9 019580 AC13 11/12/2023 FA 2023- 2 988,02 2 9 020753 SOLDE 26/04/2024 FA 2024- 6 645,20 6 6 M2022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi- 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 41 015192 SOLDE 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 41 08/11/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 996,00 996,0						4 717,20
11/12/2023 FA 2023- 2 988,02 2 9 020753 SOLDE 26/04/2024 FA 2024- 6 645,20 6 6 M2022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi - 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 4 1 M2022-038 BDL - Mission Contrôleur Technique - APAVE 8 964,00 996,00 996 016564 AC1 08/11/2022 FA 996,00 996,00 996 016642 AC2 22/11/2022 FA 1992,00 19 016730 AC3 01/01/2023 FA 1494,00 14 017283 AC4 07/02/2023 FA 1494,00 14 017515 AC5 07/03/2023 FO4023002546 1 494,00 14 017515 AC5 07/03/2023 FA 1494,00 14 017528 AC7 15/07/2024 FA 1494,00 14 021558 AC7 15/07/2024 FA 1494,00 14 021558 AC7 15/07/2024 FA 1995,00 99 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10295,41						2 981,83
26/04/2024 FA 2024- FA 2024- 6 645,20 6 645,2		<u> </u>		-		2 988,02
M2022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi - 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 4 11 015192 SOLDE 24/05/2022 FA 22.05.0772- 4 102,56 4 1 M2022-038 BDL - Mission Contrôleur Technique - APAVE 8 964,00 996,00 99 016564 AC1 08/11/2022 FA 996,00 9 016642 AC2 22/11/2022 FA 1 992,00 1 9 016730 AC3 01/01/2023 FA 1 494,00 1 4 017283 AC4 07/02/2023 FA 1 494,00 1 4 017754 AC6 07/03/2023 F04023002546 1 494,00 1 4 017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 1 4 021558 AC7 15/07/2024 FA 1 996,00 9 018274 AC1 06/23 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 FA 1 995,01 9 018274 AC1 06/23 70/07/2024 FA 10 295,41 10 25 018274 AC1 06/23 70/07/2023 FAFAC001381 10 295,41				2 300,02	6 645 20	6 645,20
Dispay		20/01/2021		4 102.56	0 0 13,20	4 102,56
M2022-038 BDL - Mission Contrôleur Technique - APAVE 8 964,00 996,00 9 96 016564 AC1 08/11/2022 FA 996,00 9 016642 AC2 22/11/2022 FA 1 992,00 19 016730 AC3 01/01/2023 FA 1 494,00 14 017283 AC4 07/02/2023 FA 1 494,00 14 017515 AC5 07/03/2023 F04023002546 1 494,00 14 017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 14 021558 AC7 15/07/2024 FA 1 996,00 9 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 29 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 598,62 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022	<u> </u>	24/05/2022	FA 22.05.0772-			4 102,56
016564 AC1 08/11/2022 FA 996,00 9 016642 AC2 22/11/2022 FA 1 992,00 1 9 016730 AC3 01/01/2023 FA 1 494,00 1 4 017283 AC4 07/02/2023 FA 1 494,00 1 4 017515 AC5 07/03/2023 FO4023002546 1 494,00 1 4 017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 1 4 021558 AC7 15/07/2024 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 70/04/2023 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 70/07/2024 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 70/07/2024 FA 1 494,00 1 4 018274 AC1 06/23 70/07/2024 FA 1 494,00 9 6,00 9 018274 AC1 06/23 70/07/2024 FA 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 10 295,41 <td></td> <td>,</td> <td>1 22</td> <td></td> <td>996,00</td> <td>9 960,00</td>		,	1 22		996,00	9 960,00
22/11/2022 FA 1992,00 19	·	08/11/2022	FA	-	,	996,00
016730 AC3 01/01/2023 FA 1 494,00 1 4 017283 AC4 07/02/2023 FA 1 494,00 1 4 017515 AC5 07/03/2023 FO4023002546 1 494,00 1 4 017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 1 4 021558 AC7 15/07/2024 FA 1 494,00 9 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 295,41 10 25 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2		22/11/2022				1 992,00
017515 ACS 07/03/2023 F04023002546 1 494,00 1 4 017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 1 4 021558 AC7 15/07/2024 FA 1 494,00 9 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 295,41 10 29 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 29 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2						1 494,00
017754 AC6 07/04/2023 FA 1 494,00 1 4 021558 AC7 15/07/2024 FA 996,00 9 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 295,41 10 2 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 369 094,22 49 982,40 419 0 USUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0	017283 AC4	07/02/2023	FA	1 494,00		1 494,00
021558 AC7 15/07/2024 FA 996,00 9 M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 25 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2	017515 AC5	07/03/2023	F04023002546	1 494,00		1 494,00
M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP 10 295,41 10 29 018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2	017754 AC6	07/04/2023	FA	1 494,00		1 494,00
018274 AC1 06/23 07/07/2023 FAFAC001381 10 295,41 10 2 2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 00 U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 00 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2	021558 AC7	15/07/2024	FA		996,00	996,00
2 RECETTES 29 787 960,07 8 952 623,71 38 740 58 U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2				10 295,41		10 295,41
U SUBVENTIONS 369 094,22 49 982,40 419 0 U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 598,62 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 507/02/22 5 275,62 5 2	018274 AC1 06/23	07/07/2023	FAFAC001381	10 295,41		10 295,41
U101 Subventions 369 094,22 49 982,40 419 0 22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 59 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 \$07/02/22 5 275,62 5 2						38 740 583,78
22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME 6 598,62 6 598,62 22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 S07/02/22 5 275,62 5 2						419 076,62
22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE 07/02/2022 FA 07/02/22 1 323,00 1 3 23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 \$07/02/22 5 275,62 5 2				-	49 982,40	419 076,62
23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE 07/02/2022 S07/02/22 5 275,62 5 2	<u> </u>		1			6 598,62
						1 323,0
22-05898 Subvention ADEME 3R 2022 Lieu Ressource (part Travaux) - ADEME 12 495,60 49 982,40 62 47		07/02/2022	507/02/22			5 275,62
22-39484 SUBV 3R 2022 LIEU RESSOURCE 20% 05/12/2022 AC1 12 495,60 12 4			1		49 982,40	62 478,00 12 495,60

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
23-40412 SUBV 3R 2022 BDR TRAVAUX	05/12/2022	S5/12/22		49 982,40	49 982,40
23-06645 Subvention FRANCE 2030 Reversement - BORDEAUX METROPOLE		,	350 000,00	, ,	350 000,00
23-44624 REVERSEMENT AC1 FRANCE 2030	01/11/2023	C0010 APF01	350 000,00		350 000,0
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			29 380 000,00	8 800 000,00	38 180 000,0
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			470 000,00	600 000,00	1 070 000,0
19-02728 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			470 000,00	600 000,00	1 070 000,00
19-19054 AC1 PART° EQUILIBRE 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	70 000,00		70 000,0
21-32145 AC2 PART® EQUILIBRE 2021	30/09/2021	FA 30/09/21	200 000,00		200 000,0
22-37899 AC3 PART° EQUILIBRE 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	200 000,00	300 000 00	200 000,0
23-41135 AC5 PART° EQUILIBRE 2023 24-50622 AC6 PART° EQUILIBRE 2024	21/03/2023	FA 21/03/23 FA 23/07/24		200 000,00 400 000,00	200 000,00 400 000,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage	23/07/2024	TA 23/01/24	28 910 000,00	8 200 000,00	37 110 000,0
19-02729 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			28 910 000,00	8 200 000,00	37 110 000,00
19-19055 AC1- CRF 2017 PART° 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	3 110 000,00	,	3 110 000,0
21-32144 AC2- CRF 2017 PART°2021	30/09/2021	FA 30/09/21	8 400 000,00		8 400 000,0
22-37900 AC3 PART° RO 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	8 200 000,00		8 200 000,0
23-41133 AC4 PART° RO 2023	21/03/2023	FA 21/03/23	9 200 000,00		9 200 000,0
24-50687 AC7 PART° RO 2024	06/08/2024	FA 6/08/24		8 200 000,00	8 200 000,0
X PRODUITS DIVERS			38 865,85	102 641,31	141 507,1
X101 Loyers				25 326,67	25 326,6
24-07507 Redevance + charges MAIF - MAIF	02/12/2	FA 2021 ::=		25 326,67	25 326,67
24-51403 REDVCE PROV CHARGES 1/09-31/12/24	02/10/2024	FA 2024-117-		25 326,66	25 326,6
24-51985 ECART DE RGT/ FA 2024-117 24-51461 REDVCE PROV CHGES 1/09-31/12/24	28/10/2024 02/10/2024	FA 2024-117 FA 2024-118-		0,01 11 652,77	0,01 11 652,7
24-51461 REDVCE PROV CHGES 1/09-31/12/24 24-52501 AVOIR/ REDVCE FA 2024-118	25/11/2024	FA 2024-118- FA 2024-159-		-11 652,77	-11 652,7
X102 Refacturations	23/11/2024	1A 2024-139-	26 086,98	13 214,98	39 301,9
20-03492 Refacturation des charges MDP Mérignac - LEON A VELO			23 477,30	10 11 1,00	23 477,30
20-23538 CHARGES 1TR2020	01/02/2020	FA 2020-26-	1 818,29		1 818,2
20-24218 CHARGE 2EME T 2020	01/04/2020	FA2020-34-	1 818,29		1 818,2
20-25239 CHARGES 4TR2019	12/06/2020	FA 2020 45	1 304,42		1 304,4
20-25558 CHARGES 3TR 2020	01/07/2020	FA 2020 53	1 818,29		1 818,2
20-26751 CHARGES 4TR 2020	01/10/2020	FA 2020 71	1 818,29		1 818,2
20-27050 REGULARISATION ELEC + EAU 2019	05/10/2020	FA2020-73-	4 028,93		4 028,9
21-28870 CHARGES 1ER TR 2021	01/01/2021	FA 2021 05	888,65		888,6
21-29521 CHARGES 2EME TR 2021	01/04/2021	FA 2021 21	1 818,29		1 818,2
21-29649 ECART DE REGLEMENT	11/03/2021	FA 2021-05-	-0,01		-0,0
21-29886 REFACTURATION 09/19-04/21	03/05/2021 24/03/2022	FA 2021 26 FA 2022-32-	1 517,04 5 454,86		1 517,0 5 454,8
22-35431 CHARGES 3TR21 ; 4TR21 ; 1TR22 22-35465 REFACTURATION 05/21-03/22	24/03/2022	FA 2022-32-	1 191,96		1 191,9
23-40870 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-	1 552,00		1 552,0
23-41426 ANNUL APPEL PROVISION	01/04/2023	FA 23-055	-1 552,00		-1 552,0
23-06097 Refacturation des charges MDP Mérignac - COMPAGNONS			1 694,00	4 724,12	6 418,12
23-40871 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-	1 694,00		1 694,0
23-45104 APPEL A PROVISION 01/05/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-136		4 517,00	4 517,0
24-49241 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-42-		-6 211,00	-6 211,0
24-49242 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-42-		6 418,12	6 418,1
23-06202 Refacturation charges MDP Mérignac - R-USE			186,24	165,46	351,70
23-41459 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-056	93,12		93,1
23-41938 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-075	93,12		93,1
23-45106 APPEL A PROVISION 01/08/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-137		155,20	155,2
24-49203 REGUL APPEL A PROV 2023 24-49212 CHARGES 2023	17/04/2024 17/04/2024	FA 2024-39- FA 2024-39-		-341,44 351,70	-341,4 351,7
23-06203 Refacturation charges MDP Mérignac - OFFICINE REEMPLOI	17,04,2024	1 7 2024-33-	729,44	2 025,53	2 754,97
23-41468 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-057	729,44	2 023,33	729,4
23-41939 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-076	. 25,44	729,44	729,4
23-45107 APPEL A PROVISION 01/08/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-138		1 215,73	1 215,7
24-49243 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-40-		-2 674,61	-2 674,6
24-49244 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-40-		2 754,97	2 754,9
23-06204 Refacturation charges MDP Mérignac - M.D 85				2 754,97	2 754,9
23-41469 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-058		729,44	729,4
23-41940 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-077		729,44	729,4
23-45108 APPEL A PROVISION 01/05/23 à 31/12/23	01/12/2023	FA2023-139		1 215,73	1 215,7
24-49247 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-41-		-2 674,61	-2 674,6
24-49249 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-41-		2 754,97	2 754,9
		1	1	2 444,90	2 444,90
24-07381 Refacturation 50% vitrerie BDR - EUROVIA GIRONDE	00/00/000	EA 2024 121			2
24-07381 Refacturation 50% vitrerie BDR - EUROVIA GIRONDE 24-50671 REFACT 50% VITRERIE BDR 24-07507 Redevance + charges MAIF - MAIF	08/08/2024	FA 2024-101-		2 444,90 1 100,00	2 444,9 1 100,0 0

			Dániá ausa TTC	Dániá TTC	Dániá aum TTC
		T	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
7.17.17	Data Fastana	N (A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
24-51461 REDVCE PROV CHGES 1/09-31/12/24 24-52501 AVOIR/ REDVCE FA 2024-118	02/10/2024 25/11/2024	FA 2024-118- FA 2024-159-		-666,67	-666,67 -666,67
X201 Produits financiers	23/11/2024	TA 2024-133-	12 778,87	64 099,66	76 878,53
19-02987 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			1 603,22	04 033,00	1 603,22
19-20550 REM° CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	683,83		683,83
19-20560 REGUL REM° CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	-50,00		-50,00
19-21760 REM° CPTE COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	969,39		969,39
19-23043 REGUL C/C REM CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	-633,83		-633,83
19-23044 REGUL C/C REM CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	633,83		633,83
20-03412 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			2 592,28		2 592,28
20-23256 REM° CPTE COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	767,28		767,28
20-24905 REM° CPTE COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	697,43		697,43
20-25713 REM° CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	599,11		599,11
20-27169 REM° CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	528,46		528,46
21-04133 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE			2 400,29		2 400,29
21-28552 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	368,19		368,19
21-29759 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	369,63		369,63
21-30910 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	245,68		245,68
21-32219 INTERETS CREDITEURS 3TR21 22-34293 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	118,58		118,58
22-34293 INTERETS CREDITEURS 4TR21 22-34403 ANNUL INT CRED 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22 FA 01/01/22	1 462,19 -1 462,19		1 462,19 -1 462,19
22-34404 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 298,21		1 298,21
22-05279 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE	01/01/2022	TA 01/01/22	2 540,58		2 540,58
22-35805 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	1 243,18		1 243.18
22-36950 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	828,27		828,27
22-38163 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	469,13		469,13
23-05980 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE		, ,	3 642,50		3 642,50
23-40034 INTERETS CREDITEURS 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	848,05		848,05
23-41723 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	1 012,89		1 012,89
23-42927 INTERETS CREDITEURS 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	849,63		849,63
23-44029 INTERETS CREDITEURS 3TR3	06/10/2023	FA 06/10/23	931,93		931,93
24-06915 Rémunération compte courant 2024 - CAISSE D'EPARGNE				64 099,66	64 099,66
24-46770 INTERETS CREDITEURS 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24		11 178,65	11 178,65
24-48327 INTERETS CREDITEURS 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24		23 400,01	23 400,01
24-50298 INTERETS CREDITEURS 2TR24					
	01/07/2024	FA 01/07/24		6 373,06	6 373,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24	01/07/2024	FA 01/07/24 FA 02/10/24		23 147,94	23 147,94
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT			3 081 789,38	-	23 147,94 4 246 637,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			214 215,38	23 147,94	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes			214 215,38 214 215,38	23 147,94	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32	23 147,94	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL			214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32	23 147,94	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06	23 147,94	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06	23 147,94 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 4 032 422,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00	23 147,94 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 4 032 422,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser	02/10/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 5 13 785,00 1 169 989,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 5 13 785,00 1 169 989,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 4 032 422,00 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 22-05884 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3)	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3)	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 662 804,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024		214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024		214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL Z TVA A REVERSER Z102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE O100 Avances interne	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024		214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE O200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE 0100 Avances interne 18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024 31/08/2024	FA 02/10/24	214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE 0200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE 0100 Avances interne 18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 18-17292 AVANCE C0001/C0010	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024 31/08/2024		214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE 0200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE 0100 Avances interne 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 18-17292 AVANCE C0001/C0010	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024 31/08/2024	FA 02/10/24	214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00 175 583,32	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00 175 583,32
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE 0200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE 0100 Avances interne 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 18-17292 AVANCE C0001/C0010 19-17668 Avance inter OP C0003/C0010 (transfert terrain CF001) 19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024 31/08/2024 12/12/2018 28/12/2018	FA 02/10/24	214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 214 215,38 37 258,06	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00 175 583,32 37 258,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24 3 AMORTISSEMENT O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE 0200 Rembousement avances internes 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 19-17850 REMB AVCE - POOL 19-02504 REGLEMENT PAR CO003 - FAB 19-17848 REMB AVCE - POOL 2 TVA A REVERSER 2102 TVA à reverser 19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) 19-21004 CA3 06/2019 22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-34283 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3) 22-39451 CA3 11/2022 24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-46794 CA3 12/2023 24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3) 24-51161 CA3 08/2024 4 MOBILISATION O AVANCES INTERNE 0100 Avances interne 18-02442 REGLEMENTS PAR CO001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB 18-17292 AVANCE C0001/C0010	02/10/2024 14/01/2019 14/01/2019 01/06/2019 26/01/2022 30/11/2022 25/01/2024 31/08/2024	FA 02/10/24	214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 37 258,06 2 867 574,00 513 785,00 513 785,00 1 169 989,00 1 169 989,00 1 183 800,00 1 183 800,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00 175 583,32	23 147,94 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 1 164 848,00 662 804,00 662 804,00 502 044,00	23 147,94 4 246 637,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 176 957,32 37 258,06 4 032 422,00 513 785,00 1 169 989,00 1 183 800,00 662 804,00 502 044,00 502 044,00 214 215,38 214 215,38 214 215,38 176 957,32 1 374,00 175 583,32 37 258,06

CRFA 2024 Merignac Soleil Annexe 7 Suivi clauses insertion

Marchés			Montant marché	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprises
M2020-037 Lot 1 - Assainissement	Voirie de desserte interne ilot	1 563 002,00 €	350,00€	356,50€	Dubreuilh	
	Castorama viabilisation abords	1 303 002,00 €				
M2020-037 Lot 2 - Terrassements/voirie	Voirie de desserte interne ilot	529 587,80 €	350,00€	350,00€	Eiffage	
	Castorama viabilisation abords	529 587,80 €				
M2020-037 Lot 3 - Réseaux divers/éclairage	Voirie de desserte interne ilot	237 020,00 €	150,00€	150,00€	Lacis	
	Castorama viabilisation abords					
M2022-040 Lot 1 - VRD & Eclairage	Travaux d'aménagement des	9 677 118,74 €	5 005,00 €	5 593,00 €	Eurovia-Moter	
	espaces publics de la phase 1					
M2022-040 Lot 2 - Paysage	Travaux d'aménagement des	2 642 670 00 6	1 155,00 €	1 155,00 €	ID Verde	
	espaces publics de la phase 1	2 613 678,00 €				

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110109-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025
