

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2025

MERIGNAC

Mérignac Soleil

SOMMAIRE

1	Présentation de l'opération d'aménagement	3
1.1	Préambule.....	3
1.2	Cadre juridique de l'intervention.....	3
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement	4
1.4	Programme prévisionnel de construction	4
1.5	Programme prévisionnel des équipements publics.....	4
2	Actions menées au 31 décembre 2025	6
2.1	Procédures administratives	6
2.2	Etudes	6
2.3	Acquisitions foncières.....	8
2.4	Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens.....	11
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	13
2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières	14
2.7	Accompagnement des projets immobiliers	14
2.8	Médiation / Communication / Information	20
3	Actions à mener en 2026	20
3.1	Procédures administratives	20
3.2	Etudes	20
3.3	Acquisitions foncières et libération des sols.....	22
3.4	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	22
3.5	Commercialisation des terrains : cessions foncières	22
3.6	Accompagnement des projets immobiliers	23
3.7	Communication, concertation, médiation et animation du projet urbain	23
4	Analyse financière.....	24
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2025	24
4.1.1	Les dépenses	24
4.1.2	Les recettes	25
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2026	25
4.2.1	Les dépenses	25
4.2.2	Les recettes	26
4.3	Imputation des charges du concessionnaire – Rémunération aménageur	26
4.4	Participation du concédant.....	26
4.5	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	27
4.6	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts	27
	Annexes	30

1 Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le projet urbain Mérignac Soleil vise à faire muter un site stratégique d'entrée de ville de près de 69 hectares entre l'aéroport et le cœur historique de Bordeaux.

Tout en veillant à conforter et valoriser l'activité commerciale en place sur ce secteur, l'opération d'aménagement s'attache à la mise en œuvre d'une programmation mixte mêlant habitat, équipements et services. Cette diversification programmatique s'inscrit dans la dynamique de restructuration et de densification urbaine liée au projet d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport, et dans les objectifs métropolitains de mise en œuvre d'une offre de logements accessibles économiquement et attractive en termes d'usage.

Par ailleurs le projet s'appuie sur une stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols, de développement des mobilités douces et des perméabilités entre tissus pavillonnaires mitoyens et équipements publics majeurs environnants, d'optimisation et de mutualisation des stationnements, contribuant à créer les conditions nécessaires pour « habiter Mérignac Soleil – Chemin Long ».

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par **délibération n°2018-449** en date du 6 juillet 2018, Bordeaux Métropole a :

- Approuvé les modalités financières prévisionnelles de l'opération d'aménagement,
- Approuvé le programme global des équipements publics et des constructions,
- Confié la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,
- Approuvé les termes du Traité de Concession de l'opération Mérignac Soleil avec la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, et autorisé le Président à signer ledit Traité,
- Délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins du traité de concession,
- Délégué l'exercice du droit d'expropriation à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins de l'exécution du traité de concession,
- Fixé le montant de la participation métropolitaine prévisionnelle à l'opération.

Le traité de concession « Mérignac Soleil » a été notifié à l'aménageur le 30 août 2018 pour une durée de 15 ans.

- Un premier avenant portant sur l'augmentation des participations communales et métropolitaines a été adopté par la délibération 2021-05 du 29 janvier 2021
- Un deuxième avenant redéfinissant le cadencement de la participation métropolitaine a fait l'objet de la délibération 2022-604 lors du conseil métropolitain du 6 décembre 2024
- L'avenant n°3 portant sur l'augmentation des participations communales et métropolitaines a été adopté par la délibération 2024-653 du 6 décembre 2024

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement



Mérignac Soleil

Périmètre du projet urbain actualisé suite
aux enquêtes publiques DUP, MECDU et Parcellaire (68,9 ha)



1.4 Programme prévisionnel de construction

Le programme global des constructions issu du plan guide approuvé en 2024 fixe la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 206 711m² environ pour les logements (soit environ 2 978 logements) et 70 707 m² environ pour les commerces, bureaux, activités et équipements.

Une mixité programmatique à l'îlot est toujours systématiquement recherchée.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme métropolitain « habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature », il vise notamment à la diversification et à l'accessibilité économique de l'offre de logements développée selon la répartition suivante actualisée : 35% de locatif social, 22% de BRS (bail réel solidaire), en lieu et place de l'accession sociale et abordable ramenée à 3%, 40% d'accession libre incluant les logements en LLI (logement locatif intermédiaire).

1.5 Programme prévisionnel des équipements publics

Le projet urbain Mérignac Soleil s'appuie sur une stratégie paysagère extrêmement volontariste, qui vise à renaturer un secteur aujourd'hui imperméabilisé à 80% et dévolu à l'automobile, en conservant au maximum le patrimoine végétal existant.

L'actualisation du plan guide en 2024 a maintenu ce niveau d'exigence et a permis d'optimiser l'aménagement des espaces publics en développant une stratégie paysagère s'appuyant sur :

- Une redéfinition des acquisitions foncières nécessaires aux aménagements afin de diminuer les impacts sur les propriétés privées
- Une inscription des aménagements paysagers dans la trame d'espaces verts existants aux abords du site Mérignac Soleil, en particulier le parc du Château ;

- La requalification de l'ensemble des voies comprises dans le périmètre de l'opération, en systématisant les plantations d'alignements et en confortant, sécurisant, créant ou développant les linéaires cyclables, et en proposant systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager et arboré ;
- La création de nouveaux espaces publics, des voies et venelles nouvelles pour faciliter la desserte des futurs programmes, ainsi que d'espaces uniquement dévolus aux piétons, en particulier trois parcs dont un d'environ un hectare.

Par ailleurs, afin d'accompagner l'arrivée de nouveaux habitants induits par l'opération, un nouveau groupe scolaire associé à une crèche et une salle multisports sera construit et la création ou la réhabilitation de trois classes dans un groupe scolaire préexistant en dehors du périmètre opérationnel a également été prévu.

a) Les espaces publics

Autour des principaux axes de circulation, dont les avenues de la Somme, J.F. Kennedy et Matosinhos, le projet consiste à réaliser des aménagements d'espaces publics visant à favoriser l'usage des modes alternatifs à l'automobile. Le projet peut pour cela s'appuyer sur l'offre de transport que constitue le tramway et va également permettre de créer, développer, conforter et sécuriser des linéaires cyclables, et proposer systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager arboré plus dense.

Trois typologies d'espaces publics requalifiés, aménagés ou créés sont prévus par l'opération :

- Les « allées métropolitaines » : il s'agit de requalifier l'avenue Kennedy, l'avenue Matosinhos et l'avenue de la Somme afin d'accompagner l'arrivée du tramway, de permettre plus de confort d'usage pour les modes doux piétons et cyclables et composer des alignements d'arbres de première hauteur ;
- Les « rues transversales » : elles irrigueront et desserviront les différents programmes du quartier. Il peut s'agir de requalification de voiries existantes comme de création de voies nouvelles permettant la desserte d'îlots. Elles seront également généreusement plantées ;
- Les « espaces publics de sociabilité » : il s'agit de futures places publiques, placettes, parvis piétons et d'espaces verts emblématiques de type parc ou square, à créer, qui viendront participer à renouveler la qualité urbaine et paysagère du site et participer à l'animation du quartier.

En outre, les réseaux nécessaires à la desserte des programmes immobiliers seront dévolés, créés ou renforcés dans le cadre des travaux réalisés par l'aménageur sur les futurs espaces publics.

La réalisation de ces espaces publics peut être soumise à des règles de compensations environnementales et conduire à l'acquisition de fonciers de compensation et/ou à la réalisation de travaux hors du périmètre de projet.

b) Les équipements de superstructure

Le programme des équipements publics prévoit également la création d'un nouvel équipement scolaire de 17 classes associé à une crèche et une salle multisports dans le périmètre de l'opération d'aménagement, sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux-Métropole, et l'extension/réhabilitation de 3 classes répondant aux besoins de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil, réalisé en dehors du périmètre de l'opération d'aménagement, sur des groupes scolaires existants.

Ce nouvel équipement étant soumis à des règles de compensations environnementales concernant les espèces protégées et les zones humides, Bordeaux Métropole a confié à La Fab la réalisation du dossier de demande de dérogation des espèces protégées ainsi que l'acquisition du foncier de compensation et son aménagement. Concernant les compensations zones humides, Bordeaux Métropole met un foncier à disposition de La Fab afin d'y réaliser les aménagements de compensation attendus.

2 Actions menées au 31 décembre 2025

2.1 Procédures administratives

a) Procédure d'expropriation

Dans la continuité de l'arrêté de cessibilité de la phase 1, accompagné de la procédure d'urgence (valable 6 mois), délivré par la Préfecture le 24 avril 2024, l'ensemble des ordonnances d'expropriations ont été obtenues en 2024, sauf sur 2 fonciers qui devront être réintégrés dans l'enquête parcellaire n°2. L'ensemble des jugements d'expropriation provisionnels et définitifs demandés en phase 1 ont été rendus entre mai 2024 et octobre 2025.

Au 31 décembre 2025, 19 jugements définitifs et 10 jugements provisionnels ont été rendus.

Après plusieurs échanges avec les services de l'Etat, et pour faire suite à la première enquête parcellaire pour laquelle l'ensemble des démarches de cessibilité n'ont pas pu être menées dans les délais de la procédure d'urgence, il a été décidé de préparer l'enquête parcellaire n°2 en suivant le programme des aménagements des espaces publics phase 2 et en remettant les emprises non abouties de la phase 1. Une troisième enquête parcellaire sera à prévoir pour finir le projet urbain.

b) Demande de Dérogation Espèces Protégées (DDEP) accompagnant le projet d'aménagement du parc Carpentier

L'actualisation du dossier de Demande de Dérogation Espèces Protégées (DDEP) accompagnant le projet d'aménagement du parc Carpentier et le projet du groupe scolaire, a été réalisé avec l'étude d'éligibilité et le plan de gestion d'un nouveau foncier de compensation pour l'avifaune et le grand capricorne (foncier privé en vente et à acquérir).

2.2 Etudes

a) Etudes urbaines

Dans la continuité de l'actualisation du plan guide, le dossier de CPAUPE a été actualisé en 2025 par l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine en tenant compte de l'évolution du plan guide autour de 7 thématiques principales : position métropolitaine, économie, plaques, espaces publics, habiter, paysage et stationnement. Le document final a été remis en août 2025.

L'agence MDP a également réalisé des perspectives des futurs espaces publics de la phase 2.

Des missions ont été confiées en 2025 à l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pour accompagner la mutation de différents îlots (avis sur permis de construire, faisabilité et fiche de lot). Il s'agit notamment de :

- Echanges avec les opérateurs et reprises des faisabilités sur les îlots Stokomani, Flunch, Orlac
- Echanges avec Carrefour et reprise de la faisabilité des îlots P7-1 à 4
- Echange avec Pichet et Nhood et reprise de la faisabilité îlot P4-2c
- Suivi projet et avis sur Permis de Construire îlot P6-1/P6-2 (Alinéa-Saint Maclou)
- Avis et jury concours groupe scolaire/crèche/salle multisport

L'accord cadre du marché de maîtrise d'œuvre urbaine se terminant en octobre 2025, la procédure de renouvellement du marché a été lancée en août 2025. Le nouveau marché a été organisé en 3 lots (architecte/urbaniste, paysagiste/bureau d'études VRD/éclairage et bureau d'étude environnement) pour une durée de 8 ans, correspondant à la fin du traité de concession. La réception des candidatures s'est tenue fin septembre 2025 et a permis de retenir 3 candidats par lots pour remettre leurs offres. L'analyse des offres, l'audition des candidats et la négociation sont prévues en début d'année 2026 pour pouvoir notifier la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre en mars 2026.

b) Mission accompagnement développement commercial et économique

Sur le marché en cours avec le cabinet Bérénice, l'année 2025 a permis de compléter les prises de contacts avec les différentes enseignes et de préparer un atelier de travail collectif, réunissant les acteurs économiques de la zone commerciale, qui s'est tenu le 18 septembre 2025. Cet atelier a permis de présenter le plan guide actualisé et l'avancement du projet urbain aux participants puis de recueillir les attentes, remarques et besoins des participants. 4 thématiques ont été identifiées pour poursuivre le travail : quelles modalités d'implantation des activités en rez de chaussée, comment faire évoluer son activité sans transfert, comment adapter le stationnement, quelles possibilités de mutualisation.



Dans la suite des ambitions du démonstrateur de la ville durable France 2030 sur la transformation d'une zone commerciale monofonctionnelle en quartier urbain mixte, le marché d'accompagnement au développement commercial et économique transversal Marne Soleil a été renouvelé pour une durée de 4 ans en novembre 2025.

L'équipe retenue est composée du cabinet AID – Observatoire – Stratégie – Programmation, du cabinet Reeter, d'Egis et des Petites Rivières.

c) Etudes de maîtrise d'œuvre des espaces publics :

Quelques reprises d'étude d'aménagement ont été nécessaires pour accompagner l'avancement du chantier, notamment pour la mise au point du projet d'aménagement et des documents explicatifs accompagnant la convention d'Obligations Environnementales (ORE) avec l'indivision Mérignac Soleil.

d) Etudes techniques et environnementales

Les études techniques sont menées au fur et à mesure de l'avancement du projet et de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation des travaux en cours. En particulier :

- Missions géomètre
- Etudes géotechniques
- Dossiers de sécurité liés à la gestion trafic et au tramway
- Des études environnementales ont également été lancées et/ou réalisées en 2025 :
- Mise à jour du scénario retenu pour le plan de circulation du plan guide
- Actualisation de l'étude qualité de l'air

e) Mission d'OPC interchantier et mission CSPS

Le marché associant l'OPC interchantier (OPCiC) et la mission d'OPC VRD sur les phases 0 et 1 des aménagements des espaces publics a suivi son cours en 2025.

f) France 2030 : fin de la phase d'incubation – lancement phase réalisation

L'année 2025 a permis de lancer les dernières études de la phase incubation France 2030 :


- Etude de définition d'une stratégie économie circulaire de l'opération menée par les AMO économie circulaire Cancan et Néo Eco
- Stratégie de refunctionalisation des sols, réalisée par Hekladonia
- Définition d'une stratégie du dernier maillon acquéreur par Cancan
- Etude de faisabilité d'un hub des mobilités

Une synthèse de l'ensemble des études de la phase incubation a été réalisée et a permis de construire le dossier de la phase réalisation autour de 3 axes (dont découlent 7 actions) :

- Axe 1 : renaturer, réactiver, réformer, refunctionaliser le site
- Axe 2 : transformer le modèle obsolète de la zone commerciale
- Axe 3 : bâtir, aménager, habiter le quartier autrement

En mars 2025, le dossier de la phase réalisation a été présenté en comité d'engagement. Il a reçu un avis favorable pour 5 actions sur 7, et l'ensemble des réserves a été levé en fin d'année 2025. La convention de la phase réalisation a été signée par l'ensemble des partenaires le 20 février 2026, pour un montant total de subvention de 5 919 307 € répartis entre les différents porteurs de projets.

2.3 Acquisitions foncières

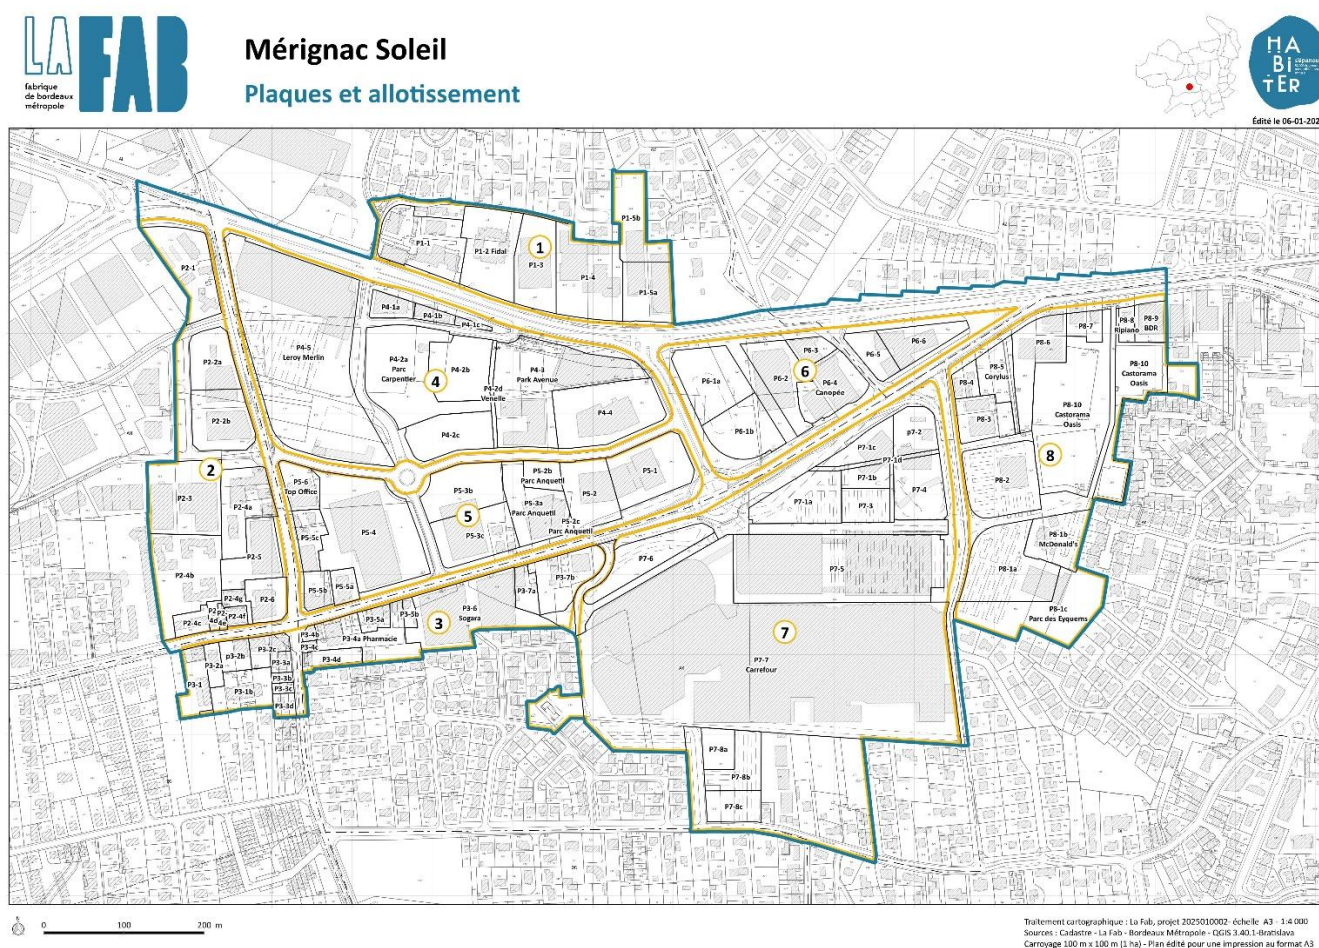

a) Acquisitions amiables

Ilot P8.3

Aux termes d'un acte de vente régularisé le 11 mars 2025 ont été acquis les murs commerciaux d'un immeuble à usage de restaurant cadastré section AY 58 (51 rue de Mirepin), d'une surface bâtie de 405 m²

moyennant le prix principal de 788.450€, de 79.845€ au titre des indemnités de emploi et de 54.705€ au titre des indemnités accessoires.

Ilot P5-5

Suite au retrait de la vente des biens faisant l'objet de procédures de préemption, des négociations amiables ont été engagées avec les propriétaires en octobre 2025 pour procéder à l'acquisition de 2 immeubles commerciaux actuellement occupés (magasin de piscine, magasin de peinture et assureur) situés au 114 (parcelle AW 139) et 116 (parcelle AW356) avenue Henri Vigneau pour respectivement 450 000 et 1 200 000€.

b) Acquisition par voie de préemption

Suite à la notification en date du 21 mars 2025 d'une déclaration d'intention d'aliéner portant sur un immeuble situé au 118 avenue Henri Vigneau et cadastré AW 36, La Fab a pris la décision d'exercer son droit de préemption le 16 mai 2025 moyennant le prix de 935 000€.

c) Acquisitions par voie d'expropriation


Dans le cadre du parachèvement de la procédure d'expropriation en lien avec la phase 1 des travaux d'espaces publics et l'acquisition de certains îlots, plusieurs jugements définitifs ont été rendus sur plusieurs emprises :

Aménagement de l'avenue de la Somme et de la rue Mirepin :

- 111m² sur le foncier cadastré AY 792 (43-49 rue de Mirepin) pour un montant principal de 7 110€ et de 1316,50€ au titre des indemnités de emploi en janvier 2025
- 10 540m² sur le foncier cadastré AX 507, 508, 510 à 514 dépendant du centre commercial Mérignac Soleil pour un montant principal de 555 488€ et de 56 549€ au titre des indemnités de emploi en juillet 2025
- 4 169 m² sur le foncier cadastré AY 790 et 795 dépendant de ce même centre commercial pour un montant principal de 286 759€ et de 29 676€ au titre des indemnités de emploi ainsi que de 20469,36 € au titre des indemnités accessoires en juillet 2025.
- 393 m² sur le foncier cadastré AY 790 (Place du 11 novembre 1918) pour un montant principal de 25 580€, de 3 558€ au titre des indemnités de emploi et de 40.000€ au titre des indemnités accessoires en juillet 2025.
- 2 148 m² sur le foncier dépendant de l'ancien site « Castorama » pour un montant principal et toutes indemnités confondues de 107 400€ en octobre 2025.

Ilot P8-7 et aménagements avenue de la Somme et rue Mirepin :

- 936m² sur le foncier cadastré AY 796 et 797 (34 Avenue de la Somme) pour un montant principal de 450 918€, de 46 091,80€ € au titre des indemnités de emploi et de 36.000€ au titre des indemnités accessoires en avril 2025.
- 922m² sur le foncier cadastré AY 798 et 799 (36 Avenue de la Somme) pour un montant en principal de 1 480 138€, de 149 013,80€ € au titre des indemnités de emploi et de 116 317€ au titre des indemnités accessoires en janvier 2025.

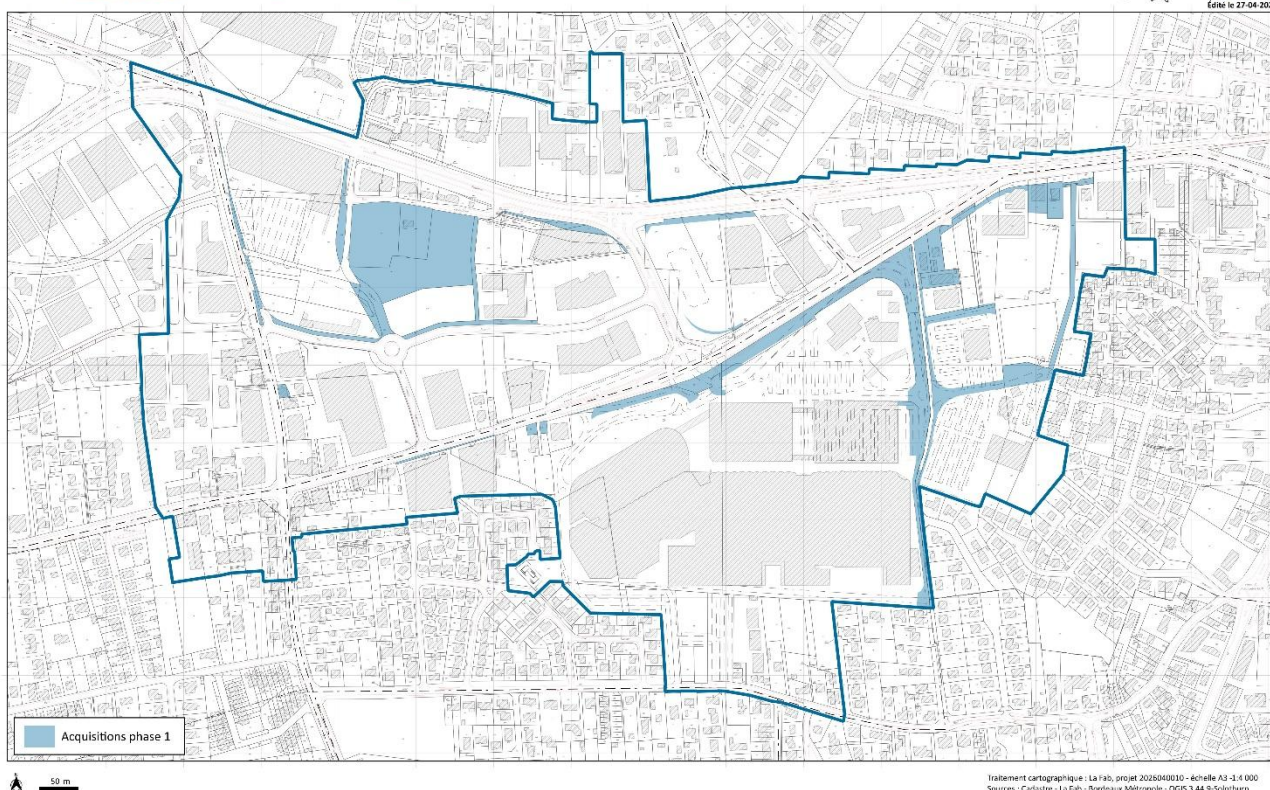

d) Indemnités de transfert ou d'éviction

Ilot P8-3 :

Régularisation d'un protocole d'éviction totale en mars 2025 avec l'unique occupant de l'immeuble (restaurant) sis au 51 rue de Mirepin pour pouvoir en prendre possession moyennant le paiement d'une indemnité principale de 486 542€, d'une indemnité de remploi de 33 458 et de 90 000€ en accessoires.

Ilot P8-4 :

Régularisation d'un protocole d'éviction partielle en août 2025 avec un des occupants de l'ensemble immobilier sis au 50 Avenue de la Somme (assurance) pour pouvoir prendre possession de son local commercial moyennant le paiement d'une indemnité principale toutes indemnités confondues de 250 000€ stipulée payable fin 2026.

Ilot P8-6 :

Régularisation d'un protocole d'éviction partielle en février 2025 avec un des occupants de l'ensemble immobilier sis au 40 Avenue de la Somme pour pouvoir prendre possession d'un espace extérieur compris dans son bail commercial moyennant le paiement d'une indemnité principale de 10 000€ et de 2 000€ en accessoires.

Ilot P8-7 :


Obtention d'un jugement définitif en avril 2025 pour procéder à l'éviction de l'occupant et pour pouvoir prendre possession des lieux sis au 34 avenue de la Somme après paiement d'une indemnité principale de 95 400€, de 9 540€ au titre de l'indemnité de remploi et de 165 890,50€ en accessoires.

e) Procédures d'appel en cours

En 2025, 5 dossiers de fixation judiciaire faisaient l'objet d'une procédure d'appel. Les décisions devraient intervenir dans le courant de l'année 2026

f) Création d'une Obligation Réelle Environnementale (ORE)

Signée en septembre 2025 entre Bordeaux Métropole et l'indivision ImmoFi Soleil, représentée par Klépierre, le contrat d'ORE engage les propriétaires à la conservation, la gestion et l'entretien de leur espace vert. Contractuellement, La Fab s'est engagé à réaliser l'aménagement paysager des emprises, et à assurer la garantie de parfait achèvement pour une durée de 5 ans.

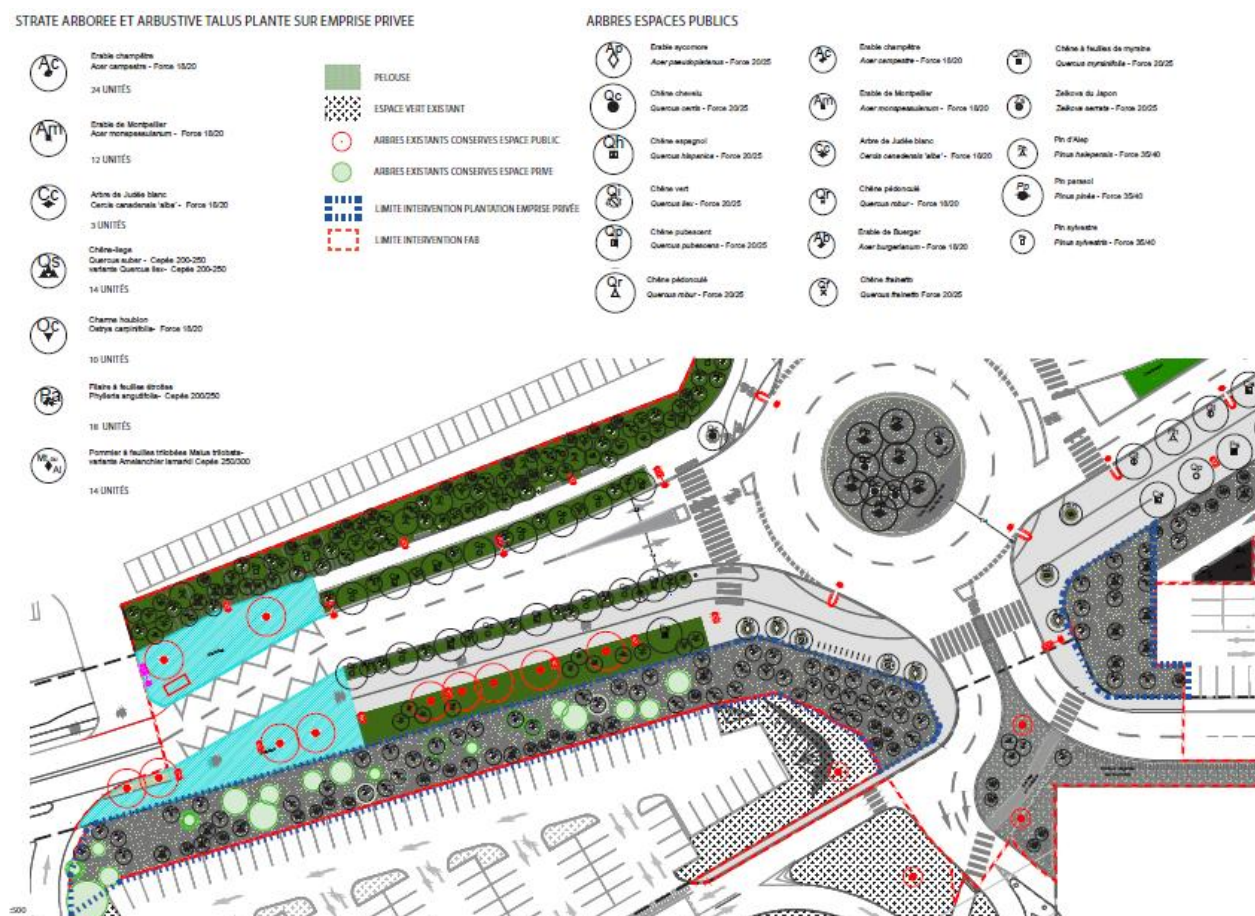

2.4 Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

a) Expertises immobilières

Sans objet en 2025

b) Assistance juridique

Les principales missions d'assistance juridique menées en 2025 ont porté sur l'accompagnement de la procédure de cessibilité, sur l'accompagnement des négociations amiables de cessions foncières et sur l'accompagnement des procédures de préemption engagées depuis 2021 dont les appels sont en cours d'instruction.

c) Mise en état et libération des sols

À la suite de la maîtrise foncière de 5 propriétés bâties et aux diagnostics ressources réalisés en 2024, un marché de démolition a été lancé et a permis de réaliser la démolition de 2 immeubles en 2025 (situés sur les ilots P8-4 et P8-7), 3 autres immeubles (situés sur les ilots P4-2a ; P5-5c et P8-3) sont en tranche conditionnelle pour des travaux de démolition en 2026.

d) Gestion des biens

L'ensemble des biens propriété de La Fab sont équipés d'alarme et de dispositifs de sécurisation des accès au fur et à mesure des acquisitions. L'entretien des différents espaces verts et des interventions pour assurer la propreté des sites occupés sont également assurés tout au cours de l'année.

Pour l'immeuble inoccupé situé au 34 avenue de la Somme, et l'immeuble en partie occupé par une société d'assurance situé au 50 avenue de la Somme, des occupations temporaires dans le cadre de mises à disposition précaires sont en cours d'étude pour une mise en œuvre en 2026.


2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

a) Conception des espaces publics

L'étude AVP du parc de la rue Carpentier a été réalisé et remis au mois d'août 2025.

b) Travaux sous maîtrise d'ouvrage aménageur

Pour faire suite à la livraison en 2023 des tronçons 1.1 (sans la partie venelle) et 1.1bis, 1.3, et en 2024, du premier tronçon de la nouvelle rue Germaine Tillion, les travaux d'aménagement des secteurs 1.4, 1.5 et 1.7 ont été réalisés. Les secteurs 1.6 (giratoire Matosinhos) et 1.2 (abords Matosinhos) ont été livrés. L'ensemble des aménagements du secteur 1.8 (carrefour Somme Mirepin) a été engagé pour une livraison prévue en avril 2026.

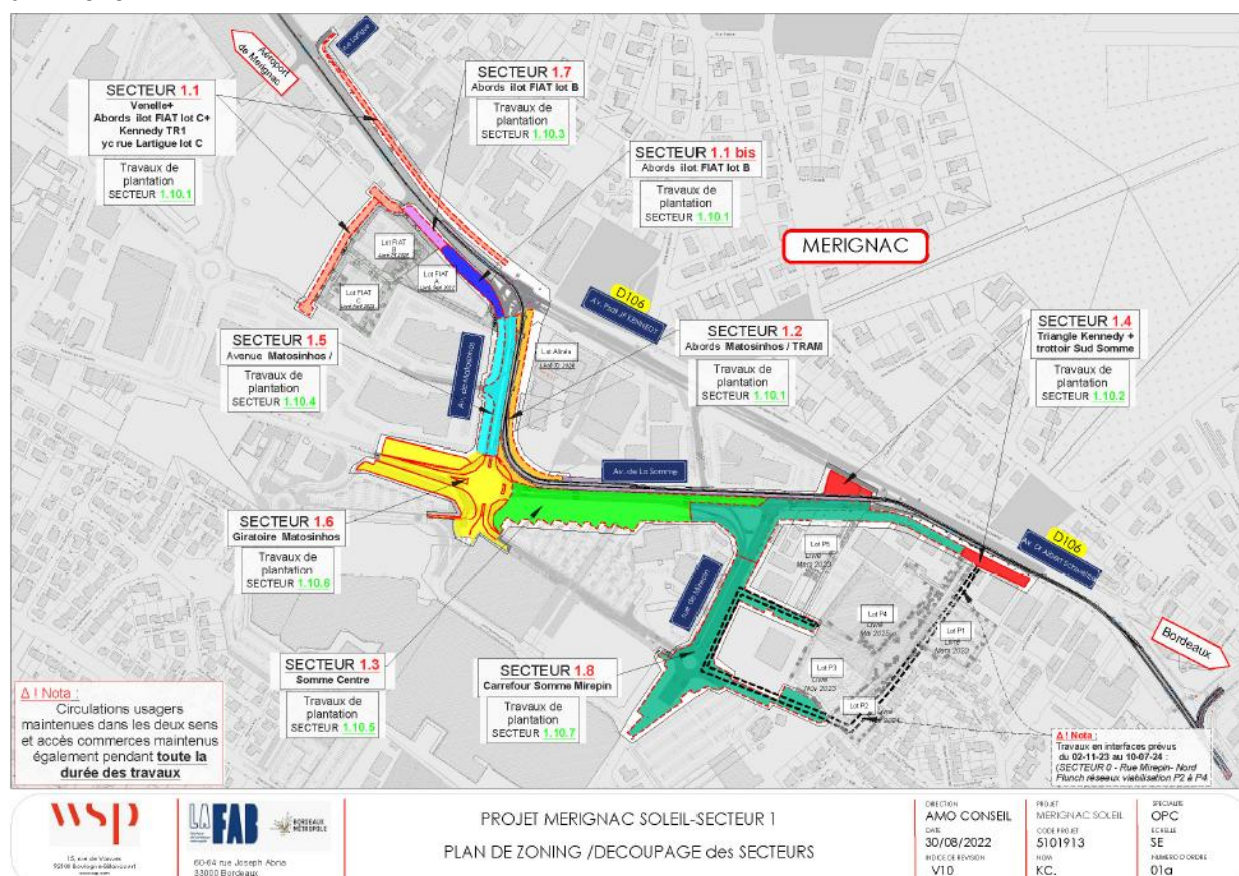

Organisation des travaux d'aménagement des espaces publics phase 1



Livraison av. de la Somme Centre (1.3) sept 2024



Travaux rond point Matosinhos (1.6) mars 2025



livraison placette Kennedy (1.4) juin 2025



Livraison avenue Matosinhos (1.5/1.2) juin 2025



Rue Germaine Tillion – sept 2025



Travaux trottoirs avenue de la Somme (1.8) sept 2025

c) Réalisation des travaux hors maîtrise d'ouvrage aménageur

Des adaptations réseaux via les concessionnaires (Régie de l'eau, Enedis notamment) ont été nécessaires pour la réalisation des travaux de la phase 1. Une coordination avec les services de Bordeaux Métropole a également été menée pour permettre l'installation des nouveaux carrefours à feux sur les secteurs livrés.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession de terrain n'a été réalisée en 2025

2.7 Accompagnement des projets immobiliers



Récapitulatif des PC purgés et chantiers en cours fin 2025 – 824 logts et 5 166m² activités

a) Îlot 8.12 Parc Mirepin/Oasis Urbaine P1, P2, P3, P4 (ex Castorama) et 8.5 résidence Corylus/P5 (ex Castorama)

A l'issue d'une consultation lancée par La Fab et le propriétaire, Castorama, a été retenu le groupement Aqprim/Sogeprom et Clairsienne pour la maîtrise d'ouvrage, La nouvelle Agence, BLP et Two architects pour la maîtrise d'œuvre.

Le permis de construire, Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4), valant division a été délivré le 10 août 2018, comme le permis de construire du P5.

Le permis modificatif n°4 pour le Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4) a été déposé en décembre 2023 et délivré en mars 2024.

La société Aqprim ayant déposé le bilan en 2024, c'est la société Sogeprom qui a repris l'opération afin de pouvoir la mener à son terme.

Concernant les plots P1 à P4, la programmation de l'îlot représente 28 040 m² SDP, soit 350 logements et 1478 m² de commerces et services en rez-de-chaussée. La programmation logement se répartit comme suit :

- 53 % de logements sociaux, représentant 186 logements,
- 3 % de logements en accession sociale ou abordable, représentant 10 logements,
- 5 % de logements en BRS, représentant 18 logements,
- 39 % de logements en accession libre, représentant 136 logements.

Concernant le plot P5, la programmation représente 3 608,66 m² SDP soit 31 logements et 3 cellules commerciales. La programmation logement se répartit comme suit :

- 74 % de logements en accession sociale et abordable représentant 23 logements,
- 26 % de logements en accession libre représentant 8 logements

La résidence Corylus (P5) a été livrée au mois de mai 2023.



Photo chantier îlot 8.5 – Corylus/P5 (ex CASTORAMA)

mars 2024 et mars 2025



© Sabine Delcour

La résidence Charme (P1) a été livrée au mois de septembre 2023.




Photo chantier îlot 8.10 – Charme/P1 (ex CASTORAMA) -

mars et septembre 2024



© Sabine Delcour

Le Bâtiment P3 (Euphorbia), sous maîtrise d'ouvrage Aqprim, dont le chantier a démarré en février 2022 a été livré en septembre/octobre 2025.

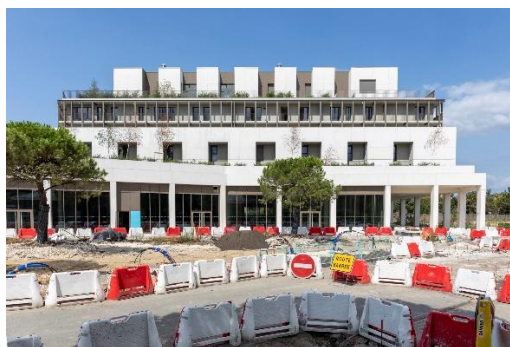

Livraison logements îlot 8.10 – Euphorbia/P3 ex CASTORAMA) - juin et septembre 2025

©Sabine Delcour

Les travaux du bâtiment P4 (Tamaris), initialement sous maîtrise d'ouvrage de Clairsiennne (racheté par Domofrance en 2025) ont démarré en décembre 2022 et la résidence a été livrée en octobre 2025.



Livraison logements îlot 8.10- Tamaris (P4) (ex CASTORAMA) - septembre 2025

© Sabine Delcour

b) Îlot 4.3 Fiat – Park Avenue

Les opérateurs Pichet et Clairsiennne (Domofrance désormais) ont acquis le foncier de l'ex-concession automobile Fiat auprès du propriétaire. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à l'agence BLP. La programmation de l'opération est la suivante, à l'issue des dernières modifications :

- 290 logements représentant 20 938 m² SDP, soit :
 - 35.5 % de logements sociaux (103 logements),
 - 7,5 % logement en BRS (22 logements),
 - 7 % logement abordable (21 logements) et
 - 50 % de logement en accession libre (144 logements)
- 2 268 m² de surfaces commerciales.

Le permis de construire a été délivré en octobre 2018.

En 2022, le permis modificatif validant les évolutions du programme sur le bâtiment du bailleur social a été délivré.

Par ailleurs, les bâtiments A et C, sous maîtrise d'ouvrage de Pichet, ont été livrés respectivement en octobre 2022 et mai 2023. Quant au bâtiment C, sous maîtrise d'ouvrage Domofrance, il a été livré en octobre 2025.



Photos îlot 4.3 - Park Avenue (ex FIAT) - novembre 2024 et juin 2025 © Sabine Delcour

c) Ilot P6-1 P6-2 (ex Alinéa St Maclou)

L'opérateur Nhood, via la foncière Plenisol, est propriétaire du foncier ex Alinéa depuis 2019. En 2024, via la foncière Ceetrus, il a entrepris l'acquisition du foncier de St Maclou, en vue de la réalisation d'une opération immobilière d'ensemble.

Dans ce contexte, il s'est rapproché de Bordeaux Métropole, La Fab et la Ville en vue de la définition d'une programmation et d'une constructibilité validée par l'ensemble des acteurs, en vérifiant sa faisabilité économique.

Une fiche de lot a été réalisée par la maîtrise d'œuvre urbaine en décembre 2024.

Une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en décembre 2024 et le choix de l'équipe lauréate a eu lieu en avril 2025. L'équipe, composée des agences d'architecture Scalène (mandataire) et Ur, des bureaux d'études Soconer, Terrell, cabinet Faure, R-use et du paysagiste Studio Mathieu Lucas ont déposé un dossier de permis de construire en incomplet le 11 août 2025. Le dossier a été complété le 11 décembre 2025 pour un délai d'instruction expirant le 11 mai 2026.

Une convention de partenariat entre Nhood et La Fab a été signée en décembre 2025.

Le permis présente une programmation de :

- Logements locatifs sociaux : 154 logements soit environ 52% (5 632 m² environ) se répartissant ainsi :
 - LLS familial PLAI : 12 logements soit environ 8%
 - LLS familial PLUS : 24 logements soit environ 15%
 - LLS étudiants PLS : 118 logements soit environ 77 %
- Accession sociale (BRS) : 42 logements soit environ 15%, représentant 3 216 m² de SDP
- Accession libre (dont LLI) : 98 logements soit environ 33% (6 734 m² de SDP environ)
- Programmation commerciale : pour un total 6 389 m² de SDP comprenant les transferts de St Maclou et de Boulanger a minima et 1538m² de SDP bureaux



Perspectives- dossier permis de construire Les Sources – 2025/2026

d) Ilot P4.2b Leroy Merlin/Carpentier

Le jury du concours Conception/Réalisation pour le groupe scolaire/crèche/salle multisport s'est tenu le 14 novembre 2025. Les offres finales sont attendues pour avril 2026 pour une présentation en commission d'appel d'offres en juin 2026.

e) Ilot P4.2c Friche Sud Leroy Merlin

Cet îlot, toujours propriété de Leroy Merlin, mais sous promesse avec le groupe Pichet associé à Nhood, a fait l'objet d'une reprise d'étude de faisabilité pour prendre en compte les enjeux environnementaux du site. Le porteur de projet a pris en compte la diminution de constructibilité induite des contraintes environnementales et doit reprendre son bilan d'opération pour renégocier le prix du foncier avec le propriétaire et trouver les solutions de compensations nécessaires à l'opération immobilière.

Accusé de réception en préfecture
SPL La Fab - CRFA 2025 – Mériemac Solé
n° : 2025-0316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

2.8 Médiation / Communication / Information

AMO communication, participation et animation du projet urbain

Dans le cadre du marché attribué à l'équipe Garluche/Alga/2 degrés en décembre 2023, la phase diagnostic a été remise en février 2024 et un plan d'actions a été présenté en mai 2024.

Dans ce cadre de plan d'action, les prestations réalisées en 2025 sont :

- 1 lettre info projet
- 4 lettres infos chantier
- Actualisation de la carte projet Marne Soleil suite à l'actualisation du plan guide
- 6 panneaux d'exposition dans l'espace public
- 1 atelier de concertation du parc rue Carpentier en avril 2025
- 1 forum du projet urbain organisé en mai 2025
- Des permanences projet tout au long de l'année
- 1 animation « changer de tempo » le 20 septembre 2025



« Changer de tempo » le 20 septembre 2025 © Alexandre Dupeyron

3 Actions à mener en 2026

3.1 Procédures administratives

f) Procédures foncières

Afin de préparer la deuxième phase d'aménagement des espaces publics et maîtriser les fonciers nécessaires aux travaux, une nouvelle enquête parcellaire devra être mise en œuvre dans le courant de l'année 2026.

g) PLU

Dans le cadre de la préparation de la prochaine modification du PLU, une modification des règles de hauteur sur certains zonage couvrant le projet urbain sera demandée.

3.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre urbaine

La nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, suite au renouvellement de l'accord cadre, devra mettre en place une méthodologie de travail collégiale pour répondre aux différents enjeux du projet urbain autour du récit urbain, paysager et environnemental. L'année devra permettre la réalisation des études AVP de la phase 2 des espaces publics et la redéfinition des objectifs environnementaux du projet.

En parallèle, l'équipe, en fonction des sujets, devra également assurer l'accompagnement de certains projets immobiliers :

- Ilot P6-1/P6-2 Alinéa/Saint Maclou : suivi du permis de construire
- Participation au comité technique d'analyse des offres finales du concours pour le groupe scolaire
- Ilot P4-2c Sud friche Leroy Merlin : réalisation de la fiche de lot
- Ilots P7-1/7-2/7-3/7-4 secteur drive et station-service de Carrefour : reprise de la faisabilité des ilots

- Ilot P3-7 Orlac : reprise de la faisabilité et fiche de lot
- Ilot P6-5/P6-6 Orchestra : réalisation d'une fiche de lot
- Ilot P8-3/P8-4 Keria-Memphis : reprise de la faisabilité et fiche de lot

b) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage activités économiques

Suite au renouvellement du marché AMO activités économiques, la nouvelle équipe sera missionnée pour poursuivre la prise de contact avec les enseignes, aux côtés de La Fab, accompagner les mutations foncières, les transferts d'enseignes et la commercialisation des nouveaux locaux d'activités.

Une stratégie de définition de la mise en place d'une gouvernance collective avec les enseignes sera également proposée par l'équipe, dans le cadre de la phase réalisation France 2030.

c) Accompagnement aux changements de pratiques de mobilité

Dans la continuité de l'expérimentation vélo réalisée en 2024 pour accompagner le changement de pratique de déplacement des nouveaux habitants, une enquête sur la mobilité des nouveaux habitants sera menée dans le courant de l'année. Elle permettra de pouvoir évaluer les usages et identifier les leviers permettant d'accompagner au mieux les habitants dans le développement des pratiques de mobilités douces.

d) Etudes techniques et environnementales

Des études techniques et environnementales seront menées afin notamment de permettre la réalisation des études AVP de la phase 2 des espaces publics, mais également pour accompagner les différentes actions France 2030 :

- Différentes campagnes de sondages pour la qualité des sols, les diagnostics d'enrobé, etc...
- Les dossiers réglementaires loi sur l'eau : un Porté à Connaissance (PAC) pour le projet du parc de la rue Carpentier, un Dossier Loi sur l'Eau pour la 2eme phase des aménagements des espaces publics
- la finalisation du dossier de Demande de Dérogation Espèces Protégées en lien avec les projets d'espace (Parc de la rue Carpentier et venelle) et d'équipements publics (groupe scolaire/crèche/salle multisports)

e) Mission d'OPC, de CSPS et de sécurité tram

Le travail de coordination OPC VRD et OPC inter chantier se terminera en avril 2026.

Le travail du coordinateur SPS se terminera également en avril 2026.

Le travail de MOE sécurité et d'OQA en lien avec le STRMTG (sécurité tram) se terminera également en 2026.

f) Démonstrateur Ville Durable France 2030

L'année 2026, première année de la phase réalisation permettra la mise en place progressive des différentes actions :

- **Action 1 - Restaurer écologiquement les sols désimperméabilisés** : les expérimentations sur la refertilisation des sols doivent permettre d'alimenter le travail d'étude et les travaux à prévoir pour la phase 2 des espaces publics. Dans un second temps ces résultats d'expérimentation permettront la généralisation de préconisations pour l'aménagement des espaces privés.
- **Action 2 - Démarche d'économie circulaire opérationnelle**: une étude de faisabilité préalable à la mise en place d'une plateforme de gestion des terres excavées sera menée. La réalisation de la plateforme est prévue fin 2027 pour accompagner la phase 2 des espaces publics. En parallèle, La Fab se fait accompagner par son AMO économie circulaire, le bureau d'études Néo-éco pour l'intégration de matériaux et produits recyclés et réemployés dans les futurs aménagements d'espaces publics

- **Action 3 – Hub des mobilités décarbonées** : recherche des partenariats et du porteur de projet pour la mise en place du hub, des aménagements et signalétiques associés
- **Action 4 – Gouvernance collaborative des acteurs commerciaux** : Mise en place de la feuille de route pour l'organisation des rencontres des acteurs commerciaux du secteur. Organisation des premiers ateliers de travail thématiques pour contribuer à une vision partagée du projet urbain et des formats commerciaux
- **Action 5 – Filières de réemploi pour le dernier maillon acquéreur** : mise en place d'un showroom des matériaux au sein de la base du réemploi et première mise en œuvre d'une stratégie de réemploi au sein de l'opération P6-1/P6-2 Les Sources (Alinéa/ST Maclou)

3.3 Acquisitions foncières et libération des sols

Cinq jugements d'expropriation ont fait l'objet de procédure d'appel par les propriétaires, les jugements en appel sont donc attendus en 2026.

Des négociations à l'amiable et l'acquisition d'un maximum d'emprises foncières nécessaire à la phase 2 des travaux d'espaces publics devront être engagées en parallèle de la préparation de la 2eme enquête parcellaire. De même, une négociation amiable avec le propriétaire vendeur du foncier de compensation pour le parc et le groupe scolaire sera engagée afin de compléter les annexes nécessaires au dossier DDEP.

3.4 Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

a) Etudes de maîtrise d'œuvre des espaces publics

Les études AVP de la phase 2 des espaces publics seront réalisées par la nouvelle équipe de maitrise d'œuvre durant l'année 2026. La nouvelle maitrise d'œuvre poursuivra également les études PRO du parc public sur la friche Leroy Merlin (dit « parc rue Carpentier ») afin de permettre la coordination avec le projet de construction du nouveau groupe scolaire/crèche/salle multisports sous maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole. Le dépôt du dossier conjoint de Demande de Dérogation Espèce Protégées (DDEP) et le retour d'instruction devront permettre de valider les mesures de compensations préalables aux travaux. Pour mener les études d'aménagement concernant les sites de compensation, une mission de maitrise d'œuvre dédiée devra être lancée.

b) Réalisation des travaux

L'ensemble des travaux de réseaux et d'aménagement des espaces publics (phase 0 et 1) seront finalisés en avril 2026. Le suivi des garanties des végétaux de l'ensemble de ces secteurs se poursuivra.

Des travaux d'expérimentation de refonctionnalisation des sols seront réalisés à partir de mars 2026 sur des emprises Fab et des emprises privées. Un suivi des résultats sera mené pendant 2 ans. Il permettra d'émettre des prescriptions pour la réalisation des travaux d'espaces publics et pour les ilots privés pour le traitement des sols en place et pour le choix des végétaux.

Ces travaux de refonctionnalisation des sols font partie des actions subventionnables France 2030 démonstrateur de la ville durable.

Enfin les travaux de démolition se poursuivront en septembre 2026 sur 3 immeubles acquis par la Fab au 51 rue de Mirepin, au 110 avenue Vigneau et au 7 rue Peyandreaux.

3.5 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession foncière n'est prévue en 2026.

3.6 Accompagnement des projets immobiliers

a) Fonciers Carrefour / Immofi Soleil / SCI Maklouf

Suite à la période électorale, des séances de travail pourront être programmées entre La Fab et ses partenaires Carrefour, Klépierre, Immofi Soleil et la SCI Maklouf afin de travailler ensemble sur les prochaines années à des scénarios de valorisation des fonciers aux abords du centre commercial, qui puissent s'intégrer dans les grandes orientations d'aménagement du projet urbain.

b) Ilot P8.10 et P8.6 Parc Mirepin/Oasis Urbaine – Castorama

Suite à la reprise de la commercialisation du dernier plot P1 Hedera (16 logements) de l'opération, le chantier de construction devrait être lancé au cours de l'année 2026.

c) Îlots P6.1 et P6.2 – Alinéa/Saint Maclou

Suite à la complétude du dossier de permis de construire en décembre 2025, la maîtrise d'œuvre urbaine accompagnera l'instruction et remettra un avis qui sera annexé à l'arrêté de permis de construire. L'accompagnement se poursuivra ensuite sur la phase Pro et DCE du projet pour valider les choix techniques et qualitatifs conformément aux objectifs inscrits dans la fiche de lot et dans la convention de partenariat.

d) Ilots P6-5 et P6-6_Orchestra

Les échanges sur la programmation de cet îlot devront se poursuivre avec la SAS Repenser la Ville afin de valider une programmation d'activités qui constituera un marqueur d'identité à l'échelle du projet urbain ainsi qu'une programmation logements. Une fois cette programmation stabilisée et un équilibre économique validé par la SAS Repenser la Ville, le travail de la fiche de lot pourra être engagé.

e) Ilot P8.3/P8-4 – Kéria/ Memphis

Sur la base du plan guide actualisé, sur cet îlot en partie maîtrisé par La Fab, les négociations pourront être relancées avec les autres propriétaires afin d'envisager la passation d'une convention de partenariat et la réalisation d'une fiche de lot puis le lancement d'une consultation d'ici la fin de l'année 2026.

f) Ilot P4.2b équipement Leroy Merlin/Carpentier

La Fab et la maîtrise d'œuvre urbaine participeront à la commission technique d'analyse des offres finales remises par les candidats à Bordeaux Métropole.

g) Ilot P4.2c ilot Sud friche Leroy Merlin

La Fab poursuivra également les échanges avec les opérateurs Pichet et Nhood pour la mise en place d'une fiche de lot qui servira de base au lancement d'un concours pour la mutation de cet îlot.

3.7 Communication, concertation, médiation et animation du projet urbain

Pour tenir compte du plan d'actions régulièrement actualisé, l'année 2026 devra permettre :

- La distribution d'une lettre info projet
- La tenue de permanences régulières avec les habitants dont 2 en présence des interlocuteurs techniques Fab/Ville et BM
- L'organisation d'un évènement annuel
- La mise en place d'outils pédagogiques autour de l'expérimentation de la refertilisation des sols
- La mise à jour du site internet

Le marché actuel se terminant au 31 janvier 2027, la procédure de renouvellement de marché devra être engagée à partir du mois de septembre 2026.

4 Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2025

4.1.1 Les dépenses

Les Dépenses pour l'année 2025 s'élèvent à un montant global de 12 491 683 € TTC et correspondent à :

a) ETUDES

Le poste Etude représente 788 133 € TTC.

- Fin de l'actualisation du plan guide du projet urbain et actualisation du CPAUPE
- Prise en compte de la réclamation de Michel Desvignes Paysage
- Ilot P4-2b : Participation au jury du concours groupe scolaire/crèche/salle multisports
- Ilot P6-1/P6-2 : Suivi du concours de maîtrise d'œuvre et accompagnement à préparation du dossier de permis de construire
- Reprise de faisabilités pour la mise au point des programmations des ilots P4-2c, P8-1 et P3-7
- Etudes de géomètre et géotechniques
- Mission de coordination par l'OPC interchantier

b) FONCIER

Le poste Foncier représente 2 456 713 € TTC.

- Acquisitions foncières
- Suivi de la procédure de DUP et de cessibilité
- Taxes foncières
- Gestion des biens maîtrisés

c) TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES

Le poste Frais d'aménagement représente 8 720 364 € TTC.

- Honoraires de la maîtrise d'œuvre, du SPS et de l'OPC
- Travaux de la phase 0 des espaces publics
- Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des concessionnaires
- Travaux de la phase 1 des espaces publics

d) HONORAIRES CONCESSION

Le poste Honoraires de concession représente 380 000 € TTC.

e) COMMUNICATION

Le poste Médiation/Communication représente 86 969 € TTC.

- Mission réalisée par l'AMO médiation communication : lettres d'information ; gestion du site internet ; organisation d'événementiels

f) FRAIS DIVERS

Le poste Frais divers s'élève à 59 505 € TTC

4.1.2 Les recettes

Les recettes s'élèvent à un montant global de 6 265 131 TTC et correspondent à :

a) SUBVENTIONS

Le poste Subventions représente 62 478 € (Région Nouvelle Aquitaine sur la BDR)

b) PARTICIPATIONS

Le poste Participation métropolitaine représente 6 000 000 € TTC.

c) PRODUITS DIVERS : produits divers, refacturation et produits financiers

Le poste autres produits représente 202 653 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2026

4.2.1 Les dépenses

Les dépenses s'élèvent prévisionnellement à 9 231 174 € TTC et correspondent à.

a) ETUDES GENERALES

- Mission d'accompagnement des projets immobiliers et réalisation de fiches d'îlots et/ou faisabilités urbaines
- Les missions géomètre
- Etudes techniques
- Etudes environnementales
- Mission AMO commerces/activités/équipements
- Mission AMO Mobilité

b) FONCIER

- Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du programme prévisionnel des équipements publics phase 2 et mise en œuvre de la procédure de cessibilité phase 2
- Assistance juridique sur les procédures d'expropriation phase 2

c) TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES

- Fin de la phase 1 des travaux
- Chantiers de démolition
- Expérimentation pour la refunctionalisation des sols

d) HONORAIRES CONCESSION

- Rémunération forfaitaire prenant en compte les frais d'ingénierie nécessaires à la conduite des études et des travaux à mener sur les 5 prochaines années
-

e) FRAIS DE COMMUNICATION

- Mission d'animation, concertation, médiation et communication : réalisation lettre info projet, mise à jour site internet et diffusion newsletter, permanences avec les habitants, évènement annuel, mise à jour maquette du projet urbain
-

f) FRAIS DIVERS

- Frais divers et frais financiers.
- Participation aux frais liés à la maison des projets : frais liés à la gestion de la maison des projets

4.2.2 Les recettes

Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2026 sont de 6 212 092 € TTC.

a) PARTICIPATION METROPOLITAINE

Il est prévu le versement d'une participation à l'équilibre et à la remise d'ouvrage.

b) PARTICIPATION VILLE : il est prévu le versement d'une participation à la remise d'ouvrage de la Ville de Mérignac

4.3 Imputation des charges du concessionnaire – Rémunération aménageur

L'article 19 du traité de concession stipule que « le concessionnaire est autorisé à imputer ses charges de fonctionnement en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations de charges sont destinées à couvrir le coût d'intervention du concessionnaire, et sont dites 'rémunérations' au sens de l'article L 1523-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). »

■ Avenant - Point de vigilance :

La forte mobilisation des équipes sur les années 2027-2030 nécessite des frais d'ingénierie supplémentaires notamment sur la conduite de l'ensemble des études (urbaines, commerciales, environnementales), la réalisation des acquisitions des emprises foncières nécessaires au projet et le suivi des cessions (à forte complexité juridique), la mise en place d'une gouvernance avec les acteurs économiques présents sur le site, condition de la mutation d'ensemble de la zone commerciale, l'encadrement de la réalisation du programme de construction de la phase 2, les travaux à mener sur les 5 prochaines années et afin de permettre la mise en œuvre des ambitions financées par France 2030. En effet, la mobilisation des équipes sera nécessairement importante afin de parvenir à tenir les objectifs, ambitieux en termes de délais, de mise en œuvre du programme de construction et des équipements publics de la phase 2.

Cela produit, dans le cadre du présent CRFA, une révision du montant global de la rémunération ainsi qu'un recalage des montants forfaitaires annuels. Il est proposé d'établir un avenant (n°4) d'augmentation de rémunération pour un montant de 1 560 000 €.

Au vu du contexte opérationnel à venir (ajustement des projets immobilier, durée de l'opération à revoir et maintien de la mobilisation des équipes par exemple), il conviendra de prévoir une nouvelle révision du montant global de la rémunération du concessionnaire.

4.4 Participation du concédant

L'avenant 3 au traité de concession fixe le montant de la participation du concédant à 70 774 200 € HT (TVA due en sus) dont 53 253 135 € HT au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 17 521 065 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement et le montant de la participation du concédant sont modifiés, selon l'échéancier suivant :

- 2025 : 6 000 000 € TTC
- 2026 : 3 900 000 € TTC
- 2027 : 6 023 976 € TTC

- 2028 : 4 533 333 € TTC
- 2029 : 3 233 333 € TTC
- 2030 : 6 051 135 € TTC
- 2031 : 3 897 798 € TTC
- 2032 : 2 503 471 € TTC
- 2033 : 7 101 180 € TTC

4.5 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2025, la trésorerie présente un solde positif de 7 649 338 € et un solde prévisionnel cumulé positif de 10 630 256 € au 31 décembre 2026.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.6 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

a) ETUDES

Dans le cadre du programme France 2030 démonstrateur de la Ville Durable, le budget des études est augmenté à hauteur de 857 490 €HT notamment pour les études environnementales (économie circulaire et refonctionnalisation des sols), pour un montant de 455 490 € et les études commerciales pour un montant de 300 000 €.

b) FONCIER

Au global, ce poste prévisionnel augmente de 2 324 532 € HT, il comprend :

- les coûts des terrains acquis en 2025 (toutes indemnités incluses) au regard des montants prévisionnels inscrits au bilan à hauteur de 500 K€,
- la revalorisation des estimations d'une partie des acquisitions phase 2 au vu des jugements rendus dans le cadre de la procédure d'expropriation phase 1 à hauteur de 800 K€,
- l'augmentation des aléas fonciers dans l'attente des 4 jugements en appel dont les acquisitions Carrefour de la phase 1 des travaux à hauteur de 600 K€,
- la prise en compte de l'acquisition d'un foncier de compensation pour l'opération parc/groupe scolaire, à hauteur de 400 K€, en dehors du périmètre de l'opération, intégré à la proposition d'avenant 4
- l'augmentation des taxes foncières en fonction des nouvelles acquisitions réalisées.

c) FRAIS D'AMENAGEMENT

Ce poste diminue de 661 448€ HT

- Diminution des aléas travaux provisionnés pour les phases 2 et 3 des aménagements des espaces publics à 4,7%

d) FRAIS DE COMMUNICATION

Ce poste augmente de 235 533 € HT

- Augmentation du budget dédié aux actions de médiation à hauteur de 175 000 €

- Prise en compte de la participation à la maison du projet au sein de la Base du Réemploi à hauteur de 50 000 €.

e) REMUNERATION

Proposition d'avenant (n°4) pour augmenter ce poste à hauteur d'un montant de 1 560 000 € HT. Ce montant prend en compte les frais d'ingénierie nécessaires à la conduite de l'ensemble des missions nécessaires à la conduite du projet comme exposé au point 4.3.

f) FRAIS DIVERS

Ce poste est ajusté (en fonction de l'avancement de l'opération) à la baisse pour un montant de 54 143 €HT.

g) SUBVENTIONS

Ce poste intègre la subvention de la phase de réalisation France 2030 pour un montant de + 3 817 277 € (part de subvention attribuée à l'aménageur).

h) AUTRES PRODUITS

Ces postes constitués des loyers et des produits financiers encaissés en 2025 et 2026 s'élèvent à + 444 688 €

Le bilan prévisionnel demeure donc à l'équilibre et n'a pas d'impact sur le montant de la participation du concédant.

Il est proposé un avenant (n°4) pour prendre en compte :

- **l'augmentation de la rémunération de l'aménageur** pour un montant de 1 560 000 €, au regard de la révision du montant global de la rémunération ainsi que du recalage des montants forfaitaires annuels (point 4.3)
- **la mise à jour de l'annexe 3 du traité de concession présentant les modalités d'acquisition du foncier** intégrant l'achat d'un foncier nécessaire à la réalisation des compensations des projets de parc, groupe scolaire, crèche et salle multisports.

Points de vigilance

La présentation de ce bilan s'appuie sur l'absence de demande de participation complémentaire de Bordeaux Métropole pour intégrer les dépenses supplémentaires engendrées par les besoins de compensations environnementales des projets du parc public de la rue Carpentier, sous maîtrise d'ouvrage de La Fab, et du groupe scolaire/crèche/salle multisport sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole (acquisition foncière).

Cet exercice est soumis aux aléas liés aux estimations prévisionnelles du montant des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet urbain. En effet de nombreux facteurs peuvent évoluer tels que les prétentions des propriétaires, l'évolution des valeurs foncières, l'état de santé des activités présente sur ces sites. Ces données impactent significativement la fixation des prix notamment par le juge de l'expropriation.

Les premiers jugements en appel, en 2026, sont susceptibles de faire évoluer à la hausse les valeurs de référence au m² sur le secteur. Ils sont également susceptibles de stabiliser les valeurs de référence et les futures estimations prévisionnelles.

Au global, l'augmentation du coût des acquisitions foncières et des aléas fonciers ainsi que l'intégration des coûts liés à la compensation concourent à impacter de manière significative le poste des aléas travaux, alors même que les études des phases 2 et 3 des travaux restent à engager.

Le bilan, à ce stade d'avancement de l'opération présente des marges de manœuvre réduites en cas de nouvelles dépenses ou d'évolution des coûts fonciers et/ou travaux.

Le cas échéant, des arbitrages futurs, visant à prioriser les dépenses, pourront être proposés quant à la diminution des acquisitions foncières à porter par le bilan aménageur ou encore sur la modification du programme des travaux.

Quant à la rémunération aménageur, au regard du contexte opérationnel prévisionnel (difficultés de sortie des projets immobiliers, durée de l'opération susceptible d'être augmentée et maintien de la mobilisation des équipes), une nouvelle révision du montant global de la rémunération du concessionnaire sera à envisager.

Annexes

- Annexe 1. Bilan consolidé de l'opération d'aménagement
- Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé
- Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement
- Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné
- Annexe 3. Tableau acquisition cession
- Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé
- Annexe 4b. PGC Etat d'avancement
- Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps
- Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires
- Annexe 6. Suivi factures
- Annexe 7. Suivi des heures d'insertion

TOTAL DES DEPENSES CUMUL	89 699 881	13 191 380	102 891 261	27 364 694	12 491 683	39 856 376	9 231 174	16 993 522	11 581 738	6 569 009	8 334 450	5 775 507	4 153 505	395 980
--------------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Session Charges foncières		9 648 445	1 597 482	11 245 927	0	0	0	0	2 566 465	0	980 696	4 721 713	1 116 785	1 860 269	0
	Prix unit														
Libre	4 590	5 232 053	1 046 411	6 278 464	0	0	0	0	1 019 440	0	639 242	2 884 816	719 896	1 015 070	0
Abordable	1 170	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locatif social	1 935	1 715 520	171 552	1 887 072	0	0	0	0	306 405	0	192 133	867 068	216 374	305 092	0
Accession sociale	1 917	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS	2 187	1 107 964	60 938	1 168 902	0	0	0	0	189 796	0	119 012	537 085	134 027	188 982	0
Commerces	2 340	844 708	168 942	1 013 650	0	0	0	0	152 984	0	30 308	432 744	46 488	351 125	0
Bureaux	2 340	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités	2 340	748 200	149 640	897 840	0	0	0	0	897 840	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Subventions	4 398 848	-	4 398 848	419 077	62 478	481 555	987 896	400 000	699 600	699 600	699 600	430 597	0	0
-------------	-----------	---	-----------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

[illegible][illegible]

Autres recettes (dont subventions)	1 323 448	232 283	1 555 731	141 507	202 653	344 160	292 205	64 130	65 400	65 400	156 876	567 559	-	-
Autres produits	1 199 840	232 283	1 432 123	64 629	155 923	220 552	292 205	64 130	65 400	65 400	156 876	567 559	0	0
Produits financier	123 608	-	123 608	76 879	46 729	123 608	0	0	0	0	0	0	0	0


TOTAL RECETTES	89 699 881	13 191 380	102 891 261	38 740 584	6 265 131	45 005 714,34	6 212 092	12 528 549	8 026 991	7 057 687	12 091 315	6 474 731	4 825 731	668 451
----------------	------------	------------	-------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

Total dépenses	89 699 881	13 191 380	102 891 261	27 364 694	12 491 683	39 856 376	9 231 174	16 993 522	11 581 738	6 569 009	8 334 450	5 775 507	4 153 505	395 980
Total recettes	89 699 881	13 191 380	102 891 261	38 740 584	6 265 131	45 005 714	6 212 092	12 528 549	8 026 991	7 057 687	12 091 315	6 474 731	4 825 731	668 451
Avance Collectivités ou emprunts	11 000 000		11 000 000	0	2 500 000	2 500 000	6 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
Remboursement Avance ou Emprunts	11 000 000		11 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000
Avance Interne	-	-	-	0	0	0	0							
Solde trésorerie/année	-	0,00	0,00	11 375 890,03	-3 726 552	7 649 338	2 980 918	-1 964 973	-5 554 747	-1 511 323	2 256 865	-1 800 776	-1 327 774	-727 529

SOLDE TRESORERIE CUMULEE	Accuse de reception en prefecture	11 375 890	-3 726 552	7 649 337,93	10 630 256	8 665 284	3 110 537	1 599 214	3 856 079	2 055 303	727 529	0
--------------------------	-----------------------------------	------------	------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---


Accusé de réception en préfecture 11 375 890
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

	(1) Bilan initial valeur %		(2) CRFA 2025 valeur %		(2-1) variat° %
DEPENSES EN TTC €					
Études de définition et de suivi de l'opération	1 980 000	3%	7 216 680	7%	264%
Accompagnement projets immobiliers	1 440 000	2%	3 181 512	3%	121%
Autres études	540 000	1%	4 035 168	4%	647%
Frais d'acquisition et de libération des sols	23 586 523	30%	38 621 577	38%	64%
Acquisitions foncières	18 947 572	24%	28 106 653	27%	48%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier privé	18 947 572	24%	28 106 653	27%	48%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	4 638 951	6%	8 180 502	8%	76%
Libération des terrains	0	0%	876 668	1%	0%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	0	0%	1 457 753	1%	0%
Frais d'aménagement (*)	42 823 039	55%	49 582 210	48%	16%
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 055 474	5%	4 801 901	5%	18%
Travaux et aléas	38 623 565	50%	39 756 970	39%	3%
Autres frais	144 000	0%	5 023 340	5%	3388%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0%
	0	0%	0	0%	0%
Honoraires concession	3 950 000	5%	5 510 000	5%	39%
	3 950 000	5%	5 510 000	5%	39%
Frais de communication	660 000	1%	911 675	1%	38%
Frais divers	1 519 000	2%	1 023 042	1%	-33%
Frais financiers	1 425 000	2%	0	0%	-100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	94 000	0%	1 023 042	1%	988%
Actualisation	1 831 474	2%	477 880	0%	-74%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	1 831 474	2%	477 880	0%	-74%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	1 123 077	1%	-451 802	0%	-140%
TOTAL DES DEPENSES	77 473 114	100%	102 891 261	100%	33%

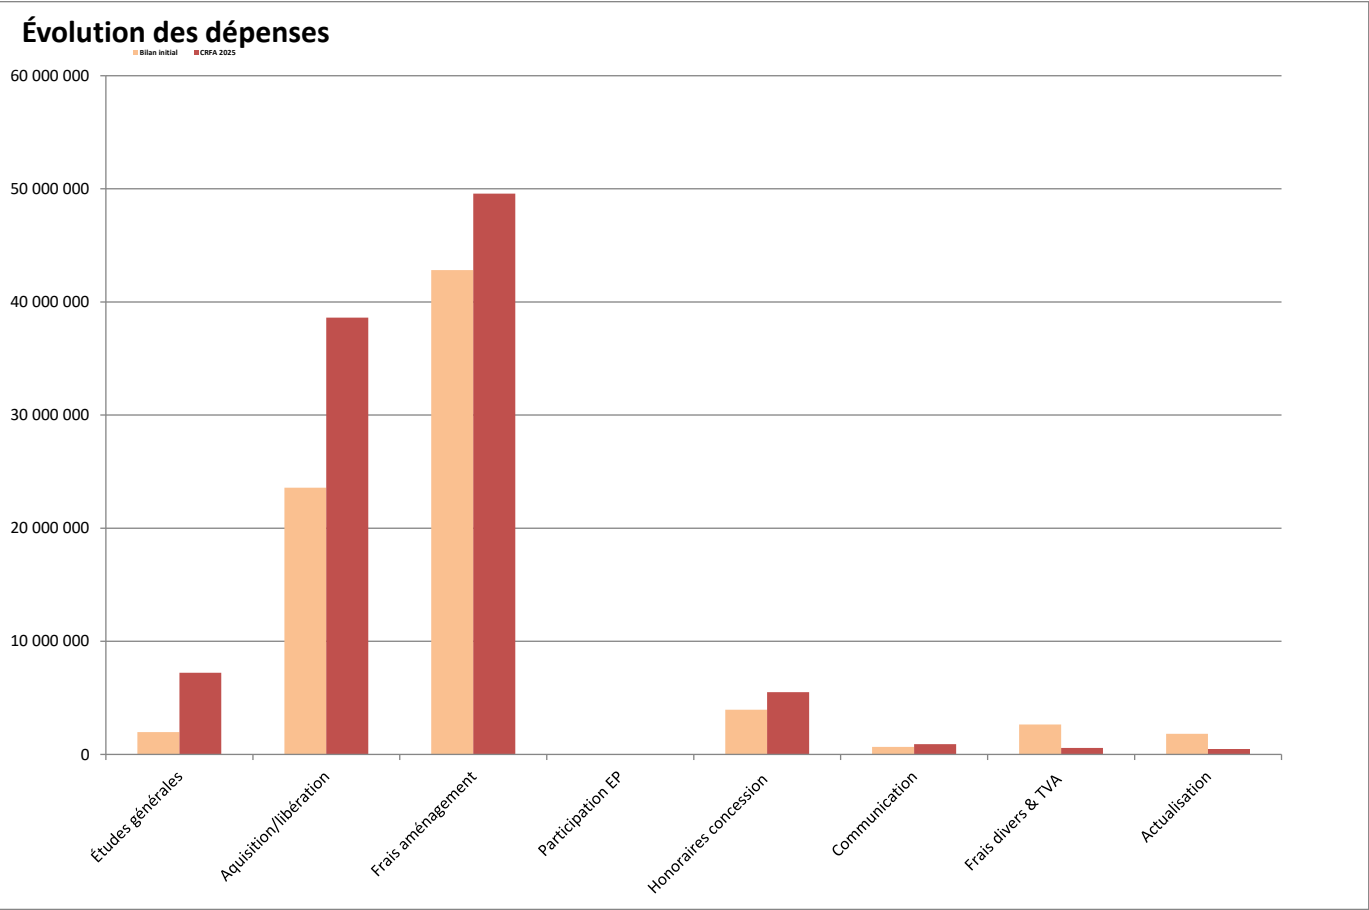

RECETTES EN TTC €							
	Bilan origine	CRFA 2025					
Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	13 717 848	18%	11 245 927	11%	-18%
Accession libre	450	4 590	7 329 960	9%	6 278 464	6%	-14%
Accession abordable	130	1 170	661 733	1%	0	0%	-100%
Locatif social	215	1 935	1 778 733	2%	1 887 072	2%	6%
Accession sociale	213	1 917	1 860 022	2%	0	0%	-100%
BRS		2 187	0	0%	1 168 902	1%	0%
Commerces	260	2 340	1 271 400	2%	1 013 650	1%	-20%
Bureaux	0	2 340	0	0%	0	0%	0%
Activités	200	2 015	816 000	1%	897 840	1%	10%
Participation constructeurs	Prix unit m² SP	CRFA 2025	0	0%	0	0%	0%
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général		0%			0%		0%
Subventions		0%	4 398 848	4%			0%
Participation métropolitaine	61 115 010	79%	81 424 827	79%			33%
Participation équilibre	1 469 047	2%	17 521 065	17%			1093%
Participation remise d'ouvrages	59 645 963	77%	63 903 762	62%			7%
Participation complément prix	0	0%	0	0%			0%
Participation communale	2 640 256	3%	4 265 929	4%			62%
Ville de Mérignac	2 640 256	3%	4 265 929	4%			62%
Autres recettes	0	0%	1 555 731	2%			0%
Autres produits		0%	1 432 123	1%			0%
Produits financier		0%	123 608	0%			0%
TOTAL DES RECETTES	77 473 114	100%	102 891 261	100%			33%

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DF-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026


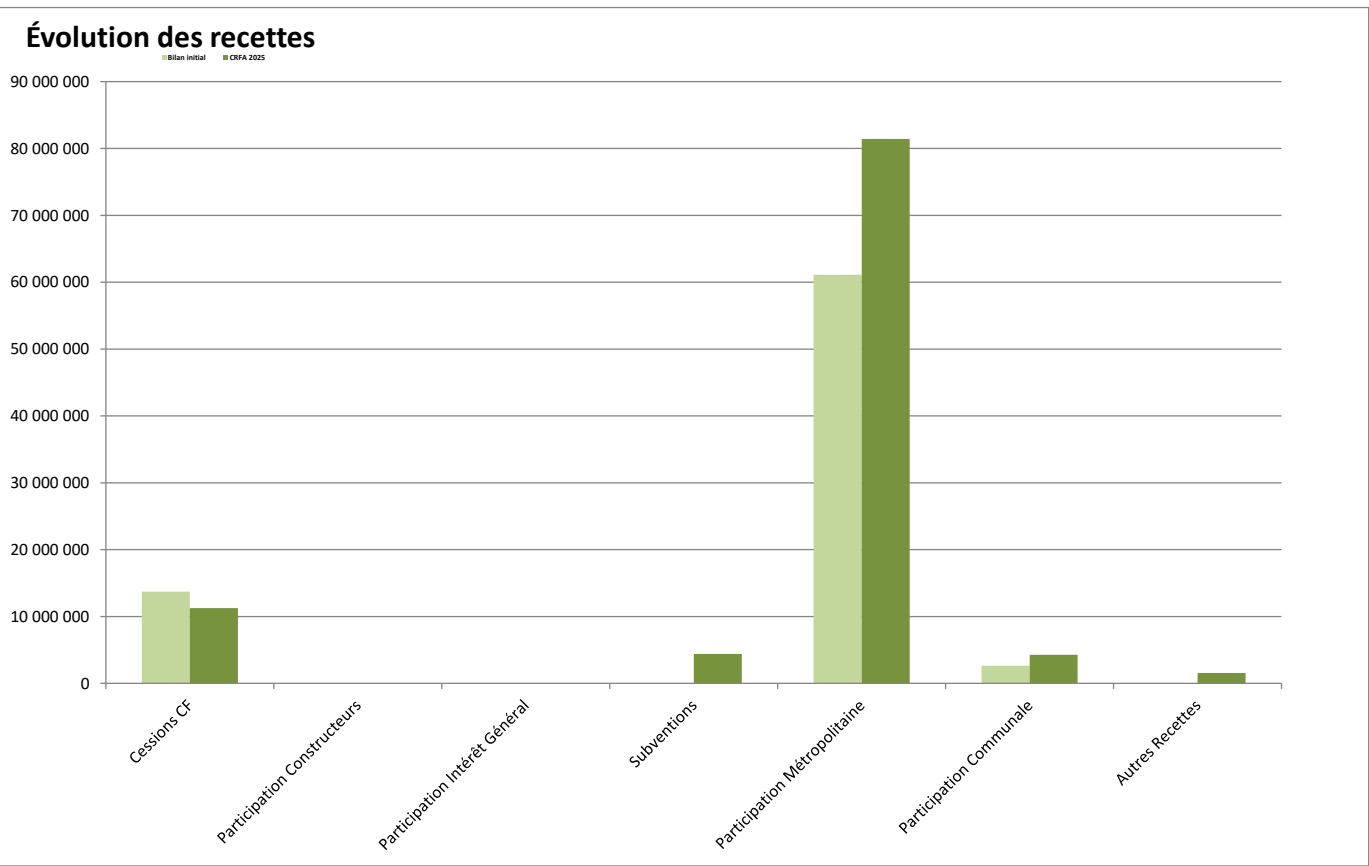


DEPENSES EN TTC €	CRF 2025		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé à fin 2025		Reste à réaliser	
			valeur	%	valeur	%
Études de définition et de suivi de l'opération	7 216 680	7%	3 158 979	44%	4 057 701	56%
Accompagnement projets immobiliers	3 181 512	3%	1 407 520	44%	1 773 992	56%
Autres études	4 035 168	4%	1 751 459	43%	2 283 709	57%
Frais d'acquisition et de libération des sols	38 621 577	38%	10 955 341	28%	27 666 235	72%
Acquisitions foncières	28 106 653	27%	8 005 730	28%	20 100 923	72%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier privé	28 106 653	27%	8 005 730	28%	20 100 923	72%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	8 180 502	8%	2 776 493	34%	5 404 009	66%
Libération des terrains	876 668	1%	173 118	20%	703 550	80%
Aléas	1 457 753	1%	0	0%	1 457 753	100%
Frais d'aménagement (*)	49 582 210	48%	17 959 869	36%	31 622 341	64%
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 801 901	5%	1 441 643	30%	3 360 257	70%
Travaux et aléas	39 756 970	39%	15 713 708	40%	24 043 261	60%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	5 023 340	5%	804 517	16%	4 218 823	84%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%
Honoraires concession	5 510 000	5%	2 337 258	42%	3 172 742	58%
	5 510 000	5%	2 337 258	42%	3 172 742	58%
Frais de communication	911 675	1%	443 491	49%	468 183	51%
Frais divers	1 023 042	1%	969 016	95%	54 026	5%
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	1 023 042	1%	969 016	95%	54 026	5%
Actualisation	477 880	0%	0	0%	477 880	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	477 880	0%	0	0%	477 880	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-451 802	0%	4 032 422	-893%	-4 484 224	993%
TOTAL DES DEPENSES	102 891 261	100%	39 856 376	39%	63 034 885	61%

RECETTES EN TTC €

Charges foncières	Bilan origine		CRFA 2025						
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP					
Accession libre	450	4 590	6 278 464	6%	0	0%	6 278 464	100%	
Accession abordable	130	1 170	0	0%	0	0%	0	0%	
Locatif social	215	1 935	1 887 072	2%	0	0%	1 887 072	100%	
Accession sociale	213	1 917	0	0%	0	0%	0	0%	
BRS		2 187	1 168 902	1%	0	0%	1 168 902	100%	
Commerces	260	2 340	1 013 650	1%	0	0%	1 013 650	100%	
Bureaux	0	2 340	0	0%	0	0%	0	0%	
Activités	200	2 015	897 840	1%	0	0%	897 840	100%	
Participation constructeurs	Bilan origine		CRFA 2025						
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP					
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)	0		0	0%	0	0%	0	0%	
Participation équipements d'intérêt général				0%		0%		0%	
Subventions	4 398 848	4%	481 555	11%	3 917 293	89%			
Participation métropolitaine	81 424 827	79%	44 180 000	54%	37 244 827	46%			
Participation équilibre	17 521 065	17%	1 070 000	6%	16 451 065	94%			
Participation remise d'ouvrages	63 903 762	62%	43 110 000	67%	20 793 762	33%			
Participation complément prix	0	0%	0	0%	0	0%			
Participation communale	4 265 929	4%	0	0%	4 265 929	100%			
Ville de Mérignac	4 265 929	4%	0	0%	4 265 929	100%			
Autres recettes	1 555 731	2%	344 160	22%	1 211 571	78%			
Autres produits	1 432 123	1%	220 552	15%	1 211 571	85%			
Produits financier	123 608	0%	123 608	100%	0	0%			
		0%		0%		0%			
TOTAL DES RECETTES	102 891 261	100%	45 005 714	44%	57 885 547	56%			

Accusé de réception en préfecture
033-245300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de teletransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

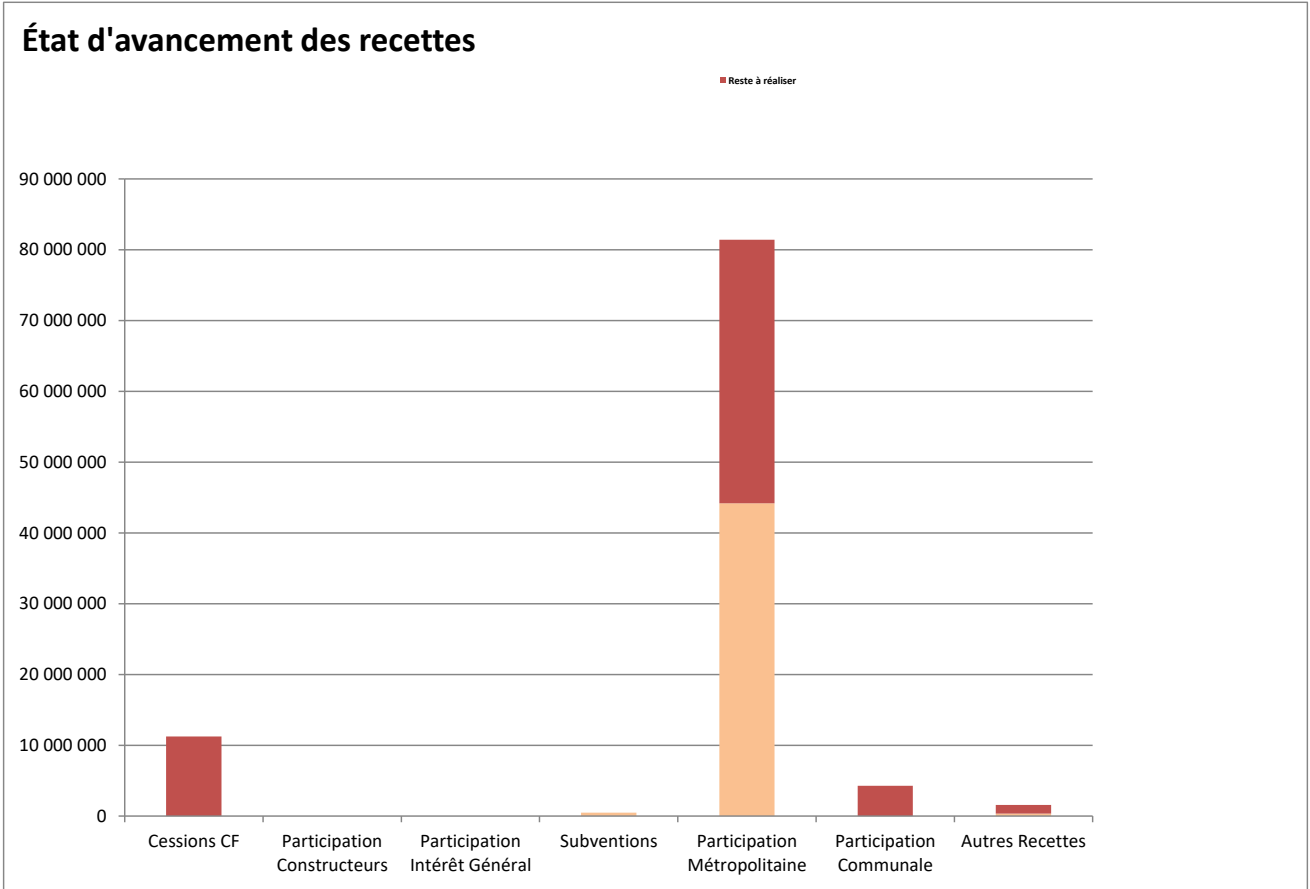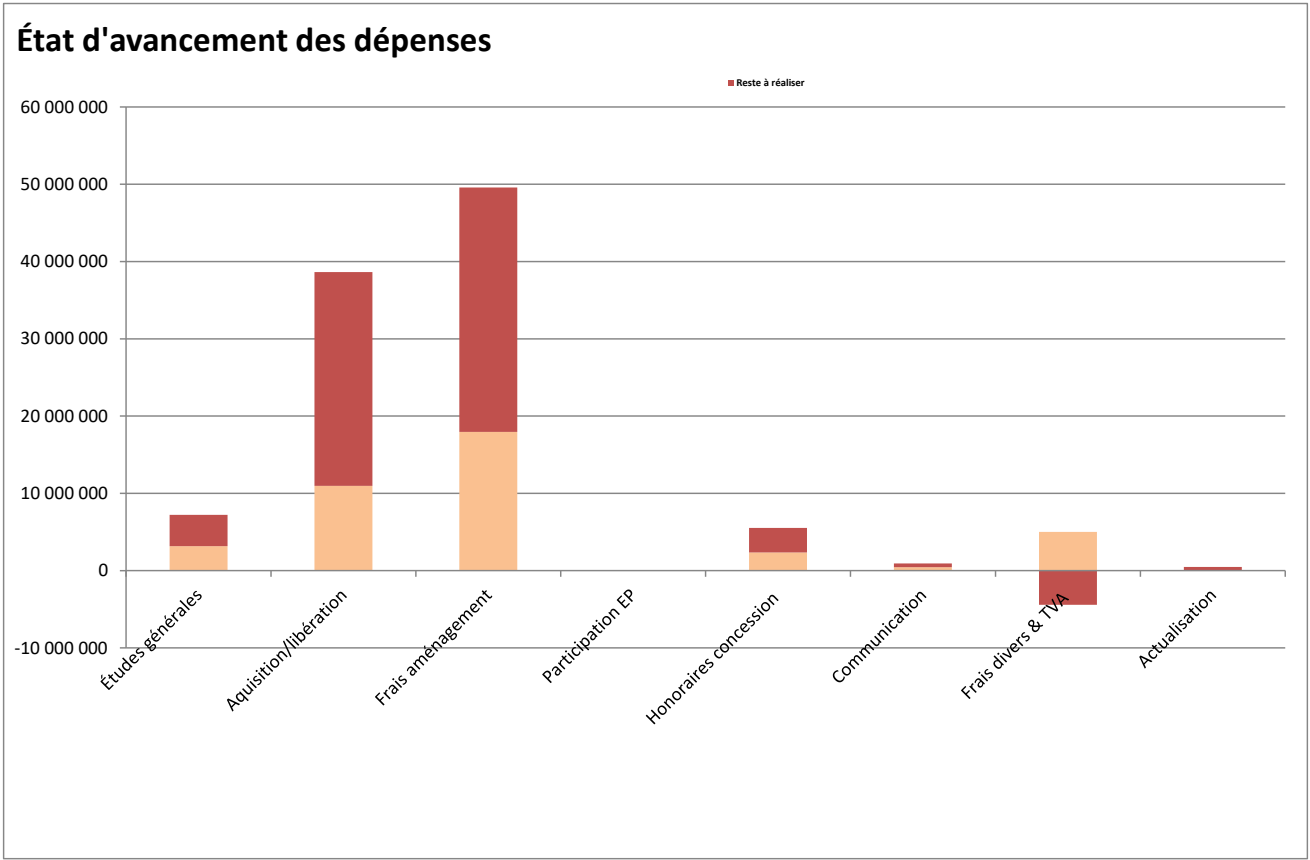

ACQUISITIONS REALISEES EN 2025

Ilot	Parcelles	Surface terrain m²	Vendeur (Propriétaire/Occupant)	Date acte /jugement	Prix € HT	remploi	indemnités diverses	Total
Emprises publiques	AX501 ; 503	1 090	Propriétaire	19/02/2025	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €
P8-3	AY 742	973	Propriétaire	11/03/2025	788 450,00 €	79 845,00 €	54 705	923 000,00 €
Emprises publiques	AW 568, 569 457, 458	407	Propriétaire	05/06/2025	8 140,00 €	0,00 €	0	8 140,00 €
Emprises publiques	AY 666, 662, 589, 664, 659, 660, 658, 657, 575, 811, 809, 813	2 148	Propriétaire	07/10/2025	107 400,00 €	0,00 €	0,00 €	107 400,00 €
		4 618			918 490,00 €	79 845,00 €	54 705,00 €	1 053 040,00 €


AUCUNE CESSION FONCIERE EN 2025

Ilot	Parcelles	Surface terrain	Acquéreur	Programme	SDP		Date acte	Prix HT

Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2025		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	73 500	35,00%	73 919	35%	0,57%
PLAI	22 050	10,50%	22 176	30%	0,57%
PLUS	51 450	24,50%	43 021	58%	0,57%
PLS			8 722	12%	
Accession sociale et abordable	52 500	25,00%	5 170	3%	-5,99%
BRS			44 187	21%	
Accession libre	84 000	40,00%	85 219	41%	1,45%
Sous total logements	210 000	100,00%	208 495		-1%
Logements	210 000	70%	208 495	75%	-1%
Commerces, activités, bureaux et équipement	90 000	30%	70 491	25%	-22%
Total	300 000	100%	278 986		-7%


Programme de construction actualisé en m² SP

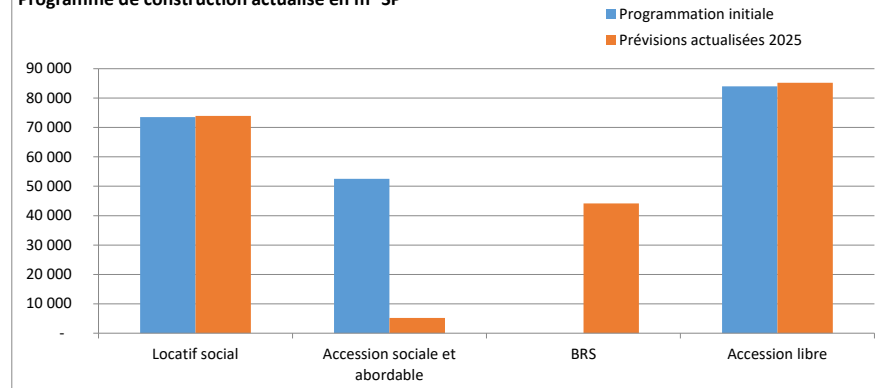

Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 2025		Variation%
		%		%	
Locatif social	980	35%	1 127	37%	15%
PLAI	294	10,5%	338	30,0%	15,0%
PLUS	686	24,5%	666	59,1%	-2,9%
PLS	0		123	10,9%	
Accession sociale et abordable	700	25%	72	2%	-90%
BRS	0		643	21%	
Accession libre	1 120	40%	1 222	40%	9%
Sous total logements	2 800	100%	3 065		9%

Programme de construction actualisé en nbre de logements

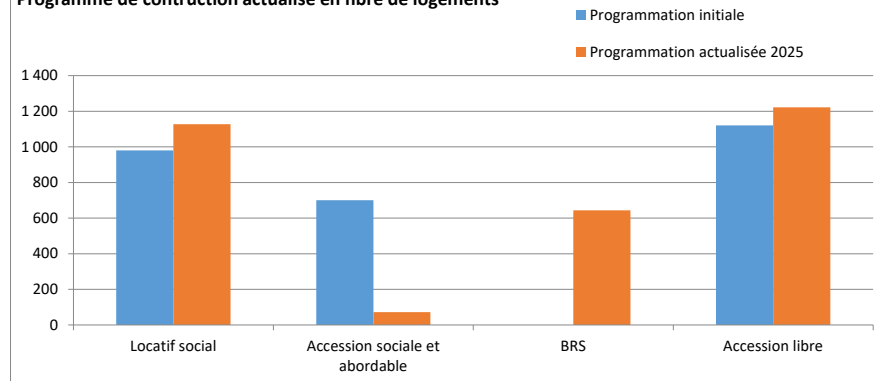


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2025		Etat d'avancement			
	m² SP	%	Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	73 919	35%	22 041	30%	51 878	70%
PLAI	21 892	10,5%	8 001	36,5%	13 891	63%
PLUS	42 533	20,4%	12 681	30%	29 852	70%
PLS	8 548	4,1%	1 359	16%	7 190	84%
Accession sociale et abordable	5 170	3%	5 170	100%	-	0%
BRS	44 187	21%	2 930	7%	41 257	93%
Accession libre	85 219	41%	29 937	35%	55 282	65%
Sous total logements	208 495		60 078	29%	148 417	71%
Commerces, activités et équipements	70 491		5 166	7,3%	65 325	92,7%
Total	278 986		65 244	23%	213 742	77%

* PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

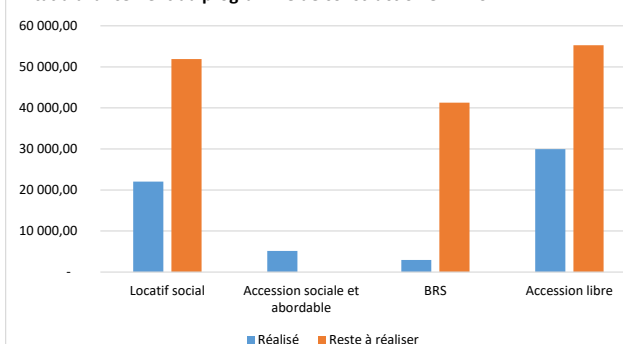


Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2024	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		logts	%	logts	%
Locatif social	1 127	292	26%	835	74%
PLAI	314	106	34%	208	66%
PLUS	609	168	28%	441	72%
PLS	123	18	15%	105	85%
Accession sociale et abordable	72	72	100%	0	0%
BRS	643	40	56%	603	94%
Accession libre	1 222	420	34%	802	66%
Sous total logements	3 065	1 116	36%	1 949	64%

* PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

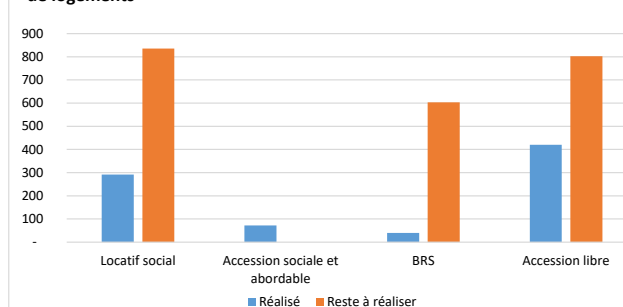

C0010 Mérygnac Soleil - CRFA 2025
Annexe 4c Programme de construction échelonné dans le temps*

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP																		
Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2024	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	73 500	73 919	22 041							5 632	0	7 891	7 300	2 412	8 756	8 232	9 354	2 301
Accession sociale et abordable	52 500	5 170	5 170							0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		44 187	2 930							3 216	0	5 159	4 777	1 592	6 288	7 056	7 595	1 451
Accession libre	84 000	85 219	29 937							6 734	0	9 496	8 780	2 886	10 110	8 455	9 868	2 822
Sous total logements	210 000	208 495	60 078	0	0	0	0	0	0	15 582	0	22 546	20 857	6 890	25 153	23 743	26 817	6575
Commerces, activités et équipements	90 000	70 491	5 166	0						7 926	0	14 516	6 210	484	16 771	5 922	11 055	2 440
Total	300 000	278 986	65 244	0	0	0	0	0	0	23 508	0	37 062	27 067	7 374	41 924	29 665	37 872	9 015

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements																		
Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2024	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	980	1127	292	0	0	0	0	0	0	154	0	113	106	34	144	118	134	33
Accession sociale et abordable	700	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		643	40							42	0	74	70	23	106	101	109	21
Accession libre	1 120	1222	420	0	0	0	0	0	0	98	0	135	128	41	162	118	140	40
Sous total logements	2 800	3 065	824	0	0	0	0	0	0	294	0	322	304	98	412	336	382	93

* PC purgés
** de 2018 à 2025 : échelonnement sur la base des projets en cours d'études, au-delà, hypothèse de programmation en fonction des "maturités" foncières

BILAN AMENAGEUR

CRFA 2024			
DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	5 195 160	992 548	6 187 708
Accompagnement projets immobiliers, études	2 230 000	399 528	2 629 528
Autres études	2 965 160	593 020	3 558 180
Frais d'acquisition et de libération des sols	32 436 337	3 824 198	36 260 534
Acquisitions foncières	23 200 093	3 534 128	26 734 220
- détail acquisitions	0	0	0
* dont foncier métropolitain	0	0	0
* dont foncier communal			
* dont foncier privé	23 200 093	3 534 128	26 734 220
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	7 672 170	149 402	7 821 572
Libération des terrains	700 000	140 668	840 668
Aléas	864 074	0	864 074
Frais d'aménagement (*)	42 000 186	8 356 741	50 356 927
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 014 642	787 258	4 801 901
Travaux et aléas	33 792 555	6 744 984	40 537 538
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	4 192 989	824 498	5 017 488
Participation aux équipements publics	0	0	0
	0	0	0
Honoraires concession	3 950 000	0	3 950 000
	3 950 000	0	3 950 000
Frais de communication	530 000	95 808	625 808
Frais divers	928 000	169 703	1 097 703
Frais financiers	0	0	0
Frais divers (Assurance, Taxes...)	928 000	169 703	1 097 703
Actualisation	398 234	79 647	477 880
	398 234	79 647	477 880
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	-399 391	-399 391
TOTAL DES DEPENSES	85 437 916	13 119 254	98 557 170
CRFA 2025			
DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	6 052 650	1 164 030	7 216 680
Accompagnement projets immobiliers, études	2 690 000	491 512	3 181 512
Autres études	3 362 650	672 518	4 035 168
Frais d'acquisition et de libération des sols	34 760 869	3 860 707	38 621 577
Acquisitions foncières	24 562 019	3 544 635	28 106 653
- détail acquisitions	0	0	0
* dont foncier métropolitain	0	0	0
* dont foncier communal			
* dont foncier privé	24 562 019	3 544 635	28 106 653
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	8 011 097	169 405	8 180 502
Libération des terrains	730 000	146 668	876 668
Aléas	1 457 753	0	1 457 753
Frais d'aménagement (*)	41 338 738	8 243 472	49 582 210
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 014 642	787 258	4 801 901
Travaux et aléas	33 130 809	6 626 162	39 756 970
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	4 193 287	830 052	5 023 340
Participation aux équipements publics	0	0	0
	0	0	0
Honoraires concession	5 510 000	0	5 510 000
	5 510 000	0	5 510 000
Frais de communication	765 533	146 142	911 675
Frais divers	873 857	149 185	1 023 042
Frais financiers	0	0	0
Frais divers (Assurance, Taxes...)	873 857	149 185	1 023 042
Actualisation	398 234	79 647	477 880
	398 234	79 647	477 880
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	-451 802	-451 802
TOTAL DES DEPENSES	89 699 881	13 191 380	102 891 261
Ecart			
€ HT	€ TVA	€ TTC	Commentaires
857 490			
460 000			Etudes d'amélioration du projet financées par France 2030
397 490			
2 324 532			
1 361 926			Ajustement des acquisitions 2025/réel, augmentation de l'estimation des fonciers phase 2 et ajout du foncier de compensation GS
0			
1 361 926			Ajustement des taxes foncières à venir
338 927			Dépenses sélectives financées par France 2030
30 000			Risque d'augmentation des acquisitions pour les dossiers en appel
593 679			
-661 448			
0			
-661 746			Diminution des aléas travaux
298			
0			
0			
1 560 000			
1 560 000			Forte mobilisation des équipes y compris financement par France 2030
235 533			
			Participation maison des projets /augmentation au vu des actions menées
-54 143			
0			
-54 143			Ajustement du poste aux besoins de l'opération
0			
0			
4 261 964			

Accusé de réception en préfecture
033-24330016-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

0,00

CRFA 2025 Mérignac Soleil

Annexe 6 - Liste des dépenses réglées à fin 2025

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2024	2025	2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
1 DEPENSES			23 332 271,75	12 491 682,66	35 823 954,41
A ETUDES GENERALES			2 370 846,46	788 132,70	3 158 979,16
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			1 018 943,62	308 521,00	1 327 464,62
23-06542 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - OBRAS			6 000,00		6 000,00
018746 AC1	19/09/2023	FA 2023-MER-	6 000,00		6 000,00
23-06543 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - LIST			6 000,00		6 000,00
018763 AC1	23/09/2023	FA 23/64	6 000,00		6 000,00
M2015-025/BDC2 Accompagnement projet Tram - FABRIQUE DE LA VILLE			1 530,00		1 530,00
010235 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00		1 530,00
M2016-004/MS12 France 2030 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - 8MINUTES 18SECONDES				3 662,28	3 662,28
023958 AC1	06/03/2025	FA		2 743,20	2 743,20
025321 AC2	22/07/2025	FA		552,96	552,96
025556 AC3 - DECOMPTE DEFINITIF	12/08/2025	FA		366,12	366,12
M2016-004/MS12 France 2030 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - ALTO STEP			58 686,97	23 339,68	82 026,65
019385 AC1	30/11/2023	FA FCA2230560	17 544,00		17 544,00
020528 AC2	19/02/2024	FA FCA2240055	13 674,90		13 674,90
020640 AC3	31/03/2024	FA FCA2240202	18 296,88		18 296,88
022782 AC4	18/11/2024	FA FCA2240727	9 171,19		9 171,19
023962 AC5	28/02/2025	FA FCA2250140		13 976,16	13 976,16
025747 AC6 - DECOMPTE DEFINITIF	04/09/2025	FA FCA2250625		9 363,52	9 363,52
M2016-004/MS12 France 2030 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - DESVIGNE MICHEL			111 002,49	28 145,17	139 147,66
019388 AC1	30/11/2023	FA 326646	24 039,00		24 039,00
020116 AC2	19/02/2024	FA 326787	28 933,34		28 933,34
020483 AC3	28/03/2024	FA 326867	38 539,32		38 539,32
022786 AC4	18/11/2024	FA 327263	19 490,83		19 490,83
023960 AC5	06/03/2025	FA 327461		18 971,15	18 971,15
025335 AC6	23/07/2025	FA 327694		5 512,82	5 512,82
025631 AC7 - DECOMPTE DEFINITIF	11/08/2025	FA 327719		3 661,20	3 661,20
M2016-004/MS12 France 2030 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - LIST			122 248,80	40 942,80	163 191,60
019388 AC1	30/11/2023	FA 23/80	30 000,00		30 000,00
020116 AC2	19/02/2024	FA 24/14	30 691,80		30 691,80
020483 AC3	28/03/2024	FA 24/32	40 881,60		40 881,60
022786 AC4	18/11/2024	FA 24/92	20 675,40		20 675,40
023960 AC5	06/03/2025	FA 25/13		25 664,40	25 664,40
025335 AC6	23/07/2025	FA 25/87		9 176,40	9 176,40
025631 AC7 - DECOMPTE DEFINITIF	11/08/2025	FA 25/94		6 102,00	6 102,00
M2016-004/MS13/BDC1 COORD° URBAINE - BDC1 : Abords voie MacDo - ALTO STEP			11 915,64		11 915,64
020391 AC1	14/03/2024	FA FCA2240120	11 915,64		11 915,64
M2016-004/MS13/BDC1 COORD° URBAINE - BDC1 : Abords voie MacDo - DESVIGNE MICHEL			12 637,80		12 637,80
020328 AC1	11/03/2024	FA 326831	12 637,80		12 637,80
M2016-004/MS13/BDC10 France 2030 COORD° URBAINE - BDC10 : Accomp. concertat° Parc			510,00	510,00	1 020,00
022315 AC1	02/10/2024	FA FCA2240582	510,00		510,00
024415 AC2	14/04/2025	FA FCA2250267		510,00	510,00
M2016-004/MS13/BDC10 France 2030 COORD° URBAINE - BDC10 : Accomp. concertat° Parc			2 400,00	2 400,00	4 800,00
022308 AC1	30/09/2024	FA 327175	2 400,00		2 400,00
024454 AC2	15/04/2025	FA 327527		2 400,00	2 400,00
M2016-004/MS13/BDC11 COORD° URBAINE - BDC11 : Alinéa - St-Maclou - ALTO STEP				7 089,00	7 089,00
024933 AC1	09/06/2025	FA FCA2250404		7 089,00	7 089,00
M2016-004/MS13/BDC11 COORD° URBAINE - BDC11 : Alinéa - St-Maclou - DESVIGNE MICHEL				3 994,16	3 994,16
024930 AC1	05/06/2025	FA 327618		3 994,16	3 994,16
M2016-004/MS13/BDC11 COORD° URBAINE - BDC11 : Alinéa - St-Maclou - LIST				11 880,00	11 880,00
024930 AC1	05/06/2025	FA 327618		11 880,00	11 880,00
M2016-004/MS13/BDC12 COORD° URBAINE - BDC12 : Echanges opérateurs - LIST				23 731,68	23 731,68
023131 AC1	01/01/2025	FA 24/98		23 731,68	23 731,68
M2016-004/MS13/BDC13 COORD° URBAINE - BDC13 : Désimperméabilisation des sols PH1 -				7 935,00	7 935,00
024970 AC1	10/06/2025	FA 327623		7 935,00	7 935,00
M2016-004/MS13/BDC14 COORD° URBAINE - BDC14 : Analyse projets Alinéa-St-Maclou - ALTO				2 805,00	2 805,00
024929 AC1	09/06/2025	FA FCA2250401		2 805,00	2 805,00
M2016-004/MS13/BDC14 COORD° URBAINE - BDC14 : Analyse projets Alinéa-St-Maclou -				3 000,00	3 000,00
024934 AC1	05/06/2025	FA 327617		3 000,00	3 000,00
M2016-004/MS13/BDC15 COORD° URBAINE - BDC15 : Faisabilité Carrefour (drive/station-service)				5 400,00	5 400,00
024945 AC1	12/06/2025	FA 25/59		5 400,00	5 400,00
M2016-004/MS13/BDC17 COORD° URBAINE - BDC17 : Images/Pers esp. publics Plan Guide -				6 000,00	6 000,00
024896 AC1	05/06/2025	FA 327616		6 000,00	6 000,00
M2016-004/MS13/BDC18 COORD° URBAINE - BDC18 : Préparation Forum Projets Urbains - ALTO				1 830,00	1 830,00
024974 AC1	11/06/2025	FA FCA2250413		1 830,00	1 830,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-004/MS13/BDC18 COORD° URBAINE - BDC18 : Préparation Forum Projets Urbains -				4 920,00	4 920,00
024953 AC1	10/06/2025	FA 327622		4 920,00	4 920,00
M2016-004/MS13/BDC18 COORD° URBAINE - BDC18 : Préparation Forum Projets Urbains - LIST				8 580,00	8 580,00
024953 AC1	10/06/2025	FA 25/65		8 580,00	8 580,00
M2016-004/MS13/BDC19 COORD° URBAINE - BDC19 : Suivi projet Alinéa-St-Maclou - DESVIGNE				840,00	840,00
026722 AC1	19/11/2025	FA 327905		840,00	840,00
M2016-004/MS13/BDC19 COORD° URBAINE - BDC19 : Suivi projet Alinéa-St-Maclou - LIST				3 360,00	3 360,00
026746 AC1	19/11/2025	FA 25/120		3 360,00	3 360,00
M2016-004/MS13/BDC2 France 2030 COORD° URBAINE - BDC2 : Comité de Suivi - LIST			841,68		841,68
020438 AC1	21/03/2024	FA 24/29	841,68		841,68
M2016-004/MS13/BDC23 COORD° URBAINE - BDC23 : Réunions sup Plan Guide - ALTO STEP				13 010,04	13 010,04
026043 AC1 - DGD	08/10/2025	DGD		13 010,04	13 010,04
M2016-004/MS13/BDC23 COORD° URBAINE - BDC23 : Réunions sup Plan Guide - DESVIGNE				15 911,34	15 911,34
026043 AC1 - DGD	08/10/2025	DGD		15 911,34	15 911,34
M2016-004/MS13/BDC23 COORD° URBAINE - BDC23 : Réunions sup Plan Guide - LIST				22 263,66	22 263,66
026043 AC1 - DGD	08/10/2025	DGD		22 263,66	22 263,66
M2016-004/MS13/BDC3 France 2030 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier -			3 526,04		3 526,04
020527 AC1	22/03/2024	FA FCA2240141	3 526,04		3 526,04
M2016-004/MS13/BDC3 France 2030 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier -			2 584,61		2 584,61
020392 AC1	18/03/2024	FA 326838	2 584,61		2 584,61
M2016-004/MS13/BDC3 France 2030 COORD° URBAINE - BDC3 : Groupe scolaire Carpentier - LIST			5 651,28		5 651,28
020481 AC1	22/03/2024	FA 24/31	5 651,28		5 651,28
M2016-004/MS13/BDC4 COORD° URBAINE - BDC4 : Pharmacie Lachèze - LIST			1 563,12		1 563,12
020439 AC1	21/03/2024	FA 24/30	1 563,12		1 563,12
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine - ALTO STEP			665,65		665,65
020641 AC1	10/04/2024	FA FCA2240203	665,65		665,65
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine - DESVIGNE MICHEL			1 202,40		1 202,40
020485 AC1	28/03/2024	FA 326871	1 202,40		1 202,40
M2016-004/MS13/BDC5 COORD° URBAINE - BDC5 : PC M4 Oasis urbaine - LIST			1 563,12		1 563,12
020485 AC1	28/03/2024	FA 326871	1 563,12		1 563,12
M2016-004/MS13/BDC6 COORD° URBAINE - BDC6 : PC Carrefour Station-Service - ALTO STEP				1 453,50	1 453,50
023160 AC1	01/01/2025	FA FCA2240821		1 453,50	1 453,50
M2016-004/MS13/BDC6 COORD° URBAINE - BDC6 : PC Carrefour Station-Service - DESVIGNE			600,00		600,00
023150 AC1	12/12/2024	FA 327329	600,00		600,00
M2016-004/MS13/BDC6 COORD° URBAINE - BDC6 : PC Carrefour Station-Service - LIST			900,00		900,00
023150 AC1	12/12/2024	FA 327329	900,00		900,00
M2016-004/MS13/BDC7 COORD° URBAINE - BDC7 : Réunion réemploi 29-01-2024 - ALTO STEP			1 415,64		1 415,64
020642 AC1	10/04/2024	FA FCA2240204	1 415,64		1 415,64
M2016-004/MS13/BDC7 COORD° URBAINE - BDC7 : Réunion réemploi 29-01-2024 - DESVIGNE			722,16		722,16
020311 AC1	08/03/2024	FA 326830	722,16		722,16
M2016-004/MS13/BDC8 France 2030 COORD° URBAINE - BDC8 : Reprise secteur MacDo - ALTO			2 192,20		2 192,20
021819 AC1	31/07/2024	FA FCA2240484	2 192,20		2 192,20
M2016-004/MS13/BDC8 France 2030 COORD° URBAINE - BDC8 : Reprise secteur MacDo -			2 672,68		2 672,68
021820 AC1	05/08/2024	FA 327118	2 672,68		2 672,68
M2016-004/MS13/BDC9 France 2030 COORD° URBAINE - BDC9 : Accomp. éco Parc Carpentier -				4 860,00	4 860,00
023137 AC1	01/01/2025	FA FCA2240815		4 860,00	4 860,00
M2016-004/MS13/BDC9 France 2030 COORD° URBAINE - BDC9 : Accomp. éco Parc Carpentier -			240,00	240,00	480,00
023079 AC1	05/12/2024	FA 327310	240,00		240,00
026727 AC2	19/11/2025	FA 327904		240,00	240,00
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - 8MINUTES 18SECONDES			1 518,05	2 853,11	4 371,16
021415 AC1	28/06/2024	FA	1 518,05		1 518,05
024103 AC2	20/03/2025	FA		1 426,36	1 426,36
025327 AC3	22/07/2025	FA		855,60	855,60
025555 AC4	12/08/2025	FA		571,15	571,15
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - ALTO STEP			10 373,33	16 383,69	26 757,02
021525 AC1	02/07/2024	FA FCA2240421	10 373,33		10 373,33
024099 AC2	14/03/2025	FA FCA2250180		9 746,77	9 746,77
025447 AC3	31/07/2025	FA FCA2250575		195,64	195,64
025635 AC4	25/08/2025	FCA2250593		6 441,28	6 441,28
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - DESVIGNE MICHEL			18 469,58	34 712,72	53 182,30
021435 AC1	02/07/2024	FA 327028	18 469,58		18 469,58
024102 AC2	19/03/2025	FA 327474		17 354,00	17 354,00
025336 AC3	23/07/2025	FA 327695		10 409,76	10 409,76
025557 AC4	11/08/2025	FA 327720		6 948,96	6 948,96
M2016-004/MS14 PARC CARPENTIER/VENELLE OUEST : EP-AVP-DLE - KHEPHREN				3 120,00	3 120,00
025447 AC3	31/07/2025	FA FCA2250575		3 120,00	3 120,00
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - ALTO STEP			2 947,09		2 947,09
008301 SOLDE BDC 19	21/06/2019	FA FCA2190239	2 947,09		2 947,09
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - DESVIGNE MICHEL			2 792,56		2 792,56
008296 SOLDE BDC 19	24/06/2019	FA 324396	2 792,56		2 792,56

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - OMA			11 559,60		11 559,60
008446 SOLDE BDC 19	27/06/2019	FA V7569	11 559,60		11 559,60
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - ALTO STEP			2 590,56		2 590,56
008306 AC 1	25/06/2019	FA FCA2190247	2 331,50		2 331,50
009000 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356	259,06		259,06
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL			1 727,04		1 727,04
008297 AC 1	24/06/2019	FA 324397	1 554,34		1 554,34
008988 SOLDE	26/09/2019	FA 324500	172,70		172,70
M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - OMA			10 794,00		10 794,00
008449 AC 1	27/06/2019	FA V7569	9 714,60		9 714,60
008985 SOLDE	25/10/2019	FA V7729	1 079,40		1 079,40
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - ALTO STEP			2 019,39		2 019,39
008303 AC 1	21/06/2019	FA FCA2190242	302,90		302,90
008998 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356	1 716,49		1 716,49
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - DESVIGNE MICHEL			2 205,71		2 205,71
008298 AC 1	24/06/2019	FA 324398	330,85		330,85
008987 SOLDE	26/09/2019	FA 324501	1 874,86		1 874,86
M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - OMA			5 495,51		5 495,51
008450 AC 1	27/06/2019	FA V7569	824,40		824,40
009120 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 671,11		4 671,11
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - ALTO STEP			1 980,00		1 980,00
009006 SOLDE	25/09/2019	FA FCA2190383	1 485,00		1 485,00
010998 SOLDE BDC 22	17/09/2020	FA FCA2200554	495,00		495,00
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - DESVIGNE MICHEL			1 320,00		1 320,00
008989 AC1	26/09/2019	FA 324502	990,00		990,00
010991 SOLDE	17/09/2020	NH 324869	330,00		330,00
M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - OMA			8 250,00		8 250,00
009121 AC 1	25/10/2019	V7729	6 187,50		6 187,50
010986 SOLDE	17/09/2020	FA V8140	2 062,50		2 062,50
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			1 980,00		1 980,00
009007 AC1	25/09/2019	FA FCA2190384	297,00		297,00
010093 AC2	25/03/2020	FA FCA2200195	1 683,00		1 683,00
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			1 320,00		1 320,00
008990 AC1	26/09/2019	FA 324503	198,00		198,00
010095 AC2	27/03/2020	FA 324711	1 122,00		1 122,00
M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			8 250,00		8 250,00
009122 AC 1	25/10/2019	V7729	1 237,50		1 237,50
010086 AC2	09/04/2020	FA V7976	7 012,50		7 012,50
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - ALTO STEP			1 440,00		1 440,00
009008 AC1	25/09/2019	FA FCA2190385	1 080,00		1 080,00
010999 SOLDE BDC 24	14/09/2020	FA FCA2200543	360,00		360,00
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - DESVIGNE MICHEL			960,00		960,00
008991 AC1	26/09/2019	FA 324504	720,00		720,00
010992 SOLDE	14/09/2020	NH 324865	240,00		240,00
M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - OMA			6 000,00		6 000,00
009123 AC 1	25/10/2019	V7729	4 500,00		4 500,00
011114 SOLDE	17/09/2020	V8140	1 500,00		1 500,00
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - ALTO STEP			1 009,07		1 009,07
008999 SOLDE	20/09/2019	FA FCA2190363	1 009,07		1 009,07
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - DESVIGNE MICHEL			1 102,85		1 102,85
008992 SOLDE	26/09/2019	FA 324505	1 102,85		1 102,85
M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - OMA			4 313,88		4 313,88
009124 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 313,88		4 313,88
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - ALTO STEP			2 648,52		2 648,52
010094 AC1	25/03/2020	FA FCA2200196	1 986,38		1 986,38
011000 SOLDE BDC26	14/09/2020	FA FCA2200544	662,14		662,14
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - DESVIGNE MICHEL			1 765,68		1 765,68
010096 AC1	31/03/2020	FA 324712	1 324,26		1 324,26
010993 SOLDE	14/09/2020	FA 324866	441,42		441,42
M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - OMA			11 035,50		11 035,50
010107 AC1	09/04/2020	FA V7976	8 276,63		8 276,63
011115 SOLDE	17/09/2020	V8140	2 758,87		2 758,87
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - ALTO STEP			3 026,88		3 026,88
011001 AC1	14/09/2020	FA FCA2200542	1 513,44		1 513,44
012241 AC2	19/03/2021	FA FCA2210145	756,72		756,72
013322 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210425	756,72		756,72
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - DESVIGNE			2 017,92		2 017,92
010994 AC1	14/09/2020	FA 324867	1 008,96		1 008,96
012236 AC2	19/03/2021	FA 325158	504,48		504,48
013312 SOLDE	15/09/2021	FA 325389	504,48		504,48

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - OMA			12 612,00		12 612,00
011116 AC 1	17/09/2020	V8140	6 306,00		6 306,00
012233 AC2	20/03/2021	FA V8508	3 153,00		3 153,00
013306 AC3	15/09/2021	FA V8699	3 153,00		3 153,00
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - ALTO STEP			1 513,20		1 513,20
011002 AC1	17/09/2020	FA FCA2200555	378,30		378,30
011591 AC2	01/01/2021	FA FCA2200734	756,60		756,60
012242 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210146	378,30		378,30
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - DESVIGNE MICHEL			1 008,00		1 008,00
010995 AC1	17/09/2020	FA 324870	252,00		252,00
011593 AC2	01/01/2021	FA 324995	504,00		504,00
012237 SOLDE	19/03/2021	FA 325159	252,00		252,00
M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - OMA			6 306,00		6 306,00
011117 AC 1	17/09/2020	V8140	1 576,50		1 576,50
011596 AC2	01/01/2021	FA V8245	3 153,00		3 153,00
012341 SOLDE	20/03/2021	FA V8508	1 576,50		1 576,50
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - ALTO STEP			1 519,20		1 519,20
013323 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210429	1 519,20		1 519,20
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - DESVIGNE MICHEL			1 012,80		1 012,80
013313 SOLDE	15/09/2021	FA 325390	1 012,80		1 012,80
M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - OMA			6 330,00		6 330,00
013361 SOLDE	15/09/2021	FA V8699	6 330,00		6 330,00
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - ALTO STEP			2 073,66		2 073,66
013324 AC 1	10/09/2021	FCA2210430	1 555,25		1 555,25
014656 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220109	518,41		518,41
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - DESVIGNE MICHEL			2 576,99		2 576,99
013314 AC 1	15/09/2021	FA 325391	1 932,30		1 932,30
016068 SOLDE	05/09/2022	NH 325861	644,69		644,69
M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - OMA			3 707,55		3 707,55
013362 AC 1	15/09/2021	V8699	2 781,00		2 781,00
014650 SOLDE	02/03/2022	FA V8931	926,55		926,55
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - ALTO STEP			396,43	1 189,31	1 585,74
013325 AC 1	10/09/2021	FCA2210431	396,43		396,43
023799 AC2	01/01/2025	FA FCA2240832		1 189,31	1 189,31
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - DESVIGNE MICHEL			577,80	1 733,40	2 311,20
013315 AC1	15/09/2021	FA 325392	577,80		577,80
023181 AC2	01/01/2025	FA 327347		1 733,40	1 733,40
M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - OMA			10 381,14		10 381,14
013504 AC1	15/09/2021	FA V8699	5 190,50		5 190,50
018644 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	5 190,64		5 190,64
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - ALTO STEP			1 571,04		1 571,04
M2016-004/MS2/BDC 33 Avance	12/10/2021		-157,10		-157,10
M2016-004/MS2/BDC 33 Avance	12/10/2021		157,10		157,10
014658 AC2	28/02/2022	FA FCA2220110	1 413,94		1 413,94
016078 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220461	157,10		157,10
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - DESVIGNE MICHEL			1 047,36		1 047,36
016069 SOLDE	05/09/2022	NH 325862	1 047,36		1 047,36
M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - OMA			6 546,00		6 546,00
014651 AC1	02/03/2022	FA V8932	5 891,40		5 891,40
016024 SOLDE	31/08/2022	FA V9128	654,60		654,60
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeaudeau élargi - ALTO STEP			1 571,04		1 571,04
014659 AC1	28/02/2022	FA FCA2220128	471,31		471,31
016079 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220462	1 099,73		1 099,73
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeaudeau élargi - DESVIGNE MICHEL			1 047,36		1 047,36
016070 SOLDE	05/09/2022	NH 325863	1 047,36		1 047,36
M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeaudeau élargi - OMA			6 546,00		6 546,00
014652 AC1	02/03/2022	FA V8933	1 963,80		1 963,80
016063 SOLDE	30/08/2022	FA V9129	4 582,20		4 582,20
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Faisabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5			5 198,58		5 198,58
M2016-004/MS2/BDC35 Avance	28/02/2022		-1 463,42		-1 463,42
M2016-004/MS2/BDC35 Avance	28/02/2022		1 463,42		1 463,42
016080 AC1	26/08/2022	FA FCA2220463	3 898,93		3 898,93
018713 AC2	14/09/2023	FA FCA2230436	1 299,65		1 299,65
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Faisabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5			3 465,72		3 465,72
016071 AC1	05/09/2022	NH 325864	2 599,28		2 599,28
018714 AC2	06/09/2023	FA 326487	866,44		866,44
M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Faisabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5			21 660,75		21 660,75
016064 AC1	26/08/2022	FA V9130	16 245,56		16 245,56
018649 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	5 415,19		5 415,19
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - 8MINUTES 18SECONDES			1 111,51		1 111,51

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
008308 SOLDE	20/06/2019	FA	1 111,51		1 111,51
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - ALTO STEP			5 557,57		5 557,57
008305 SOLDE	21/06/2019	FA FCA2190244	5 557,57		5 557,57
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - DESVIGNE MICHEL			11 485,65		11 485,65
008300 SOLDE	24/06/2019	FA 324400	11 485,65		11 485,65
M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - OMA			3 396,29		3 396,29
008294 SOLDE	27/06/2019	FA V7579	3 396,29		3 396,29
M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - ALTO STEP			2 442,00		2 442,00
009003 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190359	2 442,00		2 442,00
M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - DESVIGNE MICHEL			2 628,00		2 628,00
008995 SOLDE	26/09/2019	FA 324508	2 628,00		2 628,00
M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - OMA			3 770,00		3 770,00
009116 SOLDE	25/10/2019	V7730	3 770,00		3 770,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - ALTO STEP			1 164,00		1 164,00
009004 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190360	1 164,00		1 164,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL			966,00		966,00
008996 SOLDE	26/09/2019	FA 324509	966,00		966,00
M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - OMA			9 080,00		9 080,00
009117 SOLDE	25/10/2019	V7730	9 080,00		9 080,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - ALTO STEP			960,00		960,00
009005 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190361	960,00		960,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - DESVIGNE MICHEL			657,00		657,00
008997 SOLDE	26/09/2019	FA 324510	657,00		657,00
M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - OMA			1 510,00		1 510,00
009118 SOLDE	25/10/2019	V7730	1 510,00		1 510,00
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - ALTO STEP			3 510,00		3 510,00
009150 SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190508	3 510,00		3 510,00
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - DESVIGNE MICHEL			5 876,40		5 876,40
009148 SOLDE	25/11/2019	FA 324598	5 876,40		5 876,40
M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - OMA			1 890,00		1 890,00
009147 SOLDE	26/11/2019	FA V7780	1 890,00		1 890,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - ALTO STEP			3 084,00		3 084,00
009151 SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190509	3 084,00		3 084,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - DESVIGNE MICHEL			966,00		966,00
009149 SOLDE	25/11/2019	FA 324599	966,00		966,00
M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - OMA			1 130,00		1 130,00
009177 SOLDE	26/11/2019	V7780	1 130,00		1 130,00
M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - ALTO STEP			4 410,00		4 410,00
011003 SOLDE BDC 8	17/09/2020	FA FCA2200556	4 410,00		4 410,00
M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - OMA			190,00		190,00
010989 SOLDE	17/09/2020	FA V8148	190,00		190,00
M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - ALTO STEP			12 132,00		12 132,00
011590 SOLDE	01/01/2021	FA FCA2200735	12 132,00		12 132,00
M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - OMA			565,00		565,00
011595 SOLDE	01/01/2021	FA V8246	565,00		565,00
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - 8MINUTES 18SECONDES			7 611,36		7 611,36
012248 SOLDE	23/03/2021	FA	7 611,36		7 611,36
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - ALTO STEP			23 870,34		23 870,34
012243 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210147	23 870,34		23 870,34
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - DESVIGNE MICHEL			13 880,44		13 880,44
012238 SOLDE	19/03/2021	FA 325160	13 880,44		13 880,44
M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - OMA			12 150,30		12 150,30
012234 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	12 150,30		12 150,30
M2016-004/MS9/BDC11 Suivi de réalisation d'une maquette d'urbanisme du projet urbain - OMA			3 797,60		3 797,60
012342 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	3 797,60		3 797,60
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - ALTO			539,34		539,34
012244 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210148	539,34		539,34
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » -			624,18		624,18
012239 SOLDE	19/03/2021	FA 325161	624,18		624,18
M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - OMA			6 857,90		6 857,90
012343 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	6 857,90		6 857,90
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - ALTO STEP			29 354,64		29 354,64
012245 AC1	19/03/2021	FA FCA2210149	14 677,34		14 677,34
013318 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210408	14 677,30		14 677,30
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - OMA			2 272,50		2 272,50
012344 AC1	20/03/2021	FA V8509	1 136,25		1 136,25
013405 AC2	15/09/2021	FA V8700	1 136,25		1 136,25
M2016-004/MS9/BDC16 Eude capacité pavillonnaire Sud Carrefour - OMA			5 342,90		5 342,90
013507 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90		5 342,90
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - ALTO STEP			11 623,08		11 623,08

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
013359 AC1	27/09/2021	FCA2210458	8 717,32		8 717,32
014662 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220113	2 905,76		2 905,76
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - DESVIGNE MICHEL			1 248,36		1 248,36
013358 AC1	30/09/2021	FA 325414	936,28		936,28
016072 SOLDE	06/09/2022	NH 325866	312,08		312,08
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - OMA			11 094,85		11 094,85
013357 AC1	29/09/2021	V8726	8 321,14		8 321,14
018645 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	2 773,71		2 773,71
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et			21 898,94		21 898,94
014663 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220114	21 898,94		21 898,94
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et			2 580,77		2 580,77
016073 SOLDE	06/09/2022	NH 325869	2 580,77		2 580,77
M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et			2 359,44		2 359,44
014654 SOLDE	02/03/2022	FA V8929	2 359,44		2 359,44
M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et			40 167,70		40 167,70
018502 AC1	29/05/2023	FA FCA2230233	32 134,16		32 134,16
018712 AC2	14/09/2023	FA FCA2230435	8 033,54		8 033,54
M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et			829,50		829,50
018496 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9609	829,50		829,50
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - ALTO STEP			23 020,20		23 020,20
014664 AC1	28/02/2022	FA FCA2220115	19 567,18		19 567,18
016081 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220464	3 453,02		3 453,02
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - DESVIGNE MICHEL			1 290,38		1 290,38
016074 SOLDE	06/09/2022	NH 325867	1 290,38		1 290,38
M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - OMA			2 359,44		2 359,44
014655 AC1	02/03/2022	FA V8930	2 005,61		2 005,61
016065 SOLDE	30/08/2022	FA V9131	353,83		353,83
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa - ALTO			5 236,70		5 236,70
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 236,70		5 236,70
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa -			5 888,16		5 888,16
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 888,16		5 888,16
M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa - OMA			14 554,58		14 554,58
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	14 554,58		14 554,58
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anquetil - ALTO STEP			5 909,86		5 909,86
018503 AC1	29/05/2023	FA FCA2230234	5 909,86		5 909,86
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anquetil - DESVIGNE			13 122,68		13 122,68
018497 AC 1 SOLDE	05/05/2023	FA 326265	13 122,68		13 122,68
M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Anquetil - OMA			4 573,31		4 573,31
018495 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9608	4 573,31		4 573,31
M2016-004/MS9/BDC22 FRANCE 2030 - M8 : complément de prestations au DCE - 8MINUTES			4 992,41		4 992,41
018799 AC1	27/09/2023	FA	4 992,41		4 992,41
M2016-004/MS9/BDC22 FRANCE 2030 - M8 : complément de prestations au DCE - ALTO STEP			19 117,73		19 117,73
018708 AC1	13/09/2023	FA FCA2230431	19 117,73		19 117,73
M2016-004/MS9/BDC22 FRANCE 2030 - M8 : complément de prestations au DCE - DESVIGNE			8 042,98		8 042,98
018715 AC1	06/09/2023	FA 326488	8 042,98		8 042,98
M2016-004/MS9/BDC22 FRANCE 2030 - M8 : complément de prestations au DCE - OMA			2 359,44		2 359,44
018646 SOLDE	30/09/2023	DECPTE	2 359,44		2 359,44
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux			1 393,56		1 393,56
018795 AC1	27/09/2023	FA	1 393,56		1 393,56
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux			14 818,19		14 818,19
018709 AC1	13/09/2023	FA FCA2230432	14 818,19		14 818,19
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux			1 751,90		1 751,90
018716 AC1	06/09/2023	FA 326489	1 751,90		1 751,90
M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux			1 659,00		1 659,00
018647 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	1 659,00		1 659,00
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la			1 950,98		1 950,98
018797 AC1	27/09/2023	FA	1 950,98		1 950,98
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la			8 467,54		8 467,54
018710 AC1	13/09/2023	FA FCA2230433	8 467,54		8 467,54
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la			4 645,20		4 645,20
018717 AC1	06/09/2023	FA 326490	4 645,20		4 645,20
M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la			829,50		829,50
018648 SOLDE	07/09/2023	DECPTE	829,50		829,50
M2021-010/BDC18 Audit projet urbain, accompagnement MOE urbain - FABRIQUE DE LA VILLE			7 520,70		7 520,70
019677 AC1	21/07/2023	FA 088-23	7 520,70		7 520,70
M2024-013/Lot1/BDC14 Mise au point PC Ilot P6-1 et P6-2 - CANCAN				425,46	425,46
026136 AC1	07/10/2025	FA 25-225-103		425,46	425,46
A102 Etude commerciale			72 948,55	7 106,91	80 055,46
25-08458 France 2030 Petit-déjeuner Atelier "Enseignes" du 18-09-2025 - CLASS CROUTE				176,91	176,91
026194 AC1 - FRANCE 2030	18/09/2025	FA F2056-		176,91	176,91

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2018-032/BDC10 M2 Diagnostic et préconisation à l'échelle de secteurs prioritaires de			5 601,18		5 601,18
014548 AC1	22/02/2022	FA 2202-	1 523,52		1 523,52
015290 REGUL AC1	22/02/2022	FA 2202-	-609,41		-609,41
015622 AC2	30/06/2022	FA 2206-150	2 359,15		2 359,15
018253 AC3	01/01/2023	FA 2212-280	2 327,92		2 327,92
018230 AC1	30/06/2023	FA 2306-424-	9 600,00		9 600,00
019618 AC2	01/01/2024	FA 2312-578-	12 000,00		12 000,00
020381 AC3	15/03/2024	FA 2403-650-	9 600,00		9 600,00
021483 AC4	28/06/2024	FA 2406-731	4 195,20		4 195,20
022882 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424	-9 600,00		-9 600,00
022885 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2312-578	-12 000,00		-12 000,00
022887 ANNUL ERR IMPUT	15/03/2024	FA 2403-650	-9 600,00		-9 600,00
022889 ANNUL ERR IMPUT	28/06/2024	FA 2406-731	-4 195,20		-4 195,20
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE			16 991,78		16 991,78
008977 AC1	31/10/2019	FA 1910-224	10 594,43		10 594,43
009951 AC2	28/02/2020	FA 2002-042	6 397,35		6 397,35
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO DEVELOPPEMENT			12 999,53		12 999,53
008980 AC1	30/10/2019	FA 19-10-134	8 423,08		8 423,08
009956 AC2	09/03/2020	FA 2003166	4 576,45		4 576,45
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA VILLE			9 775,03		9 775,03
008979 AC1	31/10/2019	FA 2019,10,59	3 963,80		3 963,80
009954 AC2	06/03/2020	FA 20200308	5 811,23		5 811,23
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE			5 220,11		5 220,11
008983 AC1	30/10/2019	FA 20191030	1 486,43		1 486,43
009953 AC2	09/03/2020	FA 20200309A	3 733,68		3 733,68
M2018-032/BDC6 M2 Accompagnement secteur fonciers autour de Carrefour - BERENICE			6 975,36		6 975,36
013050 AC1	30/07/2021	FA 2017-	6 975,36		6 975,36
M2018-032/BDC7 M2 Accompagnement secteur Pichet et Clairienne - BERENICE			4 795,56		4 795,56
013049 SOLDE	30/07/2021	FA 2017-	4 795,56		4 795,56
M2023-048/BDC1 Commercialisation locaux d'activités - BERENICE			10 590,00	6 930,00	17 520,00
020779 AC1	26/04/2024	FA 2404-672-	10 590,00		10 590,00
024494 AC2	31/03/2025	FA BERE-2503-		6 930,00	6 930,00
A103 Coordination OPC urbain			261 751,55	91 222,90	352 974,45
M2019-009/BDC1 Etablisst dossier OPC initial missions 6.1.1 & 6.1.3 à 6.1.5 - ARTELIA VILLE &			26 051,29		26 051,29
008928 AC 1	23/10/2019	FA 911019406	12 153,95		12 153,95
009805 AC 2	13/02/2020	FA 911029961	10 783,03		10 783,03
010259 SOLDE	30/04/2020	FA 911037169	3 114,31		3 114,31
M2019-009/BDC2 Missions 6.1.2, 6.3.1 et 6.3.2 - Missions AMO et réunions de travail - ARTELIA			4 248,14		4 248,14
010257 AC1	30/04/2020	FA 911037166	1 086,48		1 086,48
010738 AC2	31/07/2020	FA 911044701	3 161,66		3 161,66
M2019-009/BDC3 Validation PIC et fiche suivi travaux ilot Castorama - ARTELIA VILLE & TRANSP			718,56		718,56
010739 SOLDE	31/07/2020	FA 911044702	718,56		718,56
M2019-009/BDC4 OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP			10 570,28		10 570,28
011538 AC1	01/01/2021	FA 911054353	10 570,28		10 570,28
M2019-009/BDC5 Suivi OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP			40 128,04		40 128,04
012289 AC1	31/03/2021	FA 911066172	12 191,04		12 191,04
012978 AC2	23/07/2021	FA 911076095	9 169,13		9 169,13
014432 AC3	31/01/2022	FA 911093207	16 693,90		16 693,90
015357 AC4	20/06/2022	FA 911106103	2 073,97		2 073,97
M2019-009/BDC6 Mission OPC-IC_05.22 / 08.22_phase réalisation trvx_ilots Oasis Urbaine & Park			11 182,46		11 182,46
016116 SOLDE	22/09/2022	FA 911113910	11 182,46		11 182,46
M2019-009/BDC7 Mission OPC-IC_09.22 / 12.22_phase réalisation trvx_ilots Oasis urbaine - Park			10 536,14		10 536,14
017611 AC1	20/03/2023	FA 911131194	9 739,82		9 739,82
018402 AC2	27/07/2023	FA 911143652	796,32		796,32
M2019-009/BDC8 Mission OPC-IC_01.23 / 03.23_phase réalisation trvx_ilots Oasis urbaine - Park			9 783,67		9 783,67
017879 SOLDE	28/04/2023	FA 911135737	9 783,67		9 783,67
M2019-009/BDC9 Mission OPC-IC_04.23 / 06.23_phase réalisation trvx_ilots Oasis urbaine - Park			9 774,83		9 774,83
018403 AC1	27/07/2023	FA 911143653	9 774,83		9 774,83
M2023-018/BDC1 OPCIC / Juillet à Décembre 2023 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)			57 076,38		57 076,38
018954 AC1	29/09/2023	FA 23F0643	22 114,39		22 114,39
019770 AC2	01/01/2024	FA 23F0934	34 961,99		34 961,99
M2023-018/BDC2 OPCIC / Janvier à Juin 2024 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)			42 740,09		42 740,09
020631 AC1	29/03/2024	FA 24F0206	21 327,91		21 327,91
022381 AC2	28/06/2024	FA 24F0428	21 412,18		21 412,18
M2023-018/BDC3 OPCIC / Juillet à Décembre 2024 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)			17 375,45	25 182,01	42 557,46
022382 AC1	30/09/2024	FA 24F0720	17 375,45		17 375,45
023370 AC2	01/01/2025	FA 24F1008		22 400,17	22 400,17
024353 AC3	31/03/2025	FA 25F0266		2 781,84	2 781,84
M2023-018/BDC4 OPCIC / Juillet à Décembre 2024 complément - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)			21 566,22	6 368,77	27 934,99
022803 AC1	31/10/2024	FA 24F0817	21 566,22		21 566,22

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024366 AC2	31/03/2025	FA 25F0265		6 368,77	6 368,77
M2023-018/BDC5 OPCIC / Janvier à Juin 2025 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)				45 130,08	45 130,08
024365 AC1	31/03/2025	FA 25F0264		22 598,02	22 598,02
025195 AC2	30/06/2025	FA 25F0552		22 532,06	22 532,06
M2023-018/BDC6 OPCIC / Juillet à Décembre 2025 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)				14 542,04	14 542,04
026063 AC1	30/09/2025	FA 25F0877		14 542,04	14 542,04
A104 Concertation Animation			21 809,04	7,20	21 816,24
M2021-010/BDC6 Assistance s/ marché communication médiation et animation Soleil (Marne) -			10 098,00	7,20	10 105,20
019682 AC1	18/07/2023	FA 2307-00858	6 192,00		6 192,00
019638 AC2 - SOLDE	01/01/2024	FA 2312-00966	3 906,00		3 906,00
026713 BDC6 SOLDE	19/11/2025	REV DEF		7,20	7,20
M2024-004 Installation urbaine temporaire Ilot P5 - CANCAN			11 711,04		11 711,04
020147 AC1	01/03/2024	FA 24-192-013	3 599,71		3 599,71
020597 AC2	08/04/2024	FA 24-192-028	8 111,33		8 111,33
021021 FRANCE 2030 - AC1	28/05/2024	FA F2024-07	13 851,00		13 851,00
022880 ANNUL ERR IMPUT	28/05/2024	FA F2024-07	-13 851,00		-13 851,00
A105 Etudes environnementales			273 691,68	108 363,04	382 054,72
21-04706 AMO volet paysager, score ICU et arbres en ville - COLIN & POLI			3 000,00		3 000,00
013329 AC1	28/07/2021	FA00000988	3 000,00		3 000,00
22-05437 France 2030 Convention Recherche ICU- 20K€ sur C0010 France 2030 - NOBATEK			4 000,00		4 000,00
019476 FR2030 ICU AC1	30/11/2023	FA FA2300407	24 000,00		24 000,00
022891 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA FA2300407	-20 000,00		-20 000,00
23-06147 France 2030 Conv Perfeco et environnementale Soleil - NOBATEK			13 200,00		13 200,00
017731 AC1	31/03/2023	FA FA2300084	26 400,00		26 400,00
019374 AC2	28/11/2023	FA FA2300384	52 800,00		52 800,00
022893 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	AC1-AC2 FA	-66 000,00		-66 000,00
23-06655 Evaluation Energie Carbone - EFFICACITY			9 000,00	9 000,00	18 000,00
019544 AC1	12/12/2023	FA F23159	9 000,00		9 000,00
024751 AC2	26/05/2025	FA F25061		9 000,00	9 000,00
M2015-016/MS45-C SSP Diag enrobés - ARCAGEE			1 609,90		1 609,90
008159 AC2	31/05/2019	FA 19-099	1 609,90		1 609,90
008368 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96		1 119,96
010232 REGUL ERR IMPUTATION	28/06/2019	REGUL	-1 119,96		-1 119,96
M2018-024/BDC 22 AMO DCE Dépollution - ARCAGEE			2 946,24		2 946,24
011505 SOLDE	27/11/2020	FA 20-233	2 946,24		2 946,24
M2018-024/BDC17 Diagnostic voirie Mirepin - ARCAGEE			2 316,48		2 316,48
010810 SOLDE	21/08/2020	FA 20-139	2 316,48		2 316,48
M2018-024/BDC18 Diagnostic Keria Flunch Mac Da - ARCAGEE			9 933,43		9 933,43
010811 SOLDE	21/08/2020	FA 20-140	9 933,43		9 933,43
M2018-024/BDC21 Investigations complémentaires Mirepin - ARCAGEE			12 511,15		12 511,15
011616 AC1	01/01/2021	FA 20-268	6 816,25		6 816,25
011980 AC 2	05/02/2021	FA 21-024	5 694,90		5 694,90
M2018-024/BDC25 Suivi piézométrique - ARCAGEE			19 941,86		19 941,86
012224 AC1	22/03/2021	FA 21-064	8 651,45		8 651,45
013680 AC2	09/11/2021	FA 21-261	6 291,93		6 291,93
014509 AC3	17/02/2022	FA 22-040	4 998,48		4 998,48
M2018-024/BDC26 Evaluation complémentaire espaces publics - ARCAGEE			27 822,81		27 822,81
012854 AC 1	30/06/2021	FA 21-167	27 822,81		27 822,81
M2018-024/BDC27 AMO travaux espaces publics - ARCAGEE			1 801,44		1 801,44
017018 AC1	01/01/2023	FA 22-298	1 801,44		1 801,44
M2019-043 Actualisation ZH - NYMPHALIS			2 700,00		2 700,00
009102 SOLDE	19/11/2019	FA F1911094	2 700,00		2 700,00
M2020-065 Note actualisation enjeux écologiques - NYMPHALIS			1 200,00		1 200,00
011725 SOLDE	01/01/2021	FA F2012171	1 200,00		1 200,00
M2021-021 Test et Accompagnement avec outil « Arbre en Ville - E6			1 080,00		1 080,00
013057 SOLDE	04/08/2021	FA	1 080,00		1 080,00
M2021-029 Identification des arbres à conserver (150 arbres) - ENVOLIS			3 300,00		3 300,00
012497 SOLDE	06/05/2021	FA 21-05-655	3 300,00		3 300,00
M2021-078 Réalisation d'un bilan carbone - NOBATEK			6 240,00		6 240,00
014278 SOLDE	01/01/2022	FA FA2100291	6 240,00		6 240,00
M2022-007 Lot 1/BDC10 AMO Missions écologiques : 4 saisons+diag avant expert. arboricole -			36 176,60		36 176,60
018808 AC1	28/09/2023	FA 23-09-2067	3 281,76		3 281,76
018904 AC2	05/10/2023	FA 23-10-2088	3 281,76		3 281,76
019002 AC3	20/10/2023	FA 23-10-2114	3 667,44		3 667,44
019623 AC4	01/01/2024	FA 23-12-2268	3 188,40		3 188,40
020145 AC5	22/02/2024	FA 24-02-2364	4 581,72		4 581,72
020824 AC6	02/05/2024	FA 24-05-2489	1 958,12		1 958,12
020956 AC7	15/05/2024	FA 24-05-2533	3 319,92		3 319,92
021256 AC8	21/06/2024	FA 24-06-2617	3 319,92		3 319,92
021552 AC9	12/07/2024	FA 24-07-2723	3 319,92		3 319,92

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
021983 AC10	30/08/2024	FA 24-08-2836	6 257,64		6 257,64
M2022-007 Lot 1/BDC14 AMO Missions écologiques : note friche Leroy Merlin - ENVOLIS			374,76		374,76
019721 AC1	04/01/2024	FA 24-01-2277	374,76		374,76
M2022-007 Lot 1/BDC15 AMO Missions éco : Friche Leroy Merlin - ENVOLIS			12 109,86	25 009,57	37 119,43
020359 AC1	13/03/2024	FA 24-03-2398	4 572,72		4 572,72
020828 AC2	02/05/2024	FA 24-05-2490	438,48		438,48
021587 AC3	18/07/2024	FA 24-07-2729	3 126,00		3 126,00
022227 AC4	27/09/2024	FA 24-09-2902	3 972,66		3 972,66
023267 AC5	01/01/2025	FA 24-12-3192		7 056,00	7 056,00
023379 AC6	10/01/2025	FA 25-013210		378,00	378,00
023556 AC7	30/01/2025	FA 25-01-3255		11 039,69	11 039,69
023808 AC8	21/02/2025	FA 25-02-3326		3 598,56	3 598,56
024108 AC9	19/03/2025	FA 25-03-3412		446,72	446,72
024464 AC10	18/04/2025	FA 25-04-3527		388,32	388,32
024744 AC11	23/05/2025	FA 25-05-3631		379,80	379,80
026840 AC12	28/11/2025	FA 25-11-4337		1 722,48	1 722,48
M2022-007 Lot 1/BDC18 AMO Missions éco : Friche Leroy Merlin - ENVOLIS			2 255,04		2 255,04
021047 AC1	30/05/2024	FA 24-05-2561	1 127,52		1 127,52
021213 AC2	14/06/2024	FA 24-06-2598	1 127,52		1 127,52
M2022-007 Lot 1/BDC2 AMO Missions écologiques - secteur géographique Ouest / voisinée 4			2 455,20		2 455,20
016920 AC1	01/01/2023	FA 22-12-1601	2 455,20		2 455,20
M2022-007 Lot 1/BDC20 AMO Missions éco : Analyse 3 sites de compensation - ENVOLIS			16 834,95		16 834,95
021366 AC1	28/06/2024	FA 24-06-2670	11 212,56		11 212,56
022425 AC2	17/10/2024	FA 24-10-2963	2 816,57		2 816,57
023084 AC3	05/12/2024	FA 24-12-3129	2 805,82		2 805,82
M2022-007 Lot 1/BDC22 AMO Missions éco: Analyse site de compensation - ENVOLIS			5 622,40		5 622,40
022173 AC1	20/09/2024	FA 24-09-2875	5 622,40		5 622,40
M2022-007 Lot 1/BDC5 AMO Missions écologiques : études environnementales voisinée 4 (friche			9 743,90		9 743,90
018052 AC1	30/05/2023	FA 23-05-1846	1 310,40		1 310,40
018161 AC2	19/06/2023	FA 23-06-1878	1 362,24		1 362,24
018331 AC3	21/07/2023	FA23-07-1937	866,88		866,88
018385 AC4	25/07/2023	FA 23-07-1970	1 857,60		1 857,60
018725 AC5	15/09/2023	FA 23-09-2035	1 776,96		1 776,96
018827 AC6	29/09/2023	FA 23-09-2077	1 378,34		1 378,34
019001 AC6	20/10/2023	FA 23-10-2113	1 191,48		1 191,48
M2022-007/Lot 1/BDC19 AMO Missions éco : Etude chiroptères - ENVOLIS			3 190,68		3 190,68
021266 AC1	21/06/2024	FA 24-06-2620	1 127,52		1 127,52
021902 AC2	16/08/2024	FA 24-08-2792	2 063,16		2 063,16
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC18 SSEP 3 : AMO site Mirepin impacté/Travaux réseaux Dubreuilh -				3 671,95	3 671,95
023894 AC1	28/02/2025	FA 250122		3 671,95	3 671,95
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC23 SSEP 3 : Investigat° sols excavés Rues Peyandreau-Carpentier-			14 845,05		14 845,05
022652 AC1	31/10/2024	FA 240648	14 845,05		14 845,05
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC24 SSEP 3 : Diag ZH site compensation Rue Hipparque/Rue				21 124,51	21 124,51
023551 AC1	29/01/2025	FA 250030		19 394,72	19 394,72
024600 AC2 - SOLDE	30/04/2025	FA 250318		1 729,79	1 729,79
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC30 SSEP : analyse fraisats d'enrobés site comp. ZH - SEREA				1 256,58	1 256,58
024601 AC1	30/04/2025	FA 250319		1 256,58	1 256,58
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC32 SSEP 3 : Diags complémentaires site compens. ZH Rue				14 109,71	14 109,71
024590 AC1	30/04/2025	FA 250320		14 109,71	14 109,71
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC5 SSEP 3 : Diag amiante HAP sur enrobé parking restaurant			3 187,12		3 187,12
017886 AC1	28/04/2023	FA 230270	3 187,12		3 187,12
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC8 SSEP 3 : Carottages/diag HAP enrobé parking Carrefour - SEREA			4 134,06		4 134,06
018199 AC1	27/06/2023	FA 230393	4 134,06		4 134,06
M2023-042/BDC1 Assistance dossier Fonds verts-Biodéchets Soleil (Marne) - URBAN ID			5 694,00		5 694,00
019680 AC1	27/11/2023	FA 2023/19	5 694,00		5 694,00
M2023-055/BDC1 Gisements et gestion biodéchets : Missions 1 à 4 - ELCIMAI ENVIRONNEMENT			15 024,75		15 024,75
021014 AC1	27/05/2024	FA EV-004017	3 729,73		3 729,73
021677 AC2	26/07/2024	FA EV-004363	7 497,35		7 497,35
022225 AC3	27/09/2024	FA EV-004633	1 368,55		1 368,55
022564 AC4	29/10/2024	FA EV-004838	2 429,12		2 429,12
M2023-055/BDC2 Gisements et gestion biodéchets : Mission 5 Scénarios d'implantat° - ELCIMAI				16 592,94	16 592,94
023886 AC1	28/02/2025	FA EV-005496		16 592,94	16 592,94
M2024-006/Lot 1/BDC1 AMO missions arboricoles : Diag 131 arbres Friche LM - ENVOLIS			10 980,00		10 980,00
021586 AC1	18/07/2024	FA 24-07-2728	7 844,28		7 844,28
021971 AC2	30/08/2024	FA 24-08-2833	3 135,72		3 135,72
M2024-007 Diagnostic phytosanitaire friche Leroy Merlin - ENVOLIS			8 460,00		8 460,00
020433 AC1	21/03/2024	FA 24-03-2409	3 660,00		3 660,00
020819 AC2	02/05/2024	FA 24-05-2488	4 800,00		4 800,00
M2024-013/Lot1/BDC24 Analyse et avis PC P6-1 et P6-2 Alinéa - St Maclou - CANCAN				425,46	425,46
026132 AC1	07/10/2025	FA 25-225-104		425,46	425,46

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2024-013/Lot2/BDC9 France 2030 Mission 4.7 Participation à toute action de mise en oeuvre de				1 700,16	1 700,16
026315 FRANCE 2030 - AC1	29/10/2025	FA 10824-4290		1 700,16	1 700,16
M2024-059/BDC1 Etude Qualité de l'Air : Mission 1 - Etat initial - ANTEA FRANCE				1 917,44	1 917,44
025903 AC1	28/09/2025	FA		1 917,44	1 917,44
M2024-063/BDC10 AMO missions éco : Actual. Plan de gestion - ENVOLIS				4 892,64	4 892,64
026341 AC1	30/10/2025	FA 25-10-4203		4 892,64	4 892,64
M2024-063/BDC2 AMO missions éco : Nouveau calcul impacts env/compensation Parc Carpentier				2 342,34	2 342,34
024664 AC1	14/05/2025	FA 25-05-3599		2 342,34	2 342,34
M2024-063/BDC3 AMO missions éco : Eligibilité site compensation parcelle 281AL64 - ENVOLIS				5 809,74	5 809,74
024651 AC1	11/05/2025	FA 25-05-3592		1 801,80	1 801,80
025141 AC2	04/07/2025	FA 25-07-3786		1 800,00	1 800,00
025379 AC3	29/07/2025	FA 25-07-3901		2 207,94	2 207,94
M2024-063/BDC5 AMO missions éco : Forum Projets Urbains - ENVOLIS				510,00	510,00
024965 AC1	11/06/2025	FA 25-06-3699		510,00	510,00
A106 Etude mobilité			90 188,43	3 940,38	94 128,81
M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - ALYCE			2 280,00		2 280,00
008728 SOLDE	24/09/2019	FA 2019372	2 280,00		2 280,00
M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - TRANSITEC			2 485,20		2 485,20
009619 SOLDE	01/01/2020	FA 19495	2 485,20		2 485,20
M2016-037/BDC11 Accessibilité futeur établissement scolaire ; appui analyse AVP - TRANSITEC			4 765,20		4 765,20
009620 SOLDE	09/01/2020	FA20003	4 765,20		4 765,20
019416 AC1	02/06/2023	FA 2023266	32 700,00		32 700,00
024308 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2023266	-32 700,00		-32 700,00
019843 France 2030 - AC1	01/01/2024	FA 23.12.41	6 900,00		6 900,00
022472 FRANCE 2030 - AC2	15/10/2024	FA 24.10.24	15 600,00		15 600,00
024313 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 23-12-41	-6 900,00		-6 900,00
024316 ANNUL ERR IMPUT	15/10/2024	FA 24.10.24	-15 600,00		-15 600,00
019416 AC1	02/06/2023	FA 2023266	3 302,70		3 302,70
019417 AC2	03/08/2023	FA 23550	16 122,33		16 122,33
021434 FR2030 - AC2	03/07/2024	FA 24421	8 274,99		8 274,99
024308 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2023266	-3 302,70		-3 302,70
024311 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 23550	-16 122,33		-16 122,33
024314 ANNUL ERR IMPUT	03/07/2024	FA 24421	-8 274,99		-8 274,99
M2019-039 Lot 1/BDC14 SOLEIL Enquete sur motorisation des habitants - NOVA 7			12 597,00		12 597,00
019662 AC1	13/11/2023	FA 231105	12 597,00		12 597,00
019684 AC1	01/01/2024	FA F23-12-	13 020,30		13 020,30
023348 AC2 SOLDE	01/01/2025	FA		2 319,99	2 319,99
024319 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA F23-12-	-13 020,30		-13 020,30
024321 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2025	FA 2024/06160		-2 319,99	-2 319,99
020083 AC1	01/01/2024	FA 503-2023	11 102,22		11 102,22
021829 AC2	24/07/2024	FA 263-2024	33 326,66		33 326,66
023540 AC3 SOLDE	01/01/2025	FA 520-2024		11 392,02	11 392,02
024323 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 503-2023	-11 102,22		-11 102,22
024325 ANNUL ERR IMPUT	24/07/2024	FA 263-2024	-33 326,66		-33 326,66
024327 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2025	FA 520-2024		-11 392,02	-11 392,02
M2019-039/Lot 2/BDC19 Atelier de travail + production - AUXILIA			567,63		567,63
020167 AC1	16/02/2024	FA 041-2024	567,63		567,63
021671 FRANCE 2030 - AC1	25/07/2024	FA	3 399,66		3 399,66
022416 FRANCE 2030 - AC2	25/01/2024	FA	5 689,56		5 689,56
022895 ANNUL ERR IMPUT	25/07/2024	FA	-3 399,66		-3 399,66
022897 ANNUL ERR IMPUT	25/01/2024	FA	-5 689,56		-5 689,56
M2019-039/Lot 2/BDC9/France 2030 SOL France 2030 Etat des lieux Propo° actions - AUXILIA				-47,52	-47,52
019413 AC1	29/09/2023	FA 328-2023	10 454,40		10 454,40
020085 AC2	01/01/2024	FA 512-2023	3 586,18		3 586,18
020889 AC3	29/04/2024	FA 130-2024	3 151,15		3 151,15
021830 AC4	24/07/2024	FA 264-2024	14 078,59		14 078,59
023546 AC5	01/01/2025	FA 519-2024		7 185,02	7 185,02
024329 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 328-2023	-10 454,40		-10 454,40
024331 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 512-2023	-3 586,18		-3 586,18
024333 ANNUL ERR IMPUT	29/04/2024	FA 130-2024	-3 151,15		-3 151,15
024335 ANNUL ERR IMPUT	24/07/2024	FA 264-2024	-14 078,59		-14 078,59
024337 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2025	FA 519-2024		-7 185,02	-7 185,02
024632 AC6	24/04/2025	FA 118-2025		-47,52	-47,52
M2020-051 Expertise pour la DUP/MECDU - TRANSITEC			2 760,00		2 760,00
011154 SOLDE	13/10/2020	FA 20474	2 760,00		2 760,00
M2020-068 Accompagnement dans la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC			8 400,00		8 400,00
011637 SOLDE	01/01/2021	FA 20 646	8 400,00		8 400,00
M2021-026 Finalisation de la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC			2 550,00		2 550,00
012453 SOLDE	29/04/2021	FA 21250	2 550,00		2 550,00
M2021-063 Expertise accessibilité école - TRANSITEC			3 105,00		3 105,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
014464 SOLDE	02/02/2022	FA 22065	3 105,00		3 105,00
M2023-002 Réalisation dossier carrefours / Kennedy Matosinhos & avenue de la Somme -			6 450,00		6 450,00
017628 AC1	23/03/2023	FA 23191	6 450,00		6 450,00
M2023-012/BDC1 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour Somme/Mirepin/Pouchon -			1 290,00		1 290,00
017852 AC1	28/04/2023	FA 23291	1 290,00		1 290,00
M2023-012/BDC2 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour Somme/Mirepin/Pouchon -			2 580,00		2 580,00
018612 AC1 SOLDE	01/09/2023	FA 23578	2 580,00		2 580,00
M2023-020/Lot 1//BDC44 France 2030-2 Support informatif journée 20/09 - IMPRIMERIE				216,00	216,00
025848 SOLDE	18/09/2025	FA 0111394		216,00	216,00
M2023-020/Lot 2/BDC17 France 2030-2 Support A0 informatif 20/09 - MIPP				89,10	89,10
026057 SOLDE	30/09/2025	FA F252947		89,10	89,10
M2023-025/Lot2/MS2/BDC9 France 2030 Lot 2 - MS2 / Hub des mobilités - GARLUCHE				3 682,80	3 682,80
026023 AC1	06/10/2025	FA 275		3 682,80	3 682,80
M2023-052/BDC1 Soleil Atelier de lancement et réunion - VELIPRO (VIRAJ)			1 440,00		1 440,00
020369 AC1 SOLDE	18/03/2024	FA F350	1 440,00		1 440,00
M2023-052/BDC4 Soleil Expérimentation prêt vélo Soleil - VELIPRO (VIRAJ)			11 642,40		11 642,40
020664 AC1 SOLDE	16/04/2024	FA F-384	11 642,40		11 642,40
M2024-025 Etude de mobilité - plan guide 2024 - ALYCE			10 026,00		10 026,00
022326 AC1	24/09/2024	FA 202400559	10 026,00		10 026,00
M2024-025 Etude de mobilité - plan guide 2024 - TRANSITEC			17 250,00		17 250,00
022757 AC2	13/11/2024	FA 24738	17 250,00		17 250,00
A107 Sondages géotechniques			44 002,78	4 938,24	48 941,02
M2016-015/BDC18 Etudes et sondages Castorama/Mirepin - GEOTEC			25 085,56		25 085,56
010762 SOLDE	11/08/2020	FA 204974	2 421,60		2 421,60
010763 SOLDE	11/08/2020	FA 204972	22 663,96		22 663,96
M2020-052 LOT 1/BDC1 Voie Castorama_Essais à la plaque - GINGER CEBTP			1 233,79		1 233,79
012959 AC1	19/04/2021	FA	1 233,79		1 233,79
M2020-052 LOT 1/BDC2 Essais géotechniques G2 sur Espaces publics phase 1 - GINGER CEBTP			3 625,20		3 625,20
012808 SOLDE	29/06/2021	FA	3 625,20		3 625,20
M2020-052 LOT 1/BDC28 G2 AVP/sondages/piézo : Parc Carpentier - GINGER CEBTP				4 389,06	4 389,06
023545 AC1	29/01/2025	FA		4 389,06	4 389,06
M2020-052 LOT 1/BDC3 G1 PGC FRICHE LEROY MERLIN - GINGER CEBTP			14 058,23		14 058,23
012847 AC1	30/06/2021	FA	13 068,85		13 068,85
015741 AC2	26/07/2022	FA	989,38		989,38
M2023-043 Lot 3/BDC42 Géomètre : Bornage imp. Boulanger Rue Peyandreau - MAGEO				549,18	549,18
025693 AC1	31/08/2025	FA FC25446		549,18	549,18
A108 Géomètre			86 906,11	8 274,60	95 180,71
M2016-003/BDC 49 Bornage, arpentage, copro - CARREFOUR - AX 70 et 385 - MAGEO			2 002,82		2 002,82
008815 SOLDE	30/09/2019	FA FC11833	2 002,82		2 002,82
M2016-003/BDC41 Bornage Castorama - MAGEO			1 119,96		1 119,96
010233 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96		1 119,96
M2019-032/BDC3 Géomètre expert - Temporaire - MAGEO			2 092,56		2 092,56
008816 SOLDE	30/09/2019	FA FC11832	2 092,56		2 092,56
M2019-034 Lot 1/BDC 128 Levé, plan topo, M&J PG OP, piquetage carrefour MC DO - MAGEO			3 726,87		3 726,87
019461 AC1	30/11/2023	FA FC20896	3 726,87		3 726,87
M2019-034 Lot 1/BDC 129 Levé , plan topo, piquetage, AV Kennedy PICHET - MAGEO			2 657,87		2 657,87
019455 AC1	30/11/2023	FA FC20895	2 657,87		2 657,87
M2019-034 Lot 1/BDC 130 Piquetage Naga Ripiano BDR - MAGEO			1 276,42		1 276,42
019456 AC1	30/11/2023	FA FC20894	1 276,42		1 276,42
M2019-034 Lot 1/BDC 131 Piquetage Soleil SMJ - MAGEO			642,24		642,24
021223 AC1	31/05/2024	FA FC22287	642,24		642,24
M2019-034 Lot 1/BDC 132 Levé, plan topo, MAJ PG opé, polygone AV Somme/Kennedy - MAGEO			1 237,86		1 237,86
019460 AC1	30/11/2023	FA FC20897	1 237,86		1 237,86
M2019-034 Lot 1/BDC10 Geodétection Chemin de Mirepin et voie d'accès MacDo - MAGEO			1 088,93		1 088,93
010716 SOLDE	31/07/2020	FA FC13496	1 088,93		1 088,93
M2019-034 Lot 1/BDC11 BDC11 Plan parcellaire et bornage LEROY MERLIN - MAGEO			1 120,95		1 120,95
011048 AC1	28/09/2020	FA FC13714	1 120,95		1 120,95
M2019-034 Lot 1/BDC114 Piquetage emprises privées/publiques Somme Centre - MAGEO			2 083,70		2 083,70
018610 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20278	2 083,70		2 083,70
M2019-034 Lot 1/BDC115 Complément piquetage emprises privées/publiques Somme centre -			4 777,46		4 777,46
018878 SOLDE	30/09/2023	FA FC20433	4 777,46		4 777,46
M2019-034 Lot 1/BDC121 Etablissement DMPC SAINT MACLOU - MAGEO			2 440,72		2 440,72
019077 SOLDE	30/10/2023	FA FC20596	2 440,72		2 440,72
M2019-034 Lot 1/BDC126 Piquetage secteur Mirepin - MAGEO			7 397,81		7 397,81
019078 SOLDE	30/10/2023	FA FC20597	7 397,81		7 397,81
M2019-034 Lot 1/BDC22 Bornage et plan topo (Carrefour) - MAGEO			2 395,05		2 395,05
011956 AC1	31/01/2021	FA FC14563	2 395,05		2 395,05
M2019-034 Lot 1/BDC27 Bornage îlot Castorama - MAGEO			1 595,54		1 595,54
011584 SOLDE	01/01/2021	FA FC14269	1 595,54		1 595,54
M2019-034 Lot 1/BDC32 Plan topo Espaces publics et friche LM - MAGEO			3 301,13		3 301,13

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
012476 AC1	30/04/2021	FA FC15044	3 301,13		3 301,13
M2019-034 Lot 1/BDC41 Plan friche Leroy Merlin - MAGEO			964,00		964,00
014880 AC1	31/03/2022	FA FC17156	964,00		964,00
M2019-034 Lot 1/BDC55 Doc arpentage division declaration préalable Ilots Leroy Merlin - MAGEO			1 606,17		1 606,17
014425 AC1	31/01/2022	FA FC16688	1 606,17		1 606,17
M2019-034 Lot 1/BDC55BIS Doc arpentage division declaration préalable Ilots Leroy Merlin -			1 096,99		1 096,99
014424 AC1	31/01/2022	FA FC16682	1 096,99		1 096,99
M2019-034 Lot 1/BDC61 Report projet sur cadastre - MAGEO			15 026,30		15 026,30
017274 AC1	01/01/2023	FA FC18035	15 026,30		15 026,30
M2019-034 Lot 1/BDC62 Etabliss doc arpentage/plan de division LE MEMPHIS - MAGEO			234,72		234,72
014881 AC1	31/03/2022	FA FC17154	234,72		234,72
M2019-034 Lot 1/BDC95 Géomètre : géo-détection Memphis - MAGEO			2 479,34		2 479,34
017441 AC1	27/02/2023	FA FC19056	2 479,34		2 479,34
M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - ODACE			1 920,00		1 920,00
012676 AC1	17/05/2021	FA 21-05-437	1 920,00		1 920,00
M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - SUEZ RV OSIS OUEST			15 168,00		15 168,00
010944 AC1	24/08/2020	FAI20080120	15 168,00		15 168,00
M2023-043 Lot 1/BDC2 Géomètre : Levée topo maison friche Leroy Merlin - GEOSAT			2 989,76		2 989,76
020477 AC1	27/03/2024	FA F24030610	2 989,76		2 989,76
M2023-043 Lot 1/BDC8 Géomètre : Topo compl. friche Leroy Merlin - GEOSAT				1 939,70	1 939,70
023292 AC1	01/01/2025	FA F24120788		1 939,70	1 939,70
M2023-043 Lot 3/BDC10 Levé topo limite propriété Boulanger/Rue Matosinhos - MAGEO			2 166,48		2 166,48
020837 AC1	30/04/2024	FA FC21953	2 166,48		2 166,48
M2023-043 Lot 3/BDC11 Géomètre : masterplan BDC antérieurs - MAGEO			2 296,46		2 296,46
020834 AC1	30/04/2024	FA FC21954	2 296,46		2 296,46
M2023-043 Lot 3/BDC33 Géomètre : Limites propriété Alinea-St Maclou - MAGEO				2 582,16	2 582,16
023992 AC1	28/02/2025	FA FC24192		2 582,16	2 582,16
M2023-043 Lot 3/BDC39 Géomètre : Bornage Rue Peyandreau - MAGEO				2 074,68	2 074,68
025698 AC1	31/08/2025	FA FC25450		2 074,68	2 074,68
M2023-043 Lot 3/BDC40 Géomètre : bornage piquetage JouetClub - MAGEO				1 678,06	1 678,06
025699 AC1	31/08/2025	FA FC25451		1 678,06	1 678,06
A110 Etude et expertise juridique			3 144,32	997,20	4 141,52
19-02627 PV constats enquete publique - CASIMIRO (HUISSIER)			999,98		999,98
007548 SOLDE	12/02/2019	FA 54 493	999,98		999,98
M2021-001 Lot 1/BDC22 Prestation juridique Parking Art 40 Loi 10 mars 2023 - FIDUCIAL LEGAL			2 144,34		2 144,34
019534 AC1	30/11/2023	FA 202306785	2 144,34		2 144,34
M2021-001 Lot 1/BDC22ter MAJ Consultation - Aires de stationnement et ombrières				997,20	997,20
025726 AC1	26/08/2025	FA 202504217		997,20	997,20
A112 Autres			497 460,38	254 761,23	752 221,61
19-03244 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - NADAU ARCHITECTURE			13 500,00		13 500,00
009097 SOLDE	15/11/2019	FA 2019-11-044	13 500,00		13 500,00
19-03245 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - LAABO ARCHITECTES			13 500,00		13 500,00
009098 SOLDE	15/11/2019	FA 19-37	13 500,00		13 500,00
22-05437 France 2030 Convention Recherche ICU- 20K€ sur C0010 France 2030 - NOBATEK			20 000,00		20 000,00
022892 FRANCE 2030 AC1 PART SOLEIL	01/01/2024	FA FA2300407	20 000,00		20 000,00
23-06147 France 2030 Conv Perf eco et environnementale Soleil - NOBATEK			108 000,00	10 800,00	118 800,00
022894 FRANCE 2030 AC1-AC2	01/01/2024	FA2300038	66 000,00		66 000,00
023000 FRANCE 2030 AC3	30/11/2024	FA 2400360	42 000,00		42 000,00
026377 FRANCE 2030 AC4	31/10/2025	FA FA2500372		10 800,00	10 800,00
25-08144 Ilot Alinea-St-Maclou / indemnité équipe Faye - FAYE ARCHITECTES				12 000,00	12 000,00
024506 AC1	23/04/2025	FA 2025-0045		12 000,00	12 000,00
25-08196 Ilot Alinea-St-Maclou / indemnité équipe A6A - A6A				12 000,00	12 000,00
024736 AC1	15/04/2025	FA 704/250415		12 000,00	12 000,00
009323 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00		1 530,00
010234 REGUL ERR IMPUTATION AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	-1 530,00		-1 530,00
M2018-032/BDC12 France 2030 - M2 Accompagnement stratégique pour le PAE - BERENICE			39 830,98	8 932,30	48 763,28
018230 AC1	30/06/2023	FA 2306-424-	1 113,60		1 113,60
019618 AC2	01/01/2024	FA 2312-578-	1 492,80		1 492,80
020381 AC3	15/03/2024	FA 2403-650-	1 274,40		1 274,40
021483 AC4	28/06/2024	FA 2406-731	554,98		554,98
022882 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424	-1 113,60		-1 113,60
022884 FRANCE 2030 AC1 REGUL IMPUT	01/01/2024	FA 2306-424	10 713,60		10 713,60
022885 ANNUL ERR IMPUT	01/01/2024	FA 2312-578	-1 492,80		-1 492,80
022886 FRANCE 2030 AC2 REGUL IMPUT	01/01/2024	FA 2312-578	13 492,80		13 492,80
022887 ANNUL ERR IMPUT	15/03/2024	FA 2403-650	-1 274,40		-1 274,40
022888 FRANCE 2030 AC3 REGUL IMPUT	15/03/2024	FA 2403-650	10 874,40		10 874,40
022889 ANNUL ERR IMPUT	28/06/2024	FA 2406-731	-554,98		-554,98
022890 FRANCE 2030 AC4 REGUL IMPUT	28/06/2024	FA 2406-731	4 750,18		4 750,18
024452 FRANCE 2030 AC5	31/03/2025	FA BERE-2503-		8 932,30	8 932,30
M2019-001/BDC8 France 2030 Lot 2 - Mission Eval Socioeconomique Mérignac Soleil - SCET			56 016,00		56 016,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
017798 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC1	19/04/2023	FA F23-04-	20 940,00		20 940,00
018055 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC2	30/05/2023	FA F23-05-	26 460,00		26 460,00
019641 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC3	01/01/2024	FA F23-12-	5 136,00		5 136,00
021369 FR2030 EVAL SOCIOECO AC4	28/06/2024	FA 2024/02692	3 480,00		3 480,00
M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks - ALYCE			32 700,00		32 700,00
024310 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	FA 2023266	32 700,00		32 700,00
M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks - JONCTION			22 500,00		22 500,00
024317 AC2 REG IMPUT	15/10/2024	FA 24.10.24	15 600,00		15 600,00
024318 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	FA 23.12.41	6 900,00		6 900,00
M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks - TRANSITEC			27 700,02	7 910,52	35 610,54
024310 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	FA 2023266	3 302,70		3 302,70
024312 AC2 REG IMPUT	01/01/2024	FA 23550	16 122,33		16 122,33
024315 AC 3 REGUL IMPUT	03/07/2024	FA 24421	8 274,99		8 274,99
024870 FRANCE 2030 AC4	04/06/2025	FA 25366		7 910,52	7 910,52
M2019-039/Lot 2/BDC14 France 2030 Mission Mobilité Soleil - SCET			13 020,30	2 319,99	15 340,29
024320 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	M2019-039	13 020,30		13 020,30
024322 AC2 SOLDE REG IMPUT	01/01/2025	FA 2024/06160		2 319,99	2 319,99
M2019-039/Lot 2/BDC14 Bis France 2030 Mission mobilité Mérignac Soleil - AUXILIA			44 428,88	11 392,02	55 820,90
024324 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	FA 503-2023	11 102,22		11 102,22
024326 AC2 REG IMPUT	24/07/2024	FA 263-2024	33 326,66		33 326,66
024328 AC3 SOLDE REG IMPUT	01/01/2025	FA 520-2024		11 392,02	11 392,02
M2019-039/Lot 2/BDC9 SOL France 2030 Etat des lieux - Propos° actions - SCET			9 089,22	15 898,84	24 988,06
022896 FRANCE 2030 AC1	25/07/2024	FA	3 399,66		3 399,66
022898 FRANCE 2030 AC2	25/01/2024	FA	5 689,56		5 689,56
023301 FRANCE 2030 AC3	01/01/2025	FA		3 941,28	3 941,28
024634 AC4	12/05/2025	FA		11 957,56	11 957,56
M2019-039/Lot 2/BDC9/France 2030 SOL France 2030 Etat des lieux Propo° actions - AUXILIA			31 270,32	14 382,72	45 653,04
024330 AC1 REG IMPUT	01/01/2024	FA 328-2023	10 454,40		10 454,40
024332 AC2 REG IMPUT	01/01/2024	FA 512-2023	3 586,18		3 586,18
024334 AC3 REG IMPUT	29/04/2024	FA 130-2024	3 151,15		3 151,15
024336 AC4 REG IMPUT	24/07/2024	FA 264-2024	14 078,59		14 078,59
024338 AC5 REG IMPUT	01/01/2025	FA 519-2024		7 185,02	7 185,02
024632 AC6	24/04/2025	FA 118-2025		7 197,70	7 197,70
M2019-066/BDC43 France 2030 - Echange avec Plaine Commune sur méthodo - CANCAN			332,70	2 366,70	2 699,40
022184 AC1	23/09/2024	FA 24-019-072	332,70		332,70
024420 AC2 SOLDE	13/04/2025	FA 25-019-042		2 366,70	2 366,70
M2021-010/BDC12 SOL France 2030 AMO géné Phase Incubation matrice - FABRIQUE DE LA VILLE			26 865,78	125,19	26 990,97
019420 AC1	01/01/2023	FA 226-22	13 345,25		13 345,25
019421 AC2	14/03/2023	FA 017-23	13 520,53		13 520,53
026692 BDC12 SOL SOLDE	18/11/2025	REV DEF		125,19	125,19
M2021-010/BDC17 SOL France 2030 AMO géné - Ordonnancement Outil répliqueur - FABRIQUE			24 855,18	10 278,16	35 133,34
019422 AC1	21/07/2023	FA 087-23	8 114,10		8 114,10
019296 AC2	27/11/2023	FA NH 008	7 011,36		7 011,36
020783 AC3	29/04/2024	FA 052-24	6 188,40		6 188,40
022836 AC4	20/11/2024	FA 191-24	3 541,32		3 541,32
023229 AC5 SOLDE	01/01/2025	FA 259-24		10 193,89	10 193,89
026705 BDC17 SOLDE	19/11/2025	REV DEF		84,27	84,27
M2021-010/BDC21 France 2030 Accompagnement dossier Banque Territoires - FABRIQUE DE LA				35 415,51	35 415,51
023849 AC1	26/02/2025	FA 014-25		22 388,23	22 388,23
026396 AC2	03/11/2025	FA 182-25		13 027,28	13 027,28
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC35 France 2030 / SSEP 3 : diag pollution sols/agropédologique -				13 248,00	13 248,00
026069 AC1	09/10/2025	FA F-H545		13 248,00	13 248,00
M2024-013 lot 1/BDC4 France 2030 - Diags des flux et stratégie op - missions 2.1.3 & 2.2.3 -				11 008,20	11 008,20
024359 AC1	09/04/2025	FA 25-225-038		7 204,26	7 204,26
025464 AC2 SOLDE	04/08/2025	FA 25-225-086		3 803,94	3 803,94
M2024-013 lot 1/BDC4 France 2030 - Diags des flux et stratégie op - missions 2.1.3 & 2.2.3 -				4 233,60	4 233,60
023896 AC1	26/02/2025	FA 10235-3816		4 233,60	4 233,60
M2024-013/Lot1/BDC12 Analyse des offres Ilot P6-1 et P6-2 - CANCAN				847,56	847,56
024386 AC1	10/04/2025	FA 25-225-039		847,56	847,56
M2024-013/Lot1/BDC21 France 2030 - étude de moe show-roon - CANCAN				3 874,56	3 874,56
025821 AC1	16/09/2025	FA 25-225-096		3 874,56	3 874,56
M2024-013/lot2/BDC2 France 2030 - Mission 3 - NEOECO DEVELOPPEMENT				16 392,18	16 392,18
024231 France 2030 - AC1	31/03/2025	FA 10235-3882		2 118,90	2 118,90
025097 France 2030 - AC2	25/06/2025	FA 10824-4022		14 273,28	14 273,28
M2024-013/Lot2/BDC3 France 2030 - Mission 1.3.1 Réunion Terres excavées 15/06/25 - NEOECO				573,42	573,42
025475 AC1 SOLDE	31/07/2025	FA 10824-4109		573,42	573,42
M2024-013/Lot2/BDC4 France 2030 - Mission 1.3.2 écriture fiche action - NEOECO				845,04	845,04
025472 AC1 SOLDE	31/07/2025	FA 10824-4110		845,04	845,04
M2024-020 France 2030 - Expérimentation de la plateforme Welcooom - LESCITYZENS			13 851,00	29 571,00	43 422,00
022881 FRANCE 2030 AC1 REGUL IMPUT	28/05/2024	FA F2024-07	13 851,00		13 851,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023668 FRANCE 2030 AC2	03/02/2025	FA 2025-01		19 611,00	19 611,00
025099 FRANCE 2030 AC3 POUCHON	23/06/2025	FA F2025-09		9 960,00	9 960,00
M2024-060/BDC1 France 2030 - AMO refonct* sols : Diag/Stratégie - HEKLADONIA				26 745,72	26 745,72
024438 FRANCE 2030 - AC1	16/04/2025	FA F-H485		18 258,24	18 258,24
026061 FRANCE 2030 - AC2	09/10/2025	FA F-H546		8 487,48	8 487,48
M2025-061 France 2030 Fiche actions phase réalisation - LESCITYZENS				3 600,00	3 600,00
025944 AC1	30/09/2025	FA 2025-12		3 600,00	3 600,00
B FONCIER			8 498 628,61	2 456 712,75	10 955 341,36
B101 Coût acquisition terrain			6 682 288,20	1 309 392,00	7 991 680,20
19-02497 Acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			160 000,00		160 000,00
007330 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	160 000,00		160 000,00
19-02896 Acquisition LEROY MERLIN AW 545 à 549 / AW 516 à 544 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			1 767 335,80		1 767 335,80
19-02896 Provision	20/06/2019		77 414,00		77 414,00
19-02896 Provision	20/06/2019		11 553,00		11 553,00
19-02896 Provision	20/06/2019		1 572 962,40		1 572 962,40
19-02896 Provision	20/06/2019		249 213,00		249 213,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-79 606,60		-79 606,60
19-02896 Provision	20/06/2019		-28 500,00		-28 500,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-5 700,00		-5 700,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-30 000,00		-30 000,00
016866 ACQ* LEROY MERLIN AW 545-549	15/12/2022	ACTE 15/12/22			
016882 ACQ LEROY MERLIN AW 516 à 544	15/12/2022	ACTE 15/12/22			
22-05313 Consignation préemption SCI RUE ANDRE NAVAILLE AW 139 - Rembt 23/01/26 -			102 600,00		102 600,00
22-05313 Provision	28/04/2022		102 600,00		102 600,00
22-05314 Consignation préemption SCI PORTETS AW 356 - Rembt le 31/12/25 - CONSIGNATION			280 950,00	-280 950,00	
22-05314 Provision	28/04/2022		280 950,00		280 950,00
22-05314 Provision	28/04/2022			-280 950,00	-280 950,00
22-05440/1 Acquisition BENTEJAC AY 743 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			10 000,00		10 000,00
22-05440/1 Provision	20/06/2022		10 000,00		10 000,00
22-05717/1 Acquisition MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			195 822,00		195 822,00
22-05717/1 Provision	11/10/2022		195 822,00		195 822,00
22-05727/1 Acquisition SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			5 520,00		5 520,00
22-05727/1 Provision	18/10/2022		5 520,00		5 520,00
22-05863 Acquisition AVENUE KENNEDY (PICHET) AW435 à 513 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			17 836,00		17 836,00
22-05863 Provision	15/12/2022		26 080,00		26 080,00
019113 ACQ SNC AV. KENNEDY (PICHET) AW435 à 512	27/10/2023	ACTE 27/10/23	-8 244,00		-8 244,00
23-06361/1 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			58 000,00		58 000,00
23-06361/1 Provision	08/06/2023		58 000,00		58 000,00
23-06693/1 Acquisition CLAIRSIENNE AY 807 815 44 avenue de la Somme - LEBEAU-CABANAC			2 200,00		2 200,00
23-06693/1 Provision	27/11/2023		2 200,00		2 200,00
24-07258 Consignation Expropriation ASL Mirepin - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			33 050,00	-25 940,00	7 110,00
021135 CONSIGNATION EXPRO ASL MIREPIN	07/06/2024	07/06/24	33 050,00		33 050,00
024853 EXPRO ASL MIREPIN	09/01/2025	JUGT		-25 940,00	-25 940,00
24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX			1 272 000,00	210 638,00	1 482 638,00
24-07402 Provision	27/08/2024		1 286 056,00		1 286 056,00
023071 ACQ ONYX AY798-799	27/09/2024	EXPRO	-14 056,00		-14 056,00
023619 ACQ* ONYX AY798-799 INDEMNITE JGMT	09/01/2025	0035/12565/24		210 638,00	210 638,00
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX			893 050,00		893 050,00
021967 ACQ INDEMN EXPRO EYQUEMS AY1	29/08/2024	EX 29/08/24	720 000,00		720 000,00
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024	173 050,00		173 050,00
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX			598 153,40		598 153,40
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024	598 153,40		598 153,40
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité - CARPA PARIS			263 480,00	23 279,00	286 759,00
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024	263 480,00		263 480,00
025374 ACQ CARREFOUR AY790 et AY795	11/07/2025	JUG 11/07/25		23 279,00	23 279,00
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité - CONSIGNATION CAISSE DES			30 750,00		30 750,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790	22/10/2024	DDE	30 750,00		30 750,00
24-07540 Acquisition MAC DONALD 17 rue de Mirepin Indemnité - MCDONALD'S FRANCE			20 000,00		20 000,00
022438 INDEMN MAC DONALD	18/10/2024	FA181024	20 000,00		20 000,00
24-07542 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHES AX 507 508 510 511 512 513 514 Indemnité -			340 700,00	214 788,00	555 488,00
022436 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHES TR2	18/10/2024	FA181024	340 700,00		340 700,00
025373 ACQ CARREFOUR AX 507 508 510 511 512 513 514	11/07/2025	JUG 11/7/25		214 788,00	214 788,00
24-07543 Acquisition PLENO SOL AW663 555 554 566 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				8 560,00	8 560,00
24-07543 Provision	18/10/2024			8 560,00	8 560,00
24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33			7 770,00		7 770,00
24-07545 Provision	18/10/2024		7 770,00		7 770,00
24-07546 Acquisition SCI SMJ AY 801 802 806 - CARPA BORDEAUX			156 780,00		156 780,00
022432 INDEMN SCI SMJ	18/10/2024	FA130524	156 780,00		156 780,00
24-07548 Acquisition SCI IENG_ AY 796 797 - CARPA CHARENTE			466 290,00	-15 372,00	450 918,00
022433 INDEMN SCI IENG	18/10/2024	FA290724	466 290,00		466 290,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024693 EXPRO SCI IENG_ AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		-15 372,00	-15 372,00
24-07549 Acquisition AB GROUPE AY 796 797 - CARPA CHARENTE			1,00	95 399,00	95 400,00
022434 INDEMN AB GROUPE	18/10/2024	FA290724	1,00		1,00
024694 EXPRO AB GROUPE AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		95 399,00	95 399,00
25-07890/1 Acquis* consorts BENTEJAC immeuble Le Menphis - LEBEAU-CABANAC (NOT)				788 450,00	788 450,00
25-07890/1 Provision	28/01/2025			788 450,00	788 450,00
25-07948/1 Acquisition indivision Mérignac Soleil - LEBEAU-CABANAC (NOT)				14 500,00	14 500,00
25-07948/1 Provision	14/02/2025			14 500,00	14 500,00
25-08136/1 Acquisition SCCV Avenue Kennedy - LEBEAU-CABANAC (NOT)				8 140,00	8 140,00
25-08136/1 Provision	24/04/2025			8 140,00	8 140,00
25-08381 Consignation 15% préemption THIBAUDEAU - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				160 500,00	160 500,00
25-08381 Provision	04/08/2025			160 500,00	160 500,00
25-08595 Acquisition OASIS URBAINE AY 662 666 589 664 659 660 658 657 575 811 809 813 -				107 400,00	107 400,00
026306 ACQ* OASIS URBAINE AY 662 666 589 664 659 660 658 657 575 811 809 813	07/10/2025	JGT 7/10/25		107 400,00	107 400,00
B201 Frais d'actes			50 694,05	15 240,89	65 934,94
19-02498 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			162,43		162,43
007332 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	162,43		162,43
19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 883,43		3 883,43
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	3 883,43		3 883,43
19-02896/1 Frais acquisition LEROY MERLIN AW545-549 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			27 574,43		27 574,43
19-02896/1 Provision	27/12/2022		28 500,00		28 500,00
19-02896/1 Provision	27/12/2022		-79,80		-79,80
19-02896/1 Provision	27/12/2022		-266,45		-266,45
19-02896/1 Provision	27/12/2022		266,45		266,45
016947 FRAIS S/ACQ LEROY MERLIN AW545-549	21/12/2022	FA 21/12/22			
017561 COMP F.ACQ LEROY MERLIN AW545-549	28/02/2023	FA 28/02/23	-845,77		-845,77
19-02896/2 Frais acquisition LEROY MERLIN AW516 à 544 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			6 560,60		6 560,60
19-02896/2 Provision	28/12/2022		5 700,00		5 700,00
017463 FRAIS ACQ S/LEROY MERLIN AW516 à 544	28/02/2023	FA 28/02/23	860,60		860,60
22-05440/2 Frais d'acquisitions BENTEJAC AY743 51 rue de Mirepin - LEBEAU-CABANAC (NOT)			1 133,93		1 133,93
22-05440/2 Provision	20/06/2022		1 650,00		1 650,00
016147 FRAIS ACQ S/BENTEJAC AY743	26/09/2022	FA 26/09/22	-516,07		-516,07
22-05717/2 Frais d'acquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			4 927,86		4 927,86
22-05717/2 Provision	11/10/2022		3 459,59		3 459,59
22-05717/2 Provision	11/10/2022		1 052,29		1 052,29
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	415,98		415,98
22-05727/2 Frais d'acquisitions SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			1 448,90		1 448,90
22-05727/2 Provision	18/10/2022		1 300,00		1 300,00
017462 FRAIS ACQ SCCV SOGARA AX 480 482 484	27/02/2023	FA 27/02/23	148,90		148,90
22-05863/2 Frais d'acquisitions AVENUE KENNEDY AW 435 à 513 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			2 252,70		2 252,70
22-05863/2 Provision	15/12/2022		2 000,00		2 000,00
22-05863/2 Provision	15/12/2022		1 200,00		1 200,00
020160 FRAIS ACQ* AVENUE KENNEDY AW435-513	27/02/2024	FA 27/02/24	-937,57		-937,57
021119 FRAIS ACQ* COMP AV KENNEDY AW435-513	27/05/2024	FA 24/05/24	-9,73		-9,73
23-06361/2 Frais d'acquisition SCI SCHAJAR AY764 (621) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			2 296,77		2 296,77
23-06361/2 Provision	02/10/2023		4 100,00		4 100,00
020157 FRAIS ACQ SCI SHAJAR AY621	07/02/2024	FA 07/02/24	-1 803,23		-1 803,23
23-06693/2 Frais d'acquisition CLAIRSIENNE AY 807 815 44 av. de la Somme - LEBEAU-CABANAC			453,00		453,00
23-06693/2 Provision	22/04/2024		800,00		800,00
022160 FRAS S/ACQ CLAIRSIENNE AY807-815	10/09/2024	FA 10/09/24	-347,00		-347,00
25-07890/2 Frais Acquis* consorts BENTEJAC immeuble Le Menphis - LEBEAU-CABANAC (NOT)				9 948,11	9 948,11
25-07890/2 Provision	28/01/2025			11 100,00	11 100,00
027206 FRAIS S/ACQ BENTEJAC	12/12/2025	FA 12/12/25		-1 151,89	-1 151,89
25-07948/2 Frais d'acquisition indivision Mérignac Soleil - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 097,78	1 097,78
25-07948/2 Provision	14/02/2025			2 300,00	2 300,00
027210 FRAIS S/ACQ INDIV MERIGNAC SOLEIL	12/12/2025	FA 12/12/25		-1 202,22	-1 202,22
25-08136/2 Frais d'acquisition SCCV Avenue Kennedy - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 850,00	1 850,00
25-08136/2 Provision	24/04/2025			1 850,00	1 850,00
25-08189 Public* Ordonnance d'expropriation CARREFOUR - LEBEAU-CABANAC (NOT)				480,00	480,00
024720 PUB* ORDO EXPRO	13/05/2025	FA 150484		480,00	480,00
25-08190 Public* Ordonnance d'expropriation IMMOFI SOLEIL - LEBEAU-CABANAC (NOT)				480,00	480,00
024721 PUB* ORDO EXPRO	13/05/2025	FA 150483		480,00	480,00
25-08278 Frais acquisition PLENO SOL AW663 555 554 566 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 385,00	1 385,00
25-08278 Provision	05/06/2025			1 385,00	1 385,00
B302 Géomètres foncier			22 957,61	2 196,96	25 154,57
M2019-034 Lot 1/BDC102 Levées topo localisation d'un ouvrage - MAGEO			1 250,75		1 250,75
018065 AC1	31/05/2023	FA FC19700	1 250,75		1 250,75
M2019-034 Lot 1/BDC108 Levées topographiques _site Kéria - MAGEO			428,46		428,46
018244 SOLDE	30/06/2023	FAFC19950	428,46		428,46
M2019-034 Lot 1/BDC113 Plan surface utile 50 av de la Somme - MAGEO			1 382,10		1 382,10

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
018611 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20283	1 382,10		1 382,10
M2019-034 Lot 1/BDC117 Etablissement DMPC et plan de cession CLAIRSIENNE - MAGEO			914,06		914,06
019868 SOLDE	25/01/2024	FA FC21261	914,06		914,06
M2019-034 Lot 1/BDC118 Etablissement DMPC et plan de cession Aqprim - MAGEO			386,91		386,91
019457 DMPC+ PLAN CESSIION	30/11/2023	FA FC20900	386,91		386,91
M2019-034 Lot 1/BDC135 DMPC pour cessibilité - MAGEO			4 978,65		4 978,65
019875 AC1	25/01/2024	FA FC21267	4 978,65		4 978,65
M2019-034 Lot 1/BDC74 Etabliss docs en vue cession foncière - MAGEO			2 873,47		2 873,47
016218 AC1	30/09/2022	FA FC18223	2 873,47		2 873,47
M2019-034 Lot 1/BDC76 Etabliss DP Leroy Merlin - MAGEO			1 588,70		1 588,70
015731 AC1	22/07/2022	FA FC17795	1 588,70		1 588,70
M2019-034 Lot 1/BDC77 Piquetage partiel Ilot Alinéa - MAGEO			2 535,38		2 535,38
018879 SOLDE	30/09/2023	FA FC20434	2 535,38		2 535,38
M2019-034 Lot 1/BDC80 Bornage la friche LM - MAGEO			1 555,44		1 555,44
016569 SOLDE	31/10/2022	FA FC18405	1 555,44		1 555,44
M2021-077/BDC50 Diag amiante + ERP 50 av de la Somme Mérignac - Le GAN - AED EXPERTISES				168,70	168,70
023499 SOLDE	22/01/2025	FA FA01134242		168,70	168,70
M2021-077/BDC50 Bis Analyses complémentaires 50 av de la Somme - LE GAN - AED EXPERTISES				223,65	223,65
023500 SOLDE	22/01/2025	FA FA01134246		223,65	223,65
M2021-077/BDC51 Diag amiante amiante + ERP 50 av de la Somme - Maif - AED EXPERTISES				289,56	289,56
023441 SOLDE	15/01/2025	FA FA01133761		289,56	289,56
M2021-077/BDC59 Diagnostics parasitaires et ERP AX501 et 503 - AED EXPERTISES				163,07	163,07
023902 SOLDE	03/03/2025	FA FA01138492		163,07	163,07
M2023-043 Lot 3/BDC17 Géomètre : Plan piquetage parcelles Clairsienne - MAGEO			1 612,80		1 612,80
021665 AC1	25/07/2024	FA FC22595	1 612,80		1 612,80
M2023-043 Lot 3/BDC19 Géomètre : Plan division Carrefour - MAGEO				1 351,98	1 351,98
023991 AC1	28/02/2025	FA FC24193		1 351,98	1 351,98
M2023-043 Lot 3/BDC2 DMPC cessibilité - MAGEO			3 450,89		3 450,89
020249 AC1	29/02/2024	FA FC21597	3 450,89		3 450,89
B303 Expertises foncières			23 081,60	4 452,37	27 533,97
M2017-021/BDC26 Expertise parcelle AY n°1 - IPFEC			6 540,00		6 540,00
013393 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	6 540,00		6 540,00
M2017-021/BDC27 Expertise parcelle AY N° 2 - IPFEC			1 200,00		1 200,00
013562 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	1 200,00		1 200,00
M2017-021/BDC28 Expertise immobilière parcelle cadastrée N° AY58 - IPFEC			3 360,00		3 360,00
013565 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	3 360,00		3 360,00
M2017-021/BDC34 Prémption ilot Thibaudau - IPFEC			4 440,00		4 440,00
014460 AC1	07/02/2022	FA 13/2022	4 440,00		4 440,00
M2020-043 Expertise Bijouterie ORLAC - SOCOTEC CONSTRUCTION			1 800,00		1 800,00
011220 SOLDE	12/10/2020	FA	1 800,00		1 800,00
M2020-050 Estimation valeur foncière Bijouterie Orlac - COLOMER			3 000,00		3 000,00
011080 SOLDE	01/10/2020	FA 2020/10-14	3 000,00		3 000,00
M2021-080/BDC1 Portets Soleil - SEGAT			230,05	0,46	230,51
016489 BDC 1 EXPERTISE PORTETS SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-	230,05		230,05
026609 BDC1 SOLDE	14/11/2025	REV DEF		0,46	0,46
M2021-080/BDC18 Evaluation indemnités Bentajac LE MEMPHIS - SEGAT			2 281,50		2 281,50
020194 AC1	29/02/2024	FA FC-24-02-	2 281,50		2 281,50
M2021-080/BDC29 Evaluation indemnités MAIF - SEGAT				4 451,45	4 451,45
024120 SOLDE	18/03/2025	FA FC-25-03-		4 451,45	4 451,45
M2021-080/BDC5 Navaille Soleil - SEGAT			230,05	0,46	230,51
016486 BDC 5 EXPERTISE NAVAILLE SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-	230,05		230,05
026613 BDC5 SOLDE	14/11/2025	REV DEF		0,46	0,46
B401 Indemnités de remploi			428 235,80	131 569,10	559 804,90
24-07258 Consignation Expropriation ASL Mirepin - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			2 500,00	-1 183,50	1 316,50
021135 CONSIGNATION EXPRO ASL MIREPIN	07/06/2024	07/06/24	2 500,00		2 500,00
024853 EXPRO ASL MIREPIN	09/01/2025	JUGT		-1 183,50	-1 183,50
24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX			128 200,00	20 813,80	149 013,80
24-07402 Provision	27/08/2024		129 255,58		129 255,58
023071 ACQ ONYX AY798-799	27/09/2024	EXPRO	-1 055,58		-1 055,58
023619 ACQ* ONYX AY798-799 INDEMNITE JGMT	09/01/2025	0035/12565/24		20 813,80	20 813,80
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX			90 305,00		90 305,00
021967 ACQ INDEMN EXPRO EYQUEMS AY1	29/08/2024	EX 29/08/24	73 000,00		73 000,00
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024	17 305,00		17 305,00
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX			60 815,30		60 815,30
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024	60 815,30		60 815,30
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité - CARPA PARIS			27 348,00	2 328,00	29 676,00
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024	27 348,00		27 348,00
025374 ACQ CARREFOUR AY790 et AY795	11/07/2025	JUG 11/07/25		2 328,00	2 328,00
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité - CONSIGNATION CAISSE DES			4 075,00		4 075,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790	22/10/2024	DDE	4 075,00		4 075,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
24-07540 Acquisition MAC DONALD 17 rue de Mirepin Indemnité - MCDONALD'S FRANCE			3 000,00		3 000,00
022438 INDEMN MAC DONALD	18/10/2024	FA181024	3 000,00		3 000,00
24-07542 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHES AX 507 508 510 511 512 513 514 Indemnité -			35 070,00	21 479,00	56 549,00
022436 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHES TR2	18/10/2024	FA181024	35 070,00		35 070,00
025373 ACQ CARREFOUR AX 507 508 510 511 512 513 514	11/07/2025	JUG 11/7/25		21 479,00	21 479,00
24-07543 Acquisition PLENO SOL AW663 555 554 566 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 534,00	1 534,00
24-07543 Provision	18/10/2024			1 534,00	1 534,00
24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33			1 415,50		1 415,50
24-07545 Provision	18/10/2024		1 415,50		1 415,50
24-07546 Acquisition SCI SMJ AY 801 802 806 - CARPA BORDEAUX			16 678,00		16 678,00
022432 INDEMN SCI SMJ	18/10/2024	FA130524	16 678,00		16 678,00
24-07548 Acquisition SCI IENG_ AY 796 797 - CARPA CHARENTE			48 879,00	-2 787,20	46 091,80
022433 INDEMN SCI IENG	18/10/2024	FA290724	48 879,00		48 879,00
024693 EXPRO SCI IENG_ AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		-2 787,20	-2 787,20
24-07549 Acquisition AB GROUPE AY 796 797 - CARPA CHARENTE				9 540,00	9 540,00
024694 EXPRO AB GROUPE AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		9 540,00	9 540,00
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX			9 950,00		9 950,00
24-07633 Provision	08/11/2024		9 950,00		9 950,00
25-07890/1 Acquis* consorts BENTEJAC immeuble Le Memphis - LEBEAU-CABANAC (NOT)				79 845,00	79 845,00
25-07890/1 Provision	28/01/2025			79 845,00	79 845,00
B402 Indemnités d'évictions (résiliations)			111 000,00	520 000,00	631 000,00
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX			111 000,00		111 000,00
24-07633 Provision	08/11/2024		111 000,00		111 000,00
25-08028 Indemnité éviction LE MEMPHIS - CARPA TOULOUSE				520 000,00	520 000,00
024941 INDEMNITE EVICTION	27/03/2025	PROT 27/03/25		520 000,00	520 000,00
B403 Indemnités diverses (transfert, instal",perte de loyers..)			694 383,16	158 863,86	853 247,02
23-06361/3 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) INDEMNITE - SCI SHAJAR			72 000,00		72 000,00
23-06361/3 Provision	19/10/2023		72 000,00		72 000,00
24-07385 Indemnité Transfert SARL Eltri 36 av de la Somme - ELTRI			50 853,00		50 853,00
022429 INDEMN SARL ELTRI	18/10/2024	FA181024	50 853,00		50 853,00
24-07401 Indemnité Transfert SARL ADM 21 36 av de la Somme - ADM 21			4 250,00		4 250,00
022430 INDEMN SARL ADM 21	18/10/2024	FA181024	4 250,00		4 250,00
24-07402 Acquisition ONYX AY798-799 Indemnité - CARPA BORDEAUX			116 000,00	317,00	116 317,00
24-07402 Provision	27/08/2024		100 894,16		100 894,16
023071 ACQ ONYX AY798-799	27/09/2024	EXPRO	15 105,84		15 105,84
023619 ACQ* ONYX AY798-799 INDEMNITE JGMT	09/01/2025	0035/12565/24		317,00	317,00
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX			42 642,83		42 642,83
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024	42 642,83		42 642,83
24-07489 Indemnité Transfert Asso.GEIQ SAGE 36 Av. de la Somme - GEIG SAGE			11 658,00		11 658,00
022431 INDEMN GEIQ SAGE	18/10/2024	FA181024	11 658,00		11 658,00
24-07528 Indemnité Transfert SASU ADM RETAIL 36 av de la Somme - ADM RETAIL			23 229,33		23 229,33
022427 INDEMN ADM RETAIL	18/10/2024	FA240924	23 229,33		23 229,33
24-07536 Acquisition SCI KIM HAK indemnité - CARPA BORDEAUX			2 500,00		2 500,00
022428 INDEMN SCI KIM HAK	18/10/2024	FA181024	2 500,00		2 500,00
24-07538 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHE AY790 et AY795 indemnité - CARPA PARIS			240 000,00	-217 730,64	22 269,36
022435 INDEMN CARREFOUR HYPERMARCHE TR1	18/10/2024	FA181024	240 000,00		240 000,00
025374 ACQ CARREFOUR AY790 et AY795	11/07/2025	JUG 11/07/25		-217 730,64	-217 730,64
24-07539 Consignation Expro IMMOFI SOLEIL AY790 indemnité - CONSIGNATION CAISSE DES			40 000,00		40 000,00
022467 INDEMNITE IMMOFI SOLEIL AY790	22/10/2024	DDE	40 000,00		40 000,00
24-07542 Acquisition CARREFOUR HYPERMARCHES AX 507 508 510 511 512 513 514 Indemnité -				1 800,00	1 800,00
025373 ACQ CARREFOUR AX 507 508 510 511 512 513 514	11/07/2025	JUG 11/7/25		1 800,00	1 800,00
24-07545 Acquisition SCI MERIGNAC 33 98 AY792 - SCI MERIGNAC 33			40 000,00		40 000,00
24-07545 Provision	18/10/2024		40 000,00		40 000,00
24-07547 Acquisition BE SENS AY801 802 806 _indemnités - BE SENS			200,00	11 800,00	12 000,00
022468 INDEMNITE BE SENS AY801 802 806	22/10/2024	FA22102024	200,00		200,00
024937 INDEMNITE BE SENS AY801 802 806	10/02/2025	FA250610		11 800,00	11 800,00
24-07548 Acquisition SCI IENG_ AY 796 797 - CARPA CHARENTE				38 800,00	38 800,00
024693 EXPRO SCI IENG_ AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		38 800,00	38 800,00
24-07549 Acquisition AB GROUPE AY 796 797 - CARPA CHARENTE				168 690,50	168 690,50
024694 EXPRO AB GROUPE AY 796 797	30/04/2025	EXPRO		168 690,50	168 690,50
24-07633 Acquisition EPIL STORY AY798-799 - CARPA BORDEAUX			19 050,00		19 050,00
24-07633 Provision	08/11/2024		19 050,00		19 050,00
24-07703 Acquisition SAS KERIA LIVING HOME - KERIA			10 000,00		10 000,00
24-07703 Provision	25/11/2024		10 000,00		10 000,00
24-07781 Indemnité transfert 50 AV. de la Somme - RAMIREZ DE RIBAS			18 000,00		18 000,00
023188 INDEMNITE GAN 50 AV.SOMME	13/12/2024	FA171224	18 000,00		18 000,00
24-07782 Indemnité transfert VISION SUD OUEST AY1 - CARPA BORDEAUX			2 000,00	10 482,00	12 482,00
023294 INDEM TRANSFERT VISION DISPLAY	16/12/2024	JUG 16/12/24	2 000,00		2 000,00
025375 INDEM TRANSFERT VISION SUD OUEST AY1	11/07/2025	JUG 11/07/25		10 482,00	10 482,00
24-07783 Indemnité transfert MAIF - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			2 000,00		2 000,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023296 INDEM TRANSFERT MAIF	16/12/2024	JUG 16/12/24	2 000,00		2 000,00
25-07890/1 Acquis* consorts BENTEJAC immeuble Le Menphis - LEBEAU-CABANAC (NOT)				54 705,00	54 705,00
25-07890/1 Provision	28/01/2025			54 705,00	54 705,00
25-08028 Indemnité éviction LE MEMPHIS - CARPA TOULOUSE				90 000,00	90 000,00
024711 MENPHIS INDEM DIV	20/05/2025	PROT 27/03/25		90 000,00	90 000,00
B404 Indemnités de trouble commercial			96 233,20		96 233,20
24-07403 Acquisition EYQUEMS AY1 Indemnité - CARPA BORDEAUX			96 233,20		96 233,20
022426 INDEMN EYQUEMS AY1	18/10/2024	FA181024	96 233,20		96 233,20
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			40 210,32	12 430,82	52 641,14
21-04684 Dépannage fuite d'eau 60% - LOGIS ENERGIES			108,00		108,00
013481 AC1	01/09/2021	FC0973	108,00		108,00
24-07107 Nettoyage Rue Peyandreau - IDVERDE			10 074,00		10 074,00
020702 AC1	22/04/2024	FA 2904006324	10 074,00		10 074,00
25-08374 BDR - Nettoyage en attente renouvellement marché - MERIGNAC ASSO. SERVICES				997,92	997,92
025491 AC1	31/07/2025	FA 2025/ 1101		142,56	142,56
026050 AC2	31/08/2025	FA 2025/1252		285,12	285,12
026731 AC3	20/11/2025	FA 2025/1649		285,12	285,12
026882 AC4	30/11/2025	FA 2025/ 1805		285,12	285,12
M2016-001 Lot 2/BDC10 OP Merignac Soleil : Diag avant demol OUDJANE - AQUITANIS			5 409,96		5 409,96
M2016-001 Lot 2/BDC10 Avance	10/01/2019		5 216,40		5 216,40
007333 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	193,56		193,56
007420 GEST* TERRAIN 2016-2017	28/12/2018	FA 010118			
M2016-001 Lot 2/BDC12 OP Mérignac Soleil : Mise en gestion OUDJANE - AQUITANIS			7 109,85		7 109,85
M2016-001 Lot 2/BDC12 Avance	10/01/2019		4 478,71		4 478,71
007337 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	1 613,04		1 613,04
007277 BDC12 TPS 11/18	20/12/2018	FA 2018/25	64,52		64,52
007421 GEST* TERRAIN 2016-2017	28/12/2018	FA 010118			
007422 BDC12 TPS 12/18	21/01/2019	FA 2018/26	64,52		64,52
007561 BDC 12 TPS 01/19	12/02/2019	FA 2019/01	65,34		65,34
007714 BDC 12 TPS 02/19	11/03/2019	FA 2019/02	65,34		65,34
007731 GESTION TERRAIN 2018	01/01/2019	FA 010119			
007952 BDC12-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/09	65,34		65,34
008076 BDC 12-TPS 04/19	17/05/2019	FA 04.2019/12	25,74		25,74
008213 BDC 12 - TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/17	66,73		66,73
008343 BDC 12-TPS 06/19	05/07/2019	06.2019/25	200,19		200,19
008669 BDC12 - TPS 08/19	16/09/2019	FA 08.2019/29	66,73		66,73
008868 BDC12 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/33	66,73		66,73
009088 BDC12 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/38	66,73		66,73
009443 BDC12 - TPS 11/19	01/01/2020	FA 11-2019/43	66,73		66,73
009598 BDC 12 - TPS 12/19	14/01/2020	FA	66,73		66,73
009779 BDC12- TPS 01/20	10/02/2020	FA	66,73		66,73
M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS			6 876,61		6 876,61
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 441,06		2 441,06
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		153,86		153,86
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		629,65		629,65
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		115,27		115,27
008344 BDC 22-TPS 06/19	05/07/2019	FA 06.2019/26	266,92		266,92
008869 BDC 22-TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/34	133,46		133,46
009783 BDC22 - TPS 01/20	10/02/2020	FA	133,46		133,46
009965 BDC22 - TPS 02/20	10/03/2020	FA	400,39		400,39
010500 BDC22 - TPS 05/20	18/06/2020	DHC/GLS/HSIS/	333,66		333,66
010618 BDC22 TPS 06/2020	16/07/2020	FA	467,12		467,12
010787 BDC22 TPS 07/20	17/08/2020	FA	934,24		934,24
010921 TPS 08/20	10/09/2020	FA	867,51		867,51
M2021-046 Lot 1/BDC30 Sécurisation maison Leroy Merlin - VPSITEX			3 286,46		3 286,46
018919 SOLDE	22/09/2023	FA	3 286,46		3 286,46
M2021-046 Lot 1/BDC30Bis Sécurisation maison Leroy Merlin 06/2023 à 06/2024 - VPSITEX			1 684,55		1 684,55
020239 AC1	29/02/2024	FA	1 123,03		1 123,03
020575 AC2	26/03/2024	FA	140,38		140,38
020867 AC3	24/04/2024	FA	140,38		140,38
021172 AC4	31/05/2024	FA	140,38		140,38
021430 AC5	30/06/2024	FA	140,38		140,38
M2021-046 Lot 1/BDC30ter Tôlage friche Leroy Merlin - VPSITEX			336,31		336,31
020870 AC1	24/04/2024	FA	336,31		336,31
M2021-046 Lot 1/BDC31 Sécurisation ancien fournil Madalozzo du 30/03/23 au 30/09/23 -			2 075,01		2 075,01
022120 SOLDE	11/09/2024	FA	1 877,87		1 877,87
022121 SOLDE	11/09/2024	FA	197,14		197,14
M2021-046 Lot 1/BDC31bis Prolongation Sécurisation ancien fournil Madalozzo 10/23 à 06/24 -			931,58		931,58
022327 SOLDE	11/09/2024	FA	931,58		931,58
M2021-077/BDC20 Diag termites et ERP _ 30 av. de la Somme - AED EXPERTISES			109,10		109,10

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
018200 SOLDE	27/06/2023	FAFA-243703	109,10		109,10
M2021-077/BDC27 Diag termites carport 30 Av. de la Somme - AED EXPERTISES			63,06		63,06
019402 AC1 SOLDE	30/11/2023	FA FA01101626	63,06		63,06
M2024-015 [BDR] Nettoyage hebdomadaire - MERIGNAC ASSO. SERVICES			2 145,83	1 754,48	3 900,31
021116 AC1	31/05/2024	FA 2024/ 752	264,65		264,65
021423 AC2	30/06/2024	FA 2024/ 927	180,58		180,58
022063 AC3	31/08/2024	FA 2024/ 1242	139,80		139,80
022008 AC4	31/08/2024	FA 2024/ 1202	489,30		489,30
022293 AC5	30/09/2024	FA 2024/ 1367	495,13		495,13
022667 AC6	31/10/2024	FA 2024/ 1547	291,25		291,25
023081 AC7	30/11/2024	FA 2024/ 1726	285,12		285,12
023385 AC8	01/01/2025	FA 2024/ 1898		285,12	285,12
023900 AC9	28/02/2025	FA 2025/ 247		305,12	305,12
024258 AC10	31/03/2025	FA 2025/ 375		285,12	285,12
024655 AC11	30/04/2025	FA 2025/ 576		285,12	285,12
024911 AC12	31/05/2025	FA 2025/738		380,16	380,16
025127 AC13	30/06/2025	FA 2025/ 914		213,84	213,84
M2024-061 Dégagement des emprises de la friche LR + maintenance 3 ans - IDVERDE				9 678,42	9 678,42
023143 AC1	01/01/2025	FA 2912017224		7 308,00	7 308,00
025504 AC2	07/08/2025	FA 2908006325		787,02	787,02
025870 AC3	24/09/2025	FA 2909019825		1 583,40	1 583,40
B502 Gardiennage			3 353,93	26 710,46	30 064,39
M2021-046 Lot 1/BDC 24 [BDR] Renouvel surveillance BDL 15/12/22 au 15/11/23 + 1 mois			787,35	1 592,27	2 379,62
020236 AC1 LOC 13/09-12/11/23	29/02/2024	FA	524,90		524,90
020452 AC2	11/03/2024	FA	1 049,79		1 049,79
020730 AVOIR/AC2	23/04/2024	AV	-1 049,79		-1 049,79
020731 AC3 13/11-12/12/23	23/04/2024	FA	262,45		262,45
025131 AC4 13/01-12/09/23	30/06/2025	FA		1 592,27	1 592,27
M2021-084/BDC 24 Rondes maisons 110 av Vigneau 9 au 16/08 - PROTEXIO/DRAKKAR			346,98		346,98
018747 AC1 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-	346,98		346,98
M2021-084/BDC25 Rondes fournil Madalozzo - PROTEXIO/DRAKKAR			346,98		346,98
018665 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-	346,98		346,98
M2021-084/BDC61 Gardiennage36 av de la somme rondes 04/25 - PROTEXIO/DRAKKAR				237,77	237,77
024561 SOLDE	30/04/2025	FA F-25040708		237,77	237,77
M2024-002/BDC23-1 MS maison Leroy Merlin alarme et porte - VPSITEX			43,20		43,20
022291 SOLDE	30/09/2024	FA	43,20		43,20
M2024-002/BDC23-2 MS maison Leroy Merlin alarme et porte - VPSITEX			1 078,49	1 517,39	2 595,88
022276 AC1	30/09/2024	FA	649,94		649,94
022279 AC2	30/09/2024	FA	649,94		649,94
022294 AV/FA SEF102483464	30/09/2024	AV	-649,94		-649,94
022686 AC2	31/10/2024	FA	214,06		214,06
023097 AC3	30/11/2024	FA	214,49		214,49
023356 AC4	01/01/2025	FA		216,00	216,00
023665 AC5	29/01/2025	FA		216,00	216,00
023977 AC6	28/02/2025	FA		217,51	217,51
024281 AC7	31/03/2025	FA		216,00	216,00
024588 AC8	30/04/2025	FA		216,00	216,00
024879 AC9	31/05/2025	FA		219,45	219,45
025144 SOLDE	30/06/2025	FA		216,43	216,43
M2024-002/BDC24-1 MS Fournil Madalozzo alarme du 02/06/24 au 30/06/24 - VPSITEX			121,81		121,81
022202 SOLDE	25/09/2024	FA	121,81		121,81
M2024-002/BDC24-2 MS Fournil Madalozzo alarme - VPSITEX			629,12	885,14	1 514,26
022203 AC1	25/09/2024	FA	379,13		379,13
022692 AC3	31/10/2024	FA	124,87		124,87
023093 AC4	30/11/2024	FA	125,12		125,12
023360 AC5	01/01/2025	FA		126,00	126,00
023661 AC6	29/01/2025	FA		126,00	126,00
023972 AC7	28/02/2025	FA		126,88	126,88
024283 AC8	31/03/2025	FA		126,00	126,00
024582 AC9	30/04/2025	FA		126,00	126,00
024898 AC10	31/05/2025	FA		128,01	128,01
025142 SOLDE	30/06/2025	FA		126,25	126,25
M2024-002/BDC24-3 110 av H Vigneau - loc télésurveillance 01/07/25-30/06/26 - VPSITEX				351,99	351,99
026147 AC1	15/10/2025	FA	117,33		117,33
026151 AC2	15/10/2025	FA		234,66	234,66
M2024-002/BDC29-1 Maison Kim Hak installation alarme - VPSITEX				386,32	386,32
023577 SOLDE	31/01/2025	FA		386,32	386,32
M2024-002/BDC29-2 Maison Kim Hak-vidéosurveillance 01/01/25 au 30/06/26 - VPSITEX				1 764,69	1 764,69
023979 AC1	28/02/2025	FA		391,20	391,20
024275 AC2	31/03/2025	FA		195,60	195,60

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024580 AC3	30/04/2025	FA		195,60	195,60
024880 AC4	31/05/2025	FA		195,99	195,99
025158 AC5	30/06/2025	FA		195,99	195,99
025485 AC6	31/07/2025	FA		195,99	195,99
025731 AC7	31/08/2025	FA		197,16	197,16
026098 AC8	07/10/2025	FA		197,16	197,16
M2024-002/BDC29-3 Prorata Loc porte sécurisée et tôleage des ouvertures RDC - VPSITEX				3 429,60	3 429,60
023552 SOLDE	29/01/2025	FA		3 429,60	3 429,60
M2024-002/BDC29-4 48 av somme Location porte sécurisée 01/02/2025 au 31/01/2026 - VPSITEX				462,08	462,08
023984 AC1	28/02/2025	FA		57,60	57,60
024271 AC2	31/03/2025	FA		57,60	57,60
024585 AC3	30/04/2025	FA		57,60	57,60
024897 AC4	31/05/2025	FA		57,72	57,72
025150 AC5	30/06/2025	FA		57,72	57,72
025482 AC6	31/07/2025	FA		57,72	57,72
025709 AC7	31/08/2025	FA		58,06	58,06
026110 AC8	07/10/2025	FA		58,06	58,06
M2024-002/BDC30-1 Maison leng Installation alarme - VPSITEX				386,32	386,32
023924 SOLDE	28/02/2025	FA		386,32	386,32
M2024-002/BDC30-2 Maison leng - Videosurveillance 01/01/25 au 31/05/25 - VPSITEX				1 080,43	1 080,43
023978 AC1	28/02/2025	FA		432,00	432,00
024286 AC2	31/03/2025	FA		216,00	216,00
024589 AC3	30/04/2025	FA		216,00	216,00
024882 SOLDE	31/05/2025	FA		216,43	216,43
M2024-002/BDC30-3 34 av Somme - tolage RDC - VPSITEX				1 839,67	1 839,67
025181 SOLDE	26/06/2025	FA		1 839,67	1 839,67
M2024-002/BDC30-4 34 av de la somme - sécurisation installation et loc 11/24 - VPSITEX				207,21	207,21
025461 SOLDE	31/07/2025	FA		207,21	207,21
M2024-002/BDC30-5 34 av de la somme - sécurisation loc -> 11/26 - VPSITEX				589,46	589,46
025486 AC1	31/07/2025	FA		404,01	404,01
025490 AC2	31/07/2025	FA		57,72	57,72
025708 AC3	31/08/2025	FA		58,06	58,06
026096 AC4	07/10/2025	FA		58,06	58,06
026828 SOLDE	19/11/2025	FA		11,61	11,61
M2024-002/BDC30-6 34 av de la somme - prolongation alarme 01/06/25 au 30/06/26 - VPSITEX				828,08	828,08
025589 AC1	14/08/2025	FA		394,33	394,33
025743 AC2	31/08/2025	FA		197,16	197,16
026099 AC3	07/10/2025	FA		197,16	197,16
026827 SOLDE	19/11/2025	FA		39,43	39,43
M2024-002/BDC31-1 Onyx - Installation alarme - 36 av de la somme Mérygnac - VPSITEX				386,32	386,32
023927 SOLDE	28/02/2025	FA		386,32	386,32
M2024-002/BDC31-2 Onyx - Vidéosurveillance 01/01/25 au 30/06/26 - VPSITEX				1 764,69	1 764,69
023971 AC1	28/02/2025	FA		391,20	391,20
024273 AC2	31/03/2025	FA		195,60	195,60
024583 AC3	30/04/2025	FA		195,60	195,60
024878 AC4	31/05/2025	FA		195,99	195,99
025156 AC5	30/06/2025	FA		195,99	195,99
025497 AC6	31/07/2025	FA		195,99	195,99
025740 AC7	31/08/2025	FA		197,16	197,16
026102 AC8	07/10/2025	FA		197,16	197,16
M2024-002/BDC31-3 Tôleage blindage 31/03/25 ONYX 36 av de la Somme - VPSITEX				3 855,84	3 855,84
024237 SOLDE	31/03/2025	FA		3 855,84	3 855,84
M2024-002/BDC31-4 ONYX Loc° 2 portes blindées 04/25 à 03/26 - VPSITEX				693,73	693,73
024597 AC1	30/04/2025	FA		115,20	115,20
024881 AC2	31/05/2025	FA		115,43	115,43
025155 AC3	30/06/2025	FA		115,43	115,43
025496 AC4	31/07/2025	FA		115,43	115,43
025738 AC5	31/08/2025	FA		116,12	116,12
026105 AC6	07/10/2025	FA		116,12	116,12
M2024-002/BDC36 51 ch mirepin - sécurisation - VPSITEX				3 647,28	3 647,28
025147 AC1	30/06/2025	FA		3 650,40	3 650,40
025232 ANNUL AC1 ERR MONTT	10/07/2025	AV		-3 650,40	-3 650,40
025229 AC1 SOLDE	10/07/2025	FA		3 647,28	3 647,28
M2024-002/BDC36-1 51 ch mirepin - location systemes sécurité 01/07/2025 au 30/06/2027 -				446,34	446,34
025536 AC1	08/08/2025	FA		148,78	148,78
025714 AC2	31/08/2025	FA		148,78	148,78
026103 AC3	07/10/2025	FA		148,78	148,78
M2024-002/BDC38 Alarme GAN pose et location 07/07/25-31/07/25 - VPSITEX				176,40	176,40
026216 SOLDE	21/10/2025	FA		176,40	176,40
M2024-002/BDC38-1 Alarme GAN pose et location 01/08/2025 - 01/08/2027 - VPSITEX				181,44	181,44

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
026834 AC1	21/10/2025	FA		181,44	181,44
B503 Impots Foncier			16 874,25	47 538,00	64 412,25
18-02369 Taxe foncière OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			2 782,00		2 782,00
006961 TF 2018 - OUDJANE	16/10/2018	T	1 374,00		1 374,00
008608 TF 2019 - OUDJANE	12/08/2019	T 19 33	1 408,00		1 408,00
19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			35,75		35,75
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/C0010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	35,75		35,75
20-03903 Taxe foncière 2020 OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			1 459,50		1 459,50
011089 TF 2020	23/09/2020	AV	1 459,50		1 459,50
22-05717/2 Frais d'acquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			200,00		200,00
22-05717/2 Provision	11/10/2022		140,41		140,41
22-05717/2 Provision	11/10/2022		42,71		42,71
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	16,88		16,88
24-07443 TAXES FONCIERES 2024 - TRESOR PUBLIC (TF)			11 590,00		11 590,00
022077 TAXES FONCIERES 2024	12/08/2024	T 24 33	11 590,00		11 590,00
24-07689 Taxe sur les logements vacants 7 Ch de Peyandreu 2024 - TRESOR PUBLIC (TF)			807,00		807,00
022792 SOLDE	04/11/2024	FA 24 33	807,00		807,00
25-08522 TAXES FONCIERES 2025 281 + 06204 H - TRESOR PUBLIC (TF)				45 897,00	45 897,00
025757 SOLDE	11/08/2025	FA 25 33		45 897,00	45 897,00
25-08640 Taxe sur les logements vacants 7 Ch de Peyandreu 2025 - TRESOR PUBLIC (TF)				1 641,00	1 641,00
026658 SOLDE	03/11/2025	FA 25 33		1 641,00	1 641,00
B601 Assistance Juridique			220 688,76	102 318,49	323 007,25
20-03906 Notifications préemption SCI MAKLOUF - CASIMIRO (HUISSIER)			778,45		778,45
011188 NOTIFS PREEMPTION SCI MAKLOUF	16/10/2020	FA 64794	778,45		778,45
21-04349 Constat livraison ouvrage - 32 avenue de la somme - CASIMIRO (HUISSIER)			300,00		300,00
012557 AC1	18/05/2021	FA 68 925	300,00		300,00
22-05133 Notifications préemption SCI PORTET et SCI NAVAILLE - CASIMIRO (HUISSIER)			836,85		836,85
014484 AC1	14/02/2022	FA 73818	836,85		836,85
22-05155 Signification visite SCI SOPHIE ET MAGALIE - CASIMIRO (HUISSIER)			239,10		239,10
014527 AC1	18/02/2022	FA 73 905	239,10		239,10
22-05431 Signif dde de visite MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)			712,60		712,60
015241 AC1	20/05/2022	FA 75 540	712,60		712,60
22-05517 Signif préemption MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)			832,15		832,15
015714 AC1	21/07/2022	FA 76 068	832,15		832,15
23-06274 Constat des lieux aux abords du restaurant Memphis - CASIMIRO (HUISSIER)			310,00		310,00
018058 AC1	27/03/2023	FA 81 306	310,00		310,00
23-06340 Constat voie aux abords du P1 (voie Germaine Tillon) - CASIMIRO (HUISSIER)			350,00		350,00
018286 AC1	11/04/2023	FA81605	350,00		350,00
23-06342 Constat fin de travaux parking Memphis - CASIMIRO (HUISSIER)			270,00		270,00
018115 SOLDE	12/06/2023	FA 82622	270,00		270,00
23-06406 BDR - constat d'affichage 26 avenue de la Somme - CASIMIRO (HUISSIER)			291,00		291,00
018227 82556	06/06/2023	FA82556	291,00		291,00
23-06433 Honoraires mandataire ASL Chemin de Mirepin - AJILINK VIGREUX			2 000,00	-2 000,00	
23-06433 Avance	17/07/2023		2 000,00		2 000,00
23-06433 Avance	17/07/2023			-2 000,00	-2 000,00
23-06694 Signification AB GROUPE - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			142,88		142,88
019947 SOLDE	01/01/2024	FA B1262283	71,44		71,44
022025 AC2	01/01/2024	FA B1266258	71,44		71,44
23-06781 BDR- Constat affichage 26 av. de la Somme 2nd passage - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00		390,00
019646 SOLDE	01/01/2024	FA 86115	390,00		390,00
24-06873 Honoraires mandataire ASL Chemin de Mirepin_lancement mission avocat - AJILINK			1 200,00	-1 200,00	
24-06873 Avance	18/01/2024	Dossier 3028	1 200,00		1 200,00
24-06873 Avance	18/01/2024	Dossier 3028		-1 200,00	-1 200,00
24-06909 Signification SASU CHARTRONS INVEST - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			71,55		71,55
020051 SOLDE	08/02/2024	FA B1272580	71,55		71,55
24-07227 Significations jugements indem prov (Mirepin) - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			577,44		577,44
021044 AC1	23/05/2024	FA B1286141	144,36		144,36
021045 AC2	24/05/2024	FA B1286142	144,36		144,36
021046 AC3	28/05/2024	FA B1286138	144,36		144,36
021054 AC4	30/05/2024	FA B1286140	144,36		144,36
24-07335 Actes d'huissier 2024 (constats piquetage transport sur les lieux) - CASIMIRO (HUISSIER)			1 758,24		1 758,24
021531 AC1	10/06/2024	FA 90195	270,00		270,00
022116 SOLDE	28/08/2024	FA 92170	119,28		119,28
022532 SIGNIF CARREFOUR	25/10/2024	FA 93648	255,40		255,40
022533 SIGNIF CARREFOUR	25/10/2024	FA 93643	243,56		243,56
022732 PV CONSTAT NON RECOURS TA	31/10/2024	FA 93812	270,00		270,00
022809 CONSTAT RUE MIREPIN	14/11/2024	FA 94064	330,00		330,00
022952 CONSTAT 34 AV DE LA SOMME	13/09/2024	FA 92520	270,00		270,00
24-07336 Diverses significations jugements 2024 - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			3 315,06	864,14	4 179,20
021577 J2407043365 TH	10/07/2024	FA B1292121	72,18		72,18

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
021578 J2407031391 TH	10/07/2024	FA B1292079	72,18		72,18
021579 J2407043357 TH	10/07/2024	FA B1292099	72,18		72,18
021580 J2407043374 TH	11/07/2024	FA B1292358	72,18		72,18
021581 J2407043377 TH	10/07/2024	FA B1292108	72,18		72,18
021582 J2407043361 TH	10/07/2024	FA B1292118	109,96		109,96
021583 J2407043364 TH	10/07/2024	FA B1292119	72,18		72,18
021584 J2407043360 TH	10/07/2024	FA B1292120	72,18		72,18
021593 J2407043359 TH	10/07/2024	FA B1292174	109,96		109,96
021636 J2407160144 TH	22/07/2024	FA B1293419	125,08		125,08
021637 J2407043373 TH	10/07/2024	FA B1292122	72,18		72,18
021638 J2407043362 TH	10/07/2024	FA B1292123	72,18		72,18
021644 J2407160142 TH	22/07/2024	FA B1293409	152,08		152,08
021839 J2407290366 TH	01/08/2024	FA B1294650	125,84		125,84
021882 J2408091161 TH	12/08/2024	FA B1296114	76,04		76,04
021924 J2408073041 TH	21/08/2024	FA B1296826	74,26		74,26
021934 J2408091159 TH	23/08/2024	FA B1297111	73,18		73,18
021935 J2408073052 TH	23/08/2024	FA B1297114	74,26		74,26
022024 J23101822831352 TH	01/01/2024	FA B1259000	71,44		71,44
022163 SOLDE	02/09/2024	FA B1298167	112,04		112,04
022180 SOLDE	17/09/2024	FA B1300238	74,26		74,26
022178 SOLDE	17/09/2024	FA B1300240	74,26		74,26
022179 SOLDE	17/09/2024	FA B1300239	74,26		74,26
022731 SOLDE SIGNIF KIM HAK	12/11/2024	FA B1306680	148,52		148,52
023074 J241202024391 TH	05/12/2024	FA B1309355	148,52		148,52
023075 J241202023991 TH	05/12/2024	B1309356	148,52		148,52
023111 J241202024091 TH	03/12/2024	FA B1309516	186,34		186,34
023112 J241202023191 TH	03/12/2024	FA B1309517	186,34		186,34
023113 J241106004191	08/11/2024	FA B1309503	148,52		148,52
023134 SIGNIF* SAS PLENO	11/12/2024	FA B1309898	185,34		185,34
023135 SIGNIF* MAC DONALD'S	11/12/2024	FA B1309965	186,42		186,42
023274 SIGNIF* JUG EXPRO MAIF	01/01/2025	FA B1311598		453,26	453,26
023487 SIGNIFICATION VISION DISPLAY	16/01/2025	FA B1313623		148,72	148,72
023609 SIGNIF JUGMNT SAINT MACLOU	30/01/2025	FA B1315235		185,44	185,44
024957 SIGNIFICAT* COMMISSAIRE GVNT _ J2506030297 1352	11/06/2025	FA B1331508		76,72	76,72
24-07367 Signification divers actes 2024 - ID FACTO			405,50		405,50
021585 MD:1915802-SVE92	18/07/2024	FA 24.07.68789	44,63		44,63
021631 MD:1916234-EDM92	22/07/2024	FA 24.07.69954	93,49		93,49
021837 MD:1819036-MG91	06/08/2024	FA 240876881	133,69		133,69
021838 MD:1915858-DC	06/08/2024	FA 240876882	133,69		133,69
021959 MD: 1915852 - ND78/2	28/08/2024	FA 24.07.68795	44,63		44,63
022674 REMB /FA 24.07.68795	02/10/2024	DOSSIER	-44,63		-44,63
24-07372 signification acte Eglô France Luminaire - WEIBEL P SCP			42,73		42,73
021554 AC1	23/05/2024	FA A240836	42,73		42,73
25-07898 Diverses significations jugements 2025 - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)				2 014,46	2 014,46
023534 SIGNIF* JGT SCI SMJ	27/01/2025	FA B1314743		148,72	148,72
023905 SIGNIF* EGGLO	03/03/2025	FA B1319149		186,40	186,40
024043 SIGNIF* SCI MERIGNAC 33	07/03/2025	FA B1319824		196,92	196,92
024391 SIGNIF* ASS* SYNDIC MIREPIN	27/03/2025	FA B1322375		148,72	148,72
024717 SIGNIF* JGT EXPRO	09/05/2025	FA B1327888		148,72	148,72
024976 SIGNIF* JGT AB GROUP	11/06/2025	FA B1331509		74,36	74,36
025017 SIGNIF* JGT AB GROUP TC	16/06/2025	FA B1332791		103,36	103,36
025367 SIGNIF* JGT CARREFOUR	28/07/2025	FA B1338248		112,33	112,33
025359 SIGNIF* CARREFOUR 24/07/25	25/07/2025	FA B1337977		112,33	112,33
025360 SIGNIF* JGT EXPRO 11/07/25	24/07/2025	FA B1337660		74,36	74,36
025361 SIGNIF* JGT VISION SUD OUEST	28/07/2025	FA B1338103		74,36	74,36
025585 SIGNIF* JGT IMMOFI	08/08/2025	FA B1340138		74,36	74,36
025596 SIGNIF JGT VISION SUD OUEST	18/08/2025	FA B1341252		74,36	74,36
025595 SIGNIF* JGT COMMISSAIRE GVNT J2507241230 1352	18/08/2025	FA B1341253		74,36	74,36
025588 SIGNIF* JGT COMMISSAIRE GVNT J2506030297 1775	14/08/2025	FA B1341065-1		75,54	75,54
026301 JGT COMMISSAIRE GVNT J2507220098 1971	24/07/2025	FA B1337661		74,36	74,36
026293 SIGNIF* JGT COMMISSAIRE GVNT J2507212709 1971	24/07/2025	FA B1337662		74,36	74,36
026646 SIGNIF* JUGT COMMISSAIRE GOUV	07/11/2025	FA B1352919		186,54	186,54
25-07981 Actes d'huissier 2025 (constats piquetage transport sur les lieux) - CASIMIRO (HUISSIER)				2 492,42	2 492,42
023836 PV CONSTAT TRAVAUX PARKING SOLEIL	23/02/2025	FA 25-150		500,00	500,00
023837 PV CONSTAT TRAVAUX MIREPIN	25/02/2025	FA 25-37		270,00	270,00
024372 SIGNIF* PREEMPTION FLUNCH	19/02/2025	FA 253286		595,40	595,40
024536 SIGNIFICATION GARBUIO	24/04/2025	FA 25-8240		193,06	193,06
024745 SIGNIFICATION PREEMPTION	20/05/2025	FA 25-10493		535,12	535,12
024772 SIGNIFICATION IMMOFI SOLEIL	10/01/2025	FA 25-192		267,56	267,56
025797 SIGNIF* CONSIGNAT* THIBAudeau	09/09/2025	FA 25-18561		131,28	131,28

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
25-07987 Frais postulations 2025 - DELAVALLADE-RAIMBAULT				2 130,00	2 130,00
023864 POSTULATION CA SCI LES EYQUEM	10/01/2025	FA F07254		1 065,00	1 065,00
023865 POSTULATION SMJ	09/01/2025	FA F07251		1 065,00	1 065,00
25-08563 Signif SCI André Navaille - BONNAMY-VIZOSO				150,16	150,16
025827 AC1	17/09/2025	FA 128794		150,16	150,16
25-08564 Signif SCI Portets - BONNAMY-VIZOSO				150,16	150,16
025830 AC1	17/09/2025	FA 128595		150,16	150,16
25-08565 Signification divers actes 2025 - ID FACTO				90,02	90,02
026046 MD: 2149344 - LCO92	07/10/2025	FA 95479		90,02	90,02
M2016-039 Lot 1/BDC18 Presta juridique : Pollution découverte au chemin Mirepin - FIDAL			5 964,84		5 964,84
012958 AC1	20/07/2021	FA	5 964,84		5 964,84
M2016-039 Lot 1/BDC18bis Presta juridique : Clause pollution protocole Carrefour - FIDAL			1 704,24		1 704,24
014195 HONO CONSEIL AC1	01/01/2022	FA	1 704,24		1 704,24
M2016-039/BDC26 BDC26 Assistance juridique préemption SCI MAKLOUF - FIDUCIAL LEGAL			2 207,10		2 207,10
011827 BDC26 AC 1	01/01/2021	FA	2 207,10		2 207,10
M2021-001 Lot 1/BDC22-bis Prestation juridique - Compléments BDC22 Marne Soleil - FIDUCIAL				4 173,12	4 173,12
024418 AC1	31/03/2025	FA		994,50	994,50
024673 AC2	30/04/2025	FA		3 178,62	3 178,62
M2021-001 Lot 2/BDC4-1 analyse dossier EP préalable DUP - THOME HEITZMANN			4 794,77		4 794,77
013398 AC1	30/09/2021	FA 21-1247	4 794,77		4 794,77
M2021-001 Lot 2/BDC4-2 analyse modalités MECDU/PLUi - THOME HEITZMANN			726,48		726,48
013399 AC1	30/09/2021	FA 21-1280	726,48		726,48
013838 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05		3 705,05
015152 REGUL ERREUR SAISIE AC2 CONCERNE BDC 4-4 ET NON 4-2	30/11/2021	FA 21-1361	-3 705,05		-3 705,05
M2021-001 Lot 2/BDC4-4 analyse compatibilité MECDU/PLUi + DUP - THOME HEITZMANN			4 892,81		4 892,81
014127 AC1	01/01/2022	FA 21-1437	1 187,76		1 187,76
015153 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05		3 705,05
M2021-001 Lot 2/BDC4-5 Rédact° courrier en réponse + Consultation - THOME HEITZMANN			5 702,12		5 702,12
014599 AC1	28/02/2022	FA 22-1540	1 855,00		1 855,00
014856 AC2	31/03/2022	FA 22-1608	3 847,12		3 847,12
M2021-001 Lot 2/BDC4-6 Rédact mémoire / représentat° en justice SCI RUE ANDRE NAVAILLE -			5 704,84		5 704,84
015547 AC1	15/07/2022	FA 22-1812	1 578,53		1 578,53
017410 AC2	27/02/2023	FA 23-2217	1 487,37		1 487,37
017720 AC3	30/03/2023	FA 23-2255	2 638,94		2 638,94
M2021-001 Lot 2/BDC4-7 Rédact mémoire / représentat° en justice SCI PORTETS - THOME			4 941,80		4 941,80
015557 AC1	27/06/2022	FA 22-1764	1 052,35		1 052,35
017409 AC2	27/02/2023	FA 23-2216	940,04		940,04
017719 AC3	30/03/2023	FA 23-2254	2 949,41		2 949,41
M2021-001 Lot 2/BDC4-8 Instances référé Navaille et Portets/Instance au fond - THOME			10 581,48		10 581,48
015795 AC1	27/07/2022	FA 22-1825	7 779,38		7 779,38
016923 AC 2	01/01/2023	FA 22-2092	1 619,50		1 619,50
021694 AC3	30/07/2024	FA 24-3233	1 182,60		1 182,60
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-1 Accompagnement instauration SUP canalisation - THOME			1 510,56		1 510,56
015782 AC1	27/07/2022	FA 22-1834	1 510,56		1 510,56
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-10 Analyse volumétrie Carrefour et étude nomination d'un adm pour			2 385,12		2 385,12
018051 AC1	30/05/2023	FA 23-2394	963,48		963,48
018226 AC1	30/06/2023	FA23-2453	1 421,64		1 421,64
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-11 Rédaction d'une délibération - SEPT 2023 - THOME HEITZMANN			825,60		825,60
018438 AC1	27/07/2023	FA 23-2495	825,60		825,60
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-12 Rédaction des offres phase 1 - THOME HEITZMANN			6 400,44		6 400,44
018048 AC1	26/05/2023	FA 23-2374	4 249,73		4 249,73
018803 SOLDE	27/09/2023	FA 23-2569	2 150,71		2 150,71
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-13 Etablissement note/préconisations procédure urgence - THOME			2 630,04		2 630,04
018047 AC1	26/05/2023	FA 23-2372	2 630,04		2 630,04
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-14 Analyse maintien espace vert parcelle AX70 - THOME HEITZMANN			3 328,20		3 328,20
018435 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2479	3 328,20		3 328,20
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-15 Désignation d'un administrateur provisoire ASL Mirepin - THOME			1 986,60		1 986,60
018437 AC1	27/07/2023	FA 23-2484	1 986,60		1 986,60
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-16 Analyse possibilité retrocession - THOME HEITZMANN			2 309,02		2 309,02
019142 SOLDE	27/10/2023	FA 23-2625	2 309,02		2 309,02
M2021-001 Lot 2/BDC4Bis-17 Rédaction offres phase 1 - THOME HEITZMANN			4 515,00		4 515,00
018436 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2483	4 515,00		4 515,00
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-2 Validation du dossier de MECDU - fusion - THOME HEITZMANN			3 172,18		3 172,18
015801 AC1	27/07/2022	FA 22-1833	3 172,18		3 172,18
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-3 Préemption MADALOZZO - THOME HEITZMANN			755,28		755,28
015797 AC1	27/07/2022	FA 22-1832	755,28		755,28
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-4 Condition de mise en œuvre de la loi de 1892 dossier AQPRIM -			1 112,50		1 112,50
017703 AC1	31/03/2023	FA 23-2266	1 112,50		1 112,50
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-5 Etablissement d'un mémoire en intervention dossier MORENO -			3 204,00		3 204,00
016971 AC 1	01/01/2023	FA 22-2124	3 204,00		3 204,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-6 Négó désistement instance judiciaire Moreno - THOME HEITZMANN			1 958,98		1 958,98
017478 AC1	28/02/2023	FA 23-2225	1 958,98		1 958,98
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-7 Validation réponse Fab à avis MRAe MECDU - THOME HEITZMANN			3 711,74		3 711,74
017393 AC1	22/02/2023	FA 23-2198	3 711,74		3 711,74
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-8 Etablisst mémoires complémentaires Naveilles et Portets - THOME			1 940,40		1 940,40
017885 AC1	28/04/2023	FA 23-2312	1 940,40		1 940,40
M2021-001 Lot 2/BDC4bis-9 Réunion en présentiel - THOME HEITZMANN			1 171,80		1 171,80
018049 AC1	26/05/2023	FA 23-2379	1 171,80		1 171,80
M2021-001 Lot 2/BDC9-1 Rédaction Convention Aqprim BM - FIDUCIAL LEGAL			3 075,84		3 075,84
016470 AC 1	30/09/2022	FA 202205347	959,40		959,40
016469 AC 2	30/09/2022	FA 202205349	2 116,44		2 116,44
M2021-001/Lot2//BDC4Ter-25 4Ter 25 protocole éviction les foulées - THOME HEITZMANN			1 672,70		1 672,70
021975 AC1	30/08/2024	FA 24-3303	1 672,70		1 672,70
M2021-001/Lot2/4ter-17 Fixation judiciaire SCI SMJ - THOME HEITZMANN			6 354,70		6 354,70
021089 AC1	31/05/2024	FA 24-3079	2 772,96		2 772,96
021500 AC2	01/07/2024	FA 24-3132	1 203,36		1 203,36
021973 AC3	30/08/2024	FA 24-3301	1 194,63		1 194,63
022266 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3351	1 183,75		1 183,75
M2021-001/Lot2/BDC4 Ter-1 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil - THOME			2 427,46		2 427,46
018873 SOLDE	29/09/2023	FA 23-2616	2 427,46		2 427,46
M2021-001/Lot2/BDC4ter-12 Fixation judiciaire Onyx - THOME HEITZMANN			3 967,59	1 286,06	5 253,65
021091 AC1	31/05/2024	FA 24-3080	1 177,20		1 177,20
021715 AC1	31/07/2024	FA 24 -3249	1 588,13		1 588,13
021974 AC2	30/08/2024	FA 24-3302	1 202,26		1 202,26
023870 SOLDE	27/02/2025	FA 25-3744		1 286,06	1 286,06
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-12Bis Fixation judiciaire ONYX_Audience de plaidoirie 05/09/24 -				1 185,84	1 185,84
023599 SOLDE	31/01/2025	FA 25-3678		1 185,84	1 185,84
M2021-001/Lot2/BDC4ter-13 Fixation judiciaire IENG - THOME HEITZMANN			2 980,54	2 500,81	5 481,35
020791 AC1	29/04/2024	FA 24-3017	1 177,20		1 177,20
021692 AC2	30/07/2024	FA 24-3231	1 803,34		1 803,34
023325 AC3	01/01/2025	FA 24-3591		1 113,71	1 113,71
024217 SOLDE	31/03/2025	FA 25-3822		1 387,10	1 387,10
M2021-001/Lot2/BDC4ter-14 Fixation judiciare ASL Mirepin - THOME HEITZMANN			3 319,44	2 036,72	5 356,16
020521 AC1	29/03/2024	FA 24-2965	1 175,04		1 175,04
021099 AC2	31/05/2024	FA 24-3100	1 597,92		1 597,92
022252 AC3	30/09/2024	FA 24-3359	546,48		546,48
023326 AC4	01/01/2025	FA 24-3595		1 130,04	1 130,04
025627 AC5	25/08/2025	FA 25-4257		906,68	906,68
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-14bis Audience ASL Mirepin - THOME HEITZMANN			1 080,00		1 080,00
022950 SOLDE	28/11/2024	FA 24-3517	1 080,00		1 080,00
M2021-001/Lot2/BDC4ter-15 Fixation judiciaire SCI Les Eyquems - THOME HEITZMANN			4 631,04	450,84	5 081,88
020522 AC1	29/03/2024	FA 24-2973	1 175,04		1 175,04
021096 AC2	31/05/2024	FA 24-3099	1 597,92		1 597,92
021502 AC3	01/07/2024	FA 24-3135	1 569,60		1 569,60
022466 AC4	30/09/2024	FA24-3363	288,48		288,48
025594 AC5	30/07/2025	FA 25-4206		450,84	450,84
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-15bis Audience SCI Les Eyquems - THOME HEITZMANN			1 080,00		1 080,00
021501 AC1 SOLDE	01/01/2024	FA 24-3134	1 080,00		1 080,00
M2021-001/Lot2/BDC4ter-16 Fixation judiciaire SCI KIM HAK - THOME HEITZMANN			3 557,76	1 693,75	5 251,51
020826 AC1	30/04/2024	FA 24-3068	1 177,20		1 177,20
021094 AC2	31/05/2024	FA 24-3098	1 595,76		1 595,76
021504 AC3	01/07/2024	FA 24-3142	784,80		784,80
023322 AC4	01/01/2025	FA 24-3588		707,33	707,33
024571 SOLDE	29/04/2025	FA 25-3918		986,42	986,42
M2021-001/Lot2/BDC4ter-16Bis Audience SCI KIM HAK - THOME HEITZMANN			1 080,00		1 080,00
021503 AC1 SOLDE	01/07/2024	FA 24-3141	1 080,00		1 080,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-17Bis Fixation judiciaire SCI SMJ rédaction mémoire complémentaire				790,56	790,56
023590 SOLDE	31/01/2025	FA 25-3674		790,56	790,56
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-20 MEDA SCI PILOU - THOME HEITZMANN			1 128,00		1 128,00
021693 SOLDE	30/07/2024	FA 24-3232	1 128,00		1 128,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-21 Fixation judiciaire SCI Mérignac 33 98 - THOME HEITZMANN			4 080,00	424,32	4 504,32
021702 AC1	30/07/2024	FA 24-3230	3 792,00		3 792,00
022556 AC2	29/10/2024	FA 24-3426	288,00		288,00
025639 AC3	26/08/2025	FA 25-4263		424,32	424,32
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-22 Prest jurid éviction partielle Kéria - THOME HEITZMANN			4 460,45		4 460,45
021505 AC1	01/07/2024	FA 24-3143	1 464,96		1 464,96
021701 AC2	30/07/2024	FA 24-3229	1 173,96		1 173,96
022253 AC3	30/09/2024	FA 24-3360	1 269,65		1 269,65
022552 SOLDE	29/10/2024	FA 24-3424	551,88		551,88
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-23 Suivi négos confidentielles Carrefour/Klépierre _phase 2 - THOME				3 504,82	3 504,82

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023584 SOLDE	31/01/2025	FA 25-3681		3 504,82	3 504,82
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-24 4Ter 24 procédure éviction Ab groupe - THOME HEITZMANN			3 620,02	2 834,35	6 454,37
022257 AC1	30/09/2024	FA 24-3365	3 620,02		3 620,02
023324 AC2	01/01/2025	FA 24-3590		788,40	788,40
024214 AC3	31/03/2025	FA 25-3821		1 729,56	1 729,56
024851 SOLDE	01/01/2025	FA24-3590		316,39	316,39
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-26 Protocole accord obligations environnementales Klepierre - THOME			3 279,00		3 279,00
022256 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3364	3 279,00		3 279,00
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-27 Fixation judiciaire PLENO SOL - THOME HEITZMANN			3 961,03	658,80	4 619,83
021711 AC1	31/07/2024	FA 24-3255	1 591,37		1 591,37
022254 AC2	30/09/2024	FA 24-3362	2 369,66		2 369,66
023597 AC3	31/01/2025	FA 25-3677		658,80	658,80
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-28 Fixation judiciaire St Maclou - THOME HEITZMANN			1 721,81	668,30	2 390,11
021710 AC1	31/07/2024	FA 24-3254	1 721,81		1 721,81
023591 AC2	31/01/2025	FA 25-3675		668,30	668,30
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-29 Fixation judiciaire Epil Story - THOME HEITZMANN			3 942,00	796,32	4 738,32
022554 AC1	29/10/2024	FA 24-3425	3 942,00		3 942,00
026818 AC2	27/11/2025	FA 25-4492		796,32	796,32
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-3 Mémoires + représentat* Appel SCI NAVAILLES ET PORTETS - THOME			4 856,69	4 130,78	8 987,47
019408 AC 1	29/11/2023	FA 23-2693	4 054,75		4 054,75
022261 AC2	30/09/2024	FA 24-3376	801,94		801,94
023529 AC3	27/01/2025	FA 25-3664		2 371,68	2 371,68
025432 AC4	30/07/2025	FA 25-4218		1 759,10	1 759,10
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-30 Fixation judiciaire Carrefour - THOME HEITZMANN			2 780,59	3 684,31	6 464,90
021709 AC1	31/07/2024	FA 24-3253	1 591,37		1 591,37
022251 AC2	30/09/2024	FA 24-3358	1 189,22		1 189,22
023532 AC3	27/01/2025	FA 25-3660		1 502,06	1 502,06
024218 AC4	31/03/2025	FA 25-3823		990,82	990,82
024768 SOLDE	26/05/2025	FA 25-3997		1 191,43	1 191,43
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-31 Fixation judiciaire Macdonald - THOME HEITZMANN			3 568,99	2 704,44	6 273,43
021708 AC1	31/07/2024	FA 24-3252	1 591,37		1 591,37
022267 AC2	30/09/2024	FA 24-3361	1 189,22		1 189,22
022560 AC3	29/10/2024	FA 24-3422	788,40		788,40
023593 AC4	31/01/2025	FA 25-3676		1 159,49	1 159,49
024221 AC5	31/03/2025	FA 25-3825		670,39	670,39
025640 SOLDE	26/08/2025	FA 25-4262		874,56	874,56
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-32 Fixation judiciaire Carrefour - THOME HEITZMANN			2 780,59	3 921,33	6 701,92
021707 AC1	31/07/2024	FA 24-3251	1 591,37		1 591,37
022270 AC2	30/09/2024	FA 24-3356	1 189,22		1 189,22
024222 AC3	31/03/2025	FA 25-3826		981,24	981,24
024570 AC4	29/04/2025	FA 25-3917		1 511,64	1 511,64
025630 AC5	25/08/2025	FA 25-4255		1 428,45	1 428,45
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-33 Fixation judiciaire Indivision Mérignac Soleil - THOME HEITZMANN			2 780,59	1 691,14	4 471,73
021716 AC1	31/07/2024	FA 24-3250	1 591,37		1 591,37
022271 AC2	30/09/2024	FA 24-3357	1 189,22		1 189,22
025443 AC3	30/07/2025	FA 25-4205		1 691,14	1 691,14
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-34 Eviction GEIQ - THOME HEITZMANN			1 261,44	845,57	2 107,01
022563 AC1	29/10/2024	FA 24-3423	1 261,44		1 261,44
025448 AC2	30/07/2025	FA 25-4209		845,57	845,57
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-35 Eviction ADM RETAIL - THOME HEITZMANN			5 587,42		5 587,42
022268 AC1	30/09/2024	FA 24-3355	5 587,42		5 587,42
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-36 ImmoFi_référé suspension contre arrêté cessib - THOME			4 721,76		4 721,76
022318 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3388	4 721,76		4 721,76
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-37 Recours contentieux contre DUP Noël -2CS - THOME HEITZMANN			1 760,76		1 760,76
022593 AC1	31/10/2024	FA 24-3486	1 760,76		1 760,76
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-38 ImmoFi_recours contentieux contre arrêté cessib - THOME			786,96		786,96
022978 AC1	29/11/2024	FA 24-3535	786,96		786,96
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-39 Note sur csq modif DUP nouvelle acq* - THOME HEITZMANN			2 833,06		2 833,06
022988 SOLDE	29/11/2024	FA 24-3538	2 833,06		2 833,06
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-4 Analyse opportunité envoi courrier à l'exproprié - THOME			2 464,68		2 464,68
019144 SOLDE	30/10/2023	FA 23-2635	2 464,68		2 464,68
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-40 Fixation judiciaire GAN - THOME HEITZMANN				3 309,00	3 309,00
023321 AC1	01/01/2025	FA 24-3587		2 864,52	2 864,52
023916 AC2	28/02/2025	FA 25-3749		444,48	444,48
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-41 Fixation judiciaire MAIF - THOME HEITZMANN				6 646,73	6 646,73
024562 AC1	29/04/2025	FA 25-3915		3 129,36	3 129,36
024766 AC2	26/05/2025	FA 25-4002		1 139,33	1 139,33
025033 AC3	25/06/2025	FA 25-4083		1 185,58	1 185,58
025651 SOLDE	27/08/2025	FA 25-4271		1 192,46	1 192,46
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-42 Fixation judiciaire Vision Display - THOME HEITZMANN				5 297,21	5 297,21

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023323 AC1	01/01/2025	FA 24-3589		2 181,24	2 181,24
024223 AC2	31/03/2025	FA 25-3827		1 129,78	1 129,78
024763 AC3	26/05/2025	FA 25-3996		1 986,19	1 986,19
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-43 Timbres fiscaux appel Navailles et Portets - THOME HEITZMANN			491,85		491,85
023024 AC1	29/11/2024	FA 24-3546	491,85		491,85
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-45 Préparation défense CAA Navaille et Portets - THOME HEITZMANN			2 911,75		2 911,75
022977 AC1	29/11/2024	FA 24-3536	2 911,75		2 911,75
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-47 Accompagnement préemption FLUNCH - THOME HEITZMANN				1 720,68	1 720,68
023933 SOLDE	28/02/2025	FA 25-3773		1 720,68	1 720,68
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-48 Appel SCI LES EYQUEMS - THOME HEITZMANN				2 858,98	2 858,98
024569 AC1	29/04/2025	FA 25-3916		2 068,56	2 068,56
025038 AC2	25/06/2025	FA 25-4082		790,42	790,42
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-49 Appel SCI SMJ - THOME HEITZMANN				4 142,21	4 142,21
024771 AC1	23/05/2025	FA 25-3990		2 315,09	2 315,09
025427 AC2	30/07/2025	FA 25-4229		1 024,25	1 024,25
026791 AC3	26/11/2025	FA 25-4481		802,87	802,87
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-5 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil - THOME			2 495,23		2 495,23
019450 AC 1	30/11/2023	FA 23-2725	2 495,23		2 495,23
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-50 Réunions mensuelles suivi immeubles phases 1 et 2 - THOME				265,20	265,20
024529 AC1	28/04/2025	FA 25-3905		265,20	265,20
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-51 Note juridique Lotissement les Eyquems - THOME HEITZMANN				555,91	555,91
023934 SOLDE	28/02/2025	FA 25-3772		555,91	555,91
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-52 Fixation judiciaire IMMOFI SOLEIL parcelles AY 790-795 - THOME				5 301,00	5 301,00
023869 AC1	27/02/2025	FA 25-3740		1 985,40	1 985,40
024220 AC2	31/03/2025	FA 25-3824		981,24	981,24
024764 SOLDE	26/05/2025	FA 25-3998		2 334,36	2 334,36
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-53 Conseil juridique réparations BENTEJAC - THOME HEITZMANN				530,40	530,40
024204 SOLDE	31/03/2025	FA 25-3843		530,40	530,40
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-54 Assistance éviction MENPHIS - THOME HEITZMANN				2 676,86	2 676,86
024212 SOLDE	31/03/2025	FA 25-3844		1 829,88	1 829,88
025641 SOLDE	26/08/2025	FA 25-4264		846,98	846,98
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-55 Rédaction 2 mémoires complémentaires Dossier IENG/AB Groupe -				1 588,32	1 588,32
025025 SOLDE	23/06/2025	FA 25-4074		1 588,32	1 588,32
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-6 Suivi de négociations confidentielles avec Carrefour - THOME			2 401,44		2 401,44
019143 AC1	30/10/2023	FA 23-2634	466,99		466,99
020518 AC2 SOLDE	27/03/2024	FA 24-2949	1 934,45		1 934,45
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-7 Suivi mensuel Mérignac Soleil - THOME HEITZMANN			3 452,33		3 452,33
019407 AC 1	29/11/2023	FA 23-2689	857,74		857,74
019634 AC2	01/01/2024	FA 23-2752	860,11		860,11
020186 AC3	29/02/2024	FA 24-2881	868,03		868,03
022255 SOLDE	30/09/2024	FA 24-3363	866,45		866,45
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-9 Protocole Bentejac - THOME HEITZMANN			3 423,82		3 423,82
020188 AC1	29/02/2024	FA 24-2893	3 423,82		3 423,82
M2021-001/Lot2/BDC4Ter10 Convention Carrefour Klépierre - THOME HEITZMANN			2 947,94		2 947,94
019957 AC1	31/01/2024	FA 24-2834	2 947,94		2 947,94
M2025-009/Lot2/BDC1.01 Note jurid phasage enq parcel et cessib - THOME HEITZMANN				2 786,78	2 786,78
025626 AC1	25/08/2025	FA 25-4259		2 786,78	2 786,78
M2025-009/Lot2/BDC1.02 Appel époux IENG - THOME HEITZMANN				2 825,64	2 825,64
025961 AC1	29/09/2025	FA 25-4321		1 325,28	1 325,28
026789 AC2	24/11/2025	FA 25-4470		1 500,36	1 500,36
M2025-009/Lot2/BDC1.03 Appel Ab Groupe - THOME HEITZMANN				521,98	521,98
025947 AC1	29/09/2025	FA 25-4324		746,98	746,98
026905 REMB TIMBRE	09/10/2025	ARRET		-225,00	-225,00
M2025-009/Lot2/BDC1.04 Fixation judiciaire Oasis Urbaine - THOME HEITZMANN				4 084,27	4 084,27
025963 AC1	29/09/2025	FA 25-4325		2 156,59	2 156,59
026133 AC2	13/10/2025	FA 25-4381		1 927,68	1 927,68
M2025-009/Lot2/BDC1.05 Thibaudeau défense TA - THOME HEITZMANN				4 337,28	4 337,28
025892 AC1	26/09/2025	FA 25-4305		4 337,28	4 337,28
M2025-009/Lot2/BDC1.06 Préemption Thibaudeau fixation judiciaire - THOME HEITZMANN				1 698,77	1 698,77
025889 AC1	26/09/2025	FA 25-4306		1 698,77	1 698,77
M2025-009/Lot2/BDC1.07 Référé préventif démol Madalozzo - THOME HEITZMANN				1 566,24	1 566,24
026129 AC1	14/10/2025	FA 25-4390		1 566,24	1 566,24
M2025-009/Lot2/BDC1.08 Appel ImmoFi Soleil - THOME HEITZMANN				1 643,83	1 643,83
026361 AC1	31/10/2025	FA 25-4424		1 643,83	1 643,83
M2025-009/Lot2/BDC1.09 Appel Carrefour Mirepin - THOME HEITZMANN				1 643,83	1 643,83
026357 AC1	31/10/2025	FA 25-4426		1 643,83	1 643,83
M2025-009/Lot2/BDC1.10 Appel Carrefour Somme - THOME HEITZMANN				1 643,83	1 643,83
026363 AC1	31/10/2025	FA 25-4425		1 643,83	1 643,83
B602 DUP, expro			48 762,94	2 010,00	50 772,94
19-02658 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			797,00		797,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
007787 RSU	01/04/2019	FA 01/04/19	440,00		440,00
007788 COPIE ACTES	01/04/2019	FA 01/04/19	75,00		75,00
008163 COPIES ACTES	06/06/2019	FA 06/06/19	255,00		255,00
008225 COPIE ACTE	18/06/2019	20/06/19	15,00		15,00
012585 DMD DE RSU	28/05/2021	FA 28/05/21	12,00		12,00
21-04178 Concertation avis d'ouverture et clôture - SUD OUEST PUBLICITE			1 240,18		1 240,18
012053 PUB PRESSE CONCERT AVIS D'OUVERTURE	21/02/2021	FA	661,49		661,49
012209 CONCERT AVIS OUVERTURE	21/03/2021	FA	578,69		578,69
21-04842 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - BUREAU HYPOTHEQUES			870,00		870,00
013735 DMD RSU CARREFOUR	22/11/2021	FA 22/11/21	12,00		12,00
013786 DMD RSU ETAT PARCEL	24/11/2021	FA 24/11/21	816,00		816,00
013852 DMD RSU CARREFOUR	03/12/2021	FA 03/12/21	12,00		12,00
013981 DMD COPIE ACTE	13/12/2021	3304P02-2018P	30,00		30,00
22-05113 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2022 - BUREAU HYPOTHEQUES			2 028,00		2 028,00
014490 DMD COPIES ACTES	16/02/2022	FA 16/02/22-	831,00		831,00
014910 DDE RSU PREEMPT PORTETS NAVAILLE	08/04/2022	FA 08/04/22-	60,00		60,00
015151 DMD RSU COPIES ACTES	18/05/2022	FA 18/05/22-	138,00		138,00
015285 DMD RSU COPIES ACTES	09/06/2022	FA 09/06/2022-	237,00		237,00
015559 DDE RSU COPIES ACTES PORTETS NAVAILLE	24/06/2022	FA 24/06/2022-	117,00		117,00
016045 DMD RSU-COPIES ACTES	16/09/2022	FA 16/09/22 -	645,00		645,00
23-05909 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2023 - BUREAU HYPOTHEQUES			1 323,00		1 323,00
016986 DMD RSU + ACTES	03/01/2023	FA 03/01/23-	603,00		603,00
018117 06/2023	01/06/2023	FA SPF BX1 T	180,00		180,00
018825 DMD RSU	29/09/2023	FA 29/09/2023	96,00		96,00
018842 DMD RSU AQPRIM	03/10/2023	FA 03/10/2023	48,00		48,00
019609 DEMANDE RSU CESSIB	20/12/2023	FA 20/12/2023	396,00		396,00
23-06010 Copies d'actes et RSU_ préemption Navailles et Portets - BUREAU HYPOTHEQUES			414,00		414,00
017223 DDE RSU COPIES ACTES NAVAILLE ET PORTETS	02/02/2023	FA 3236-SD	120,00		120,00
017739 DMD RSU ET ACTES	06/04/2023	FA 06/04/2023	294,00		294,00
23-06125 Mise en place registre numérique pour EP - PUBLILEGAL			700,80		700,80
020290 SOLDE	01/01/2024	FA FPU-23-	700,80		700,80
23-06211 2 insertions Sud Ouest Avis EP - SUD OUEST PUBLICITE			2 180,12		2 180,12
017893 AC1	30/04/2023	FA 230402432	1 100,60		1 100,60
018056 AC2	30/05/2023	FA 230502441	1 079,52		1 079,52
23-06218 Constat affichage 17 panneaux avis EP 4 passages - CASIMIRO (HUISSIER)			4 080,00		4 080,00
018103 AC1	05/06/2023	FA 82538	4 080,00		4 080,00
23-06266 2 insertions Les Echos judiciaires Avis EP - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			2 062,47		2 062,47
017869 AC1	13/04/2023	F2023EJ17952	1 039,58		1 039,58
018128 SOLDE	04/05/2023	FA	1 022,89		1 022,89
23-06312 Signif huissier notif EP - CASIMIRO (HUISSIER)			651,35		651,35
017990 AC1	15/05/2023	FA 82 144	651,35		651,35
23-06445 Commissaire Enquêteur EP - JAKUBOWSKI MARC			7 382,12		7 382,12
018337 AC1 SOLDE	24/07/2023	TA	7 382,12		7 382,12
23-06696 Copies termes de référence - BUREAU HYPOTHEQUES			60,00		60,00
019289 COPIES	27/11/2023	FA SPF BX1	60,00		60,00
23-06750 2 insertions Les Echos judiciaires Arrêté DUP - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			191,02		191,02
019578 SOLDE	01/01/2024	FA	191,02		191,02
24-06866 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2024-2025 - BUREAU			1 632,00	2 010,00	3 642,00
019828 DMD RSU CESSIB	17/01/2024	FA 17/01/2024-	144,00		144,00
019855 DMD RSU CESSIB	23/01/2024	FA 23/01/2024-	24,00		24,00
020430 DEMANDE RSU ET COPIES ACTES CESSIB	22/03/2024	FA 22/03/2024-	198,00		198,00
021125 DMD STATUTS AFUL	05/06/2024	FA 05/06/24-T	30,00		30,00
021570 DMD RSU POUR CDC	17/07/2024	FA 17/07/2024-	216,00		216,00
022215 DMD RSU AVANT PAIEMENT	27/09/2024	FA 27/09/2024-	1 056,00		1 056,00
022307 DMD RSU REMB TROP PERCU	03/10/2024	FA 03/10/2024	-36,00		-36,00
024007 DMD RSU DECONSIGN IMMOFI	11/03/2025	FA 11/03/2025		24,00	24,00
025052 DMD RSU DOSS PARCELLAIRE P2	27/06/2025	FA 27/06/2025		612,00	612,00
025253 DMD RSU EP PHASE 2	16/07/2025	FA16/07/2025		132,00	132,00
025524 DMD RSU PHASE 2	08/08/2025	FA 08/08/25		843,00	843,00
025796 DMD RSU COPIES ACTES DOSSIER PARCELLAIRE PHASE 2	12/09/2025	FA 12/08/2025		189,00	189,00
025818 REMB SPF DMD RSU 08/08/28	10/09/2025	FA 10/09/2025		-30,00	-30,00
026124 DMD RSU OASIS URBAINE ET FONCIER COMPENSATION	15/10/2025	FA 15/10/2025		240,00	240,00
24-06884 Insertion presse Sud Ouest Arrêté DUP - SUD OUEST PUBLICITE			262,18		262,18
019862 SOLDE	01/01/2024	FA 231202745	262,18		262,18
24-07289 Signif arrêté cessibilité Bentejac et Coustaut - CASIMIRO (HUISSIER)			85,30		85,30
021333 AC1	25/06/2024	FA 90674	85,30		85,30
M2018-042 Dossier DUP mise en compatibilité - CITADIA CONSEIL			11 880,00		11 880,00
007480 REDACTION DOSSIER MECDU	29/01/2019	FA 19/5891	10 620,00		10 620,00
007642 REDACTION DOSSIER MECDU	25/02/2019	FA 19/6021	1 260,00		1 260,00
M2019-030 Lot 4/BDC6 50 Panneaux Avis EP - GRAPHI 33			1 439,76		1 439,76

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
021794 AC1 SOLDE 50 AVIS EP	02/08/2024	DGD BDC6	1 439,76		1 439,76
M2021-001/Lot2/BDC4ter-11 Préparation réponses à un recours gracieux NOËL 2CS - THOME			3 165,36		3 165,36
021152 AC1	31/05/2024	FA 24-3104	3 165,36		3 165,36
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-2 Prépa PV réponse à CE DUP-MECDU -parcel - THOME HEITZMANN			5 510,30		5 510,30
019452 AC 1	30/11/2023	FA 23-2723	5 510,30		5 510,30
M2021-001/Lot2/BDC4Ter-8 Courrier réponse ASL Mirepin sur manquement EP - THOME			807,98		807,98
019695 SOLDE	01/01/2024	FA 23-2804	807,98		807,98
B603 Petits travaux - frais libération site			1 627,20	9 109,38	10 736,58
M2022-066 Défrichement parcelle et évacuation avant bornage - parcelle AW279 - EIFFAGE			1 627,20		1 627,20
016723 SOLDE	10/11/2022	FA	1 627,20		1 627,20
M2024-013/Lot1/BDC17 Mission 3.3.1.1 Contribution rédaction CCTP et annexes - CANCAN				2 118,90	2 118,90
025822 AC1	16/09/2025	FA 25-225-095		2 118,90	2 118,90
M2024-013/Lot1/BDC25 Inventaire ressources Memphis - CANCAN				1 275,12	1 275,12
026286 AC1	27/10/2025	FA 25-225-110		1 275,12	1 275,12
M2024-013/Lot1/BDC6 Inventaire ressources 34, 38, 48 Av Somme, 112 Av Vigneau + St Maclou -				5 715,36	5 715,36
023791 AC1	23/01/2025	FA 25-225-006		4 001,97	4 001,97
024861 AC2	03/06/2025	FA 25-225-057		1 713,39	1 713,39
B702 Démolition - Désamiantage			58 237,59	114 880,42	173 118,01
25-08009 Etude déracordement 7, rue de Peyandreau - ORANGE TRAVAUX				594,00	594,00
024574 AC1	18/04/2025	FA		594,00	594,00
25-08010 Etude déracordement 110, Rue Henri Vigneau - ORANGE TRAVAUX				594,00	594,00
024573 AC1	18/04/2025	FA		594,00	594,00
25-08011 Etude déracordement 51, Rue de Mirepin - ORANGE TRAVAUX				594,00	594,00
024737 AC1	16/05/2025	FA		594,00	594,00
25-08012 Eude déracordement 34, Avenue de la Somme - ORANGE TRAVAUX				594,00	594,00
024575 AC1	18/04/2025	FA		594,00	594,00
25-08013 Etude déracordement 48, Avenue de la Somme - ORANGE TRAVAUX				594,00	594,00
024576 AC1	18/04/2025	FA		594,00	594,00
25-08019 Suppression ouvrage gaz 110 av Henri Vigneau - REGAZ				1 656,00	1 656,00
25-08019 Avance	18/03/2025			1 656,00	1 656,00
024823 AC1	22/05/2025	FA FCO-			
25-08034 Dépose câbles cuivre 7, rue de Peyandreau - ORANGE TRAVAUX				239,92	239,92
024821 AC1	23/05/2025	FA		239,92	239,92
25-08035 Dépose câbles cuivre 110, Rue Henri Vigneau - ORANGE TRAVAUX				474,53	474,53
024873 AC1	26/05/2025	FA		474,53	474,53
25-08036 Dépose câbles cuivre 48, Avenue de la Somme - ORANGE TRAVAUX				239,92	239,92
024874 AC1	26/05/2025	FA		239,92	239,92
25-08037 Dépose câbles cuivre 34, Avenue de la Somme - ORANGE TRAVAUX				709,14	709,14
024822 AC1	23/05/2025	FA		709,14	709,14
25-08184 Suppression ouvrage gaz 34 Av de la Somme - REGAZ				1 656,00	1 656,00
25-08184 Avance	13/05/2025			1 656,00	1 656,00
025193 AC1	08/07/2025	FA FCO-			
M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS			56 636,31		56 636,31
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		41 394,94		41 394,94
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 609,12		2 609,12
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		10 677,52		10 677,52
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		1 954,73		1 954,73
011706 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/20	0,01		0,01
M2019-066/BDC35 Réalisation diags ressources Keria - Memphis - Orchestra - St Maclou -			1 601,28	3 417,12	5 018,40
021219 AC1	29/05/2024	FA 24-019-046	1 601,28		1 601,28
024856 [BDR] PERMIS MODIFICATIF	03/06/2025	FA 25-019-056		1 797,12	1 797,12
025212 AC3	09/07/2025	FA 25-019-079		1 620,00	1 620,00
M2021-077/BDC43 Diag amiante plomb parasite 5 Chemin de Peyandreau - AED EXPERTISES				2 958,72	2 958,72
024035 AC1	13/03/2025	FA FA01139269		2 913,70	2 913,70
024498 AC2	24/04/2025	FA FA01143544		45,02	45,02
M2021-077/BDC57 Diag amiante plomb parasites 34 av de la Somme - AED EXPERTISES				3 499,01	3 499,01
024039 AC1	14/03/2025	FA FA01139362		3 093,79	3 093,79
024499 AC2	24/04/2025	FA FA01143545		405,22	405,22
M2021-077/BDC57-1 Diag hydrocarbure 34 av. de la Somme AY796 et 797 - AED EXPERTISES				43,74	43,74
024150 SOLDE	26/03/2025	FA FA01140586		43,74	43,74
M2021-077/BDC58 Diag amiante plomb parasite 112 av Vigneau - AED EXPERTISES				2 630,69	2 630,69
024040 SOLDE	14/03/2025	FA FA01139368		2 630,69	2 630,69
M2021-077/BDC58-1 Diag hydrocarbures 112 av. Vigneau AW n°374 et 376 - AED EXPERTISES				131,21	131,21
024279 SOLDE	04/04/2025	FA FA01141974		131,21	131,21
M2021-077/BDC60 Diags plomb amiante termites 48 avenue de la Somme - AED EXPERTISES				3 994,27	3 994,27
024036 AC1	13/03/2025	FA FA01139276		3 994,27	3 994,27
M2021-077/BDC75 Diag canalisations amiantées 34 et 48 Av. de la Somme - AED EXPERTISES				347,66	347,66
026796 AC1	25/11/2025	FA FA01162587		173,83	173,83
026799 AC2	26/11/2025	FA FA01162746		173,83	173,83
M2023-022/BDC13 MOE démolition : 4 Maisons - GINGER DELEO				26 468,49	26 468,49

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024128 AC1	24/03/2025	FA DESOP0043		6 947,64	6 947,64
024130 AC2	24/03/2025	FA DESOP0044		789,50	789,50
024501 AC3	23/04/2025	FA		8 730,04	8 730,04
024439 AC4	16/04/2025	FA		755,70	755,70
025013 AC5	20/06/2025	FA		3 244,72	3 244,72
025014 AC6	20/06/2025	FA		753,49	753,49
025380 AC7	29/07/2025	FA DESOP0205		1 771,20	1 771,20
026168 AC8	17/10/2025	FA		1 647,64	1 647,64
026180 AC9	20/10/2025	FA		535,19	535,19
026672 AC10	17/11/2025	FA		209,22	209,22
026675 AC11	17/11/2025	FA		1 084,15	1 084,15
M2025-035-2 Travaux démolition 4 maisons individuelles+Memphis - AQUILOE				18 000,00	18 000,00
026750 AC1 - 10/2025	29/10/2025	FA 2510-0004		18 000,00	18 000,00
M2025-035-2 Travaux démolition 4 maisons individuelles+Memphis - BDS				45 444,00	45 444,00
026750 AC1 - 10/2025	29/10/2025	FA 2510-0064		45 444,00	45 444,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			9 239 505,37	8 720 363,54	17 959 868,91
D103 VRD			6 192 704,54	6 687 842,60	12 880 547,14
22-05112 Extension de réseaux 44-46 avenue de la Somme - Mérignac - ENEDIS (EX : ERDF)			14 136,38		14 136,38
22-05112 Avance	16/02/2022	DC26/052092	5 414,23		5 414,23
017502 AC1	01/03/2023	FA 0326 -	8 722,15		8 722,15
018565 AC1BIS	01/03/2023	DC26/052092			
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - 2MTP			2 462,50		2 462,50
015805 07/22	26/07/2022	AC6	2 462,50		2 462,50
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - DUBREUILH			1 267 948,96	1 407 832,96	2 675 781,92
M2020-037-2/Lot 1 Avance	12/11/2020		23 445,04		23 445,04
013260 07/21	16/09/2021	AC1	94 154,09		94 154,09
014191 12/21	01/01/2022	AC2	46 003,56		46 003,56
015577 04/22	30/06/2022	AC3	261 842,99		261 842,99
015581 05/22	30/06/2022	AC4	76 854,45		76 854,45
015630 06/22	30/06/2022	AC5	139 370,56		139 370,56
015805 07/22	26/07/2022	AC6 07	13 300,81		13 300,81
016244 AC7-09/22	06/10/2022	FA 2209322	7 746,29		7 746,29
017671 AC8-03/23	29/03/2023	AC 8	8 983,55		8 983,55
018167 AC9-05/23	30/05/2023	FA328609591	24 088,67		24 088,67
020596 AC10-03/24	29/03/2024	FA2403337	220 329,00		220 329,00
020955 AC11-04/24	30/04/2024	FA2405305	196 039,34		196 039,34
021371 AC12-05/24	28/06/2024	FA2406323	148 400,07		148 400,07
022243 AC13-07/24	10/09/2024	FA2408318	7 390,54		7 390,54
023260 AC14-11/24	01/01/2025	FA2411343		206 373,91	206 373,91
023560 AC15-12/24	24/01/2025	FA		164 124,16	164 124,16
023833 AC16-01/25	13/02/2025	FA		209 749,77	209 749,77
024098 AC17-02/25	14/03/2025	FA 2503305		132 326,15	132 326,15
024492 AC18-03/25	15/04/2025	FA 2504305		80 585,40	80 585,40
024905 AC19-04/25	30/05/2025	FA 2505315		160 006,71	160 006,71
025436 AC20-05/25	23/06/2025	FA 2506007		102 905,45	102 905,45
025430 AC21-06/25	24/07/2025	FA		266 022,79	266 022,79
026434 AC22-10/25	20/10/2025	FA 0102510345-		85 738,62	85 738,62
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - SEIHE			79 138,38		79 138,38
020596 AC10-03/24	29/03/2024	FA2403337	68 375,90		68 375,90
021371 AC12-05/24	28/06/2024	FA2406323	10 762,48		10 762,48
M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - SOPEGA TP				36 490,93	36 490,93
026434 AC22-10/25	20/10/2025	FA 0102510345-		36 490,93	36 490,93
M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - EIFFAGE ROUTE SO			593 281,71	31 665,66	624 947,37
012172 AC1-12/20	10/03/2021	FA	14 594,58		14 594,58
012173 AC2-01/21	10/03/2021	FA	64 657,97		64 657,97
013259 AC3-07/21	16/09/2021	FA	4 643,40		4 643,40
013450 AC4-09/21	30/09/2021	AC4	3 207,67		3 207,67
017311 AC5-01/23	10/02/2023	FA	20 091,61		20 091,61
017539 AC6-02/23	10/03/2023	FA	41 676,42		41 676,42
018166 AC7-03/23	06/06/2023	FA	94 955,51		94 955,51
018939 AC8-07/23	09/10/2023	FA	79 900,37		79 900,37
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA	52 239,28		52 239,28
019577 AC10-11/23	01/01/2024	FA	3 431,38		3 431,38
020559 AC11 - 03/24	29/03/2024	FA	9 292,96		9 292,96
021864 AC12 - 06/24	27/06/2024	FA	6 885,78		6 885,78
022244 AC13 - 07/24	09/08/2024	FA	14 801,71		14 801,71
022245 AC14 - 08/24	30/09/2024	FA	130 276,28		130 276,28
022697 AC15 - 09/24	26/09/2024	FA	52 626,79		52 626,79
023146 AC15 - 09/24 ANNULATION	26/09/2024	FA	-52 626,79		-52 626,79
023147 AC15 - 09/24 REGULARISATION	26/09/2024	FA	52 626,79		52 626,79

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023250 AC16 - 10/24	01/01/2025	FA		25 917,78	25 917,78
024032 AC17 - 12/24	24/02/2025	FA		5 747,88	5 747,88
M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - SIGNATURE/SECTRA				11 581,50	11 581,50
023250 AC16 - 10/24	01/01/2025	FA		11 581,50	11 581,50
M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - SOP			26 778,20	2 172,50	28 950,70
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA 100000	9 902,00		9 902,00
022245 AC14 - 08/24	30/09/2024	FA	16 876,20		16 876,20
023250 AC16 - 10/24	01/01/2025	FA		2 172,50	2 172,50
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - DECOUPE BETON			5 410,00		5 410,00
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA	5 410,00		5 410,00
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - EUROVIA-MOTER (GRPT)			3 621 458,11	4 564 546,27	8 186 004,38
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		44 906,43		44 906,43
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		21 401,39		21 401,39
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA	75 421,26		75 421,26
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	315 966,19		315 966,19
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	324 211,88		324 211,88
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA	241 386,31		241 386,31
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	472 839,09		472 839,09
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA	174 697,32		174 697,32
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA	71 719,11		71 719,11
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA	390 797,54		390 797,54
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA	320 413,22		320 413,22
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA	210 896,46		210 896,46
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA	251 651,35		251 651,35
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA	311 078,18		311 078,18
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA	222 512,91		222 512,91
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA	70 477,21		70 477,21
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA	85 766,13		85 766,13
022996 AC16 - 10/2024	25/11/2024	FA	15 316,14		15 316,14
023645 AC17 - 01/2025	30/01/2025	FA		201 240,97	201 240,97
024015 AC18 - 02/2025	28/02/2025	FA		321 888,34	321 888,34
024478 VENTIL TF->TO3 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		-17 715,55	-17 715,55
024479 VENTIL TF->TO3 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		17 715,55	17 715,55
024339 AC19 - 03/2025	28/03/2025	FA		366 948,88	366 948,88
024680 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		-6 024,94	-6 024,94
024681 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		6 024,94	6 024,94
024684 AC20 - 04/2025	07/05/2025	FA		261 680,26	261 680,26
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		403 069,07	403 069,07
025197 AC22 - 06/2025	30/06/2025	FA		434 708,75	434 708,75
025404 REGUL REPART* TF-T01-T02-T03	30/06/2025	R30/06/25		-14 728,32	-14 728,32
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		456 984,04	456 984,04
025657 AC23 - 07/2025 REGUL	29/08/2025	FA		907,22	907,22
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		452 712,64	452 712,64
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		480 624,58	480 624,58
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		532 432,94	532 432,94
026974 AC27 - 11/2025	26/11/2025	FA		666 076,90	666 076,90
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - FC BTP			40 614,30	16 187,40	56 801,70
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	3 807,00		3 807,00
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	12 235,60		12 235,60
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	3 325,00		3 325,00
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA	540,00		540,00
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA	3 520,00		3 520,00
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA	3 646,70		3 646,70
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA	8 875,00		8 875,00
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA	3 715,00		3 715,00
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA	950,00		950,00
024015 AC18 - 02/2025	28/02/2025	FA		4 092,50	4 092,50
024339 AC19 - 03/2025	28/03/2025	FA		4 411,60	4 411,60
024680 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		-20 124,70	-20 124,70
024681 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		20 124,70	20 124,70
024684 AC20 - 04/2025	07/05/2025	FA		3 101,50	3 101,50
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		2 096,20	2 096,20
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		2 485,60	2 485,60
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - MARTINS PAVAGE				4 855,50	4 855,50
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		4 855,50	4 855,50
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - PROCESS GRENAILLAGE				24 270,00	24 270,00
025197 AC22 - 06/2025	30/06/2025	FA		3 000,00	3 000,00
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		7 710,00	7 710,00
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		13 560,00	13 560,00
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - SIGNATURE/SECTRA			76 099,88	37 639,97	113 739,85

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	38 659,63		38 659,63
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	2 349,92		2 349,92
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA	7 583,25		7 583,25
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA	11 407,20		11 407,20
022996 AC16 - 10/2024	25/11/2024	FA	16 099,88		16 099,88
024015 AC18 - 02/2025	28/02/2025	FA		8 426,30	8 426,30
024339 AC19 - 03/2025	28/03/2025	FA		2 316,48	2 316,48
024684 AC20 - 04/2025	07/05/2025	FA		2 505,40	2 505,40
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		374,48	374,48
025197 AC22 - 06/2025	30/06/2025	FA		2 347,40	2 347,40
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		5 600,00	5 600,00
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		13 524,70	13 524,70
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		2 545,21	2 545,21
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - SOLS AQUITAINE			453 376,12	499 631,82	953 007,94
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA	2 777,50		2 777,50
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA	75 165,35		75 165,35
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA	62 872,86		62 872,86
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA	88 699,27		88 699,27
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA	34 189,11		34 189,11
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA	62 634,30		62 634,30
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA	100,95		100,95
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA	57 210,09		57 210,09
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA	47 379,81		47 379,81
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA	17 207,22		17 207,22
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA	5 139,66		5 139,66
024478 VENTIL TF->TO3 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		-88 577,75	-88 577,75
024479 VENTIL TF->TO3 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		88 577,75	88 577,75
024339 AC19 - 03/2025	28/03/2025	FA		87 603,07	87 603,07
024684 AC20 - 04/2025	07/05/2025	FA		63 387,30	63 387,30
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		29 428,86	29 428,86
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		48 666,25	48 666,25
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		18 676,59	18 676,59
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		73 477,99	73 477,99
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		110,19	110,19
026974 AC27 - 11/2025	26/11/2025	FA		178 281,57	178 281,57
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - TECHNIVERT			12 000,00	8 400,00	20 400,00
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA	12 000,00		12 000,00
024680 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		-10 000,00	-10 000,00
024681 VENTIL TF->TO1/TO2 (AVT3 -V)	31/03/2025	REGUL		10 000,00	10 000,00
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		8 400,00	8 400,00
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - TS PAVAGE				17 265,00	17 265,00
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		2 150,00	2 150,00
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		5 940,00	5 940,00
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		3 875,00	3 875,00
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		5 300,00	5 300,00
M2025-065 Travaux signalisation tricolore Somme/Mirepin/Pouchon - AXIMUM MOBILITE				25 303,09	25 303,09
026354 AC1	31/10/2025	FA		25 303,09	25 303,09
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			577 906,03	306 998,98	884 905,01
M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - DUBREUILH			28 815,00		28 815,00
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA 2022101862	22 073,00		22 073,00
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA 2022102170	4 764,00		4 764,00
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA 2023101552	1 978,00		1 978,00
M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - LACIS-EHTP (GRPT)			253 833,13	43 177,03	297 010,16
015579 05/22-AC1	30/06/2022	FA 2022101214	34 673,46		34 673,46
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA 2022101862	54 704,74		54 704,74
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA 2022102170	19 216,93		19 216,93
016239 09/22-AC4	06/10/2022	FA 2022102172	18 182,96		18 182,96
017543 02/23-AC5	10/03/2023	FA 2023100553	13 315,66		13 315,66
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA 2023101552	6 052,93		6 052,93
018680 07/23-AC7	31/07/2023	FA 2023102978	18 178,36		18 178,36
021175 05/24-AC8	31/05/2024	FA 2044102344	44 050,48		44 050,48
022083 06/24-AC9	30/06/2024	FA 2024103179	38 952,48		38 952,48
022984 07/24-AC10	29/08/2024	FA 2024104370	6 505,13		6 505,13
023789 07/24-AC11 / DGD	12/02/2025	FA 2024106138		43 177,03	43 177,03
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - CEPECA-CITEOS			179 119,03	66 735,43	245 854,46
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	7 278,41		7 278,41
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	50,65		50,65
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA	33 982,76		33 982,76
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA	3 611,03		3 611,03
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA	66,96		66,96

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA	74 729,19		74 729,19
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA	32 557,25		32 557,25
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA	26 842,78		26 842,78
024015 AC18 - 02/2025	28/02/2025	FA		5 272,95	5 272,95
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		109 809,23	109 809,23
025404 REGUL REPART* TF-T01-T02-T03	30/06/2025	R30/06/25		-77 653,10	-77 653,10
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		13 752,48	13 752,48
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		44,25	44,25
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		15 509,62	15 509,62
M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - EUROVIA-MOTER (GRPT)			116 138,87	197 086,52	313 225,39
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		2 330,07		2 330,07
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		1 110,46		1 110,46
018656 AC2 - 08/2033	31/08/2023	FA	1 455,68		1 455,68
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA	456,80		456,80
019829 AC6 - 12/2023	15/01/2024	FA	6 559,73		6 559,73
020039 AC7 - 01/2024	09/02/2024	FA	13 496,86		13 496,86
020223 AC8 - 02/2024	29/02/2024	FA	45 165,22		45 165,22
020539 AC9 - 03/2024	29/03/2024	FA	-9 603,71		-9 603,71
020942 AC10 - 04/2024	30/04/2024	FA	20,88		20,88
021137 AC11 - 05/2024	31/05/2024	FA	23 655,76		23 655,76
021421 AC12 - 06/2024	28/06/2024	FA	8 174,10		8 174,10
021699 AC13 - 07/2024	26/07/2024	FA	8 265,34		8 265,34
021995 AC14 - 08/2024	30/08/2024	FA	-16,15		-16,15
022269 AC15 - 09/2024	30/09/2024	FA	15 302,26		15 302,26
022996 AC16 - 10/2024	25/11/2024	FA	-234,44		-234,44
023645 AC17 - 01/2025	30/01/2025	FA		-0,35	-0,35
024015 AC18 - 02/2025	28/02/2025	FA		19 753,40	19 753,40
024339 AC19 - 03/2025	28/03/2025	FA		3 919,04	3 919,04
024684 AC20 - 04/2025	07/05/2025	FA		4 459,08	4 459,08
024944 AC21 - 05/2025	28/05/2025	FA		50 249,66	50 249,66
025404 REGUL REPART* TF-T01-T02-T03	30/06/2025	R30/06/25		92 381,42	92 381,42
025438 AC23 - 07/2025	28/07/2025	FA		14 079,10	14 079,10
026005 AC24 - 08/2025	29/08/2025	FA		2 098,08	2 098,08
026258 AC25 - 09/2025	26/09/2025	FA		8,85	8,85
026427 AC26 - 10/2025	30/10/2025	FA		-4 686,07	-4 686,07
026974 AC27 - 11/2025	26/11/2025	FA		14 824,31	14 824,31
D105 Mobilier urbain			32 611,49	14 596,52	47 208,01
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE			782,31	-768,11	14,21
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		9,40		9,40
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		6,25		6,25
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA 2902022024	766,66		766,66
026891 RESORPTION AVANCE TF	04/12/2025	RESORPTION		-768,11	-768,11
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE-BRETTES-			31 829,18	15 364,62	47 193,80
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022			135,22	135,22
020893 AC7b - 04/2024	06/05/2024	FA 2905004424	7 911,38		7 911,38
021083 AC8b - 05/2024	28/05/2024	FA 2905014224	12 990,88		12 990,88
021086 AC8a - 05/2024	28/05/2024	FA 2905014324	2 949,73		2 949,73
021650 AC10b - 07/2024	22/07/2024	FA 2907011824	4 853,65		4 853,65
021651 AC10c - 07/2024	22/07/2024	FA 2907012324	248,59		248,59
022390 AC11b - 09/2024	01/10/2024	FA 2910002224	1 201,57		1 201,57
022391 AC11c - 09/2024	01/10/2024	FA 2910002424	1 673,38		1 673,38
023239 AC12b - 12/2024	01/01/2025	FA EA		4 384,56	4 384,56
024393 AC14a - 03/2025	27/03/2025	FA		23,38	23,38
024375 AC14d - 03/2025	01/04/2025	FA		510,11	510,11
025130 AC15d - 06/2025	01/07/2025	FA EA		6 023,52	6 023,52
025993 AC17a - 09/2025	29/09/2025	FA		558,36	558,36
025987 AC17b - 09/2025	29/09/2025	FA		582,90	582,90
025981 AC17d - 09/2025	29/09/2025	FA		2 058,34	2 058,34
026295 AC18b - 10/2025	28/10/2025	FA		93,86	93,86
026812 AC19c - 11/2025	27/11/2025	FA		994,37	994,37
D106 Arrosage - Espaces verts			876 076,19	1 024 971,84	1 901 048,02
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - BRETTES PAYSAGE			288 470,02		288 470,02
018856 AC2 - 09/2023	27/09/2023	FA 2909022123	10 354,48		10 354,48
019484 AC3a - 11/2023	07/12/2023	FA 29	1 843,02		1 843,02
019546 AC3b - 11/2023	08/12/2023	FA 2912012123	88 660,72		88 660,72
019993 AC4a - 01/2024	01/02/2024	FA 2901010524	9 656,47		9 656,47
019994 AC4b - 01/2024	01/02/2024	FA 2901010424	2 550,26		2 550,26
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA 2902022024	6 421,06		6 421,06
020220 AC5b - 02/2024	28/02/2024	FA 2902022224	43 295,10		43 295,10
020736 AC6a - 03/2024	22/04/2024	FA 2904011524	5 977,27		5 977,27

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
020737 AC6b - 03/2024	22/04/2024	FA 2904011424	119 711,64		119 711,64
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE			379 520,53	-2 304,32	377 216,21
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		4 614,31		4 614,31
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		3 066,17		3 066,17
018596 AC1 - 08/2023	01/09/2023	FA 2908010223	144 432,35		144 432,35
018856 AC2 - 09/2023	27/09/2023	FA 2909022123	41 135,56		41 135,56
019484 AC3a - 11/2023	07/12/2023	FA 29	75 492,73		75 492,73
020219 AC5a - 02/2024	28/02/2024	FA 2902022024	110 779,41		110 779,41
026891 RESORPTION AVANCE TF	04/12/2025	RESORPTION		-2 304,32	-2 304,32
M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE-BRETTES-			208 085,64	1 027 276,15	1 235 361,79
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022			2 937,20	2 937,20
020843 AC7a - 04/2024	30/04/2024	FA 2904019924	71 339,17		71 339,17
020893 AC7b - 04/2024	06/05/2024	FA 2905004424	42 384,52		42 384,52
021083 AC8b - 05/2024	28/05/2024	FA 2905014224	10 560,42		10 560,42
021086 AC8a - 05/2024	28/05/2024	FA 2905014324	654,00		654,00
021195 AC8c - 05/2024	28/05/2024	FA 2905014424	11 349,35		11 349,35
021413 AC9a - 06/2024	28/06/2024	FA 2907000524	1 870,00		1 870,00
021422 AC9b - 06/2024	27/06/2024	FA 2906025724	25 765,01		25 765,01
021412 AC9c - 06/2024	27/06/2024	FA 2906025824	31 691,83		31 691,83
021651 AC10c - 07/2024	22/07/2024	FA 2907012324	7 579,69		7 579,69
022390 AC11b - 09/2024	01/10/2024	FA 2910002224	1 912,68		1 912,68
022391 AC11c - 09/2024	01/10/2024	FA 2910002424	2 978,97		2 978,97
023239 AC12b - 12/2024	01/01/2025	FA EA		100 998,43	100 998,43
023238 AC12c - 12/2024	01/01/2025	FA 2912025824		37 673,66	37 673,66
023922 AC13b - 02/2025	27/02/2025	FA EA		32 003,96	32 003,96
023925 AC13d - 02/2025	26/02/2025	FA EA		93 528,02	93 528,02
024393 AC14a - 03/2025	27/03/2025	FA		44 905,50	44 905,50
024364 AC14b - 03/2025	01/04/2025	FA EA-		133 535,51	133 535,51
024375 AC14d - 03/2025	01/04/2025	FA		34 986,95	34 986,95
025110 AC15b - 06/2025	30/06/2025	FA EA		11 261,69	11 261,69
025130 AC15d - 06/2025	01/07/2025	FA EA		160 632,71	160 632,71
025116 AC15e - 06/2025	30/06/2025	FA EA		36 066,79	36 066,79
025658 AC16b - 08/2025	29/08/2025	FA		2 101,92	2 101,92
025662 AC16c - 08/2025	29/08/2025	FA		11 115,95	11 115,95
025659 AC16d - 08/2025	27/08/2025	FA		6 122,42	6 122,42
025663 AC16e - 08/2025	29/08/2025	FA EA-		40 494,77	40 494,77
026027 AC17e - 09/2025	01/10/2025	FA		20 394,36	20 394,36
026295 AC18b - 10/2025	28/10/2025	FA		4 902,15	4 902,15
026287 AC18e - 10/2025	28/10/2025	FA		111 360,28	111 360,28
026819 AC19b - 11/2025	27/11/2025	FA		22 276,38	22 276,38
026812 AC19c - 11/2025	27/11/2025	FA		2 438,95	2 438,95
026809 AC19d - 11/2025	27/11/2025	FA		2 608,33	2 608,33
026813 AC19e - 11/2025	27/11/2025	FA		114 930,22	114 930,22
D203 Electricité			113 632,04	214 419,51	328 051,55
23-06409 Raccord. travaux Somme Centre - ENEDIS (EX : ERDF)			3 952,50		3 952,50
23-06409 Avance	03/07/2023		1 976,25		1 976,25
018372 AC1	13/07/2023	FA 3400046112			
019267 AC2	10/11/2023	FA 0326-	1 976,25		1 976,25
23-06783 Raccord. travaux 30, Av. de la Somme - ENEDIS (EX : ERDF)			9 526,86	45 741,76	55 268,62
23-06783 Avance	18/12/2023		9 526,86		9 526,86
026305 AC1	14/10/2025	FA 0326-		45 741,76	45 741,76
24-06857 Raccord. travaux Rue Germaine Tillon - ENEDIS (EX : ERDF)			1 591,20		1 591,20
24-06857 Avance	16/01/2024		1 591,20		1 591,20
021016 AC1	17/05/2024	FA 0326-			
24-07052 Déplacement d'une armoire MANT - ETF			2 130,30		2 130,30
021050 AC1	30/05/2024	FA	2 130,30		2 130,30
24-07116 Raccordement armoire MANT - NGE ENERGIES SOLUTIONS (EX LACIS)			21 365,10		21 365,10
020773 AC1	19/04/2024	FA 2024101727	21 365,10		21 365,10
24-07179 Déplacement armoire MANT - AXIMUM MOBILITE ATLANTIQUE			47 049,12		47 049,12
020981 AC1	21/05/2024	FA	47 049,12		47 049,12
24-07182 Déplacement armoire MANT - INEO			7 305,14		7 305,14
021205 AC1	12/06/2024	FA 8230036476	7 305,14		7 305,14
24-07370 Développement BT et HTA sur Somme et Mirepin - ENEDIS (EX : ERDF)			20 711,82	163 393,26	184 105,08
24-07370 Avance	31/07/2024		20 711,82		20 711,82
026072 AC1	24/07/2025	FA 0326-		163 393,26	163 393,26
25-07842 Raccordement pompe de relevage Rue G-Tillon - EDF				1 606,49	1 606,49
024114 AC1	20/03/2025	FA		198,54	198,54
024663 AC2	10/05/2025	FA		63,32	63,32
024942 AC3	09/06/2025	FA		31,66	31,66
025281 AC4	20/07/2025	FA		199,96	199,96

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
025456 AC5	16/06/2025	FA		386,26	386,26
025774 AC6	09/09/2025	FA		72,02	72,02
025896 AC7	20/09/2025	FA		275,14	275,14
026442 AC8	09/11/2025	FA		72,02	72,02
026978 AC9	05/12/2025	FA		307,57	307,57
25-08303 Suppression branchement 48 Av de la Somme - ENEDIS (EX : ERDF)				666,00	666,00
25-08303 Avance	17/06/2025			666,00	666,00
025217 AC1	10/07/2025	FA 3400041916			
25-08461 Suppression branchement 34 Av de la Somme - ENEDIS (EX : ERDF)				676,80	676,80
25-08461 Avance	09/09/2025			676,80	676,80
026066 AC1	06/10/2025	FA 0326-			
25-08477 Suppression branchement 48 Av de la Somme - 2ème PDL - ENEDIS (EX : ERDF)				666,00	666,00
25-08477 Avance	16/09/2025			666,00	666,00
025997 AC1	22/09/2025	FA 3400059180			
25-08546 Dépose coffret élec pompes Rue de Mirepin - ENEDIS (EX : ERDF)				1 669,20	1 669,20
25-08546 Avance	07/10/2025			1 669,20	1 669,20
D204 Eau potable			220 451,78	122 170,32	342 622,10
22-05535 Raccordement DN 150 - av de la Somme (Castorama) - devis D192201040 - LYONNAISE			11 990,66		11 990,66
22-05535 Avance	29/07/2022		10 650,60		10 650,60
017433 AC1	01/01/2023	FA 192203299	1 340,06		1 340,06
23-06216 [BDR]Eau conso 26 Av Somme Cpteur H22VA264157 - EAU BM (REGIE)			174,45	142,97	317,42
017762 AC1	04/04/2023	FA 380058	31,96		31,96
019209 AC2	03/11/2023	FA 800356	35,18		35,18
020754 AC3	19/04/2024	FA 0001101728	26,46		26,46
021911 AC4	09/08/2024	FA 0001354078	80,85		80,85
024245 AC5	26/03/2025	FA 1666305		66,56	66,56
026082 AC6	06/10/2025	FA 1941798		76,41	76,41
23-06403 Branchement arrosage Av. de la Somme/Ch. Pouchon - EAU BM (REGIE)			24 594,67		24 594,67
23-06403 Avance	28/06/2023		14 495,21		14 495,21
018411 AC1	20/07/2023	FA BM2300869			
018765 AC2	18/09/2023	FA 699386	55,70		55,70
018739 AC3	15/09/2023	FA BM2301150	8 942,70		8 942,70
019208 AC4	03/11/2023	FA 800840	244,66		244,66
020755 AC5	19/04/2024	FA 0001104044	236,10		236,10
021937 AC6	20/08/2024	FA 0001389846	620,30		620,30
23-06790 Déplacement compteur 28 Av. de la Somme (BDR) - EAU BM (REGIE)			2 400,04		2 400,04
23-06790 Avance	20/12/2023		2 400,04		2 400,04
019940 DEPLACEMENT COMPTEUR	17/01/2024	FA BM2400090			
020980 AVOIR DEPLACEMENT COMPTEUR	16/05/2024	AV BM2400752		-0,04	-0,04
025470 SOLDE DIFF REGLMT S/AV BM2400752	31/07/2025	REGUL		0,04	0,04
23-06791 Déplacement compteur 30 Av. de la Somme (Ripiano) - EAU BM (REGIE)			1 732,82		1 732,82
23-06791 Avance	20/12/2023		1 732,82		1 732,82
021912 AC1	07/08/2024	FA BM2401213		-0,02	-0,02
025471 SOLDE DIFF REGLMT S/FA BM24012	31/07/2025	REGUL		0,02	0,02
23-06798 Rue Mirepin : phase 0 = raccordement pour bouclage AEP oasis urbaine - EAU BM			11 787,00		11 787,00
23-06798 Avance	22/12/2023		11 787,00		11 787,00
23-06799 Bayonnette rond-point Mirepin : phase 0 - contrat 293359 - EAU BM (REGIE)			12 773,78		12 773,78
23-06799 Avance	22/12/2023		12 773,78		12 773,78
23-06800 Matosinhos ouest : phase 1 = devoiement réseaux sous trottoir - EAU BM (REGIE)			137 675,01	7 246,05	144 921,06
23-06800 Avance	22/12/2023		73 251,52		73 251,52
021519 AC1	10/07/2024	FA BM2401048	64 423,49	7 246,05	71 669,54
24-06821 Matosinhos ouest : phase 1 = raccordement AEP arrosage/Contrat 281755 - EAU BM			13 854,16	1 184,31	15 038,47
24-06821 Avance	08/01/2024		9 353,40		9 353,40
021008 AC1	15/05/2024	FA BM2400737	4 133,27		4 133,27
021346 AC1 - CONSO	18/06/2024	FA 0001247477	95,71		95,71
021961 AC2 - CONSO	26/08/2024	FA 0001400045	271,78		271,78
024090 AC3 - CONSO	12/03/2025	FA 1645101		521,36	521,36
026125 AC4 - CONSO	08/10/2025	FA 1948348		662,95	662,95
026981 SOLDE AVCE	01/01/2025	FA BM2400737			
24-07238 Raccordement DN150 de la venelle Castorama - EAU BM (REGIE)			3 469,19	-3 469,19	
24-07238 Avance	31/05/2024		3 469,19		3 469,19
24-07238 Avance	31/05/2024			-3 469,19	-3 469,19
25-08014 Eau conso 50 Av Somme Cpteur D19BA169966/Contrat 53600 - EAU BM (REGIE)				773,74	773,74
023511 AC1	01/01/2025	FA 0001425124		31,86	31,86
026967 AC2	09/10/2025	FA 1954648		370,42	370,42
026992 AC3	26/03/2025	FA 1667162		371,46	371,46
25-08025 Création branchement incendie hydrant fonte/Rue de Mirepin - contrat 304646 - EAU				36 433,01	36 433,01
25-08025 Avance	24/03/2025			21 640,56	21 640,56
026157 AC1	09/10/2025	FA 1952241		14 792,45	14 792,45
25-08026 Création branchement incendie hydrant fonte/Rue de Mirepin - contrat 304630 - EAU				39 790,76	39 790,76

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
25-08026 Avance	24/03/2025			22 759,79	22 759,79
026334 AC1	17/10/2025	FA 1963138		17 030,97	17 030,97
25-08027 Création branchement incendie hydrant fonte/Av Somme - contrat 304656 - EAU BM				21 164,60	21 164,60
25-08027 Avance	24/03/2025			14 971,66	14 971,66
026126 AC1	08/10/2025	FA 1947387		6 192,94	6 192,94
25-08032 Création branchement incendie hydrant fonte/49, Rue de Mirepin - contrat 305497 -				1 945,78	1 945,78
25-08032 Avance	25/03/2025			583,73	583,73
026160 AC1	09/10/2025	FA 1952237		1 362,05	1 362,05
25-08124 Création branchement/45s, Rue de Mirepin - contrat 307279 - EAU BM (REGIE)				972,89	972,89
25-08124 Avance	18/04/2025			972,89	972,89
25-08125 Création branchement/50, av Somme - contrat 307285 - EAU BM (REGIE)				1 945,78	1 945,78
25-08125 Avance	18/04/2025			972,89	972,89
026127 AC1	08/10/2025	FA 1947385		972,89	972,89
25-08198 Eau conso Av Somme Cpteur C22FE010763 - EAU BM (REGIE)				2 950,23	2 950,23
024244 AC1	26/03/2025	FA 1665146		297,08	297,08
026081 AC2	06/10/2025	FA 1945893		2 653,15	2 653,15
25-08572 Déplacement fosse compteur eau Rue de Mirepin - contrat 323690 - EAU BM (REGIE)				11 089,39	11 089,39
25-08572 Avance	15/10/2025			11 089,39	11 089,39
D205 Téléphonie/Fibre optique			32 549,50		32 549,50
22-05164 Travaux réseau rue de Peyandreau - Mérignac Soleil - ORANGE (LILLE)			32 549,50		32 549,50
016351 SOLDE	04/10/2022	FA	32 549,50		32 549,50
D207 Gaz				101 294,17	101 294,17
24-07579 Extensions réseau gaz secteur Mirepin - REGAZ				101 294,17	101 294,17
025785 AC1	11/09/2025	FA FCO-		101 294,17	101 294,17
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)			937 814,66	239 316,28	1 177 130,94
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 - 8MINUTES 18SECONDES			5 890,57	1 495,27	7 385,84
011005 AC1	14/09/2020	FA	2 582,40		2 582,40
011588 AC2	01/01/2021	FA	861,30		861,30
012366 AC3	23/03/2021	FA	385,94		385,94
013327 AC4	08/09/2021	FA	118,60		118,60
016097 AC5	31/08/2022	FA	710,81		710,81
018796 AC6	27/09/2023	FA	344,00		344,00
020748 AC7	25/04/2024	FA	323,90		323,90
021469 AC8	30/06/2024	Fa	402,29		402,29
022168 AC9	18/09/2024	FA	161,33		161,33
023476 AC10	20/01/2025	FA		284,21	284,21
024239 AC11	31/03/2025	FA		531,88	531,88
025332 AC12	21/07/2025	FA		306,32	306,32
026270 AC13	24/10/2025	FA		372,86	372,86
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 - ALTO STEP			120 824,07	50 562,19	171 386,26
011004 AC1 PRO	26/08/2020	FAC2200500	25 836,00		25 836,00
011589 AC2	01/01/2021	FCA2200736	14 639,80		14 639,80
012246 AC3	19/03/2021	FCA2210150	7 463,96		7 463,96
012247 AC3 AV1	19/03/2021	FCA2210151	16 543,80		16 543,80
013321 AC4	10/09/2021	FCA2210421	3 321,74		3 321,74
016082 AC5	26/08/2022	FA FCA2220465	14 427,96		14 427,96
018500 AC6	29/05/2023	FA FCA2230231	7 157,80		7 157,80
020750 AC7	03/04/2024	FA FCA2240237	9 433,06		9 433,06
021480 AC8	28/06/2024	FA FCA2240407	11 439,91		11 439,91
022167 AC9	02/09/2024	FA FCA2240541	10 560,04		10 560,04
023439 AC10	01/01/2025	FA FCA2240857		1 312,61	1 312,61
024465 AC11	14/04/2025	FA FCA2250266		6 188,17	6 188,17
025344 AC12	25/07/2025	FA FCA2250553		29 160,62	29 160,62
026275 AC13	24/10/2025	FA FCA2250762		13 900,79	13 900,79
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 - DESVIGNE MICHEL			30 681,73	1 930,65	32 612,38
010996 AC1	14/09/2020	FA 324868	15 500,40		15 500,40
011592 AC2	01/01/2021	FA 324996	861,30		861,30
012240 AC3	19/03/2021	FA 325162	622,54		622,54
013310 AC4	15/09/2021	FA 325393	402,51		402,51
016075 AC5	06/09/2022	NH 325868	1 890,81		1 890,81
018718 AC6	06/09/2023	FA 326491	936,96		936,96
020740 AC7	24/04/2024	FA 326907	1 848,67		1 848,67
021461 AC8	04/07/2024	FA 327032	1 686,84		1 686,84
022171 AC9	19/09/2024	FA 327156	6 931,70		6 931,70
023440 AC10	15/01/2025	FA 327379		234,02	234,02
024256 AC11	02/04/2025	FA 327506		405,10	405,10
025339 AC12	23/07/2025	FA 327692		233,29	233,29
026272 AC13	24/10/2025	FA 327852		1 058,24	1 058,24
M2016-004/MS10 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 0 - OMA			12 601,90		12 601,90
010987 AC1 PRO	10/09/2020	FA V8141	6 458,00		6 458,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
011594 AC2	01/01/2021	FA V8247	717,75		717,75
012235 AC3	20/03/2021	FA V8510	1 276,28		1 276,28
013308 AC4	09/09/2021	FA V8701	335,43		335,43
016066 AC5	30/08/2022	FA V9132	1 575,69		1 575,69
018492 AC6	30/07/2023	FA V9605	778,79		778,79
018643 SOLDE 50%VISA 33%DET	07/09/2023	DECPTE	1 459,96		1 459,96
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - 8MINUTES 18SECONDES			20 368,22	2 304,16	22 672,38
013328 AC1	15/09/2021	FA	7 430,08		7 430,08
014667 AC2	28/02/2022	FA	363,65		363,65
016095 AC3	31/08/2022	FA	1 396,96		1 396,96
018504 AC4	30/04/2023	FA	2 107,01		2 107,01
018798 AC5	27/09/2023	FA	1 661,58		1 661,58
019604 AC6	01/01/2024	FA	2 054,69		2 054,69
020032 AC7	31/01/2024	FA	106,88		106,88
020316 AC8	29/02/2024	FA	1 132,68		1 132,68
020747 AC9	25/04/2024	FA	569,89		569,89
022521 AC10	24/10/2024	FA	3 544,80		3 544,80
025320 AC11	22/07/2025	FA		689,06	689,06
026274 AC12	24/10/2025	FA		1 615,10	1 615,10
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - AG PAYSAGES			44 342,16	12 159,12	56 501,28
018499 AC3 SSTT	30/04/2023	FA FN 08-23	12 771,60		12 771,60
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	5 185,20		5 185,20
019624 AC5	01/01/2024	FA 326699	12 771,60		12 771,60
020037 AC6	09/02/2024	FA 326768	-709,92		-709,92
020309 AC7	08/03/2024	FA 326829	8 491,20		8 491,20
020739 AC8	24/04/2024	FA 326906	3 591,36		3 591,36
022531 AC9	25/10/2024	FA 327221	2 241,12		2 241,12
025340 AC10	23/07/2025	FA 09-25		2 756,16	2 756,16
026388 AC11	03/11/2025	FA 17-25		9 402,96	9 402,96
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - ALTO STEP			336 654,45	112 134,79	448 789,24
013326 AC1	16/09/2021	FCA2210440	94 477,98		94 477,98
014666 AC2	28/02/2022	FA FCA2220116	10 836,13		10 836,13
016094 AC3	26/08/2022	FA	19 626,40		19 626,40
018501 AC4	29/05/2023	FA FCA2230232	51 353,17		51 353,17
018711 AC5	14/09/2023	FA FCA2230434	34 104,95		34 104,95
019835 AC6	01/01/2024	FA FCA2230561	24 634,84		24 634,84
019644 AC7	01/01/2024	FA FCA2230633	27 844,56		27 844,56
020376 AC8	01/01/2024	FA FCA2210515	12 741,06		12 741,06
020310 AC9	31/01/2024	FA FCA2240054	7 293,01		7 293,01
020312 AC10	28/02/2024	FA FCA2240101	37 283,53		37 283,53
020749 AC11	03/04/2024	FA FCA2240236	16 458,82		16 458,82
023768 AC12	11/02/2025	FA FCA2250066		23 376,98	23 376,98
025346 AC13	25/07/2025	FA FCA2250554		40 411,03	40 411,03
026271 AC14	24/10/2025	FA FCA2250761		48 346,78	48 346,78
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - DESVIGNE MICHEL			241 035,58	38 988,14	280 023,72
013311 AC1	15/09/2021	FA 325388	96 024,30		96 024,30
016076 AC2	07/09/2022	FA 325870	23 574,12		23 574,12
018498 AC3	05/05/2023	FA 326266	39 374,67		39 374,67
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	16 374,12		16 374,12
019624 AC5	01/01/2024	FA 326699	24 593,04		24 593,04
020037 AC6	09/02/2024	FA 326768	507,64		507,64
020309 AC7	08/03/2024	FA 326829	13 770,41		13 770,41
020739 AC8	24/04/2024	FA 326906	6 544,88		6 544,88
022531 AC9	25/10/2024	FA 327221	20 272,40		20 272,40
025340 AC10	23/07/2025	FA 327693		20 294,29	20 294,29
026388 AC11	03/11/2025	FA 327868		18 693,85	18 693,85
M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - OMA			51 255,43		51 255,43
013309 AC1	15/09/2021	FA V8706	30 293,74		30 293,74
014657 AC2	02/03/2022	FA V8934	2 128,92		2 128,92
016067 AC3	29/08/2022	FA V9135	5 827,98		5 827,98
018494 AC4	31/07/2023	FA V9606	6 161,41		6 161,41
018699 VISA 8% DET 7% AV2 50%	08/09/2023	DECOMPTE	5 926,57		5 926,57
019478 ANNUL AVCT VISA-DET-AV8	08/09/2023	FV9621	-5 926,57		-5 926,57
019480 VISA DET AV8	08/12/2023	DECPTE DEF	6 843,38		6 843,38
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - ALTO STEP			4 314,72		4 314,72
013319 SOLDE	10/09/2021	FCA2210410	4 314,72		4 314,72
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - DESVIGNE MICHEL			1 248,36		1 248,36
013316 SOLDE	15/09/2021	FA 325394	1 248,36		1 248,36
M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - OMA			9 150,60		9 150,60
013407 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	9 150,60		9 150,60

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - ALTO STEP			1 618,02		1 618,02
013320 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210413	1 618,02		1 618,02
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - DESVIGNE MICHEL			975,66		975,66
013317 SOLDE	15/09/2021	FA 325395	975,66		975,66
M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - OMA			5 342,90		5 342,90
013451 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90		5 342,90
M2022-037 Dossier de sécurité - ARTELIA VILLE & TRANSP			35 760,00		35 760,00
020964 AC1	17/05/2024	FA 911172634	24 960,00		24 960,00
022866 AC2	22/11/2024	FA 911192263	10 800,00		10 800,00
M2022-069/BDC1 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER			8 741,16		8 741,16
017938 AC1	28/04/2023	FA FS04230397	1 828,80		1 828,80
018545 AC2	31/07/2023	FA FS07230744	3 250,08		3 250,08
018949 AC3	30/09/2023	FA FS09230922	3 662,28		3 662,28
M2022-069/BDC2 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER			3 552,70		3 552,70
018544 AC1	31/07/2023	FA FS07230745	3 552,70		3 552,70
M2022-069/BDC3 Mission OQA - Mise à jour Note Secteur 1.3 - CERTIFER			3 456,43		3 456,43
018950 AC1	30/09/2023	FA FS09230923	3 456,43		3 456,43
M2022-069/BDC4 Mission OQA - Avis Secteurs 1.2/1.3/1.4 - CERTIFER FRANCE				8 893,58	8 893,58
026056 AC1	09/10/2025	FA		8 893,58	8 893,58
M2022-069/BDC5 Mission OQA - Avis Secteur 1.5 Matosinhos Ouest - CERTIFER FRANCE				2 615,76	2 615,76
026052 AC1	07/10/2025	FA		2 615,76	2 615,76
M2022-069/BDC6 Mission OQA - Avis Secteur 1.6 Giratoire Matosinhos - CERTIFER FRANCE				2 590,56	2 590,56
026049 AC1	01/01/2025	FA		2 590,56	2 590,56
M2022-069/BDC7 Mission OQA - Avis Secteurs 1.8+triangle Kenndy-Matosinhos - CERTIFER				3 662,06	3 662,06
026028 AC1	25/09/2025	FA		3 662,06	3 662,06
M2025-036 Dossier carrefour à feux Somme/Mirepin/Pouchon - GERTRUDE				1 980,00	1 980,00
025859 AC1	12/09/2025	FA BOD		1 980,00	1 980,00
D302 Coordonnateur SPS			20 179,35	8 753,33	28 932,68
M2019-026 Mission de CSPS niveau 2 - Espaces publics - VERITAS			20 179,35	7 571,33	27 750,68
009735 AC1	29/01/2020	FA 20213189	1 143,42		1 143,42
010000 AC2	29/01/2020	FA 20213189-2	1 147,98		1 147,98
011556 AC3	01/01/2021	FA 20702041	2 126,90		2 126,90
011824 AC4	11/01/2021	FA 21001773	760,57		760,57
012732 AC5	21/06/2021	FA 21078598	783,32		783,32
015247 AC6	01/06/2022	FA 22070732	805,50		805,50
018830 AC7	29/09/2023	FA 23125062	3 546,25		3 546,25
018974 AC8	13/10/2023	FA 23132850	711,57		711,57
019239 AC9	16/11/2023	FA 23148647	741,09		741,09
019551 AC10	01/01/2024	FA 23163120	713,48		713,48
019793 AC11	12/01/2024	FA 24006055	717,35		717,35
020045 AC12	09/02/2024	FA 24019185	715,42		715,42
020321 AC13	08/03/2024	FA 24032317	721,20		721,20
020691 AC14	19/04/2024	FA 24050615	1 708,67		1 708,67
021004 AC15	24/05/2024	FA 24064183	767,46		767,46
021242 AC16	19/06/2024	FA 24076895	767,46		767,46
021515 AC17	09/07/2024	FA 24087497	767,46		767,46
021918 AC18	19/08/2024	FA 24102842	761,28		761,28
022143 AC19	12/09/2024	FA 24113254	772,97		772,97
022345 AC20	04/10/2024	FA 24124280		769,52	769,52
022716 AC21	08/11/2024	FA 24139774		770,89	770,89
023528 AC22	27/01/2025	FA 25004788		774,99	774,99
024014 AC23	11/03/2025	FA 25027281		777,08	777,08
024299 AC24	07/04/2025	FA 25040094		782,58	782,58
024607 AC25	06/05/2025	FA 25052843		779,82	779,82
024869 AC26	04/06/2025	FA 25065937		777,77	777,77
025196 AC27	08/07/2025	FA 25081833		774,34	774,34
025477 AC28	04/08/2025	FA 25094152		775,70	775,70
025861 AV/AC28	22/09/2025	AV 25112307		-775,70	-775,70
025858 AC28	22/09/2025	FA 25112335		388,20	388,20
025717 AC29	04/09/2025	FA 25105937		199,25	199,25
026749 AC30	21/11/2025	FA 25141266		776,89	776,89
M2025-046 Mission CSPS travaux de démolitions 4 maisons - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION				1 182,00	1 182,00
025971 AC1 - 09/2025	30/09/2025	FA 25117011		642,00	642,00
026637 AC2 - 10-11/2025	13/11/2025	FA 25137922		540,00	540,00
D303 OPC sur travaux			235 579,79		235 579,79
M2019-011/BDC1 M5.1 Etudes de conception (PRO) - BERGER LOUIS			12 876,00		12 876,00
009733 AC 1	21/01/2020	FA 5101913.01-	6 438,00		6 438,00
010254 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-	6 438,00		6 438,00
M2019-011/BDC10 M5.3 Phase préparation de chantier - ilot oasis urbaine (P1 à P5) - WSP			14 072,94		14 072,94
015141 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-	14 072,94		14 072,94

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2019-011/BDC11 M5.4 phase de réalisation des travaux (voie Castorama) - WSP FRANCE			24 490,62		24 490,62
015892 SOLDE	16/08/2022	FA AC22-08-	24 490,62		24 490,62
M2019-011/BDC12 M5.3 phase prépa de chantier (concessionnaires) & M5.4 phase réalisation			22 390,68		22 390,68
016340 AC1	10/10/2022	FA AC22-10-	11 387,68		11 387,68
017508 SOLDE	28/02/2023	FA AC23-02-	11 003,00		11 003,00
M2019-011/BDC13 M5.3 (11.22 à 01.23) & M5.4 (01.23 à 03.23) amgt espaces publics plots P1 & 016891 AC1			39 466,68		39 466,68
018175 AC2	01/01/2023	FA AC22-12-	14 414,58		14 414,58
018509 AC3 SOLDE	20/06/2023	FA AC23-06-	22 560,14		22 560,14
	08/08/2023	FA AC23-08-	2 491,96		2 491,96
M2019-011/BDC14 M5.3 phase préparation de chantier 03.23 à 07.23 - WSP FRANCE			14 519,70		14 519,70
018174 AC1	16/06/2023	FA AC23-06-	7 266,42		7 266,42
018510 AC2 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-	7 253,28		7 253,28
M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP FRANCE			7 917,89		7 917,89
018511 AC1 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-	7 917,89		7 917,89
M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - BERGER LOUIS			8 190,00		8 190,00
010387 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-	8 190,00		8 190,00
M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS			13 140,00		13 140,00
010608 AC1	15/07/2020	FA 5101913.01-	5 256,00		5 256,00
011143 SOLDE	02/10/2020	FA 51091301	7 884,00		7 884,00
M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS			13 323,96		13 323,96
012047 SOLDE	01/01/2021	FA 5101913.01-	13 323,96		13 323,96
M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS			22 888,01		22 888,01
012139 SOLDE	03/03/2021	FA 5101913.01-	22 888,01		22 888,01
M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER LOUIS			13 449,35		13 449,35
012354 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-	4 888,55		4 888,55
012665 AC2	31/05/2021	FA 5101913.01-	8 560,80		8 560,80
M2019-011/BDC7 M5.1 Etudes de conception (PRO) TRAM - BERGER LOUIS			13 248,11		13 248,11
012353 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-	3 943,92		3 943,92
012731 AC2	17/06/2021	FA 5101913.01-	5 983,48		5 983,48
013065 AC3	30/07/2021	FA 5101913.01-	3 312,35		3 312,35
013595 AVOIR SUR BDC 7	28/10/2021	AV 5101913	-3 312,35		-3 312,35
014519 SOLDE	01/01/2022	FA 5101913.01-	3 320,71		3 320,71
M2019-011/BDC8 M5.4 Travaux Eté 2021 - BERGER LOUIS			7 415,85		7 415,85
013123 08/21 SOLDE	23/08/2021	FA 5101913.01	7 415,85		7 415,85
M2019-011/BDC9 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - phase 1 - WSP FRANCE			8 190,00		8 190,00
015140 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-	8 190,00		8 190,00
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			1 957 258,06	380 000,00	2 337 258,06
G101 Rémunération			1 957 258,06	380 000,00	2 337 258,06
18-02475 Rémunération aménageur 2018 - FAB			37 258,06		37 258,06
007258 REM 30/08-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-20	37 258,06		37 258,06
19-02799 Rémunération aménageur 2019 - FAB			200 000,00		200 000,00
008478 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-10	100 000,00		100 000,00
008709 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-20	50 000,00		50 000,00
009219 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-30	50 000,00		50 000,00
20-03718 Rémunération aménageur 2020 - FAB			230 000,00		230 000,00
010430 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-10	115 000,00		115 000,00
011026 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-21	57 500,00		57 500,00
011691 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-32	57 500,00		57 500,00
21-04303 Rémunération aménageur 2021 - FAB			350 000,00		350 000,00
012219 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-10	87 500,00		87 500,00
012921 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-21	87 500,00		87 500,00
013473 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-32	87 500,00		87 500,00
014093 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-43	87 500,00		87 500,00
22-05229 Rémunération aménageur 2022 - FAB			370 000,00		370 000,00
014874 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-10	92 500,00		92 500,00
015363 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-21	92 500,00		92 500,00
016057 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-32	92 500,00		92 500,00
016851 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-43	92 500,00		92 500,00
23-06250 Rémunération aménageur 2023 - FAB			370 000,00		370 000,00
017810 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-10	92 500,00		92 500,00
018376 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-22	92 500,00		92 500,00
019503 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-34	92 500,00		92 500,00
019513 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-46	92 500,00		92 500,00
24-07310 Rémunération aménageur 2024 - FAB			400 000,00		400 000,00
021339 REM 01/01/24-30/06/24	25/06/2024	ND 2024-10	200 000,00		200 000,00
022575 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-21	100 000,00		100 000,00
023289 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-31	100 000,00		100 000,00
25-08221 Rémunération aménageur 2025 - FAB				380 000,00	380 000,00
024706 REM 01/01-31/03/25	13/05/2025	ND 2025-07		95 000,00	95 000,00
025064 REM 01/04-30/06/25	30/06/2025	ND 2025-18		95 000,00	95 000,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
025814 REM 01/07-30/09/25	30/09/2025	ND 2025-28		95 000,00	95 000,00
026877 REM 1/10-31/12/25	31/12/2025	ND 2025-39		95 000,00	95 000,00
H FRAIS DIVERS			1 266 033,25	146 473,67	1 412 506,92
H101 Communication			356 522,33	86 968,87	443 491,20
19-03212 MDP "Citröen Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE			219,60		219,60
009165 SOLDE	26/11/2019	FA 096 011607	219,60		219,60
19-03262 MDP "Citröen Fayat" Maintenance porte automatique 1S20 - THYSSENKRUPP			144,00		144,00
010502 MAINTENANCE PORTES MDP	17/06/2020	CEH825115920	144,00		144,00
19-03281 MDP "Citröen Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL			327,10		327,10
009250 REGUL AFFECT* MDP	30/11/2019	FA FC 1823	327,10		327,10
19-03299 MDP "Citröen Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - DEKRA			122,40		122,40
009320 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FAI3566335	122,40		122,40
19-03312 MDP "Citröen Fayat" Charges courantes - FAYAT			34 888,82		34 888,82
009350 REGUL AFFECTAT* MDP	30/11/2019	031219	5 961,60		5 961,60
009939 APPEL PROV T2 2020	05/03/2020	FA 62 03 2020	2 980,80		2 980,80
010441 APPEL PROV T3 2020	01/06/2020	FA 95 06 2020	2 980,80		2 980,80
010660 REGULARISATION CHARGES 2019	30/06/2020	FA 116.06.2020	6 604,82		6 604,82
010878 APPEL PROV T4 2020	04/09/2020	FA 152.09.2020	2 980,80		2 980,80
011818 APPEL PROV T1 2021	01/01/2021	FA 32.12.2021	2 980,80		2 980,80
011821 REGUL CHARGES REELLES	01/01/2021	AV 40.12.2021	-1 524,00		-1 524,00
012340 APPEL PROV T2 2021	03/03/2021	FA 68 03 3021	2 980,80		2 980,80
012769 APPEL PROV T3 2021	01/06/2021	FA 143 06 2021	2 980,80		2 980,80
013485 APPEL PROV T4 2021	01/09/2021	FA 173.09.2021	2 980,80		2 980,80
014222 APPEL PROV T1 2022	01/01/2022	FA 37.12.2022	2 980,80		2 980,80
009671 ABONN 01/20	21/01/2020	FA	32,40		32,40
009713 REGUL AFFECTAT* ABONN 01/20	21/01/2020	FA	-32,40		-32,40
20-03466 MDP "Citröen Fayat" Pose d'un programmeur sur le chauffage - CONFORT HOME 33			612,00		612,00
009789 PROGRAMMEUR MDP	12/02/2020	F 190071	612,00		612,00
20-03539 MDP "Citröen Fayat" Réparation porte d'entrée - THYSSENKRUPP			297,36		297,36
010501 REPARATION PORTE MDP	12/06/2020	CEH825115664	297,36		297,36
20-04003 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (à cpter 2520) + entrée secondaire (à			317,28		317,28
011814 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA	72,00		72,00
011897 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA	69,29		69,29
013005 MAINTENANCE AC3	06/07/2021	FA	175,99		175,99
2021-020 Bilan concertation - DEUX DEGRES			3 600,00		3 600,00
013551 SOLDE	13/10/2021	FA 20210037	3 600,00		3 600,00
21-04100 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage conférence de presse - MIKAYILLI-C+CLAIR			180,00		180,00
012102 NETTOYAGE MDP CONF PRESSE	01/02/2021	FA 2021 0102	180,00		180,00
21-04667 Distribution flyer journée mobilité active du 16/10 - DISTRIPUB			648,00		648,00
013635 SOLDE	05/10/2021	FA0701	648,00		648,00
013640 EXERCICE 2021	13/10/2021	FA 2021-4067-1	10 200,00		10 200,00
014095 REGUL LIGNE BUDG EXE 2021	13/10/2021	FA 2021-04067-	-10 200,00		-10 200,00
013958 SOLDE	15/12/2021	FA 190175	235,20		235,20
014096 REGUL LIGNE BUDG SOLDE	15/12/2021	FA 190175	-235,20		-235,20
22-05117 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (2022)+ entrée secondaire (2022) -			74,37		74,37
014259 AC1 - 01/01 - 30/06	10/01/2022	FA	149,56		149,56
016104 AC2 - 01/07- 31/12	11/07/2022	FA	149,56		149,56
016107 AV /AC2	08/09/2022	AV	-149,56		-149,56
016109 AV /AC1	08/09/2022	AV	-75,19		-75,19
22-05181 Déménagt/emmenagt MDP 60% - DEMENAGEURS BRETONS			957,60		957,60
014787 AC1	23/03/2022	FB22000464	957,60		957,60
22-05888 Distribution lettre infos 5 le 17/01/2022 - DISTRIMAG FRANCE			698,40		698,40
017101 SOLDE	18/01/2023	FA F20230118-	698,40		698,40
23-06535 TAXE FONCIERE 2023 BDL (281 + 06204 H) - TRESOR PUBLIC (TF)			10 532,00		10 532,00
018721 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33	10 532,00		10 532,00
24-07219 [BDR] Achat chaises Alinea - NEOMARCHE MERIGNAC			2 696,40		2 696,40
24-07219 Avance	28/05/2024		2 696,40		2 696,40
023687 [BDR] ACHAT CHAISES	01/01/2025	FA 04/09/24			
24-07281 [BDR] Inauguration - MAISON ARCHITECTURE-308			8 280,00		8 280,00
021518 AC1 SOLDE	05/07/2024	FA F2024070	8 280,00		8 280,00
24-07383 [BDR] Achat tables Alinea - NEOMARCHE MERIGNAC			1 841,80		1 841,80
24-07383 Avance	09/08/2024		1 841,80		1 841,80
025501 REGUL TVA ACQ 8 TABLES	01/01/2025	FA			
24-07758 Chauffage de chantier 15kw 400V MW Tolls - TORROS/CUBIX BUSINESS			415,00		415,00
24-07758 Avance	10/12/2024		415,00		415,00
24-07768 [BDR] Montage - assemblage 8 tables - OFFICINE REEMPLOI			600,00		600,00
023173 SOLDE	16/12/2024	FA 2024121601	600,00		600,00
25-07883 [BDR] 27 Plais pour "Rencontre Urbanisme Circulaire" 30/01/25 - NEOMARCHE				145,80	145,80
25-07883 Avance	24/01/2025			145,80	145,80
023639 SOLDE PLAIDS	29/01/2025	FA 29/01/25			

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
25-08145 Accueil petit-déjeuner Forum du projet urbain 24/05 - ELYSE				932,00	932,00
024775 SOLDE	24/05/2025	FA FB0348		932,00	932,00
M2016-015/BDC13/2 Maison des projets_Etude G2 AVP/PRO - GEOTEC			4 578,24		4 578,24
009316 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 30112019	4 578,24		4 578,24
008733 AC1	27/06/2019	NH 4	2 988,00		2 988,00
008731 SOLDE	27/06/2019	NH 03_2	1 175,76		1 175,76
009251 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 05122019	-4 163,76		-4 163,76
M2017-036/MS3/BDC 2 BDC 2 Carte globale projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			4 032,00		4 032,00
008758 SOLDE	27/09/2019	NH 5	4 032,00		4 032,00
M2017-036/MS3/BDC 3 BDC 3 Kit du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			2 016,00		2 016,00
009592 AC1	01/01/2020	NH 10	1 512,00		1 512,00
009936 SOLDE	05/03/2020	NH 19	504,00		504,00
M2017-036/MS3/BDC 4 BDC 4 Site internet projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			5 292,00		5 292,00
009593 AC1	01/01/2020	NH 11	3 969,00		3 969,00
009937 SOLDE	05/03/2020	NH 20	1 323,00		1 323,00
M2017-036/MS3/BDC 5 BDC 5 Exposition (ancien showroom "DS") du projet Marne/Soleil - DEUX			2 736,00		2 736,00
008759 SOLDE	27/09/2019	NH 6	2 736,00		2 736,00
M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - CANCAN			16 305,00		16 305,00
008937 SOLDE	15/10/2019	FA 19-069-002	16 305,00		16 305,00
M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES			8 647,78	2,59	8 650,37
008760 AC 1	27/09/2019	NH 7	6 048,00		6 048,00
009835 SOLDE	20/02/2020	NH 17	2 599,78		2 599,78
023749 DGD	10/02/2025	REV DEF		2,59	2,59
M2017-036/MS3/BDC 7 BDC 7 Lettre d'information n°1 - DEUX DEGRES			756,00	3,78	759,78
009275 SOLDE	01/01/2020	FA 20190091	756,00		756,00
023878 DGD	31/01/2025	REV DEF		3,78	3,78
M2017-036/MS3/BDC 9 BDC 9 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES			4 044,10	4,03	4 048,13
009829 SOLDE	20/02/2020	NH 16	4 044,10		4 044,10
023564 DGD	01/01/2025	REV DEF		4,03	4,03
M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - DEUX DEGRES			778,01	3,06	781,07
012199 SOLDE	18/01/2021	FA 20210004	778,01		778,01
023565 DGD	01/01/2025	REV DEF		3,06	3,06
M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - SEPPA			3 386,61	13,32	3 399,93
012199 SOLDE	18/01/2021	FA 6917	3 386,61		3 386,61
023565 DGD	01/01/2025	REV DEF		13,32	13,32
M2017-036/MS3/BDC12 BDC 12 Lettre d'information n°2 - DEUX DEGRES			2 631,01		2 631,01
011243 AC 1	21/10/2020	FA 20200071	1 519,56		1 519,56
012381 AC 2	05/03/2021	FA 20200085	1 111,45		1 111,45
M2017-036/MS3/BDC13 BDC 13 Site Internet Page occupations temporaires - DEUX DEGRES			1 013,04	5,04	1 018,08
011241 SOLDE	21/10/2020	FA 20200073	1 013,04		1 013,04
023568 DGD	01/01/2025	REV DEF		5,04	5,04
M2017-036/MS3/BDC14 BDC 14 Permanence projet urbain - DEUX DEGRES			307,53	1,54	309,07
011240 SOLDE	21/10/2020	FA 20200074	307,53		307,53
023569 DGD	01/01/2025	REV DEF		1,54	1,54
M2017-036/MS3/BDC16 BDC 16 Panonceaux réemploi - DEUX DEGRES			818,10	5,67	823,77
011654 SOLDE	01/01/2021	FA 20200103	818,10		818,10
023570 DGD	01/01/2025	REV DEF		5,67	5,67
M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES			3 999,60	27,72	4 027,32
011655 SOLDE	01/01/2021	FA 20200102	3 999,60		3 999,60
023571 DGD	01/01/2025	REV DEF		27,72	27,72
M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes ouvertes - DEUX DEGRES			3 875,44	26,40	3 901,84
012116 AC1	01/01/2021	FA 20200087	823,77		823,77
013549 AC2	13/10/2021	FA 20210059	526,90		526,90
013548 SOLDE	13/10/2021	FA 20210059	2 524,77		2 524,77
023572 DGD	01/01/2025	REV DEF		26,40	26,40
M2017-036/MS3/BDC19 BDC 19 Permanence Maison du projet "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES			2 565,50		2 565,50
014543 SOLDE	01/01/2022	NH 48	2 565,50		2 565,50
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - CANCAN			3 528,00		3 528,00
012714 AC1	12/04/2021	FA 21-118-030	3 528,00		3 528,00
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES			105,84		105,84
012714 AC1	12/04/2021	REV S/BDC20	105,84		105,84
M2017-036/MS3/BDC21 BDC 21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA			5 452,14	42,72	5 494,86
012389 SOLDE	22/03/2021	FA 6919	5 452,14		5 452,14
023704 DGD	10/02/2025	REV DEF		42,72	42,72
M2017-036/MS3/BDC22 BDC 22 lettre d'informations N° 3 - DEUX DEGRES			2 752,64		2 752,64
014541 SOLDE	01/01/2022	NH 42	2 752,64		2 752,64
M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 gestion des projets (semestre 1) - DEUX DEGRES			3 431,23		3 431,23
013283 SOLDE	27/07/2021	FA 20210044	3 431,23		3 431,23
M2017-036/MS3/BDC24 BDC 24 lettre chantier 4 (avril 2021 - secteur Mirepin) - DEUX DEGRES			1 398,60		1 398,60
013556 SOLDE	24/06/2021	FA 20210036	1 398,60		1 398,60

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journée de la mobilité : 16 oct 2021 - DEUX			523,66	4,53	528,19
013555 SOLDE	13/10/2021	FA 20210054	523,66		523,66
023705 DGD	10/02/2025	REV DEF		4,53	4,53
M2017-036/MS3/BDC28 BDC 28 gestion de projets (semestre 2) - DEUX DEGRES			2 848,18	19,15	2 867,33
014277 SOLDE	11/01/2022	FA 20220004	2 848,18		2 848,18
023706 DGD	10/02/2025	REV DEF		19,15	19,15
M2017-036/MS3/BDC29 BDC 29 lettre d'informations N° 4 - DEUX DEGRES			4 007,99	14,44	4 022,43
016601 SOLDE	15/11/2022	FA 20220071	4 007,99		4 007,99
023707 DGD	10/02/2025	REV DEF		14,44	14,44
M2017-036/MS3/BDC30 Lettre info n°5 Lettre chantier Actu site internet Marne-Soleil Gestion de			7 346,30	6,05	7 352,35
017085 AC1	01/01/2023	FA 20220085	3 916,08		3 916,08
017957 AC2	25/04/2023	FA F2300023	1 726,20		1 726,20
019427 AC3	28/11/2023	FA 2300068	1 704,02		1 704,02
023725 DGD	10/02/2025	REV DEF		6,05	6,05
M2017-036/MS3/BDC31 M3 : bilan / 5 années de médiation - DEUX DEGRES			1 262,20	-11,16	1 251,04
018053 SOLDE	25/04/2023	FA F2300021	1 262,20		1 262,20
023708 DGD	10/02/2025	REV DEF		-11,16	-11,16
M2017-036/MS3/BDC32 M3 : lettre info travaux et gestion de projets - DEUX DEGRES			2 276,07	8,06	2 284,13
019280 AC1	24/11/2023	FA F2300064	2 276,07		2 276,07
023709 DGD	10/02/2025	REV DEF		8,06	8,06
M2017-036/MS3/BDC33 M3 : info travaux et occupat° temporaire - DEUX DEGRES			14 284,52		14 284,52
019281 AC1	24/11/2023	FA F2300065	6 333,70		6 333,70
020150 AC2	23/02/2024	FA F2400005	5 098,99		5 098,99
020766 AC3	26/04/2024	FA F2400015	2 392,18		2 392,18
022299 AC4	03/10/2024	FA F2400054	459,65		459,65
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - A6A			3 583,95		3 583,95
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	3 583,95		3 583,95
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - BALZA XAVIER			2 030,40		2 030,40
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 030,40		2 030,40
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - CESMA			1 572,48		1 572,48
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 572,48		1 572,48
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - ETBA THOMAS			1 087,63		1 087,63
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 087,63		1 087,63
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - GUIRAUD ANDRE			2 601,14		2 601,14
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 601,14		2 601,14
M2018-001 MDP "Citroën Fayat" MOE Maison du projet - VIVIEN (BET)			2 620,80		2 620,80
M2018-001 Avance	12/12/2019		-2 620,80		-2 620,80
M2018-001 Avance	12/12/2019		2 620,80		2 620,80
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 620,80		2 620,80
M2018-011 MDP "Citroën Fayat" Controle technique MDP - VERITAS			970,35		970,35
009340 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	970,35		970,35
M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISOIRE			14 378,40		14 378,40
010143 AC 1	21/04/2020	FA 20-014	3 610,80		3 610,80
010361 AC2	29/05/2020	FA NH 20-025	3 607,20		3 607,20
010481 AC3	29/06/2020	FA 20-031	3 607,20		3 607,20
010687 SOLDE	30/07/2020	FA 20-041	3 553,20		3 553,20
M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE			43 273,44		43 273,44
010145 AC 1	21/04/2020	FA 20-016	4 320,00		4 320,00
010363 AC2	29/05/2020	FA NH 20-027	4 328,64		4 328,64
011028 AC2	28/09/2020	NH 20-055	8 592,48		8 592,48
011249 AC4	27/10/2020	FA 20-063	8 665,92		8 665,92
011542 AC5	01/01/2021	FA 20-072	8 683,20		8 683,20
011668 SOLDE	01/01/2021	FA 20-086	8 683,20		8 683,20
M2019-015/BDC 5 Actualisation des ilots Castorama (P5) et Sogara - ATELIER PROVISOIRE			4 460,04		4 460,04
013624 AC1	29/10/2021	FA 21-081	2 600,64		2 600,64
014362 SOLDE	26/01/2022	FA 22-010	1 859,40		1 859,40
M2019-015/BDC 7 Actualisation des ilots Castorama P1 P2 P3 et P4 - ATELIER PROVISOIRE			3 708,00	4 071,60	7 779,60
013355 AC 1	28/09/2021	FA 21-069	3 708,00		3 708,00
023842 AC2	26/02/2025	FA 25-008		4 071,60	4 071,60
M2019-015/BDC 8 BDL Démontage et remontage maquette - ATELIER PROVISOIRE			1 129,68		1 129,68
015118 SOLDE	05/04/2022	NH 22-035	1 129,68		1 129,68
M2019-015/BDC 9 Réalisation des boîtes de transport de la maquette - ATELIER PROVISOIRE			2 580,19		2 580,19
016357 SOLDE	13/10/2022	NH 22-081 60%	2 580,19		2 580,19
M2019-015/BDC10 Montage de la maquette à la MDP & actualisation ilots Fiat & B1 B7 - ATELIER			4 799,52	1 710,94	6 510,46
019701 AC1	01/01/2024	FA 23-077	4 799,52		4 799,52
023797 AC2	31/01/2025	FA 25-006		1 710,94	1 710,94
M2019-015/BDC11 Actualisation des plaques suite actualisation Plan Guide - ATELIER PROVISOIRE				29 315,52	29 315,52
025028 AC1	23/06/2025	FA 25-029		21 928,32	21 928,32
026130 AC2	26/09/2025	FA 25-047		7 387,20	7 387,20
M2019-021 MDP "Citroën Fayat" Aménagement intérieur - CONFORT HOME 33			11 228,76		11 228,76

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
009262 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA190027	9 942,12		9 942,12
009460 SOLDE AVENANT	01/01/2020	FA 190031	1 286,64		1 286,64
M2019-029 MDP "Citroën Fayat" Nettoyage post chantier - DERICHEBOURG			3 034,80		3 034,80
009302 REGUL AFFECT* MDP	30/11/2019	FA 002/19	3 034,80		3 034,80
M2019-030 Lot 1/BDC39 60% Impression lettre d'information et lettre de chantier Mérignac			807,33		807,33
017066 AC1	13/01/2023	FA 39839	841,18		841,18
017417 REGUL REV/AC1	13/01/2023	FA 39839	-88,78		-88,78
021311 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC39	54,93		54,93
M2019-030 Lot 1/BDC49 Impresssion Kit projet Soleil - BLF IMPRESSION			750,48		750,48
019584 AC1	01/01/2024	FA 41190	636,00		636,00
021789 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC49	114,48		114,48
M2019-030 Lot 1/BDC51 Réimpression Kit projet Soleil 100 ex. - BLF IMPRESSION			819,94		819,94
019891 AC1	26/01/2024	FA 41372	702,00		702,00
021790 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC51	117,94		117,94
M2019-030 Lot 2/BDC3 1 PD format 0,80 x 1,20 m - MIPP			59,76		59,76
009729 BDC3-AC1	31/01/2020	FA 200349	60,00		60,00
021276 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC3	-0,24		-0,24
M2019-030 Lot 2/BDC39 Palissades ex Alinéa coté Kennedy - MIPP			4 351,97		4 351,97
019738 PANNEAU ALINEA PALISSADES	01/01/2024	FA F233974	3 726,00		3 726,00
021758 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC39	625,97		625,97
M2019-033 MDP "Citroën Fayat" Sécurisation locaux - VPSITEX			1 061,28		1 061,28
009333 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	844,56		844,56
009645 09/11-08/12/19	01/01/2020	FA	216,72		216,72
M2019-057 MDP "Citroën Fayat" Travaux complémentaires - CONFORT HOME 33			813,60		813,60
009628 SOLDE	10/01/2020	FA 190058	813,60		813,60
M2020-001 MDP "Citroën Fayat" Travaux mise aux normes locaux - MODEX BTP			2 640,00		2 640,00
011398 SOLDE SOLEIL	02/10/2020	FA 02102020-	2 640,00		2 640,00
M2020-002 MDP "Citroën Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - VPSITEX			216,72		216,72
009760 AC 1	31/01/2020	MPF102003990	216,72		216,72
M2020-002/BDC1 MDP "Citroën Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2020 - VPSITEX			2 600,64		2 600,64
009959 BDC1-ABONN 01/2020	29/02/2020	MPF102007576	216,72		216,72
010236 BDC1-ABONN 02/2020	31/03/2020	FA	216,72		216,72
010240 BDC1 ABONN 03/2020	27/04/2020	FA	216,72		216,72
010442 BDC1 ABONN 04/2020	01/06/2020	FA	216,72		216,72
010568 BDC1 ABONN 05/2020	30/06/2020	MPF102039170	216,72		216,72
010734 BDC1 ABONN 06/2020	31/07/2020	MPF102046853	216,72		216,72
010877 BDC1 ABONN 07/2020	31/08/2020	MPF102053913	216,72		216,72
011365 BDC1 ABONN 09/2020	31/10/2020	FA	216,72		216,72
011817 BDC1 ABONN-10/2020	01/01/2021	FA	216,72		216,72
011898 BDC1 ABONN 11/2020	01/01/2021	FA MPF	216,72		216,72
012103 BDC1 ABONN 12/2020	31/01/2021	FA	216,72		216,72
014240 BDC1 ABONN 08/2020	01/01/2022	FA	216,72		216,72
M2020-002/BDC2 MDP "Citroën Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2021 - VPSITEX			2 600,64		2 600,64
012104 ABONN 01/2021	28/02/2021	FA MPF	216,72		216,72
012449 ABONN 02/2021	31/03/2021	FA	216,72		216,72
012480 ABONN 03/21	30/04/2021	FA	216,72		216,72
012739 ABONN 04/2021	31/05/2021	FA	216,72		216,72
013033 ABONN 05/2021	30/06/2021	FA	216,72		216,72
013101 ABONN 06/2021	31/07/2021	FA	216,72		216,72
013244 ABONN 07/2021	31/08/2021	FA MPF	216,72		216,72
013568 ABONN 08/2021	30/09/2021	FA	216,72		216,72
013776 ABONN 09/2021	31/10/2021	FA	216,72		216,72
014120 ABONN 10/2021	01/01/2022	FA	216,72		216,72
014224 ABONN 11/2021	01/01/2022	FA	216,72		216,72
014616 ABONN 12/2021	31/01/2022	FA	216,72		216,72
M2020-002/BDC3 MDP "Citroën Fayat" Abonnt trimestriel sécurisation 2022 - VPSITEX			650,16		650,16
014786 ABONN 01/2022	28/02/2022	FA	216,72		216,72
014899 ABONN 02-03/2022	31/03/2022	FA	433,44		433,44
013569 AC1	30/09/2021	FA 21-5728	1 131,41		1 131,41
014097 AC1	30/09/2021	FA 21-5728	-1 131,41		-1 131,41
013853 AC1	23/11/2021	FA 2111077	4 559,50		4 559,50
014098 AC1	23/11/2021	FA 2111077	-4 559,50		-4 559,50
M2022-006 Diagnostic amiante avant travaux de réhabilitation ex-local commercial la Bordlaise			2 151,60		2 151,60
015274 AC1	31/05/2022	FA I6130561	2 151,60		2 151,60
M2023-020/Lot 1//BDC1 Impression lettres d'info et de chantier - IMPRIMERIE LAPLANTE			1 066,80		1 066,80
020411 AC1	12/03/2024	FA 0103360	1 066,80		1 066,80
M2023-020/Lot 1//BDC10 60% Lettre présentation des permanences Marne-Soleil 480 ex. -			645,12		645,12
022174 SOLDE	19/09/2024	FA 01061808	645,12		645,12
M2023-020/Lot 1//BDC16 60% Lettre d'information Marne/Soleil décembre 2024 - IMPRIMERIE			1 280,16		1 280,16
023166 SOLDE	13/12/2024	FA 0107523	1 280,16		1 280,16

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2023-020/Lot 1//BDC20 Lettre info chantier riverain 01/25 - IMPRIMERIE LAPLANTE				780,00	780,00
023478 SOLDE	20/01/2025	FA 0107960		780,00	780,00
M2023-020/Lot 1//BDC23 Lettre Info chantier + Lettre info Giratoire + Poster Soleil 02/25 -				1 215,00	1 215,00
023796 SOLDE	19/02/2025	FA 0108413		1 215,00	1 215,00
M2023-020/Lot 1//BDC28 60% Impression de flyers concertation projet Marne-Soleil 03/25 60% -				208,80	208,80
024160 SOLDE	26/03/2025	FA 0108904		208,80	208,80
M2023-020/Lot 1//BDC32 Impress° Lettre info Chantier Mirepin 04/25 - IMPRIMERIE LAPLANTE				403,20	403,20
024451 SOLDE	16/04/2025	FA 0109307		403,20	403,20
M2023-020/Lot 1//BDC34 60% Flyers "Forum du projet urbain" et Inaug° Place Gabriela Mistral -				165,60	165,60
024591 SOLDE	30/04/2025	FA 0109519		165,60	165,60
M2023-020/Lot 1//BDC36 60% Livrables Forum projet urbain 24/05/25 - IMPRIMERIE LAPLANTE				709,20	709,20
024756 SOLDE	26/05/2025	FA 0109813		709,20	709,20
M2023-020/Lot 1//BDC42 60% Impression de la lettre info chantier Marne Soleil n°9 60% -				1 280,16	1 280,16
025789 SOLDE	12/09/2025	FA 0111313		1 280,16	1 280,16
M2023-020/Lot 1//BDC43 Impression de la Lettre info travaux secteur Mirepin 08/25 -				201,60	201,60
025767 IMPRESS° LETTRE INFO MIREPIN 08/25	08/09/2025	FA 0111253		201,60	201,60
M2023-020/Lot 1//BDC45 60% Impress° Flyers du programme des animations Marne/Soleil -				86,40	86,40
026029 SOLDE	30/09/2025	FA 0111624		86,40	86,40
M2023-020/Lot 1//BDC6 Concertation Finale Parc - IMPRIMERIE LAPLANTE			233,70		233,70
021042 AC1	30/05/2024	FA 0104579	233,70		233,70
M2023-020/Lot 2/BDC12 60% Impress° panneaux extérieur et intérieur carto Marne/Soleil - MIPP				934,36	934,36
024913 SOLDE	28/05/2025	FA F251607		934,36	934,36
M2023-020/Lot 2/BDC16 60% Production 2 Roll-up + 3 panneaux A0 Événement 20/09 60% - MIPP				282,60	282,60
026058 SOLDE	30/09/2025	FA F252948		282,60	282,60
M2023-020/Lot 2/BDC8 60% Réalisation et pose Dibon 6 panneaux information Marne - Soleil				1 658,47	1 658,47
024093 SOLDE	19/03/2025	FA F250806		1 658,47	1 658,47
M2023-020/Lot 2/BDC9 60% 6 panneaux intérieur Viscom info Marne - Soleil - MIPP				229,92	229,92
024095 SOLDE	19/03/2025	FA F250808		229,92	229,92
M2023-020/Lot 4/BDC2 Lettres et affiches info travaux - GRAPHI 33			268,99		268,99
020307 AC1	07/03/2024	FA	268,99		268,99
M2023-020/Lot 4/BDC3 Lettre information chantier - GRAPHI 33			163,80		163,80
020913 SOLDE	13/05/2024	FA	163,80		163,80
M2023-020/Lot 4/BDC4 Lettre chantier Mégnac Soleil - GRAPHI 33			50,40		50,40
021115 AC1	31/05/2024	FA	50,40		50,40
M2023-020/Lot 4/BDC6 Lettre info chantier - Travaux Mirepin - GRAPHI 33			50,40		50,40
022650 SOLDE	31/10/2024	FA	50,40		50,40
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - ALGA MEDIATION			8 674,56		8 674,56
021106 AC1	31/05/2024	FA 24-05-70	8 674,56		8 674,56
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX DEGRES			1 084,32		1 084,32
021061 AC1	28/05/2024	FA F2400026	1 084,32		1 084,32
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE			813,24		813,24
020976 AC1	02/05/2024	FA 171	813,24		813,24
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat*-Animation Parc Carpentier - ALGA			845,88		845,88
022162 AC1	29/07/2024	FA 24-07-76	845,88		845,88
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat*-Animation Parc Carpentier - DEUX DEGRES			2 048,16		2 048,16
021353 AC1	26/06/2024	FA F2400032	2 048,16		2 048,16
M2023-025/Lot1/MS2/BDC1 Lot 1 - MS2 / Concertat*-Animation Parc Carpentier - GARLUCHE			5 346,30		5 346,30
021210 AC1	10/06/2024	FA 177	2 816,22		2 816,22
021356 AC2	26/06/2024	FA 182	2 530,08		2 530,08
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info travaux - DEUX DEGRES			792,79		792,79
020548 AC1	02/04/2024	FA F2400008	792,79		792,79
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info travaux - GARLUCHE			432,43		432,43
020537 AC1	03/04/2024	FA 164	432,43		432,43
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 France 2030 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - ALGA				2 641,32	2 641,32
023548 AC1	28/01/2025	FA 25-01-98		2 641,32	2 641,32
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 France 2030 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - DEUX DEGRES			1 198,69		1 780,37
022579 AC1	30/10/2024	FA F2400065	1 198,69		1 198,69
024807 AC2	30/05/2025	FA F2500039		1 780,37	1 780,37
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 France 2030 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - GARLUCHE			399,56	2 073,05	2 472,61
022553 AC1	29/10/2024	FA 196	399,56		399,56
023578 AC2	31/01/2025	FA 228		820,12	820,12
024802 AC3	28/05/2025	FA 261		1 252,93	1 252,93
M2023-025/Lot1/MS2/BDC4 France 2030 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 - ALGA				6 364,22	6 364,22
025409 AC1	29/07/2025	FA 25-07-116		6 364,22	6 364,22
M2023-025/Lot1/MS2/BDC4 France 2030 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 - DEUX				1 430,68	1 430,68
024815 AC1	30/05/2025	FA F2500035		1 430,68	1 430,68
M2023-025/Lot1/MS2/BDC4 France 2030 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 -				3 209,47	3 209,47
024803 AC1	28/05/2025	FA 259		1 669,13	1 669,13
026199 AC2	07/10/2025	FA 276		1 540,34	1 540,34
M2023-025/Lot1/MS2/BDC5 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Août à Déc. 2025 - DEUX				606,48	606,48

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
026721 AC1	19/11/2025	FA F2500071		606,48	606,48
M2023-025/Lot1/MS2/BDC5 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Août à Déc. 2025 - GARLUCHE				2 055,24	2 055,24
026203 AC1	20/10/2025	FA 285		1 949,98	1 949,98
026208 AC2	20/10/2025	FA 282		105,26	105,26
M2023-025/Lot1/MS2/BDC5 Lot 1 - MS2 / Période évènements ->Août à Déc. 2025 - SLOWFEST				1 200,00	1 200,00
026208 AC2	20/10/2025	FA 282		1 200,00	1 200,00
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX DEGRES			578,30		578,30
021076 AC1	28/05/2024	FA F2400023	578,30		578,30
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE			2 313,22		2 313,22
020973 AC1	02/05/2024	FA 168	2 313,22		2 313,22
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - travaux - DEUX DEGRES			2 734,90		2 734,90
020546 AC1	02/04/2024	FA F2400010	1 045,05		1 045,05
021062 AC2	28/05/2024	FA F2400027	424,81		424,81
021066 AC3	31/05/2024	FA F2400029	1 265,04		1 265,04
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - travaux - GARLUCHE			1 693,69		1 693,69
020496 AC1	31/03/2024	FA 161	1 693,69		1 693,69
M2023-025/Lot2/MS2/BDC2 France 2030 Lot 2 - MS2 / Concertat°-Programmat° Parc Carpentier -			3 313,20		3 313,20
021073 AC1	31/05/2024	FA 176	3 313,20		3 313,20
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - GARLUCHE			10,80		10,80
020977 AC1	21/05/2024	FA F2416017	10,80		10,80
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - VAYSSETTES ROMAIN			2 700,00		2 700,00
020977 AC1	21/05/2024	FA F2416017	2 700,00		2 700,00
M2023-025/Lot2/MS2/BDC4 Lot 2 - MS2 / Info travaux Ripiano-BDR-Matosinhos - GARLUCHE			2 530,08		2 530,08
020894 AC1	08/05/2024	FA 173	2 530,08		2 530,08
M2023-025/Lot2/MS2/BDC5 Lot 2 - MS2 / Façades Maison du Projet - DEUX DEGRES			616,28		616,28
022302 AC1	03/10/2024	FA F2400055	616,28		616,28
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 - AQUIMEDIA				694,80	694,80
023502 AC4	14/01/2025	FA F20250114-		694,80	694,80
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 - DEUX DEGRES			508,54	3 284,91	3 793,45
022582 AC1	30/10/2024	FA F2400068	508,54		508,54
023316 AC2	01/01/2025	FA F2400079		654,98	654,98
023531 AC3	27/01/2025	FA F2500003		510,05	510,05
023917 AC4	03/03/2025	FA F2500013		1 874,23	1 874,23
024813 AC5	30/05/2025	FA F2500040		245,65	245,65
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 - GARLUCHE			3 153,92	4 865,63	8 019,55
022550 AC1	29/10/2024	FA 195	1 743,55		1 743,55
022995 AC2	29/11/2024	FA 209	1 410,37		1 410,37
023312 AC3	01/01/2025	FA 221		223,34	223,34
023587 AC5	27/01/2025	FA 224		77,29	77,29
023580 AC6	31/01/2025	FA 230		2 368,08	2 368,08
024184 AC7	31/03/2025	FA 250		2 196,92	2 196,92
M2023-025/Lot2/MS2/BDC7 Lot 2 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 - DEUX DEGRES				1 760,83	1 760,83
024811 AC1	30/05/2025	FA F2500036		1 760,83	1 760,83
M2023-025/Lot2/MS2/BDC7 Lot 2 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 - GARLUCHE				5 472,86	5 472,86
024804 AC1	28/05/2025	FA 257		2 494,51	2 494,51
026202 AC2	07/10/2025	FA 279		2 978,35	2 978,35
M2023-025/Lot2/MS2/BDC7 Lot 2 - MS2 / Période évènements ->Juillet 2025 - ORIU/ELEKTRONS				1 260,00	1 260,00
025069 AC1	25/06/2025	Fa		1 260,00	1 260,00
M2023-025/Lot2/MS2/BDC8 Lot 2 - MS2 / Période évènements ->Août-Déc. 2025 - DEUX DEGRES				514,58	514,58
026723 AC1	19/11/2025	FA F2500073		514,58	514,58
M2023-038/BDC-SD-2 Suivi photographique et couverture évènements 11/23-11/27 - DELCOUR			3 900,44	3 215,52	7 115,96
020301 AC2	07/03/2024	FA 296_0324	770,00		770,00
020281 AC1	04/03/2024	FA 292_0324	385,00		385,00
021140 AC3	05/06/2024	FA 301_0624	772,70		772,70
021209 AC4	13/06/2024	FA 302_0624	386,93		386,93
021981 AC5	30/08/2024	FA 306-0824	790,79		790,79
022769 AC6	15/11/2024	FA 315-1124	795,02		795,02
023871 AC7	27/02/2025	FA 323_0225		793,87	793,87
024659 AC8	13/05/2025	FA 328-0525		800,03	800,03
025648 AC9	24/08/2025	FA 334_0825		807,73	807,73
026360 AC10	31/10/2025	FA 336_1025		813,89	813,89
M2023-038/BDC-SD-2 Suivi photographique et couverture évènements 11/23-11/27 - MAISON			38,50	30,80	69,30
020302 CONTRIBUT° S/AC2	07/03/2024	FA 296_0324	7,70		7,70
020284 CONTRIBUT° S/AC1	04/03/2024	FA 292_0324	3,85		3,85
021227 CONTRIBUT° S/AC3	05/06/2024	FA 301_0624	7,70		7,70
021229 CONTRIBUT° 1.1% S/AC4	13/06/2024	FA 302_0624	3,85		3,85
021987 CONTRIBUT° 1.1%/AC5	30/08/2024	FA 306-0824	7,70		7,70
022770 CONTRIBUT° 1.1%/AC6	15/11/2024	FA 315-1124	7,70		7,70
023877 COTRIBUT° 1.1%/AC7	27/02/2025	FA 323_0225		7,70	7,70
024662 CONTRIBUT° 1.1%/AC8	13/05/2025	FA 328_0525		7,70	7,70

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
025671 CONTRIBUT* 1.1%/AC9	24/08/2025	FA 334-0825		7,70	7,70
026365 CONTRIBUT* 1.1%/AC10	31/10/2025	FA 336_1025		7,70	7,70
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			4 526,18	7 135,01	11 661,19
19-02844 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			200,69		200,69
008066 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	20,24		20,24
008460 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	0,24		0,24
008922 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	180,21		180,21
20-03405 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			124,42		124,42
009581 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	35,33		35,33
010215 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	5,13		5,13
010561 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	48,68		48,68
011204 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/01/2020	35,28		35,28
21-04125 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE			375,33		375,33
011888 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21	48,57		48,57
012388 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	49,64		49,64
012941 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	52,53		52,53
013498 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	68,30		68,30
014342 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	156,29		156,29
22-05289 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE			508,46		508,46
014977 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	159,94		159,94
015685 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	183,13		183,13
016270 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	165,39		165,39
23-05973 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE			1 349,79		1 349,79
017126 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	909,30		909,30
017906 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	10,47		10,47
017932 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-3,83		-3,83
018355 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	120,18		120,18
018893 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	313,67		313,67
24-06926 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE			1 967,49		1 967,49
019924 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24	593,90		593,90
020628 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24	226,93		226,93
021615 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24	657,25		657,25
022516 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24	489,41		489,41
25-07923 Frais gestion bancaire 2025 - CAISSE D'EPARGNE				3 890,47	3 890,47
023696 COMM GESTION 4TR24	02/01/2025	FA 02/01/25		1 670,03	1 670,03
024383 COMM GESTION 1TR25	01/04/2025	FA 01/04/25		789,76	789,76
024409 ANNUL ERR MONTT 1TR25	01/04/2025	FA 01/04/25		-789,76	-789,76
024410 COMM GESTION 1TR25	01/04/2025	FA 01/04/25		789,49	789,49
025224 COMM GESTION 2TR25	01/07/2025	FA 01/07/25		662,94	662,94
026142 COMM GESTION 3TR25	01/10/2025	FA 01/10/25		768,01	768,01
25-07991 Indemnisation dommage pneu M Mme Gebal 11/01/25 - GEBAL				234,10	234,10
024008 INDEMNISATION DOMMAGE PNEU M Mme GEBAL 11/01/25	12/02/2025	11032025		234,10	234,10
25-08294 Réglement sinistre véhicule - MAAF ASSURANCES				3 010,44	3 010,44
024943 REGLEMENT REPARATION SINISTRE VEHICULE	13/02/2025	B9829191 -		3 010,44	3 010,44
H106 Contentieux			581,58		581,58
M2021-001 Lot 1/BDC20 Rédaction résiliation contrat OMA - FIDUCIAL LEGAL			581,58		581,58
018158 SOLDE	30/05/2023	FA202302736	581,58		581,58
H107 Autres			904 403,16	52 369,79	956 772,95
2021-065 BDL Lieu ressource réemploi MOE Aménagement locaux - SCOURZIC ORIANNE			11 203,92		11 203,92
015225 SOLDE	27/04/2022	FA 2022-	11 203,92		11 203,92
2024-051 [BDR] Travaux de réparation porte d'entrée façade principale - MIROITERIE SUD OUEST				3 972,59	3 972,59
023377 SOLDE	10/01/2025	FA		3 972,59	3 972,59
21-04864 BDL Lieu ressources réemploi Convention occupation-BM 21-27 - TRESOR PUBLIC (BM)			32 478,00	9 900,00	42 378,00
014095 REGUL LIGNE BUDG EXE 2021	13/10/2021	FA 2021-04067-	10 200,00		10 200,00
016693 EXERCICE 2022	29/11/2022	FA 10500-2022-	10 200,00		10 200,00
019106 EXERCICE 2023	18/10/2023	TIT 10500-2023-	1 600,00		1 600,00
020174 EXERCICE 2023 BIS	13/02/2024	TITRE 10500-	8 003,00		8 003,00
022465 REDEVANCE 09/24	30/09/2024	T 10500-2024-	825,00		825,00
022904 REDEVANCE 11/24	05/11/2024	TITRE 4170	825,00		825,00
022967 REDEVANCE 10/24	02/10/2024	FA	825,00		825,00
023522 REDEVANCE 12/24	01/01/2025	T10500-2024-		825,00	825,00
024135 REDEVANCE 01/25 ET 02/25	14/03/2025	FA		1 650,00	1 650,00
024225 REDEVANCE 03/25	13/03/2025	TITRE		825,00	825,00
024678 REDEVANCE 04/25	16/04/2025	TITRE 1312		825,00	825,00
024847 REDEVANCE 04/25	23/05/2025	TITRE		825,00	825,00
025078 REGUL DOUBLON SAISIE 04/25	23/05/2025	T 10500-2025-		-825,00	-825,00
025093 REDEVCE 05/25	07/05/2025	TIT 10500-2025-		825,00	825,00
025331 REDEVCE 07/25	07/07/2025	TIT 10500-2025-		825,00	825,00
025478 REDEVCE 06/25	23/06/2025	TITRE 10500		825,00	825,00
025668 RDVCE 08/25	06/08/2025	TITRE 2828		825,00	825,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
025865 RDVCE 09/25	09/09/2025	TITRE 10500-		825,00	825,00
026304 RDVCE 10/25	09/10/2025	TITRE 10500-		825,00	825,00
026801 RDVCE 11/25	10/11/2025	TITRE 10500-		825,00	825,00
21-04887 BDL Lieu ressources réemploi Pose coffret chantier raccordement sur disjoncteur			235,20		235,20
014096 REGUL LIGNE BUDG SOLDE	15/12/2021	FA 190175	235,20		235,20
21-04942 BDR Lieu ressources réemploi Conso Electricité - EDF			14 915,37	7 491,66	22 407,03
014373 ABO 11/12/21 - 31/01/22 & MES	09/01/2022	FA	498,96		498,96
014482 ABO + CONTRIBUT* 11/12/21 - 28/02/22	09/02/2022	FA	203,71		203,71
014641 ABO + CONTRIBUT* 11/03/22 - 31/03/22	09/03/2022	FA	187,76		187,76
014919 ABO 04/22 + CONTRIBUT* 08/03/22 - 08/04/22	11/04/2022	FA	203,71		203,71
015113 ABO 05/22 + CONTRIBUT* 08/04/22 - 07/05/22	10/05/2022	FA	198,40		198,40
015323 ABO 06/22 + CONTRIBUT* 08/05/22 - 07/06/22	09/06/2022	FA	40,85		40,85
015645 ABO 07/22 + CONTRIBUT* 08/06/22 - 07/07/22	09/07/2022	FA	376,09		376,09
015848 ABO 08/22 + CONTRIBUT* 08/07/22 - 07/08/22	09/08/2022	FA	227,09		227,09
016027 ABO 09/22 + CONTRIBUT* 08/08/22 - 07/09/22	09/09/2022	FA	222,32		222,32
016252 ABO 10/22 + CONTRIBUT* 08/09/22 - 07/10/22	09/10/2022	FA	221,33		221,33
016584 ABO 11/22 + CONTRIBUT* 08/10/22 - 07/11/22	09/11/2022	FA	230,72		230,72
016829 ABO 12/22 + CONTRIBUT* 08/11/22 - 07/12/22	09/12/2022	FA	302,53		302,53
017068 ABONN 01/23+CONTRIBUT* 08/12/22	10/01/2023	FA	317,03		317,03
017921 ABONN 04/23+CONTRIBUT*	09/04/2023	FA	348,24		348,24
017922 ABONN 05/23+CONTRIBUT*	09/05/2023	FA	235,15		235,15
017937 ABONN 02+03/23 +CONTRIBUT*	19/03/2023	FA	910,36		910,36
018234 ABONN 06/23+CONTRIBUT*	09/06/2023	FA	251,65		251,65
018387 ABONN 07/23+CONTRIBUT*	09/07/2023	FA	243,05		243,05
018512 ABONN 08/23+CONTRIBU*	09/08/2023	FA	283,22		283,22
018669 ABO 09/23 + CONTRIB*	09/09/2023	FA	246,67		246,67
019022 ABONN 10/23+CONTRIBUT*	10/10/2023	FA	263,38		263,38
019256 ABONN 11/23 + CONTRIBU*	09/11/2023	FA	316,86		316,86
019523 ABONNT 12/23	09/12/2023	FA	715,81		715,81
019768 ABONN 01/24	09/01/2024	FA	1 068,13		1 068,13
020371 ABONNT 02/24	09/02/2024	FA	1 352,30		1 352,30
020342 ABONNT 03/24	09/03/2024	FA	1 443,71		1 443,71
020634 ABONNT 04/24	09/04/2024	FA	663,43		663,43
020934 ABONNT 05/24	14/05/2024	FA	314,88		314,88
021237 ABONNT 06/24	09/06/2024	FA	308,12		308,12
021557 ABONNT 07/24	09/07/2024	FA	305,50		305,50
021878 ABONNT 08/24 +CONSO	09/08/2024	FA	286,40		286,40
022118 ABONN 09/24 + CONSO	10/09/2024	FA	291,61		291,61
022444 ABONN 10/24	09/10/2024	FA	157,55		157,55
022721 ABONN 11/24	09/11/2024	FA	683,20		683,20
023129 ABONN 12/24	10/12/2024	FA	995,65		995,65
023386 ABONNT 01/25	09/01/2025	FA		1 433,84	1 433,84
023742 ABONNT 02/25	11/02/2025	FA		1 388,04	1 388,04
024046 ABONNT 03/25	09/03/2025	FA		852,58	852,58
024398 ABONNT 04/25	09/04/2025	FA		640,81	640,81
024645 ABONNT 05/25	09/05/2025	FA		365,70	365,70
024939 ABONNT 06/25	11/06/2025	FA		326,64	326,64
025235 ABONNT 07/25	09/07/2025	FA		318,34	318,34
025542 ABONNT 08/25	09/08/2025	FA		338,53	338,53
025772 ABONNT 09/25	09/09/2025	FA		325,87	325,87
026064 ABONNT 10/25	09/10/2025	FA		356,29	356,29
026441 ABONNT 11/25	09/11/2025	FA		428,62	428,62
026977 ABONNT 12/25	09/12/2025	FA		716,40	716,40
22-05126 BDL Lieu ressources réemploi Conso Eau - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			172,02		172,02
014510 ABO + CONSO 10/12/21 - 31/12/21	17/01/2022	FA 1067010990	57,90		57,90
015131 ABO + CONSO 01/01/22 - 18/03/22	23/03/2022	FA 1068907990-	97,91		97,91
016152 ABO + CONSO 19/03/22 - 19/09/22	20/09/2022	AV 1074066661	-28,54		-28,54
017348 CONSO 09/22-12/22	08/02/2023	FA 1078079721	44,75		44,75
22-05240 BDL Travaux de démolition d'un mur en béton cellulaire - lieu ressources -			1 471,00		1 471,00
016286 SOLDE	08/09/2022	FA 2209002	1 471,00		1 471,00
22-05740 BDL - Mise à disposition de toilettes écologiques provisoires - RESILIENCIA			783,46		783,46
017304 SOLDE	01/01/2023	FA 2022-12-31-	783,46		783,46
22-05882 BDL Lieu ressources réemploi Changt serrure RM - GERAULT			180,00		180,00
017278 SOLDE	27/01/2023	FA F230156	180,00		180,00
23-06043 BDL - Mise à disposition de toilettes écologiques provisoires - mi 11.22 à 01.23 -			679,28		679,28
017370 AC1	01/01/2023	FA 2022-12-31-	389,61		389,61
017374 SOLDE	30/01/2023	FA 2023-01-30-	289,67		289,67
23-06109 BDR Assurance DO sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)			6 063,30		6 063,30
017482 ASS DO BDR	10/02/2023	GFG2023/S/00	6 063,30		6 063,30
23-06110 BDR Assurance TRC sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)			3 214,40		3 214,40

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
017483 ASS TRC BDR	10/02/2023	FA	2 729,30		2 729,30
018532 COMP	22/08/2023	FA	485,10		485,10
23-06113 BDR Nettoyage sanitaires - ANDY NETT 33			245,18		245,18
017828 SOLDE	25/04/2023	FA F2023-0202	245,18		245,18
23-06196 BDR Nettoyage sanitaires- complément de prestation - ANDY NETT 33			18,00		18,00
017829 SOLDE	25/04/2023	F2023-0202	18,00		18,00
23-06420 BDR - Dératisation du site - BUGS 3D			1 268,40		1 268,40
018407 AC1	26/07/2023	F33-23-00558	210,00		210,00
019053 AC2	25/10/2023	FA F33-23-	210,00		210,00
020181 AC3 02/24	25/01/2024	FA F33-24-	210,00		210,00
020476 AC4- DOUBLON AC3	25/01/2024	FA F33-24-	210,00		210,00
023200 AC4 - REGUL DOUBLON AC3	18/12/2024	FA F33-24-	-210,00		-210,00
023199 AC4 04/24	25/04/2024	FA F33-24-	210,00		210,00
023201 AC5 09/24	06/09/2024	FA F33-24-	214,20		214,20
023082 SOLDE 11/24	07/11/2024	FA F33-24-	214,20		214,20
23-06561 BDR Nettoyage fin de chantier - ANDY NETT 33			947,28		947,28
019737 SOLDE	01/01/2024	FA F2023-0734	947,28		947,28
23-06640 [BDR] travaux étanchéité toiture - AVENIR ETANCHEITE			1 032,00		1 032,00
019433 SOLDE	24/11/2023	FA 12504-23	1 032,00		1 032,00
23-06766 Plateaux repas - Déjeuners de travail 2023 - CLASS CROUTE			188,10		188,10
019576 AC1	15/12/2023	FA 2056-	188,10		188,10
24-06835 [BDR] Nettoyage fin de chantier - YULIYANOV KALOYAN			1 008,00		1 008,00
020153 SOLDE	19/02/2024	FA 33000	1 008,00		1 008,00
24-06886 [BDR] Petits-déjs de travail 2024 / Banque territoires (France 2030) - CLASS CROUTE			188,10		188,10
019949 AC1	30/01/2024	F2056-	188,10		188,10
24-06940 [BDR] Abonnement carte SIM alarme - SFR FIBRE			59,88	59,88	119,76
24-06940 Avance	01/02/2024		4,99		4,99
24-06940 Avance	01/02/2024		-4,99		-4,99
019797 ABONN 01/24	01/01/2024	FA B523-	4,99		4,99
020507 ABONN 02/24	28/01/2024	FA B524-			
020508 ABONN 03/24	28/02/2024	FA B524-	4,99		4,99
020743 ABONN 04/24	28/03/2024	FA B524-	4,99		4,99
020812 ABONN 05/24	28/04/2024	FA B524-	4,99		4,99
021406 ABONN 06/24	28/05/2024	FA B524-	4,99		4,99
021407 ABONN 07/24	28/06/2024	FA B524-	4,99		4,99
022072 ABONN 08/24	28/07/2024	FA B524-	4,99		4,99
022073 ABONN 09/24	28/08/2024	FA B524-	4,99		4,99
022250 ABONN 10/24	28/09/2024	FA B524-	9,98		9,98
022801 ABONN 11/24	28/10/2024	FA B524-	4,99		4,99
023214 ABONN 12/24	28/11/2024	FA B524-	4,99		4,99
023320 ABONN 01/25	01/01/2025	FA B524-		4,99	4,99
023618 ABONNT 02/25	28/01/2025	FA B525-		4,99	4,99
024045 ABONNT 03/25	28/02/2025	FA B525-		4,99	4,99
024511 ABONNT 04/25	28/03/2025	FA B525-		4,99	4,99
024667 ABONNT 05/25	28/04/2025	FA B525-		4,99	4,99
024981 ABONNT 06/25	28/05/2025	B525-		4,99	4,99
025312 ABONNT 07/25	28/06/2025	FA B525-		4,99	4,99
025465 ABONNT 08/25	28/07/2025	FA B525-		4,99	4,99
025965 ABONNT 09/25	28/08/2025	FA B525-		4,99	4,99
026191 ABONNT 10/25	28/09/2025	FA B525-		4,99	4,99
026440 ABONNT 11/25	28/10/2025	FA B525-		4,99	4,99
026993 ABONNT 12/25	28/11/2025	FA B525-		4,99	4,99
24-07089 [BDR] Toilettes sèches installation+collecte mensuelle 03/24 à 03/25 - RESILIENCIA				220,42	220,42
023343 AC1	03/01/2025	FA F202501-		220,42	220,42
24-07259 [BDR] Enlèvement des déchets - PENA ENVIRONNEMENT			574,80	1 416,10	1 990,90
022319 AC1- ERREUR SAISIE	01/09/2024	FA 17862	296,40		296,40
022320 AC2	30/09/2024	FA 17864	296,40		296,40
022445 AC1- REGUL ERREUR SAISIE	01/09/2024	FA 17862	-296,40		-296,40
022446 AC1	01/09/2024	FA17862	138,00		138,00
022654 AC3	31/10/2024	FA 19199	140,40		140,40
023376 AC4	01/01/2025	FA 21477		187,20	187,20
024174 AC5	01/03/2025	FA 24983		212,20	212,20
024344 AC6	31/03/2025	FA 25250		182,46	182,46
024833 AC7	01/05/2025	FA 27187		34,80	34,80
025072 AC8	01/06/2025	FA 28327		182,46	182,46
025275 AC9	30/06/2025	FA 29386		182,46	182,46
025624 AC10	01/08/2025	FA 30375		201,72	201,72
025750 AVOIR/AC10	31/08/2025	AV 30694		-166,92	-166,92
025843 AC11	31/08/2025	FA 31479		34,80	34,80
026097 AC12	30/09/2025	FA 32441		182,46	182,46

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
026700 AC13	31/10/2025	FA 33543		182,46	182,46
24-07271 [BDR] Remplacement panneau vitré cassé - MIROITERIE SUD OUEST			4 889,79		4 889,79
24-07271 Avance	12/06/2024		2 444,90		2 444,90
021358 AC1	25/06/2024	FA F24060152			
021848 SOLDE	07/08/2024	FA F24080032	2 444,89		2 444,89
24-07275 Plateaux-repas : Déjeuner-travail du 18-06-2024 - CLASS CROUTE			230,70		230,70
021330 AC1	18/06/2024	FA 2056-	230,70		230,70
24-07320 [BDR] Pose d'un rideau dans l'ERP - OFFICINE REEMPLOI			660,00		660,00
021465 SOLDE	04/07/2024	FA 2024070401	660,00		660,00
24-07324 [BDR] Nettoyage extérieur - MEDI-PEINTURE			2 280,00		2 280,00
021516 SOLDE	28/06/2024	FA 4488	2 280,00		2 280,00
24-07332 [BDR] Travaux d'enduit - LEAL CONCEPT&RENOVATION			1 176,00		1 176,00
021508 SOLDE	09/07/2024	FA 1113	1 176,00		1 176,00
24-07480 [BDR] Petit-déjeuner réunion prépa Copro du 20/09/2024 - CLASS CROUTE			76,90		76,90
022181 AC1	20/09/2024	FA F2056-	76,90		76,90
24-07727 [BDR] F&P prise chauffage ERP - ENELEC			2 650,32		2 650,32
023076 SOLDE	05/12/2024	FA 24-12-0552-	2 650,32		2 650,32
25-08122 [BDR] Permis modificatif - CANCAN				1 500,00	1 500,00
026276 25-139-107	24/10/2025	FA 25-139-107		1 500,00	1 500,00
25-08566 BDR Assurance DO COMP sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)				1 787,13	1 787,13
026071 ASS DO BDR COMP	07/10/2025	FA		1 787,13	1 787,13
M2017-025/BDC36 BDL Lieu ressources réemploi Diagnostic amiante - AED EXPERTISES			582,32		582,32
013951 AC1	01/01/2022	FA 218777	582,32		582,32
M2017-025/BDC38 BDL Lieu ressources réemploi Diagnostic amiante - location d'une échelle -			108,00		108,00
014480 SOLDE	14/02/2022	FA - 220429	108,00		108,00
M2019-023/BDC12 Reportage photographique - aménagements de la base du réemploi -			550,00		550,00
019592 AC1	01/01/2024	FA 287-1223	550,00		550,00
M2019-023/BDC12 Reportage photographique - aménagements de la base du réemploi - MAISON			5,50		5,50
019678 AC1	01/01/2024	FA 287-1223	5,50		5,50
M2019-030 Lot 2/BDC29 BDR Production et pose 2 Panneaux PC - MIPP			142,92		142,92
017244 BDC29 AC1	26/01/2023	FA 230187	120,00		120,00
021288 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC29	22,92		22,92
M2019-034 Lot 1/BDC73 BDL Dépôt permis réhabilitation 28av de la Somme Mérignac - MAGEO			1 656,84		1 656,84
015302 AC1	31/05/2022	FA FC17511	1 656,84		1 656,84
M2019-066/BDC20 Rédaction d'une charte des usagers de la Base du Réemploi - CANCAN			4 650,60		4 650,60
017408 AC1	27/02/2023	FA 23-019-012	3 963,60		3 963,60
020112 AC2 SOLDE	19/02/2024	FA 24-019-010	687,00		687,00
M2020-071bis/BDC 7 SOLEIL BDL Lieu ressources réemploi Sécurisation Bordelaise de literie -			2 412,38		2 412,38
015617 AC1-09/21-03/22	30/06/2022	FA	2 412,38		2 412,38
M2021-046 Lot 1/BDC21 BDL Lieu ressources réemploi Sécurisation - VPSITEX			1 734,92		1 734,92
016627 BDC21-AC1	17/11/2022	FA	1 533,97		1 533,97
017010 BDC21-AC2	01/01/2023	FA	200,95		200,95
M2021-046 Lot 2/BDC2 BDL Lieu ressources réemploi Gardiennage BDL - PROTEXIO/DRAKKAR			1 131,41		1 131,41
014097 AC1	30/09/2021	FA 21-5728	1 131,41		1 131,41
M2021-060 BDL Lieu ressources Réemploi Travaux déconstruction dépose repose faux-plafonds			4 559,50		4 559,50
014098 AC1	23/11/2021	FA 2111077	4 559,50		4 559,50
M2021-061 BDL Lieu ressources réemploi AMO Mise aux normes - BUREAU VERITAS SOLUTIONS			4 542,00		4 542,00
014308 AC1	24/01/2022	FA 22000550	3 210,00		3 210,00
014642 AC2	09/03/2022	FA 22002159	1 332,00		1 332,00
M2022-017 BDR_ Mission de CSPS niveau 3 - DEKRA			3 218,71		3 218,71
015539 AC1	23/06/2022	FA I6165469	588,24		588,24
016167 AC2	23/09/2022	FA I6318464	160,91		160,91
016465 AC3	24/10/2022	FA I6380985	157,25		157,25
016773 AC4	01/01/2023	FA I6418955	159,26		159,26
016960 AC5	01/01/2023	FA I6523955	157,68		157,68
017059 AC6	12/01/2023	FA I6553278	158,26		158,26
017481 AC7	27/02/2023	FA I6634318	159,11		159,11
017538 AC8	08/03/2023	FA I6655529	159,12		159,12
018144 AC9	09/06/2023	FA I6818705	160,85		160,85
019242 AC10	15/11/2023	FA I7111018	1 212,31		1 212,31
020400 SOLDE	11/03/2024	FA I7334493	145,72		145,72
M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			33 276,25	2 530,26	35 806,51
M2022-020/Lot 00 Avance	06/09/2022		2,70		2,70
M2022-020/Lot 00 Avance	06/09/2022		-2,70		-2,70
M2022-020/Lot 00 Restitution RG	06/09/2022			2 530,26	2 530,26
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	10 968,55		10 968,55
017176 REGUL TVA/AC1	01/01/2023	AC1			
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	4 859,87		4 859,87
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	68,64		68,64
020014 AC5 01/24	28/01/2024	FA 20230381	5 043,94		5 043,94

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
020460 AC6 01/24	25/03/2024	FA	32,90		32,90
020799 AC7 02/24	29/04/2024	FA	2,70		2,70
021956 AC8 SOLDE	28/08/2024	FA	12 299,65		12 299,65
M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			17 796,00		17 796,00
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	5 413,50		5 413,50
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	5 634,00		5 634,00
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	4 048,50		4 048,50
020013 AC4 12/23	01/01/2024	AC4	1 080,00		1 080,00
020460 AC6 01/24	25/03/2024	FA	1 080,00		1 080,00
020799 AC7 02/24	29/04/2024	FA	540,00		540,00
M2022-020/Lot 01 BDR Lot 01 Démolition - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			21 908,66	1 172,99	23 081,65
M2022-020/Lot 01 Restitution RG	26/09/2022			1 150,15	1 150,15
016099 AC1 09/22	20/09/2022	FA FD00338	5 661,33		5 661,33
018828 AC2 09/23	29/09/2023	FA FA01070	8 917,07		8 917,07
020447 AC3 02/24	25/03/2024	FA FA01038	7 330,26		7 330,26
022023 AC4 DGD	04/09/2024	DGD	22,84		22,84
023686 ANNUL AC4	04/09/2024	DGD	-22,84		-22,84
024297 AC4 DGD	18/03/2025	DGD		22,84	22,84
M2022-020/Lot 02 BDR Lot 02 Gros-oeuvre - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			47 685,89	2 466,38	50 152,27
M2022-020/Lot 02 Restitution RG	21/11/2022			2 466,38	2 466,38
017835 AC1- 04/23	27/04/2023	FD00364	10 533,83		10 533,83
017965 AC2- 04/23	27/04/2023	FD00365	15 296,36		15 296,36
018221 AC3 06/23	30/06/2023	FA FA01046	3 098,42		3 098,42
018220 AC4 06/23	30/06/2023	FA FD00371	6 817,57		6 817,57
019389 AC5 11/23	30/11/2023	FA FA01075	11 425,02		11 425,02
021517 AC6 DGD	03/07/2024	FA 1149	514,69		514,69
M2022-020/Lot 03 BDR Lot 03 Charpente - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			6 835,74	346,50	7 182,24
M2022-020/Lot 03 Restitution RG	20/10/2022			346,50	346,50
018398 AC1 06/23	11/07/2023	FA 2023071201	924,48		924,48
021494 SOLDE 02/24	08/07/2024	FA 2024070303	5 911,26		5 911,26
M2022-020/Lot 04 BDR Lot 04 Menuiserie extérieure ALU - BDL Lieu Ressources - travaux de			43 614,63	2 975,57	46 590,20
M2022-020/Lot 04 Restitution RG	18/01/2023			2 313,00	2 313,00
017334 AC1 12/22	01/01/2023	F-12.22.098-	12 172,48		12 172,48
018542 AC2 07/23	18/07/2023	FA F-07.23.065	17 911,01		17 911,01
019728 AC3 12/23	01/01/2024	FA F-12.23.138	3 539,66		3 539,66
020800 AC4 02/24	29/04/2024	FA	6 705,58		6 705,58
021414 AC5 02/24	31/05/2024	F0524052	3 285,90		3 285,90
027006 DGD 02/24	12/12/2025	DGD 02/24		662,57	662,57
M2022-020/Lot 05 BDR Lot 05 Plomberie-Sanitaires - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation			30 119,28	0,91	30 120,19
017335 01/23	25/01/2023	AC1-	8 955,11		8 955,11
018998 AC2 02/23	20/10/2023	FA 204516	13 369,44		13 369,44
018999 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205103	6 463,10		6 463,10
019124 AC4 09/23	02/11/2023	Lot 05_EA_04	844,87		844,87
020787 AC5 SOLDE 02/24	29/03/2024	FA	486,76		486,76
024831 AC6 DGD	02/06/2025	DGD		0,91	0,91
M2022-020/Lot 06 BDR Lot 06 Ventilation - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			51 244,26		51 244,26
016430 AC1- 10/22	28/10/2022	FA 203894	30 506,80		30 506,80
017587 AC2 01/23	31/01/2023	AC2	4 105,86		4 105,86
019000 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205104	9 610,92		9 610,92
020790 AC4 03/24	29/04/2024	FA	2 256,44		2 256,44
020792 SOLDE 03/24	29/04/2024	FA	4 764,24		4 764,24
M2022-020/Lot 07 BDR Lot 07 Electricité - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			148 852,18	29,43	148 881,61
016822 AC1-11/22	01/01/2023	FA 22.11.0321	25 820,29		25 820,29
017181 AC2-12/22	30/12/2022	FAC819838830	3 984,94		3 984,94
017226 AC3-01/23	30/01/2023	FA 304194378	15 774,56		15 774,56
018035 AC4 05/23	19/05/2023	FA 23050706	31 528,15		31 528,15
018952 AC5 09/23	30/09/2023	F23-09-0222	46 372,56		46 372,56
019443 AC6 11/23	29/11/2023	FA F23-11-0431-	10 987,58		10 987,58
019900 AC 7 01/24	28/01/2024	FA 24 01 0611	6 811,51		6 811,51
020793 AC8 SOLDE	29/04/2024	FA	7 572,59		7 572,59
022197 AC9 DGD	24/09/2024	DGD	29,42		29,42
023685 ANNUL AC9	24/09/2024	DGD	-29,42		-29,42
024083 AC9 DGD	01/03/2025	DGD		29,43	29,43
M2022-020/Lot 08 BDR Lot 08 Désenfumage - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un			14 194,49	732,00	14 926,49
M2022-020/Lot 08 Restitution RG	25/11/2022			732,00	732,00
016756 AC1	23/11/2022	FA F2202095	9 290,77		9 290,77
017553 AC2	31/01/2023	FA F2300207	2 579,71		2 579,71
018982 AC3 10/23	18/10/2023	FA F2302484	1 016,92		1 016,92
020446 AC4 02/24	31/01/2024	FA F2400195B	616,38		616,38
020515 AC5 SOLDE	31/03/2024	FA F2400642	690,71		690,71

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2022-020/Lot 09 BDR Lot 09 - Cloisons - doublage - plafond - isolation - BDL Lieu Ressources -			143 622,22	7 268,49	150 890,71
M2022-020/Lot 09 Restitution RG	21/11/2022			7 425,11	7 425,11
018034 AC1 05/23	30/05/2023	FA FD00369	15 211,51		15 211,51
018583 AC2 07/23	30/08/2023	FA FA01058	40 696,93		40 696,93
019075 AC3 10/23	30/10/2023	FA01077	55 952,86		55 952,86
019379 AC4 11/23	30/11/2023	FA01083	31 760,92		31 760,92
024295 AC5 DGD	18/03/2025	DGD		-156,62	-156,62
M2022-020/Lot 10 BDR Lot 10 Menuiseries intérieures - BDL Lieu Ressources - travaux de			65 867,34	3 417,24	69 284,58
M2022-020/Lot 10 Restitution RG	25/11/2022			3 417,24	3 417,24
018401 AC1 06/23	11/07/2023	FA 2023071201	19 546,90		19 546,90
019123 AC2 10/23	30/10/2023	FA 2023103001	6 566,08		6 566,08
019537 AC3 11/23	30/11/2023	FA 2023113001	17 685,36		17 685,36
020782 AC4 04/24	29/04/2024	FA 2024042901	13 524,60		13 524,60
021495 AC5 SOLDE	03/07/2024	FA 2024070301	8 544,40		8 544,40
M2022-020/Lot 11 BDR Lot 11 Cloisons - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local			44 762,17	2 181,91	46 944,08
M2022-020/Lot 11 Restitution RG	21/10/2022			2 181,91	2 181,91
017686 AC1 03/23	14/03/2023	FA 2023031401	7 344,80		7 344,80
018323 AC2 06/23	11/07/2023	FA2023071201	7 743,31		7 743,31
021496 02/24 SOLDE	26/06/2024	FA 2024062601	29 674,06		29 674,06
M2022-020/Lot 12 BDR Lot 12 Carrelage - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-			3 398,65		3 398,65
019555 AC1 11/23	01/01/2024	FA 4222	3 105,96		3 105,96
021498 AC2 SOLDE	28/06/2024	FA 4487	292,69		292,69
M2022-020/Lot 13 BDR Lot 13 Peinture de sol - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un			7 125,07		7 125,07
021497 SOLDE	28/06/2024	FA 4486	7 125,07		7 125,07
M2022-020/Lot 14 BDR Lot 14 Bandes signalétiques - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation			19 711,54	1 037,45	20 748,99
M2022-020/Lot 14 Restitution RG	25/11/2022			1 037,45	1 037,45
019465 AC1 11/23	24/11/2023	FA F230063	9 855,77		9 855,77
020794 AC2 02/24	23/04/2024	FA	9 855,77		9 855,77
M2022-023 BDL MOE Lieu ressource - SCOURZIC ORIANNE			58 646,98		58 646,98
016175 AC1	29/09/2022	FA 2022-	5 562,03		5 562,03
016448 AC2	28/10/2022	FA 2022-	5 763,31		5 763,31
016714 AC3	30/11/2022	FA 2022-	4 185,70		4 185,70
016921 AC4	01/01/2023	FA 2022-	4 153,02		4 153,02
017179 AC5	27/01/2023	FA 2023-	5 528,16		5 528,16
017479 AC6	02/03/2023	FA 2023-	4 190,42		4 190,42
017658 AC7	28/03/2023	FA 2023-	3 024,82		3 024,82
017827 AC8	25/04/2023	FA 2023-	3 909,12		3 909,12
018041 AC9	30/05/2023	FA 2023-	2 140,84		2 140,84
018197 AC10	27/06/2023	FA2023-000044	2 857,27		2 857,27
019005 AC11	20/10/2023	FA 2023-	4 717,20		4 717,20
019200 AC12	13/11/2023	FA 2023-	2 981,87		2 981,87
019580 AC13	11/12/2023	FA 2023-	2 988,02		2 988,02
020753 SOLDE	26/04/2024	FA 2024-	6 645,20		6 645,20
M2022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi - ENELEC			4 102,56		4 102,56
015192 SOLDE	24/05/2022	FA 22.05.0772-	4 102,56		4 102,56
M2022-038 BDL - Mission Contrôleur Technique - APAVE			9 960,00		9 960,00
016564 AC1	08/11/2022	FA	996,00		996,00
016642 AC2	22/11/2022	FA	1 992,00		1 992,00
016730 AC3	01/01/2023	FA	1 494,00		1 494,00
017283 AC4	07/02/2023	FA	1 494,00		1 494,00
017515 AC5	07/03/2023	F04023002546	1 494,00		1 494,00
017754 AC6	07/04/2023	FA	1 494,00		1 494,00
021558 AC7	15/07/2024	FA	996,00		996,00
M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage & rayons mi-lourds - ADLP BORDEAUX			10 295,41		10 295,41
018274 AC1 06/23	07/07/2023	FAFAC001381	10 295,41		10 295,41
M2023-026 BDR - Alarme anti-intrusion couplée incendie - PRELECT			7 199,34		7 199,34
021960 SOLDE	11/04/2024	FA 240136	7 199,34		7 199,34
M2024-013/Lot1/BDC11 [BDR] Estimation travaux mezzanine - CANCAN				962,88	962,88
023537 AC1 SOLDE	28/01/2025	FA 25-225-011		962,88	962,88
M2024-046 [BDR] Contrôle Technique - mission d'AMO achèvement travaux - APAVE ICF				900,00	900,00
023850 SOLDE	26/02/2025	FA		900,00	900,00
2 RECETTES			38 740 583,78	6 265 130,56	45 005 714,34
U SUBVENTIONS			419 076,62	62 478,00	481 554,62
U101 Subventions			419 076,62	62 478,00	481 554,62
22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME			6 598,62		6 598,62
22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE	07/02/2022	FA 07/02/22	1 323,00		1 323,00
23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE	07/02/2022	S07/02/22	5 275,62		5 275,62
22-05898 [BDR]Subvention ADEME 3R 2022 Lieu Ressource (part Travaux) - ADEME			62 478,00		62 478,00
22-39484 SUBV 3R 2022 LIEU RESSOURCE 20%	05/12/2022	AC1	12 495,60		12 495,60
23-40412 SUBV 3R 2022 BDR TRAVAUX	05/12/2022	S5/12/22	49 982,40		49 982,40

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
23-06645 Subvention FRANCE 2030 Reversement - BORDEAUX METROPOLE			350 000,00		350 000,00
23-44624 REVERSEMENT AC1 FRANCE 2030	01/11/2023	C0010 APF01	350 000,00		350 000,00
25-08332 [BDR] Subvention REGION NOUVELLE AQUITAINE Lieu Ressource (part Travaux) -				62 478,00	62 478,00
25-56112 SUBV BDR (PART TRAVAUX)	13/02/2025	AC1-SOLDE		62 478,00	62 478,00
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			38 180 000,00	6 000 000,00	44 180 000,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			1 070 000,00		1 070 000,00
19-02728 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			1 070 000,00		1 070 000,00
19-19054 AC1 PART* EQUILIBRE 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	70 000,00		70 000,00
21-32145 AC2 PART* EQUILIBRE 2021	30/09/2021	FA 30/09/21	200 000,00		200 000,00
22-37899 AC3 PART* EQUILIBRE 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	200 000,00		200 000,00
23-41135 AC5 PART* EQUILIBRE 2023	21/03/2023	FA 21/03/23	200 000,00		200 000,00
24-50622 AC6 PART* EQUILIBRE 2024	23/07/2024	FA 23/07/24	400 000,00		400 000,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage			37 110 000,00	6 000 000,00	43 110 000,00
19-02729 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			37 110 000,00	6 000 000,00	43 110 000,00
19-19055 AC1- CRF 2017 PART* 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	3 110 000,00		3 110 000,00
21-32144 AC2- CRF 2017 PART*2021	30/09/2021	FA 30/09/21	8 400 000,00		8 400 000,00
22-37900 AC3 PART* RO 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	8 200 000,00		8 200 000,00
23-41133 AC4 PART* RO 2023	21/03/2023	FA 21/03/23	9 200 000,00		9 200 000,00
24-50687 AC7 PART* RO 2024	06/08/2024	FA 6/08/24	8 200 000,00		8 200 000,00
25-57865 PART REMISE OUVRAGE	29/09/2025	AC8		6 000 000,00	6 000 000,00
X PRODUITS DIVERS			141 507,16	202 652,56	344 159,72
X101 Loyers			25 326,67	95 268,39	120 595,06
24-07507 Redevance + charges MAIF - MAIF			25 326,67	75 979,96	101 306,63
24-51403 REDVCE PROV CHARGES 1/09-31/12/24	02/10/2024	FA 2024-117-	25 326,66		25 326,66
24-51985 ECART DE RGT/ FA 2024-117	28/10/2024	FA 2024-117	0,01		0,01
24-53229 REDVCE 1/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-178-		18 994,99	18 994,99
25-54795 RDVCE 01/04/2025-30/06/2025	09/04/2025	FA 2025-35-		18 994,99	18 994,99
25-56301 RDVCE 01/07/2025-30/09/2025	27/06/2025	FA 2025-76-		18 994,99	18 994,99
25-57711 RDVCE 01/10/25-31/12/25	26/09/2025	FA 2025-111-		18 994,99	18 994,99
24-07524 Redevance + charges GAN - RAMIREZ DE RIBAS				4 468,80	4 468,80
24-51461 REDVCE PROV CHGES 1/09-31/12/24	02/10/2024	FA 2024-118-	11 652,77		11 652,77
24-52501 AVOIR/ REDVCE FA 2024-118	25/11/2024	FA 2024-159-	-11 652,77		-11 652,77
24-53095 REDVCE REMISEE 1/09-31/12/24	12/12/2024	FA 2024-160-		4 468,80	4 468,80
25-07819 Redevance + charges EURL SUD EST ASSURANCES - SUD-EST ASSURANCES				8 937,60	8 937,60
25-53352 RDVCE 1ER TRIM 2025	01/01/2025	FA 2024-179-	4 468,80		4 468,80
25-54820 RDVCE 01/04-30/06/2025	09/04/2025	FA 2025-34-		4 468,80	4 468,80
25-08293 Le Menphis : redevance de mars à mai 2025 - DIVERS				5 882,03	5 882,03
25-55867 MENPHIS REDEVANCE 03-05/2025	27/03/2025	FA270325		5 882,03	5 882,03
X102 Refacturations			39 301,96	55 609,24	94 911,20
20-03492 Refacturation des charges MDP Mérognac - LEON A VELO			23 477,30		23 477,30
20-23538 CHARGES 1TR2020	01/02/2020	FA 2020-26-	1 818,29		1 818,29
20-24218 CHARGE 2EME T 2020	01/04/2020	FA2020-34-	1 818,29		1 818,29
20-25239 CHARGES 4TR2019	12/06/2020	FA 2020 45	1 304,42		1 304,42
20-25558 CHARGES 3TR 2020	01/07/2020	FA 2020 53	1 818,29		1 818,29
20-26751 CHARGES 4TR 2020	01/10/2020	FA 2020 71	1 818,29		1 818,29
20-27050 REGULARISATION ELEC + EAU 2019	05/10/2020	FA2020-73-	4 028,93		4 028,93
21-28870 CHARGES 1ER TR 2021	01/01/2021	FA 2021 05	888,65		888,65
21-29521 CHARGES 2EME TR 2021	01/04/2021	FA 2021 21	1 818,29		1 818,29
21-29649 ECART DE REGLEMENT	11/03/2021	FA 2021-05-	-0,01		-0,01
21-29886 REFACTURATION 09/19-04/21	03/05/2021	FA 2021 26	1 517,04		1 517,04
22-35431 CHARGES 3TR21 ; 4TR21 ; 1TR22	24/03/2022	FA 2022-32-	5 454,86		5 454,86
22-35465 REFACTURATION 05/21-03/22	24/03/2022	FA 2022-34-	1 191,96		1 191,96
23-40870 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-	1 552,00		1 552,00
23-41426 ANNUL APPEL PROVISION	01/04/2023	FA 23-055	-1 552,00		-1 552,00
23-06097 Refacturation des charges MDP Mérognac 2023 - COMPAGNONS BATISSEURS			6 418,12		6 418,12
23-40871 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-	1 694,00		1 694,00
23-45104 APPEL A PROVISION 01/05/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-136	4 517,00		4 517,00
24-49241 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-42-	-6 211,00		-6 211,00
24-49242 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-42-	6 418,12		6 418,12
23-06202 Refacturation charges MDP Mérognac 2023-2024 - R-USE			351,70	3 312,00	3 663,70
23-41459 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-056	93,12		93,12
23-41938 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-075	93,12		93,12
23-45106 APPEL A PROVISION 01/08/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-137	155,20		155,20
24-49203 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-39-	-341,44		-341,44
24-49212 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-39-	351,70		351,70
24-51268 REDVCE PROV CHARGES 01/01-31/12/24	01/09/2024	FA 2024-114-		3 312,00	3 312,00
24-53238 REDVCE 01/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-177-		828,00	828,00
25-55439 AVOIR S/ RDVCE 1° TRIM 2025	15/05/2025	FA 2025-56-		-828,00	-828,00
23-06203 Refacturation charges MDP Mérognac 2023-2024 - OFFICINE REEMPLOI			2 754,97	10 512,00	13 266,97
23-41468 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-057	729,44		729,44

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119000-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
23-41939 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-076	729,44		729,44
23-45107 APPEL A PROVISION 01/08/23 - 31/12/23	01/12/2023	FA2023-138	1 215,73		1 215,73
24-49243 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-40-	-2 674,61		-2 674,61
24-49244 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-40-	2 754,97		2 754,97
24-51269 REDVCE PROV CHARGES 01/01-31/12/24	01/09/2024	FA 2024-113-		10 512,00	10 512,00
24-53239 REDVCE 01/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-176-		2 628,00	2 628,00
25-55438 AVOIR S/ 1° TRIM 2025	15/05/2025	FA 2025-55-		-2 628,00	-2 628,00
23-06204 Refacturation charges MDP Mérignac 2023 - M.D 85			2 754,97		2 754,97
23-41469 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-058	729,44		729,44
23-41940 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-077	729,44		729,44
23-45108 APPEL A PROVISION 01/05/23 à 31/12/23	01/12/2023	FA2023-139	1 215,73		1 215,73
24-49247 REGUL APPEL A PROV 2023	17/04/2024	FA 2024-41-	-2 674,61		-2 674,61
24-49249 CHARGES 2023	17/04/2024	FA 2024-41-	2 754,97		2 754,97
24-07381 [BDR]Refacturation 50% vitrerie BDR - EUROVIA GIRONDE			2 444,90		2 444,90
24-50671 REFACT 50% VITRERIE BDR	08/08/2024	FA 2024-101-	2 444,90		2 444,90
24-07387 [BDR] Redevance + charges MDP Mérignac 2024-2026 - COMPAGNONS BATISSEURS				22 550,24	22 550,24
24-50717 REDVCE PROV CHARGES 1/01-30/09/24	13/08/2024	FA 2024-102-		13 464,90	13 464,90
24-51251 REDVCE PROV CHARGES 1/10-31/12/24	01/10/2024	FA 2024-112-		4 488,30	4 488,30
24-53233 REDVCE 1/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-175-		4 488,30	4 488,30
25-55486 ANNUL PROV CHARGES 2024 (REG TVA)	21/05/2025	FA 25/02/25		-10 732,80	-10 732,80
25-55487 REGUL CHARGES 2024	25/02/2025	FA 25/02/25		9 343,44	9 343,44
25-55488 ANNUL REDVCE 1/01-31/03/25 (REG TVA)	01/01/2025	FA 2024-175		-4 488,30	-4 488,30
25-55490 REDEVCE 1/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-175		4 488,30	4 488,30
25-55491 REDEVCE 1/04-30/06/25	07/02/2025	FA 2025-57-		1 498,10	1 498,10
24-07507 Redevance + charges MAIF - MAIF			1 100,00	3 200,00	4 300,00
24-51403 REDVCE PROV CHARGES 1/09-31/12/24	02/10/2024	FA 2024-117-	1 100,00		1 100,00
24-53229 REDVCE 1/01-31/03/25	01/01/2025	FA 2024-178-		800,00	800,00
25-54795 RDVCE 01/04/2025-30/06/2025	09/04/2025	FA 2025-35-		800,00	800,00
25-56301 RDVCE 01/07/2025-30/09/2025	27/06/2025	FA 2025-76-		800,00	800,00
25-57711 RDVCE 01/10/25-31/12/25	26/09/2025	FA 2025-111-		800,00	800,00
24-07524 Redevance + charges GAN - RAMIREZ DE RIBAS				500,00	500,00
24-51461 REDVCE PROV CHGES 1/09-31/12/24	02/10/2024	FA 2024-118-	666,67		666,67
24-52501 AVOIR/ REDVCE FA 2024-118	25/11/2024	FA 2024-159-	-666,67		-666,67
24-53095 REDVCE REMISEE 1/09-31/12/24	12/12/2024	FA 2024-160-		500,00	500,00
25-07819 Redevance + charges EURL SUD EST ASSURANCES - SUD-EST ASSURANCES				1 000,00	1 000,00
25-53352 RDVCE 1ER TRIM 2025	01/01/2025	FA 2024-179-		500,00	500,00
25-54820 RDVCE 01/04-30/06/2025	09/04/2025	FA 2025-34-		500,00	500,00
25-08212 [BDR] Redevance charges BDR Merignac (et regul charges) - FLIP REEMPLOI				14 535,00	14 535,00
25-55494 REGUL CHARGES 2024	30/04/2025	FA 30/04/25		711,00	711,00
25-55495 REDEVCE 1S25	15/05/2025	FA 2025-54-		6 912,00	6 912,00
25-56304 REDEVCE T3 2025	27/06/2025	FA 2025-78-		3 456,00	3 456,00
25-57713 REDVCE T4 2025	26/09/2025	FA 2025-113-		3 456,00	3 456,00
24-53093 DG	01/01/2025	FA 2024-161-		5 000,00	5 000,00
25-56673 REMB DG	30/06/2025	FA 25/07/2025		-5 000,00	-5 000,00
25-54572 DG LE MENPHIS (51 RUE MIREPIN)	11/03/2025	FA 11/03/25		8 341,12	8 341,12
25-55896 REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE (MENPHIS)	27/03/2025	FA160625		-8 341,12	-8 341,12
X104 Autres produits Cessions Intérêts Pénalités				5 045,48	5 045,48
25-08720 Intérêts moratoires sur délais versement participation - BORDEAUX METROPOLE				5 045,48	5 045,48
25-59903 INT MOR DELAIS VERSMT PART RO 2025	22/12/2025	F22/12/25		5 045,48	5 045,48
X201 Produits financiers			76 878,53	46 729,45	123 607,98
19-02987 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			1 603,22		1 603,22
19-20550 REM" CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	683,83		683,83
19-20560 REGUL REM" CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	-50,00		-50,00
19-21760 REM" CPTE COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	969,39		969,39
19-23043 REGUL C/C REM CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	-633,83		-633,83
19-23044 REGUL C/C REM CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	633,83		633,83
20-03412 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			2 592,28		2 592,28
20-23256 REM" CPTE COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	767,28		767,28
20-24905 REM" CPTE COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	697,43		697,43
20-25713 REM" CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	599,11		599,11
20-27169 REM" CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	528,46		528,46
21-04133 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE			2 400,29		2 400,29
21-28552 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	368,19		368,19
21-29759 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	369,63		369,63
21-30910 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	245,68		245,68
21-32219 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	118,58		118,58
22-34293 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 462,19		1 462,19
22-34403 ANNUL INT CRED 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	-1 462,19		-1 462,19
22-34404 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 298,21		1 298,21
22-05279 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE			2 540,58		2 540,58

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
22-35805 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	1 243,18		1 243,18
22-36950 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	828,27		828,27
22-38163 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	469,13		469,13
23-05980 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE			3 642,50		3 642,50
23-40034 INTERETS CREDITEURS 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	848,05		848,05
23-41723 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	1 012,89		1 012,89
23-42927 INTERETS CREDITEURS 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	849,63		849,63
23-44029 INTERETS CREDITEURS 3TR3	06/10/2023	FA 06/10/23	931,93		931,93
24-06915 Rémunération compte courant 2024 - CAISSE D'EPARGNE			64 099,66		64 099,66
24-46770 INTERETS CREDITEURS 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24	11 178,65		11 178,65
24-48327 INTERETS CREDITEURS 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24	23 400,01		23 400,01
24-50298 INTERETS CREDITEURS 3TR24	01/07/2024	FA 01/07/24	6 373,06		6 373,06
24-51796 INTERETS CREDITEURS 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24	23 147,94		23 147,94
24-07258/1 Consignation Expropriation ASL Mirepin - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				88,45	88,45
25-55657 INT/ CONSIGN" ASL MIREPIN	29/05/2025	FA 25/05/25		88,45	88,45
25-07929 Rémunération compte courant 2025 - CAISSE D'EPARGNE				43 508,41	43 508,41
25-53863 INTERETS CREDITEURS 4TR24	02/01/2025	FA 02/01/25		19 502,32	19 502,32
25-54717 INTERETS CREDITEURS 1TR25	01/04/2025	FA 01/04/25		10 930,10	10 930,10
25-56360 INTERETS CREDITEURS 2TR25	01/07/2025	FA 01/07/25		7 892,25	7 892,25
25-58110 INTERETS CREDITEURS 3TR25	01/10/2025	FA 01/10/25		5 183,74	5 183,74
26-08731 Consignation Expropriation SCI PORTETS - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS				3 132,59	3 132,59
26-60008 INT/ DECONSIGNATION SCI PORTETS	29/12/2025	FA 29/12/25		3 132,59	3 132,59
3 AMORTISSEMENT			4 246 637,38		4 246 637,38
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			214 215,38		214 215,38
O200 Rembousement avances internes			214 215,38		214 215,38
18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB			176 957,32		176 957,32
19-17850 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		176 957,32		176 957,32
19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB			37 258,06		37 258,06
19-17848 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		37 258,06		37 258,06
Z TVA A REVERSER			4 032 422,00		4 032 422,00
Z102 TVA à reverser			4 032 422,00		4 032 422,00
19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)			513 785,00		513 785,00
19-21004 CA3 06/2019	01/06/2019		513 785,00		513 785,00
22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)			1 169 989,00		1 169 989,00
22-34283 CA3 12/2021	26/01/2022		1 169 989,00		1 169 989,00
22-05884 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3)			1 183 800,00		1 183 800,00
22-39451 CA3 11/2022	30/11/2022		1 183 800,00		1 183 800,00
24-06929 CA3 12/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3)			662 804,00		662 804,00
24-46794 CA3 12/2023	25/01/2024		662 804,00		662 804,00
24-07440 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3)			502 044,00		502 044,00
24-51161 CA3 08/2024	31/08/2024		502 044,00		502 044,00
4 MOBILISATION			214 215,38	2 500 000,00	2 714 215,38
M AVANCES				2 500 000,00	2 500 000,00
M100 Avances collectivités				2 500 000,00	2 500 000,00
25-08369 Avance de trésorerie C0010 - BORDEAUX METROPOLE				2 500 000,00	2 500 000,00
25-56674 AVCE 2025	05/06/2025	AC1		2 500 000,00	2 500 000,00
O AVANCES INTERNE			214 215,38		214 215,38
O100 Avances interne			214 215,38		214 215,38
18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB			176 957,32		176 957,32
18-17292 AVANCE C0001/C0010	12/12/2018	TF OUDJANE	1 374,00		1 374,00
19-17668 Avance inter OP C0003/C0010 (transfert terrain CF001)	28/12/2018		175 583,32		175 583,32
19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB			37 258,06		37 258,06
19-17742 REM 2018 PAYE PAR C0003	21/12/2018		37 258,06		37 258,06
SOLDE			11 375 890,03	-3 726 552,10	7 649 337,93

Marchés			Montant marché HT	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprises
M2020-037	Lot 1 - Assainissement	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	1 563 002,00 €	350	357	Dubreuilh
M2020-037	Lot 2 - Terrassements/voirie	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	529 587,80 €	350	350	Eiffage
M2020-037	Lot 3 - Réseaux divers/éclairage	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	237 020,00 €	150	150	Lacis
M2022-040	Lot 1 - VRD & Eclairage	Travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1	9 677 118,74 €	5 005	5 593	Eurovia-Moter
M2022-040	Lot 2 - Paysage	Travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1	2 613 678,00 €	1 155	1 155	ID Verde
