
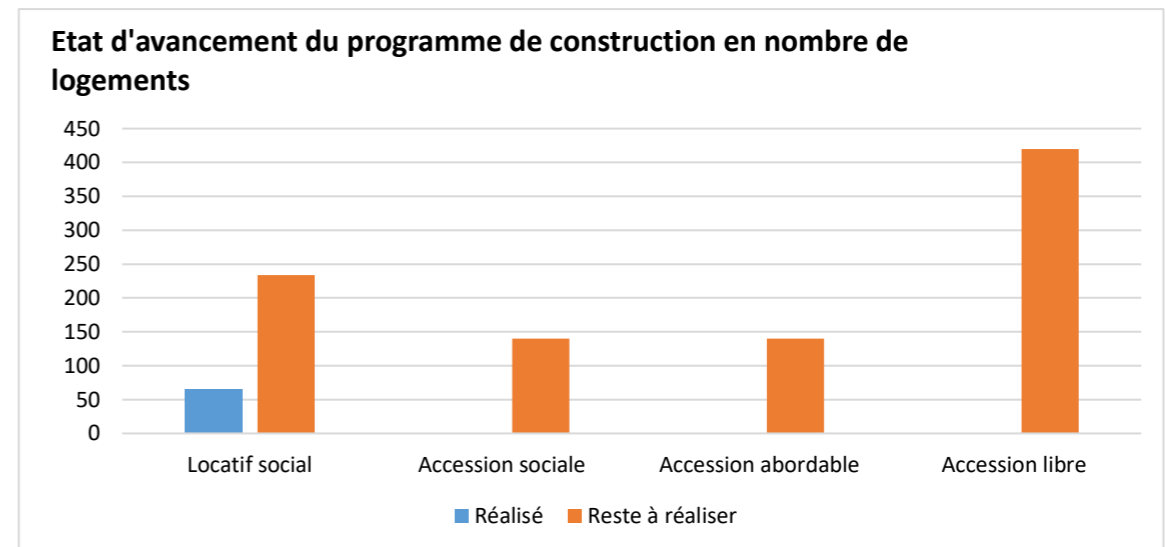


**Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SP et %\***

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%
Locatif social	25920	30%	1883	7%	24037	93%
Accession sociale	12096	14%	0	0%	12096	100%
Accession abordable	12096	14%	0	0%	12096	100%
Accession libre	36288	42%	0	0%	36288	100%
<b>Sous total logements</b>	<b>86 400</b>	<b>100%</b>	<b>1883</b>	<b>7%</b>	<b>84 517</b>	<b>98%</b>
<b>Commerces - services - activ</b>	<b>10 200</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10 200</b>	<b>100%</b>
<b>Total</b>	<b>96 600</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>96 600</b>	<b>100%</b>

\* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

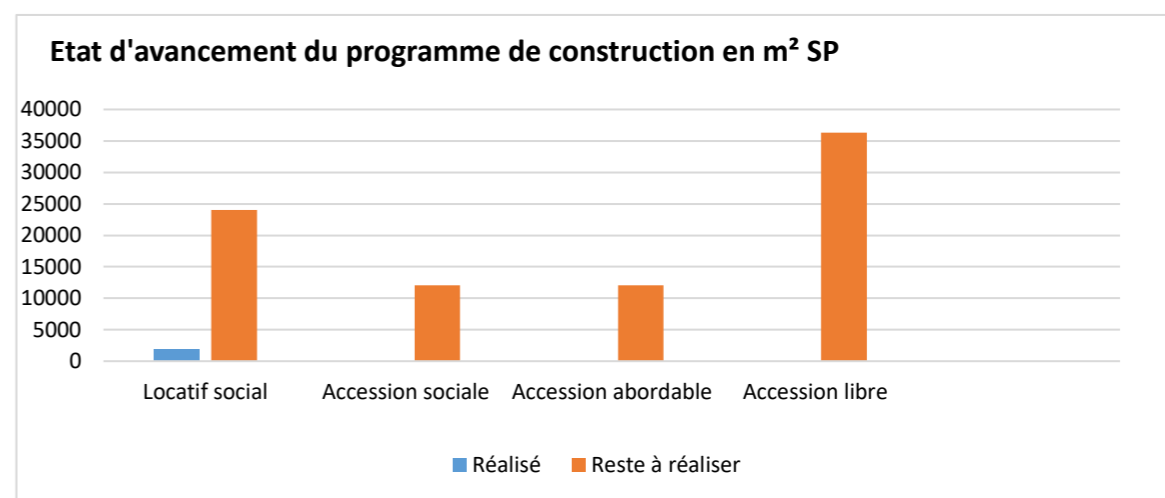

**Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements\***

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Locatif social	300		66	22%	234	78%
Accession sociale	140		0	0%	140	100%
Accession abordable	140		0	0%	140	100%
Accession libre	420		0	0%	420	100%
<b>Sous total logements</b>	<b>1000</b>		<b>66</b>	<b>22%</b>	<b>934</b>	<b>93%</b>

\* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières
