


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
	m² SP	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	8298	32%	0	0%	8298	100%
Accession sociale	4385	17%	0	0%	4385	100%
Accession abordable	5123	20%	0	0%	5123	100%
Accession libre	8099	31%	0	0%	8099	100%
Sous total logements	25 905		0	0%	25 905	100%
Commerces	0		0	0%	0	0%
Bureaux	0		0	0%	0	0%
Total	25 905		0	0%	25 905	100%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

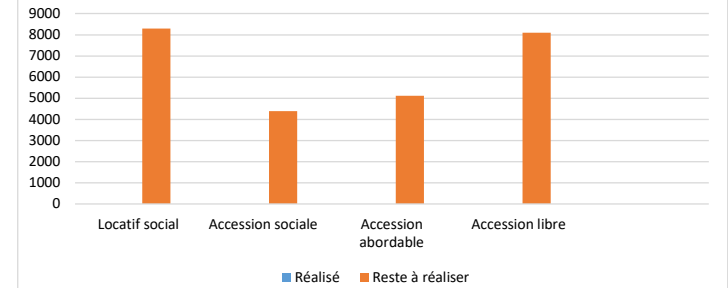

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2022	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	105	0	0%	105	100%
Accession sociale	56	0	0%	253	100%
Accession abordable	64	0	0%	253	100%
Accession libre	111	0	0%	268	100%
Sous total logements	336	0	0%	336	100%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

