


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	26151	35%	11 787	45%	14364	55%
PLAI	7590	7%	3 536	47%	4054	53%
PLUS	18561	25%	8 251	44%	10310	56%
PLS	-	-	-	-	-	-
Accession sociale	10359	14%	4 940	48%	5419	52%
Accession abordable	8458	11%	5 120	61%	3338	39%
Accession libre	29226	39%	13 509	46%	15717	54%
Sous total logements	74 193		35356	48%	38837	52%
Commerces et activités	32 863		3365	10%	29498	90%
Total	107 057		38721	36%	68335	64%

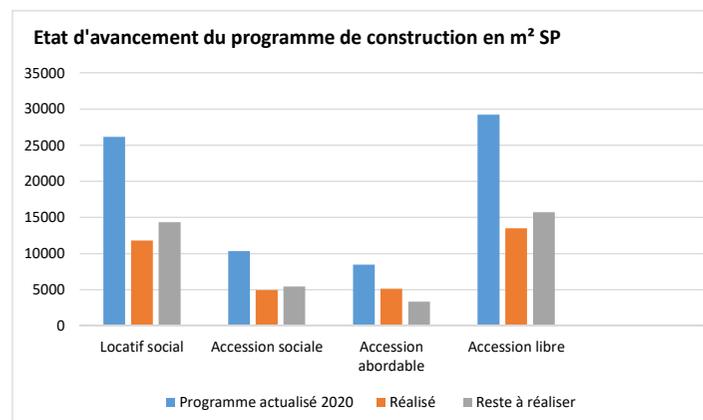

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	373		160	43%	213	57%
PLAI	115		48	42%	67	58%
PLUS	268		112	42%	156	58%
PLS	-		-	-	-	-
Accession sociale	145		68	47%	77	53%
Accession abordable	107		61	57%	45	43%
Accession libre	408		189	46%	219	54%
Sous total logements	1 032		478	46%	553	54%

