

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2024

MERIGNAC

Opération d'aménagement Marne

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

SOMMAIRE

1.	. Prés	sentation de l'opération d'aménagement	3				
	1.1	Préambule					
	1.2	Cadre juridique de l'intervention	3				
	1.3.	Périmètre de la concession d'aménagement	5				
	1.4.	Programme prévisionnel de construction	6				
	1.5.	Programme prévisionnel des espaces publics	7				
2.	Acti	ons menées au 31 décembre 2021	10				
	2.1 Pro	océdures administratives	10				
	2.2 Etu	udes	11				
	2.3.	Acquisitions foncières	12				
	2.4.	Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens	12				
	2.5.	Réalisation du programme des équipements publics	13				
	a) N	1aîtrise d'œuvre des espaces publics	14				
	2.7.	Accompagnement des projets immobiliers	16				
	2.8.	Communication / Animation / Médiation	26				
3.	. Acti	ons à mener en 2022	27				
	3.1.	Procédures administratives	27				
	3.2.	Etudes	27				
	3.3.	Acquisitions foncières	27				
	3.4	Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens	28				
	3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux	28				
	3.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières	28				
	3.7	Accompagnement des projets immobiliers	28				
	3.8	Communication / Animation / Médiation	29				
4	Ana	lyse financière	30				
	4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2020	30				
	4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2022	31				
	4.3	Participation du concédant	31				
	4.4	Trésorerie prévisionnelle et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	32				
	4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts	32				

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le secteur Mérignac Marne fait partie des sites métropolitains présentant un fort potentiel de mutation urbaine. Porte d'entrée de l'agglomération bordelaise, le site du projet urbain Mérignac Marne se structure autour d'un axe routier important et constitue un jalon entre l'aéroport et le centre historique de Bordeaux, en articulation avec la ligne A du tramway et sa future extension vers l'aéroport depuis l'arrêt « Quatre Chemins ».

Le projet a pour objectifs :

- faire émerger une identité urbaine attractive propre à ce site, qu'il s'agisse de son attractivité résidentielle, commerciale ou encore de la qualité d'usage des espaces publics, cohérente avec les quartiers et les équipements publics voisins ;
- intégrer la séquence urbaine « Marne » à une composition plus large, celle de l'axe routier et de transports en commun aéroport-Bordeaux centre, en articulation avec le secteur Chemin Long/Mérignac Soleil;
- développer une intensification urbaine de part et d'autre d'un futur axe de transports en commun en site propre, sur l'axe aéroport-Bordeaux centre ;
- développer une offre nouvelle de logements de qualité et abordables économiquement ;
- conforter la vocation et renforcer l'armature commerciale du quartier amenée à se renouveler, situé dans l'immédiate proximité de la zone commerciale de Mérignac Soleil ;
- réaliser des aménagements paysagers participant à la renaturation du site et sa mise en réseau avec le patrimoine paysager et végétal existant, permettant ainsi de réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain causé par l'imperméabilisation de surfaces et l'absence de traitement végétal.

La conception du projet urbain a été fondée sur la stratégie urbaine suivante :

- la mixité programmatique entre les commerces et l'habitat, avec pour objectif de créer des synergies autant dans leur fonctionnement, leur gestion, que leur rapport à l'espace extérieur;
- la prégnance de la nature en ville, avec pour objectif d'intégrer le paysage et la biodiversité, caractéristique importante de l'identité urbaine de Mérignac, dans l'espace urbain.

Par ailleurs ce projet porte une ambition qualitative forte en termes de logements, qui guidera la conception des bâtiments et constitue une thématique transversale du projet urbain.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n°2016-628 du 21 octobre 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- la qualification de l'opération d'aménagement Mérignac Marne d'intérêt métropolitain;
- la fixation du taux de la taxe d'aménagement majorée à 17%.

Par délibération n°2017/60 du 27 janvier 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative à l'opération Mérignac Marne ;
- la création de l'opération d'aménagement Mérignac Marne.

Par délibération n°2017/481 du 7 juillet 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le programme des équipements publics de l'opération Marne;
- la concession de la réalisation de l'opération d'aménagement à La Fab par contrat de prestations intégrées;
- les termes du contrat intitulé « traité de concession de l'opération d'aménagement Mérignac Marne »;

- les termes d'une convention d'avance de trésorerie à conclure avec La Fab pour un montant de 8 700 000 euros;
- la délégation du droit de préemption urbain à La Fab;
- le montant de la participation métropolitaine et le montant d'investissement total de Bordeaux Métropole d'un montant de 12 123 504 € TTC.

Le traité de concession « Opération d'aménagement Mérignac Marne » a été notifié à l'aménageur le 28 août 2017 pour une durée de 8 ans.

L'avenant 1 au traité de concession, en date du 24 janvier 2020 permet la gestion des trésoreries fusionnées des opérations d'aménagement de La Fab sur un compte unique.

L'avenant n°2 au traité de concession, en date du 6 août 2021, prévoit notamment une augmentation de la participation de Bordeaux Métropole à hauteur de 444 380 € HT, portant la participation de Bordeaux Métropole à 16 606 173 € HT.


L'avenant n°3 au traité de concession, en date du 11 janvier 2022 a pour objet de redéfinir le candencement du versement de la participation de Bordeaux Métropole.

Par délibération n°2023-529 du 1er décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé l'avenant 4 au Traité de concession prévoyant :

- l'augmentation de la durée de la concession d'aménagement à une durée de 13 ans,
- l'augmentation de la participation métropolitaine à hauteur de 18 732 046 € TTC.

Date de réception préfecture : 03/10/2025

1.3. Périmètre de la concession d'aménagement

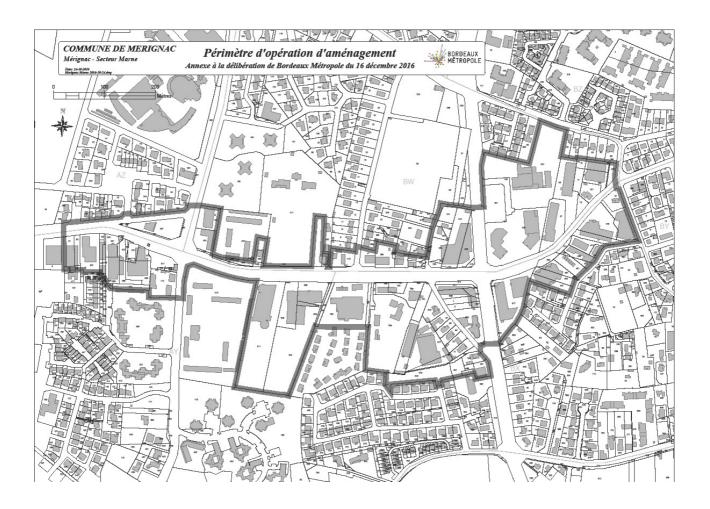


1.4. Programme prévisionnel de construction

L'aménagement doit permettre la réalisation d'un programme prévisionnel global des constructions d'environ 93 700 m² de surface plancher, comprenant initialement environ :

- 71 100 m² SDP de logements, soit environ de 1 100 logements répartis entre:
 - 35% de logements locatifs sociaux dont 30% de PLAI et 70% de PLUS;
 - 12 à 13 % de logements en accession sociale, dont le prix de vente s'élèvera entre 2 100 € et 2 400 € / m² SHAB TTC, parking compris;
 - o 12 à 13 % de logements en accession abordable, ce qui implique un prix d'objectif de commercialisation de 2 500 € / m² SHAB TTC, parking compris ;
 - 40 % de logements en accession libre.
- 22 600 m² SDP environ de commerces et activités.


Quant à la programmation logements, elle s'adapte aux évolutions de la conjoncture économique et des premiers retours d'expérience. Ainsi, en lieu et place du PSLA et de l'accession abordable, est désormais programmée de l'accession sociale en BRS.

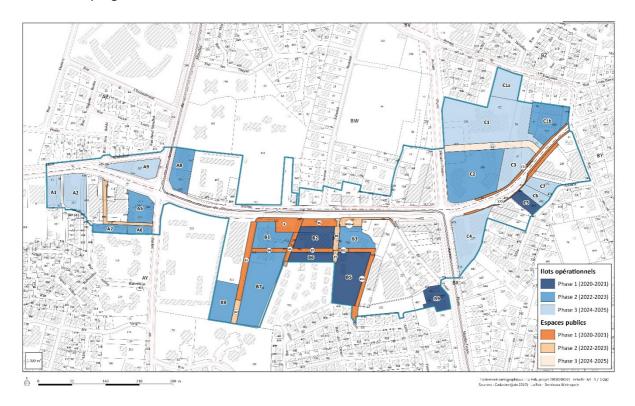

Date de réception préfecture : 03/10/2025

1.5. Programme prévisionnel des espaces publics

Au total, ce sont près de 18 500 m² d'espaces publics qui seront aménagés en accompagnement de l'arrivée des nouvelles constructions.

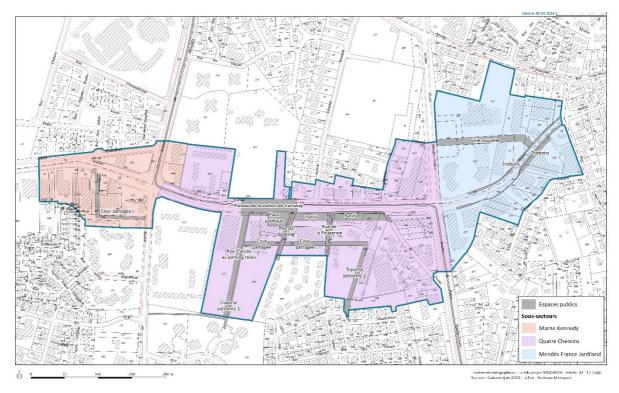

Ces espaces publics, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur, se répartissent de la manière suivante d'Ouest à l'Est:

Le secteur Kennedy/Leclerc

Il s'agit de créer une cour partagée dédiée à l'usage résidentiel, représentant une surface d'environ 1 580 m². Cette voie ne permet pas le stationnement, la chaussée en sens unique pour les voitures est partagée entre tous les modes et la vitesse de circulation est limitée dans le sens d'une priorité donnée aux modes doux (zone de rencontre).

Les plantations, privées comme publiques, seront prégnantes et couplées à des noues de gestion des eaux pluviales.

Le secteur Quatre Chemins

Le secteur Quatre Chemins, situé au niveau de la station de tramway Quatre Chemins, au sud de l'avenue de la Marne, a vocation à être restructuré sur une majeure partie de son linéaire entre la rue Mendès France et le carrefour Kennedy/Marne, ainsi que dans sa profondeur, jusqu'au tissu pavillonnaire. Dès lors, il est envisagé:

- la création d'un espace public de centralité à l'échelle du quartier, se composant d'une place publique, ainsi que d'un parvis recomposant la façade commerciale et paysagère sur l'avenue de la Marne;
- la création de cours partagées assurant la desserte résidentielle des futurs îlots ;

la requalification des voies existantes.

La place publique

L'objectif est de créer un espace fédérateur et d'animation à l'échelle du nouveau quartier généré par le projet. Il s'agit d'un lieu de vie arboré, accueillant des terrasses et qui sera conçu de façon à accueillir des évènements ponctuels. Son usage s'appuiera autant sur les flux de transports en commun existants (tramway, parc relais...) que sur les logements neufs et les futurs commerces.

Représentant une superficie d'environ 1 920 m², il s'agit d'un espace public à dominante minérale et présentant une trame arborée dense.

Le parvis de Quatre Chemins

En prolongement de la place, le parvis participe au renforcement de la dynamique commerciale sur le secteur 4 Chemins, mettant en scène une polarité commerciale de proximité. Cet espace permet également de mettre à distance les logements des nuisances sonores liées au trafic de l'avenue de la Marne.

D'une surface d'environ 1 880 m², cet espace accueille les fonctions suivantes : circulations piétonnes, cycles, desserte automobile et technique des commerces. La voie circulée constituera une zone de rencontre permettant le partage des fonctions.

L'ensemble se caractérise par un aménagement du sol continu, depuis le pied de façade jusqu'aux stationnements et aux cheminements doux, ainsi que la création d'espaces plantés le long de l'avenue de la Marne.

La requalification des voiries existantes : la rue du bowling, la rue du parc relais et la rue de la Fougeraie

Le fonctionnement du secteur Quatre Chemins est structuré autour de voies circulées qui se connectent au réseau primaire existant. Le rôle de ces voies secondaires est de desservir les îlots nouveaux et les lotissements du secteur.

Les fonctions y sont clairement hiérarchisées : chaussée partagée entre véhicules légers, véhicules techniques et de sécurité, cycles, stationnement et trottoirs piétons suffisamment dimensionnés et plantés.

Les cours partagées circulées et piétonnes

La zone de rencontre : au sud de la frange commerçante donnant sur l'avenue de la Marne, des espaces publics à caractère résidentiel sont créés, visant à favoriser leur appropriation par les habitants, tout en répondant aux besoins d'adressage, de desserte et de sécurité des nouveaux îlots. Ces voies ne permettent pas le stationnement des véhicules. La chaussée est partagée entre tous les modes, et la vitesse de circulation limitée dans le sens d'une priorité aux circulations douces.

Cet espace public représente une superficie d'environ 2 093 m².

Les voies mode doux : deux axes modes doux complètent le maillage tous modes du projet, prenant appui sur la structure paysagère et les chemins existants. Ainsi, la haie bocagère ancienne au sud du parking relais est support d'une liaison douce, formalisant un usage existant sur le site, permettant aux logements situés au sud de rejoindre l'avenue de la Marne et la station de tramway. Cet espace représente environ 580 m².

Par ailleurs, dans la continuité de la cour partagée, une voie dédiée aux modes doux est créée, d'une surface d'environ 1 120 m², en direction du lotissement situé au sud, permettant aux nouveaux logements et à ceux du lotissement de rejoindre l'avenue de la Marne et la station de tramway.

Le secteur Mendès France

Sur ce secteur, deux types d'aménagements seront réalisés :

La voie nouvelle reliant l'avenue de la Marne et l'avenue Mendès France

Le développement de nouvelles fonctions mixtes de logements et commerces sur ce secteur nécessite la création d'un nouvel axe de desserte publique. En effet, le parking de Jardiland servant d'ores et déjà de circulation informelle entre les deux avenues, ce besoin sera mécaniquement augmenté par les logements et commerces créés.

Cet espace public, d'une superficie d'environ 2790 m², se composera d'une voie à double sens, d'une bande cyclable à double sens ainsi que d'espaces piétons situés de part et d'autre.

Les trottoirs de l'avenue de la Marne

Il s'agit d'optimiser les circulations piétonnes sur les trottoirs sud et nord requalifiés, demeurant dans leur emprise actuelle.

En effet, le cheminement piéton est aujourd'hui mal aisé et non conforme en termes d'accessibilité.



Le jardin des essais

Sur une partie de parcelle propriété de Bordeaux Métropole, il s'agit de réaliser des aménagements paysagers qui viendront pré figurer les différentes configurations de plantations du projet urbain. Cet espace public, d'une superficie d'environ 4 500 m², est dédié aux futurs habitants du quartier, riverains, et pourra s'intégrer partiellement aux aménagements extérieurs du futur projet immobilier qui sera développé sur la parcelle. Une partie des plantations sera maintenue sur site à terme et bénéficieront aux futurs habitants de l'îlot B8. Par ailleurs, une partie des arbustes ont été transplantés dans la cour partagée 2.

2. Actions menées au 31 décembre 2024

2.1 Procédures administratives

a) Procédure de Déclaration d'utilité publique

Le Conseil de Bordeaux Métropole, autorité concédante, a délibéré sur le lancement de la procédure de DUP à l'occasion du Conseil Métropolitain du 27 avril 2018.

Par courrier en date du 19 février 2019, réceptionné par les services compétents le 20 février 2019, La Fab a sollicité, auprès de Monsieur le Préfet de la Gironde, la mise en œuvre d'une enquête publique conjointe ayant pour objet la Déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Marne, et la détermination des parcelles à déclarer cessibles. Ce courrier visait également à faire procéder à la saisine de l'Autorité Environnementale compétente, la MRAe.

Par arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2019, modifié par arrêté en date du 25 septembre 2019, le préfet a ouvert les enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'utilité publique et parcellaire, relatives à la réalisation, par La Fabrique de Bordeaux Métropole, de l'opération d'aménagement Marne sur la commune de Mérignac.

Les enquêtes publiques conjointes visant à informer le public et à recueillir ses avis et observations sur le projet, en vue d'autoriser l'opération au titre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement, se sont déroulées du 5 novembre au 10 décembre 2019 inclus.

Le commissaire enquêteur a remis les conclusions de son enquête, le 5 janvier 2020, concluant à l'utilité publique de l'opération, auxquelles La Fab a produit une réponse.

Par arrêté du Président de Bordeaux Métropole en date du 16 juin 2020, la Métropole s'est prononcée par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération d'aménagement urbain Mérignac Marne.

La Fab a ensuite saisi la préfète de la Gironde qui a pris l'arrêté de déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement Mérignac Marne le 6 août 2020.

La Fab a obtenu un arrêté de cessibilité, délivré le 23 janvier 2024 et une ordonnance d'expropriation en suivant, en date du 24 mai 2024 portant sur les fonciers suivants : emprises foncières de la voie nouvelle Kennedy Somme, de la voie nouvelle sur le secteur Jardiland ainsi que la Bouquinerie (futur îlot A8).

Date de réception préfecture : 03/10/2025

2.2 Etudes

a) Mission maîtrise d'œuvre urbaine

L'agence Duplantier est mandataire de l'équipe, Martin Duplantier étant architecte urbaniste de l'opération et Le Sommer, le bureau d'études environnement développement durable. L'agence Debarre réalise l'accompagnement paysager des projets et Cab Ingénierie est BET VRD.

L'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine a été sollicitée sur la poursuite de réalisation de fiches de lot ou faisabilités urbaines : secteur Jardiland, îlot A8 et îlot A9.

Par ailleurs l'équipe est sollicitée sur l'accompagnement des projets immobiliers, plus particulièrement en 2024 sur la mise au point du PC de l'îlot B8, le suivi de l'îlot B5.

b) Programmation des rez-de-chaussée d'activités

L'équipe Bérénice/Sens de la Ville/Ville Ouverte/Ville Envie est AMO sur les opérations Marne/Soleil.

Bérénice a été sollicité pour un premier échange sur les commerçants preneurs des rdc de l'îlot B1.

Dans le cadre des études de programmation de l'îlot A9, en vue de la création d'un pôle EES, la Fab a confié à La Foncière Solidaire et Atis une étude de marché et de faisabilité économique d'exploitation, préalable à tout engagement d'une consultation ou passation d'un contrat visant à la réalisation et la gestion de l'ensemble immobilier, par Bordeaux Métropole.

c) <u>Mission d'OPC-IC</u> (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier)

Une mission d'OPC-IC (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier) a été lancée par La Fab, afin d'assurer la coordination des travaux réalisés, dès 2019, sous maîtrise d'ouvrage de La Fab, des opérateurs immobiliers et des concessionnaires, et a retenu, au premier trimestre 2019, le bureau d'études SETEC.

SETEC poursuit la coordination et le suivi des différents intervenants dans le cadre des travaux de construction des premiers îlots de l'opération d'aménagement, notamment sur le secteur Quatre Chemins.

d) Mission de maîtrise d'œuvre démolition

La Fab a retenu début 2021 un maître d'œuvre, le groupement Cab Ingéniérie et Cetab, en charge des démolitions à réaliser sur l'opération d'aménagement Marne.

En 2024, aucune démolition n'est intervenue.

e) Etudes techniques et environnementales

Une étude sur la gestion des biodéchets a été confiée au bureau d'études Elcimaï, permettant d'affiner le gisement disponible à l'échelle du secteur Marne Soleil élargie ainsi que d'évaluer la faisabilité opérationnelle du développement d'une méthanisation des bio déchets à l'échelle des projets urbains Marne Soleil.

Par ailleurs, une expérimentation sur les mobilités actives, confiée à Viraj, a été finalisée (cf. 2.8 b).

f) Etudes juridiques

Aucune expertise juridique n'a été menée en 2024.

2.3. Acquisitions foncières

a) Foncier espaces publics

La Fab a réalisé l'acquisition, auprès de l'opérateur Fayat Immobilier, la parcelle cadastrée section AY n°175, en vue de la réalisation de la future place Gabriela Mistral, pour un montant de 41 832 €TTC, soit pour un montant de 30€HT/m².

b) Foncier Ilot A8

La Fab a réalisé l'acquisition amiable du foncier de l'ancien local commercial Eco cuisine, situé sur l'emprise du futur îlot A8, après son dépôt de bilan, le 31 janvier 2024, pour un montant de 1 544 545 € TTC. Une indemnité de réemploi a également été versée pour un montant de 155 454€.

2.4. Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

a) Expertises immobilières

Aucune expertise immobilière n'a été réalisée en 2024.

b) Assistance juridique

Des missions d'assistance juridique ont été lancées et réalisées dans le cadre de :


- la saisine du juge de l'expropriation pour la réalisation d'acquisitions foncières sur la voie nouvelle secteur Somme-Kennedy,
- l'assistance à la négociation avec le propriétaire de la Bouquinerie.

c) Gestion des biens

Des actions de gestion des biens ont été menées, en vue de la sécurisation de l'ex local Eco cuisine, mais également des travaux de réfection du faux plafond et de nettoyage de sa toiture en vue d'en permettre l'occupation temporaire par France Travail.

d) Mise en état et libération des sols

Aucune nouvelle action n'a été entrepris en 2023.

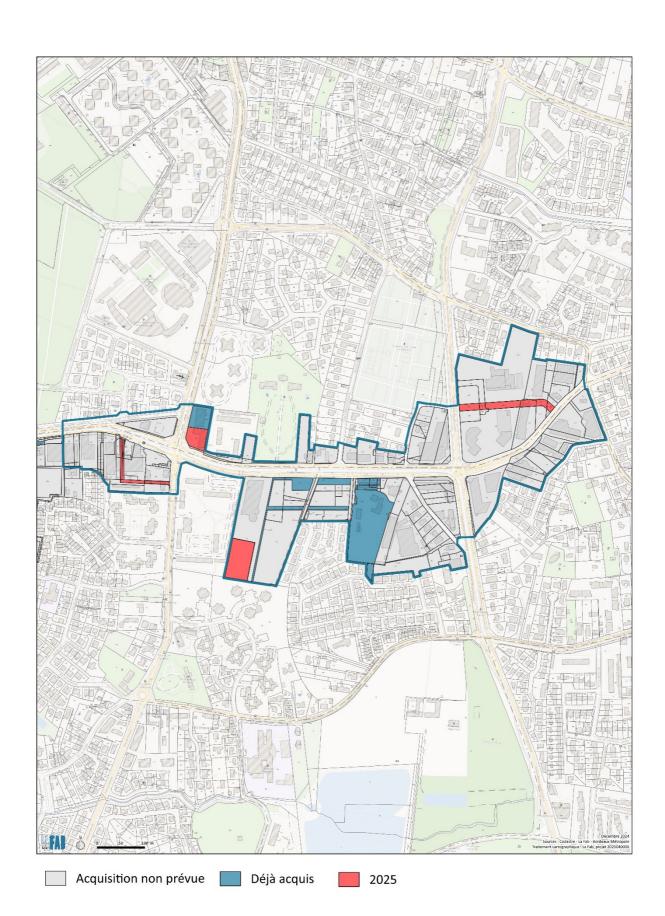

2.5. Réalisation du programme des équipements publics

a) Maîtrise d'œuvre des espaces publics

L'équipe de maîtrise d'œuvre des espaces publics a poursuivi sa mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux réseaux de la phase 2.

L'équipe de maîtrise d'œuvre a réalisé la reprise des études en vue de la réalisation des trottoirs de l'avenue de la Marne secteur Mendès France (de l'AVP jusqu'au PRO), suite à la demande des services de Bordeaux Métropole d'élargissement de la piste cyclable, afin qu'elle puisse s'inscrire dans le réseau REVE. Ces modifications d'aménagement seront génératrices d'un surcoût pour la réalisation desdits aménagements.

b) Travaux phase 2

Les entreprises suivantes ont été retenues, au premier trimestre 2021, pour réaliser la phase 2 des travaux d'aménagement de Mérignac Marne :

Lot VRD: Eiffage Route Lot Espaces verts : Cap Vert Lot fontainerie: Terideal Lot bétons : Sols Aquitaine

Les travaux VRD de viabilisation du secteur Quatre chemins ont commencé en août 2021 et se sont poursuivis en 2022 et 2023.

Le parvis phase 1, situé devant l'îlot B2, a été livré au mois de mars 2023, avec une reprise des végétaux à réaliser à l'hiver 2023- 2024, pour une remise d'ouvrage complète réalisée en 2024. L'aménagement du trottoir situé entre le quick et la rue de Pessac a été également réalisé fin 2023.



Parvis 1 – Crédit photo La Fab



Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Les travaux d'aménagement de la place Gabriela Mistral ont été engagés en juin 2024, pour une livraison en avril 2025.

Les travaux d'aménagement de la cour partagée ont finalement été engagés, après accord de Domofrance de financer les travaux de reprise des ouvrages dégradés par ses entreprises lors de son occupation de cet espace, en septembre 2024, en vue d'une livraison en avril 2025.

La Fab a également engagé la réalisation des travaux de la rue du Plantey Est ou Ouest (ex rue du Bowling et ex rue de la Fougeraie).



Travaux de la place Gabriela Mistral – Crédit photo La Fab



Travaux de la cour partagée 1 – Crédit photo La Fab

2.6. Commercialisation des terrains : cessions foncières

a) Ilot B3

La Fab a réalisé la passation d'une promesse de vente à l'opérateur Lamotte du foncier de l'îlot B3, le

La Fab a ensuite cédé, le 21 novembre 2024, l'emprise foncière de l'îlot B3 à l'opérateur Lamotte, libre de toute construction, préalablement au démarrage des travaux de l'îlot, pour un montant de 1 941 697 €.

2.7. Accompagnement des projets immobiliers

La Fab, en qualité d'aménageur, accompagne les opérateurs dans l'élaboration des différents permis de construire. Pour accomplir cette mission, La Fab a mobilisé l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine dont l'architecte urbaniste de l'opération, Martin Duplantier, dans le cadre d'ateliers de mise au point des projets immobiliers.

a) Ilot B2/B6

L'îlot B2/B6 se situe sur le foncier de l'ancien bowling et du foncier appartenant à Bordeaux Métropole où sont installées les stations de lavage Speedy/Speed'o, soit les parcelles BX 708, 796 et 797.

Le groupement travaillant sur la mise au point de l'îlot B2/B6 se compose :

- Des agences Martin Duplantier (architecte) et Anouk Debarre (paysagiste) pour la maîtrise d'œuvre;
- Du bailleur Domofrance qui s'est rendu propriétaire de la majeure partie du foncier, soit le terrain du bowling;
- Du promoteur BNP Paribas Immobilier.

La programmation représente au total 97 logements et 1 000 m² SP de commerces.

Le programme logements se décompose comme suit : 7254 m² SDP dont 41 logements en accession libre, 10 logements en accession abordable, 12 logements en accession sociale et 34 logements locatifs conventionnés.

Les permis de construire ont été obtenus le 15 juin 2018.

En 2020, La Fab a réalisé les travaux de libération (démolition et dépollution) de l'ex foncier speedy en vue de sa cession à Domofrance en juillet 2020. Les travaux de construction de l'îlot ont démarré à l'été 2020 et se sont poursuivis jusqu'en 2024. Le bâtiment de l'îlot B2, réalisé sous maîtrise d'ouvrage de BNPI, a été livré en février 2023. Les bâtiments de logement social et d'accession sociale ont été livrés par Domofrance entre janvier et juin 2024.

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025







Ilot B2 - Crédit Photo La Fab



Ilot B6 - Crédit Photo La Fab

b) Ilot B5

Le foncier de l'îlot B5 formé par la parcelle BX 793 a été acquis auprès du Conseil départemental de la Gironde à Bordeaux le 13 juillet 2021.

Le groupement d'opérateurs initial en charge de la réalisation de ces îlots est constitué de :

- Gironde Habitat pour la réalisation de la programmation en accession sociale et logement locatif social;
- l'opérateur Lamotte pour la réalisation des logements en accession libre et abordable.

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

La programmation initiale de l'îlot B5 était de 83 logements dont :

- 41 en locatif social, soit 3112 m² SDP,
- 27 en accession sociale, soit 2039 m² SDP,
- 5 en accession abordable, soit 433 m² SDP,
- 10 en accession libre, soit 759 m² SDP.

Pour la réalisation de l'îlot B5, à l'issue d'une consultation, Gironde Habitat a désigné un groupement de maîtrise d'œuvre représenté par l'agence d'architecture Patrick Arotcharen, en équipe avec la paysagiste Sabine Haristoy, en septembre 2017.

Des ateliers de mise au point du projet immobilier de l'îlot B5 se sont tenus en 2018, la mise au point du projet ayant été mise en suspens au dernier trimestre 2018 par les opérateurs.

La mise au point du projet a été arrêtée en 2020 suite à la décision de la ville de ne pas assurer le bouclage de l'espace public, soit la cour partagée 3, vers le lotissement de Fourchateau, au Sud. Un travail d'études conjoint a été mené par La Fab et Gironde Habitat pour reprendre les modalités de desserte pour la collecte des déchets ménagers ainsi que la défense incendie.

Suite à ces études, le travail de mise au point du permis de construire a repris fin 2020. Le permis de construire a été déposé en mai 2021 par Gironde Habitat et obtenu le 30 décembre 2021. Quant au permis déposé par Lamotte en avril 2021, il a été rejeté et déposé de nouveau en décembre 2021.

Fin 2022, l'opérateur Lamotte a indiqué ne pas être en mesure d'équilibrer son bilan à l'échelle des îlots B3 et B5, pour réaliser une part d'accession abordable et libre sur l'îlot B5. Il a ainsi proposé le transfert de son permis de construire à Gironde Habitat. Après avoir étudié cette proposition, Gironde Habitat en a accepté le principe et adressé fin 2023 une proposition de programmation modifiée à La Fab ainsi qu'une offre d'acquisition du foncier initialement fléché vers une vente à l'opérateur Lamotte. Le programme de l'îlot B3 est également modifié par voie de conséquence.

Le nouveau programme de l'îlot B5 est ainsi adapté comme suit :

- 56 logements LLS représentant 4304 m² SDP,
- 27 logements en BRS représentant 2039 m² SDP.

Par ailleurs, après plusieurs appels d'offre travaux infructueux, Gironde Habitat a sollicité La Fab en 2023, pour définir quelles pourraient être les adaptations du projet architectural, en vue du lancement d'un nouvel appel d'offres qui devait être lancé en 2024. Au regard du délai de modification du DCE, le nouvel appel d'offres ne sera lancé qu'en 2025.

Date de réception préfecture : 03/10/2025



Ilot B5 - Perspective agence Arrotcharen

c) Ilot B3

Le foncier de l'îlot B3 est constitué en partie de la parcelle BX 793 acquise auprès du Conseil Départemental et pour le reste, d'une partie des parcelles BX 700, 711 et 697, sur lesquelles se situait un local commercial occupé par le restaurant Le Fils du Boucher, démoli depuis sous maîtrise d'ouvrage de La Fab.

La programmation de l'îlot B3 est de 52 logements, soit 4061 m² SDP, et 776 m² de commerces.

La programmation logement initiale était la suivante : 33 % d'accession abordable, soit 17 logements et 67% en accession libre, soit 35 logements.

A l'issue d'une consultation d'architectes lancée en 2019 en partenariat par La Fab et Lamotte, c'est l'atelier Martel qui a été retenu en 14 juin 2019, en équipe avec la paysagiste Sabine Haristoy. La mise au point du projet architectural a ensuite débuté en septembre 2019 et s'est poursuivie en 2020. Le permis de construire a été déposé en avril 2021 et délivré le 2 novembre 2021, après avis favorable de La Fab.

Après lancement d'appels d'offres travaux infructueux, les opérateurs immobiliers sont revenus vers La Fab en 2022, interrogeant la programmation initiale (prix de vente, répartition de la programmation. La programmation a été ainsi adaptée : 8 logements abordables représentant 632 m² Sdp, et 44 logements en accession libre représentant 3429 m² sdp.

Lamotte a lancé ensuite sa phase de commercialisation à l'été 2023, qui s'est poursuivie en 2024, la commercialisation de 12 logements en LLI auprès de Domofrance en juillet 2024, ayant permis d'atteindre le taux de commercialisation attendu. Les travaux de construction se sont engagés en décembre 2024.



Ilot B3 - Perspective Atelier Martel

e) <u>Ilot B1/B7</u>

L'îlot B1/B7 se situe sur le foncier de la concession Peugeot, cédée par PSA à l'opérateur Fayat. Les emprises foncières sont constituées des parcelles suivantes : AY 545, 544, 541 et 539.

Dans un premier temps, une convention de partenariat a été signée en juillet 2018. Une consultation d'architectes a été ensuite lancée par la société Fayat en juillet 2018, à l'issue de laquelle a été retenue, lors d'un jury en novembre 2018, l'équipe de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Antonini, se composant par ailleurs de l'agence Baste Battle et du paysagiste Altern.

Le programme de construction prévisionnel représente 1426 m² d'activités de commerces de proximité et 220 logements, soit 15 279 m² SP, dont 35% de locatif social, soit 77 logements, 13% d'accession sociale, soit 28 logements, 11% d'accession abordable, soit 24 logements et 41% d'accession libre, soit 90 logements.

Fayat est en charge de la maîtrise d'ouvrage de l'accession libre, abordable et sociale. 1001 Vies Habitat réalise l'accession sociale sous sa maîtrise d'ouvrage et acquiert en VEFA les logements locatifs conventionnés.

La mise au point du projet immobilier a démarré début 2019 pour aboutir au dépôt de deux permis de construire en mars 2020. Toutefois, ils ont été rejetés (dépôt de l'étude cas/cas trop tardif et avis négatif du SDIS). Dès lors, Fayat et la maîtrise d'œuvre ont repris le travail de mise au point des deux permis de construire au dernier trimestre 2020, en lien avec La Fab et la Ville.

Après la tenue de nouveaux ateliers, le permis de construire a été déposé par Fayat en avril 2021 et délivré en novembre 2021.

Les travaux de construction de l'îlot B1 ont démarré à l'été 2022 et se sont poursuivis en 2024, en vue d'une livraison en mars 2025. Les travaux de l'îlot B7 ont été lancés en 2024.

En revanche, Fayat a communiqué sa grille de commercialisation en décembre 2024. Il en ressort que la programmation de logements en accession abordable n'a pas été respectée, malgré ses engagements dans le cadre de la convention de partenariat. Par ailleurs, Fayat ne s'est en aucun cas manifesté auprès de La Fab ou des collectivités lors du lancement de la commercialisation des îlots B1 et B7, afin de négocier une évolution de la programmation. Un dialogue avec l'opérateur s'engagera en 2025 en vue de substituer la réalisation de logements en BRS à l'offre de logements en accession abordable.





Ilot B1 B7 - Crédits photos La Fab

Date de réception préfecture : 03/10/2025

f) Ilot B8

L'îlot B8 se situe sur le foncier appartenant à Bordeaux Métropole, situé au sud du parc relais, sur le secteur Quatre Chemins. La question de la destination mixte (station de recharge de bus électrique et pension de famille) ou à vocation exclusive de logements du foncier appartenant à Bordeaux Métropole n'a pas été validée jusqu'à présent.

L'objectif défini, dans un premier temps, fut le lancement d'une consultation sur le sud du foncier, en phase 1, dédié à la pension de famille. La Fab a ainsi travaillé en 2021, avec la maîtrise d'œuvre urbaine, en lien étroit avec les services de Bordeaux Métropole, sur la programmation et la capacité de l'îlot B8 en vue de la réalisation d'un programme de pension de famille.

En 2022, il a été validé que Mésolia assure la maîtrise d'ouvrage de l'îlot et que la gestion future soit confiée au Diaconat. A l'issue de la consultation de maîtrise d'œuvre urbaine, a été retenu en décembre 2023, une équipe de concepteurs dont le mandataire est l'agence d'architecture

La programmation totale représente 1006 m² SDP se déclinant comme suit: 25 logements T1 ainsi que 6 logements sociaux PLAI.

En 2024, a été réalisé le travail de mise au point son permis de construire, en vue de son dépôt début 2025. La Fab et sa maîtrise d'œuvre ont accompagné cette mise au point dans le cadre de la tenue d'ateliers de travail.



Ilot B8 – Perspective Dauphins

g) Ilot A9

L'îlot A9 se situe sur le foncier appartenant à Bordeaux Métropole, emprise de l'ex-station Shell située au carrefour avenue de la somme, avenue de la marne et du Marechal Leclerc. La Fab a lancé en 2020, avec l'appui de la maîtrise d'œuvre urbaine et de l'équipe AMO RDC actifs, le travail de faisabilité et de définition des orientations programmatiques de l'îlot A9, îlot se

Date de réception préfecture : 03/10/2025

développant sur un foncier appartenant à Bordeaux Métropole et ayant une vocation exclusivement dédiée à l'activité.

Ce travail s'est poursuivi en 2021 ainsi qu'en 2022 en vue de la validation du montage opérationnel définitif début 2023. Un COPIL réunissant la ville et Bordeaux Métropole, s'est ainsi tenu en mars 2023, validant la réalisation d'un pôle d'activités ESS, représentant 2210 m² SDP, réalisé dans le cadre d'un bail à construction confié au groupement In Cité - La Foncière Solidaire.

Des réunions de travail réunissant les différents acteurs du projet - Ville, Bordeaux Métropole, futurs opérateurs – ont été organisées par La Fab en 2023 afin d'aboutir à un processus opérationnel préalable à la passation d'un bail à construction par Bordeaux Métropole.

En 2024, La Foncière Solidaire a ensuite réalisé une étude de marché et de faisabilité économique d'exploitation. Dans le même temps, In Cité a fait réaliser une étude de programmation spatiale réalisée par l'agence Selva Maugin. Ces études menées conjointement ont vocation à déterminer les orientations d'activités et les hypothèses de gestion et de portage immobilier les plus adaptées au projet, à valider en comité de pilotage en février 2025.

h) <u>Ilot A5/A6</u>

L'îlot A5 A6 est situé sur des emprises foncières privées. BNP Immobilier a signé une promesse d'achat avec la famille Saboie et les époux Hyunh, en vue de la réalisation de la programmation logement sur les îlots A5/A6. La SCI ACDC, est également propriétaire d'une partie du foncier, ayant vocation à être cédé dans le cadre de la réalisation de l'îlot.

La Fab a poursuivi en 2021 avec les opérateurs la mise au point de la programmation de l'îlot, qu'il s'agisse de la programmation activités ou logement, tout en s'assurant du maintien de l'équilibre économique de la future opération.

Ce travail a abouti au lancement, en septembre 2022, d'une consultation d'architectes en partenariat avec BNPI et la SCI ACDC.



Ilot A5-A5 - Perspective Agence NRAU

A l'issue de la consultation d'architectes, a été retenue en avril 2023 l'agence d'architectes NRAU. La mise au point du projet architectural a été lancée mi 2023, s'imbriquant avec une démarche de refonte de la programmation par les opérateurs, à la recherche de l'atteinte d'un équilibre financier de l'opération immobilière. Ce travail de recherche d'un équilibre programmatique et financier de l'opération a été poursuivi en partenariat avec BNPI par l'aménageur jusqu'à l'été 2024.

Dans le cadre de ce travail partenarial a été arrêtée la programmation suivante :

- 70 logements soit 4680 m² SDP, se répartissant entre 45% d'accession libre, 20% de BRS et et 35% de locatif social,
- 828 m² SU de commerces.

Toutefois, BNPI s'est retiré du dossier à l'été 2024. Dès lors, La Fab a alors engagé le dialogue avec d'autres opérateurs privés et bailleurs (Erilia, Villadim, Clairsienne/Domofrance, Vinci) afin de déterminer si une reprise du projet architectural et de la programmation était envisageable.

i) <u>Ilot secteur Jardiland (C1-C3-C4)</u>

Les îlots C1, C3 et C4 sont situés sur le foncier appartenant à la SCI Floriana, soit le propriétaire exploitant du magasin Jardiland.


Des échanges ont lieu entre le propriétaire, l'opérateur immobilier signataire d'une convention d'étude avec le propriétaire, Kaufman&Broad, et La Fab depuis plusieurs années, quant à la validation d'une programmation, d'une faisabilité urbaine et architecturale ainsi que de l'agrandissement du magasin Jardiland.

En 2024, l'ensemble des acteurs du projet valident une nouvelle faisabilité urbaine permettant de conserver l'actuel magasin Jardiland et de développer sur le reste du foncier une programmation mixte logements commerces.

La programmation validée est la suivante :

- 9576 m² de logements
- 5416 m² de commerces dont l'extension de Jardiland.

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

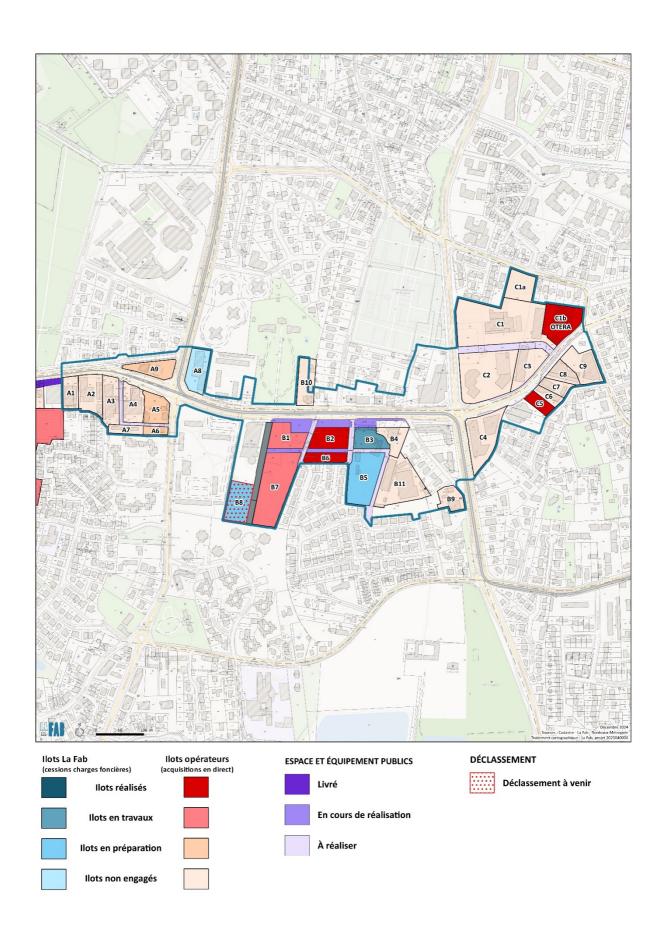

2.8. Communication / Animation / Médiation

a) AMO communication et animation du projet urbain

Depuis 2018, l'équipe de médiation, communication et animation du projet urbain Marne Soleil est désormais la suivante depuis 2024 : Garluche, Alga Médiation, Deux degrés.

L'équipe a commencé par la réalisation d'un diagnostic- plan d'actions 2024-2026 décliné à l'échelle des deux opérations Marne Soleil, partagé et validé par Bordeaux Métropole, la Ville et La Fab.

En 2024, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'ensemble définie à l'échelle du territoire Marne Soleil, l'équipe a réalisé les missions suivantes :

- Diffusion de lettres d'information sur le projet et de lettres travaux,
- Gestion du site internet
- Reprise des permanences bimensuelles avec les habitants au sein de la maison des projets avec notamment engagement de travaux sur une exposition participative.

b) Expérimentation sur les mobilités alternatives

En lien avec les actions de médiation et d'animation, La Fab a également lancé une expérimentation sur les mobilités alternatives s'adressant aux nouveaux habitants de Marne et Soleil, avec son AMO Auxilia. Ainsi, elle a attribué, en décembre 2023, à Viraj, un marché permettant de réaliser des prêts de vélo, notamment à assistance électrique, aux habitants, s'engageant dans l'expérimentation. L'expérimentation s'est poursuivie en 2024. Il en ressort un bilan positif dans l'ensemble.

Sur les participants de Mérignac Soleil/Marne, le caractère encore en construction du quartier a pu être un frein pour les habitants dans la pratique du vélo. Des difficultés très pratiques ont pu se mêler à un «ressenti» d'un environnement pas encore propice à une pratique sécurisée. Néanmoins, le vélo (en particulier le VAE) s'est avéré un outil pertinent pour répondre à de nombreux besoins de déplacements, aux motifs variés, vis-à-vis de la situation géographique du quartier. La présence d'infrastructures cyclables satisfaisantes a été relevé sur plusieurs itinéraires. Ainsi, malgré les difficultés pointées environ un tiers des participants se projettent dans un achat ou une location longue durée à relativement court terme, et une large majorité compte réduire l'utilisation de sa voiture.



Crédit photo La Fa

3. Actions à mener en 2025

3.1. Procédures administratives

a) Actualisation des mesures ERC de l'étude d'impact

La Fab la mise à jour des mesures ERC de l'étude d'impact afin d'actualiser et de renforcer le suivi des mesures mises en œuvre par les opérateurs à l'échelle des îlots.

3.2. Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre urbaine

La maîtrise d'œuvre urbaine poursuivra le cas échéant sera sollicitée pour réaliser l'actualisation ou la réalisation de nouvelles faisabilités ou la réalisation de fiches de lot préalablement au lancement de consultations de concepteurs (îlots secteur Mendès France).

Elle assurera également sa mission d'accompagnement des projets immobiliers.

b) Mission de maîtrise d'œuvre démolition

Une mission de maîtrise d'œuvre sera confiée au titulaire de l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre démolition de La Fab en vue de la réalisation de la démolition d'Eco cuisine.

c) Mission d'OPC-IC

La mission d'OPC-IC (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier) se poursuivra sous la maîtrise d'ouvrage de La Fab, impliquant la coordination des différents intervenants dans le cadre de la réalisation future ou en cours des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage Fab et opérateurs de l'ensemble du secteur Quatre Chemins.

d) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial et activités

Le marché transversale Marne/Soleil d'AMO sur la programmation et l'implantation des commerces et activités sera relancé en 2025 permettant de retenir une nouvelle équipe.

e) Etudes techniques et environnementales

Des études techniques et environnementales sont susceptibles d'être réalisés en 2025, notamment dans le cadre des travaux d'espaces publics en cours.

3.3. Acquisitions foncières

a) <u>Ilot B8</u>

La Fab réalisera l'acquisition de l'assiette foncière de l'îlot B8 appartenant à Bordeaux Métropole, en vue d'en assurer la cession à Mésolia.

b) Espace public de la cour partagée secteur Somme

En cas de déblocage de l'îlot A5/6 et de dépôt de permis de construire, La Fab saisira le juge de l'expropriation en vue de la fixation du prix des fonciers à acquérir appartenant aux sociétés Edouard et JPPS et la famille Hébrard. Le cas échéant, elle engagera également l'éviction partielles des exploitants sur les emprises concernées.

Date de réception préfecture : 03/10/2025

3.4 Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

Assistance juridique i)

Des missions d'assistance juridique seront lancées le cas échéant, notamment en vue d'assister La Fab dans le cadre de la résiliation de la convention d'occupation temporaire de France Travail sur Eco cuisine.

k) Gestion des biens

Des actions de gestion des biens pourront être menées au regard des besoins constatés.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux

a) Phase 2 des travaux d'espaces publics – marché travaux global

Les travaux d'espaces publics du secteur Quatre Chemins se poursuivront en 2024.

La cour partagée 2 sera livrée en mai 2025.

Par ailleurs, les travaux sur la place Gabriela Mistral s'achèveront fin avril 2025. Un évènement lié à l'inauguration officielle de la place sera organisé en mai 2025.

Les travaux de la cour partagée 1, d'une durée de 3 mois, s'engageront après la libération du foncier par Fayat, les plantations seront réalisées à l'hiver 2025.

3.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

a) Ilot B5

La Fab réalisera la passation d'une promesse de vente à Gironde Habitat du foncier de l'îlot B5.

b) <u>Ilot B6</u>

La Fab réalisera la passation d'une promesse de vente à Mésolia du foncier de l'îlot B8 au premier semestre 2025 et sera susceptible de conclure un acte de vente fin 2025, si le calendrier prévisionnel de démarrage des travaux de l'îlot B8 en janvier 2026 se confirme.

3.7 Accompagnement des projets immobiliers

a) <u>Ilot B3</u>

Les travaux de l'îlot B3 se poursuivront en 2025. La Fab et l'architecte urbaniste valideront le prototype de façade.

b) <u>Ilot B5</u>

Les travaux de l'îlot B5 démarreront au dernier trimestre 2025.

c) <u>Ilot B1/B7</u>

Les travaux de l'îlot B1 et B7 se poursuivront en 2025 avec une livraison de l'îlot B7 en mars 2025.

La Fab et Bordeaux Métropole engageront des échanges avec Fayat en vue de la recherche d'une issue partenariale amiable sur la commercialisation de la part de logement en accession abordable.

d) Ilot A9

La Foncière solidaire et In Cité présenteront en comité partenarial à Bordeaux Métropole, la Ville et La Fab les conclusions de leur étude de marché, de faisabilité économique et d'exploitation de l'îlot A9 en février 2025, pour validation des suites à donner par Bordeaux Métropole et la Ville.

e) Ilot A5/A6

Le travail de mise au point du permis de construire est susceptible de reprendre, dès lors que les conditions économiques et programmatiques de la reprise du travail avec un nouvel opérateur sont réunies. Le cas échéant, La Fab engagera au préalable la signature d'une convention de partenariat.

f) Ilot B8

Le permis de construire sera déposé au premier trimestre 2025 puis délivré au second trimestre 2025.

g) <u>Ilot C1-C3-C4</u>

Après signature d'une promesse de vente entre la SCI Floriana et Kaufman&Braud, sera engagée la signature d'une convention de partenariat ainsi que le lancement d'une consultation de maîtrise de concepteurs.

3.8 Communication / Animation / Médiation

a) AMO communication et animation du projet urbain

Les missions de l'équipe se poursuivront permettant la mise en œuvre du plan d'actions qui sera marquée par la tenue d'un forum du projet urbain permettant de convier les habitants et usagers ainsi que l'ensemble des acteurs du projet urbain, en mai 2025.

Date de réception préfecture : 03/10/2025

4 Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2024

Les dépenses pour l'année 2024 correspondent à :

ETUDES:

- Mission d'accompagnement de projets immobiliers B8 et réalisation de faisabilités urbaines et fiches de lot
- Reprise AVP/PRO de l'aménagement de l'avenue de la Marne sur le secteur Mendès France
- Une étude environnementale relative à la gestion des biodéchets
- Une étude sur l'îlot A9 marché et de faisabilité économique d'exploitation
- Mission de coordination des maîtrises d'ouvrage par l'OPC IC

Le poste études représente 144 363 € TTC.

FONCIER:

- Acquisition d'une partie de l'emprise foncière de l'îlot A8 ainsi que des futures emprises d'espaces publics (place secteur 4 chemins)
- Des missions d'assistance juridique et d'expertise foncière

Le poste foncier représente 1 802 448 € TTC.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES:

- Honoraires de la maitrise d'œuvre des espaces publics, dont le CSPS : suivi des travaux de la phase 2 globale des travaux (secteur Quatre Chemins)
- Travaux VRD et d'aménagement phase, au Sud du Cours de la Marne, réalisés sur le secteur Quatre Chemins par l'entreprise Eiffage Route et sous-traitants

Le poste travaux et honoraires techniques représente 904 700 € TTC.

HONORAIRES DE CONCESSION

Le poste honoraires de concession représente 150 000 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION: Actions de communication et médiation dans le cadre de la mission AMO concertation d'information et communication sur le projet

Le poste frais de communication représente 23 752 € TTC.

FRAIS DIVERS: frais de gestion bancaire

Le poste frais divers représente 362 € TTC.

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 3 025 625 €TTC.

Les recettes pour l'année 2024 :

CESSION DE CHARGES FONCIERES : Cession des charges foncières de l'îlot B3 à Lamotte.

Le poste cession de charges foncière représente 1 941 697 € TTC.

PARTICIPATION METROPOLITAINE

Date de réception préfecture : 03/10/2025

AUTRES PRODUITS: produits divers, refacturation et produits financiers

Le poste autres produits représente 87 258 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 2 028 955 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2025

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2025 correspondent à :

ETUDES:

- Mission d'accompagnement des projets immobiliers et réalisation de fiches d'îlots et/ou faisabilités urbaines
- Mission de coordination des maîtrises d'ouvrage par l'OPC IC
- **Etudes techniques**
- Mission AMO commerces/activités/équipements

FONCIER:

- Acquisition d'une partie de l'emprise foncière de l'îlot A8
- Expertises immobilières
- Missions d'assistance juridique
- Frais liés à la gestion et entretien des biens

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES:

- Honoraires de la maitrise d'œuvre des espaces publics (phase EXE secteur Quatre Chemins),
- Travaux sur le secteur 4 chemins et Mendès France (marché de travaux phase 2)
- Travaux sous maîtrise d'ouvrage concessionnaires

AMENAGEUR: Rémunération forfaitaire dont le montant est recalé en fonction de l'avancement de l'opération

FRAIS DIVERS

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 2 732 917 € TTC.

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2025 :

CESSION DE CHARGES FONCIERES : Cession des charges foncières de l'îlot B5

PARTICIPATION COMMUNALE : Versement d'une participation à la remise d'ouvrage de la Ville de Mérignac

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 2 133 516 € TTC.

4.3 Participation du concédant

Le montant de la participation du concédant, fixé par l'avenant 4 à la concession d'aménagement, s'élève à 16 835 375 € HT (TVA due en sus) dont 9 483 356 € HT au titre de la remise des ouvrages

Date de réception préfecture : 03/10/2025

destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 7 352 019 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement de la participation du concédant est le suivant :

2025 : 2 127 516 € TTC

4.4 Trésorerie prévisionnelle et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2024, la trésorerie présente un solde positif de 13 816 662 € TTC et un solde prévisionnel positif de 13 217 261 € au 31 décembre 2025.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le détail des écarts est commenté en annexe par poste de dépenses et de recettes.

Le bilan d'opération évolue de la manière suivante (pour les postes les plus significatifs) :

- Une augmentation du budget études à hauteur de 20 000 €HT, avec un recalage des dépenses consacrées à la mission de maîtrise d'œuvre urbaine à la hausse et des dépenses d'indemnisation des architectes dans le cadre des concours,
- Une augmentation du budget travaux pour un montant de 54 765 € HT. Cette augmentation se détaille comme suit :
 - Une augmentation du poste travaux à hauteur de 400 000 € HT se justifiant d'une part, par l'augmentation des travaux de la phase 2 et d'autre part, par l'augmentation du coût prévisionnel de l'aménagement de l'avenue de la Marne sur le secteur Mendès France, suite à la demande de modification des aménagements projetés par Bordeaux Métropole, en vue de la mise aux normes du réseau REVE de la piste cyclable,
 - Une diminution des aléas travaux à hauteur de 345 235 € HT.
- Une augmentation du poste foncier à hauteur de 176 620 € HT, en lien avec l'évolution des postes suivants:
 - Augmentation du coût prévisionnel des acquisitions à hauteur de 375 462 € HT au regard d'une part, des négociations amiables menées avec Jardiland en vue de l'acquisition du foncier de la voie nouvelle sur le secteur Mendès France, avec un risque de voir finalement saisir le juge de l'expropriation à défaut d'accord amiable, et d'autre part, une prise en compte de l'acquisition par La Fab de l'îlot B8 à hauteur de 156 902 € HT.
 - Diminution des frais de notaire à hauteur de 113 843 € HT au regard des acquisitions déjà réalisées,
 - Diminution de l'aléa foncier à hauteur de 100 000 € HT

Date de réception préfecture : 03/10/2025

- Une augmentation des frais de communication et une baisse des frais divers à hauteur de 42 000 € HT.
- Enfin, une réévaluation du montant des charges foncières pour une augmentation de **188 812 € HT** reposant notamment sur la prise en compte de la revente de charges foncières sur l'îlot B8 à hauteur de 156 902 € HT, ainsi qu'un ajustement prévisionnel de la programmation de l'îlot A8.

Annexes

Annexe 1 Bilan consolidé de l'opération d'aménagement

Annexe 2 A Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2 B Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2 C Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

Annexe 3 Tableau acquisitions et cessions

Annexe 4 A Programme global de construction actualisé

Annexe 4 B Programme global de construction état d'avancement

Annexe 4 C Programme global de construction échelonné dans le temps

Annexe 5 Bilan comparé

Annexe 6 Suivi des factures

Annexe 7 Suivi des clauses d'insertion



Mérignac Marne

Bilan Consolidé - CRF 2024

Annexe 1


	€ TVA	€ TTC	RECETTES			€ HT	€TVA	€ TTC
1 158 000	229 800	1 387 800		Bilan origine	CRFA 2024			
355 356	71 071	426 427	Cessions charges foncières		Prix unit m² SP	5 187 819	716 981	5 904 801
802 644	158 729	961 373	Accession libre	393	493	2 331 954	466 391	2 798 345
			Accession abordable	143	143	138 131	27 626	165 758
10 590 641	333 212	10 923 854	Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	220	220	1 430 001	85 816	1 515 818
7 029 743	19 518	7 049 261	Accession sociale (PSLA) BRS	207	207	849 959	49 593	899 553
6 654 743	19 518	6 674 261	Commerces et services	224	224	436 114	87 223	523 337
375 000		375 000	Activités			1 659	332	1 991
468 748	58 722	527 470						
1 020 000	204 972	1 224 972		Bilan origine	CRFA 2024			
1 822 150		1 822 150	Participation constructeurs		Prix unit m² SP			
250 000	50 000	300 000	NC					
7 430 279	1 482 439	8 912 718						
486 000	95 914	581 914						
6 572 750	1 312 220	7 884 970						
371 529	74 306	445 834	•	-				
	•	<u> </u>	Participation équipements d'intérêt g	général réalisés par l'a	ménageur (<			
			50%)					
			Subventions					
2 050 000		2 050 000	Particination métropolitaine au titre			16 835 375	1 896 671	18 732 046
			·	•			1030071	7 352 019
2 050 000		2 030 000	•			9 483 356	1 896 671	11 380 027
402 000	77 205	479 205	Participation complément prix					
171 200	9 577	180 777	Participation communale à la remise	d'ouvrage		18 930	3 786	22 716
82 249		82 249	Participation communes			18 930	3 786	22 716
88 951	9 577	98 528						
275 000	75.000	450.000	Autres recettes			134 996	3 260	138 256
							3 260	62 961
3/5 000	/5 000	450 000	Produits financiers			/5 295		75 295
	413 465	413 465						
	413 465	413 465						
22 177 121	2 620 698	24 797 819	TOTAL DES RECETTES			22 177 121	2 620 698	24 797 819
	355 356 802 644 10 590 641 7 029 743 6 654 743 375 000 468 748 1 020 000 1 822 150 250 000 7 430 279 486 000 6 572 750 371 529 2 050 000 2 050 000 402 000 82 249	355 356 71 071 802 644 158 729 10 590 641 333 212 7 029 743 19 518 6 654 743 19 518 375 000 468 748 58 722 1 020 000 204 972 1 822 150 250 000 50 000 7 430 279 1482 439 486 000 95 914 6 572 750 1 312 220 371 529 74 306 2 050 000 2 050 000 2 050 000 77 205 171 200 9 577 82 249 88 951 9 577 375 000 75 000 375 000 375 000 75 000	355 356	10 590 641 133 212 10 923 854 10 590 641 333 212 10 923 854 10 590 641 333 212 10 923 854 10 590 641 333 212 10 923 854 10 590 641 375 000 375 000 468 748 58 722 527 470 10 20 000 20 49 72 1 224 972 1 822 150 250 000 50 000 300 000 20 50 000 300 000 20 50 000 375 000 375 000 2 0 50 000 2 0 5	355 356	Accession scharges foncières	355 356	Sessions charges foncières Prix unit m² SP 5 187 819 716 981

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110107-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025


LAFAB

Mérignac Marne Bilan prévisionnel actualisé - CRFA 2024

ATTORNATION OF THE STATE OF	(1) Bilan initial valeur	 %	(2) CRF 2024 valeur 9	6	(2-1) variat° %	
DEPENSES EN TTC €						
Études de définition et de suivi de l'opération	936 000	4%	1 387 800	6%	489	
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	360 000	2%	426 427	2%	189	
Autres études	576 000	2%	961 373	4%	679	
Frais d'acquisition et de libération des sols	13 413 605	58%	10 923 854	44%	-19	
Acquisitions foncières	9 200 472	40%	7 049 261	28%	-23	
- détail acquisitions		0%	0	0%	09	
* dont foncier métropolitain	0	0%	375 000	2%	09	
* dont foncier communal		0%		0%	09	
* dont foncier privé	9 200 472	40%	6 674 261	27%	-27	
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	333 879	1%	527 470	2%	589	
Libération des terrains	1 235 238	5%	1 224 972	5%	-19	
Indemnités de transferts	1 993 320	9%	1 822 150	7%	-99	
Aléas	650 696	3%	300 000	1%	-549	
Frais d'aménagement (*)	6 142 315	27%	8 912 718	36%	459	
Maîtrise d'œuvre	498 550	2%	581 914	2%	179	
Travaux et aléas	5 583 764	24%	7 884 970	32%	419	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom)	60 000	0%	445 834	2%	643	
articipation aux equipements publics	0	0%	0	0%	0:	
		0%		0%	09	
		0%		0%	09	
		0%		0%	0	
lonoraires concession	1 600 000	7%	2 050 000	8%	28	
	1 600 000	7%	2 050 000	8%	289	
rais de communication	420 000	2%	479 205	2%	149	
rais divers	796 000	3%	180 777	1%	-77	
Frais financiers	590 000	3%	82 249	0%	-86	
Frais divers (Assurance, Taxes)	206 000	1%	98 528	0%	-529	
actualisation	684 637	3%	450 000	2%	-349	
ravaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	684 637	3%	450 000	2%	-34	
VA encaissée (-) / reversée (+)	-922 579	-4%	413 465	2%	-145	
TOTAL DES DEPENSES	23 069 978	100%	24 797 819	100%	7:	

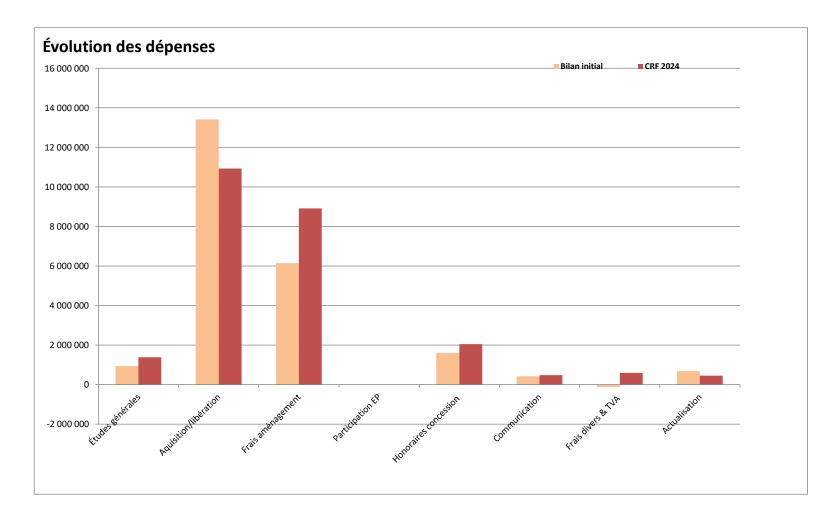

RECETTES EN TTC €						
	Bilan origine	CRFA 2024	1			
Cessions charges foncières	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	7 095 046	31%	5 904 801	24%
Accession libre	393	493	3 377 892	15%	2 798 345	11%
Abordable	143	143	619 030	3%	165 758	1%
Locatif social	220	220	1 600 562	7%	1 515 818	6%
Accession sociale	207	207	675 303	3%	899 553	4%
BRS		0	0	0%	0	0%
Commerces et services	224	224	822 259	4%	523 337	2%
Activités				0%	1 991	0%
	Bilan origine	CRFA 2024	1	_		
Participation constructeurs	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	0	0%	0	0%
Accession libre				0%		0%
Abordable				0%		0%
Locatif social				0%		0%
Accession sociale				0%		0%
Commerces et services				0%		0%
Parkista skiera farata ara saka ditakinika afa fari i			0	0%	0	00/
Participation équipements d'intérêt général			U		U	0%
Participation équipements d'intérêt général				0%		0%
Subventions				0%		0%
Participation métropolitaine			15 919 988	69%	18 732 046	76%
Participation équilibre			6 543 980	28%	7 352 019	30%
Participation remise d'ouvrages			9 376 008	41%	11 380 027	46%
Participation complément prix				0%	0	0%
Participation communale			54 944	0%	22 716	0%
Participation Commune			54 944	0%	22 716	0%
				0%		0%
Autres recettes			0	0%	138 256	1%
Refacturations				0%	62 961	0%
Produits financiers	Accusé de réce	eption en préfe	ture	0%	75 295	0%
			c1110107-DE-			0%
	Date de télétra	nsmission: 03	10/2025	0%		0%
TOTAL DEC DECETTES	Date de récept	ion préfecture	. 03/10/2025	1000/	24 707 640	1000/
TOTAL DES RECETTES	Publié le · 03/1	0/2025	23 069 978	100%	24 797 819	100%

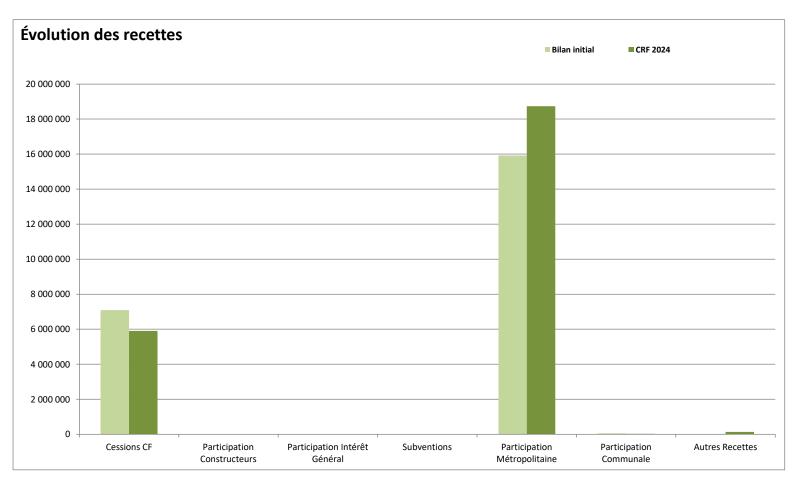





Mérignac Marne Bilan prévisionnel : état d'avancement - CRFA 2024

Études de définition et de suivi de l'opération Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers Autres études Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	CRF 2024 sleur 1 387 800 426 427 961 373 0 923 854 7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970 445 834	% 6% 2% 44% 28% 2% 5% 5% 1% 2% 36% 2% 32% 32%	804 561 232 640 571 922 6 528 231 4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0	58% 55% 59% 60% 58% 100% 65% 75% 65% 75% 65% 55% 55% 55% 56% 51% 65% 75% 75% 65% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 7	Reste à réalise valeur 9 9 193 787 389 451 4 395 623 2 963 068 2 59 766 422 789 450 000 300 000 5 2 963 844	42 42 42 42 42 42 44 44 45 35 100
Études de définition et de suivi de l'opération Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers Autres études Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	1 387 800 426 427 961 373 0 923 854 7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	6% 2% 4% 44% 28% 2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	804 561 232 640 571 922 6 528 231 4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0	58% 55% 59% 60% 58% 100% 0% 56% 51% 65% 75% 0%	583 239 193 787 389 451 4 395 623 2 963 068 0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	42 42 42 42 42 42 44 43 33 22 100
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers Autres études Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	426 427 961 373 0 923 854 7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	2% 4% 44% 28% 2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	232 640 571 922 6 528 231 4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	55% 59% 60% 58% 100% 0% 56% 51% 65% 75% 0%	193 787 389 451 4 395 623 2 963 068 0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	45 42 42 (() (44 49 35 25 100
Autres études Frais d'acquisition et de libération des sols Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	961 373 0 923 854 7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	4% 44% 28% 2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	571 922 6 528 231 4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	59% 60% 58% 100% 0% 56% 51% 65% 75% 0% 41%	389 451 4 395 623 2 963 068 0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000 5 259 601	4: 4: 4: ((4: 4: 3: 2! 100
Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	0 923 854 7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	28% 2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36%	6 528 231 4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	60% 58% 100% 0% 56% 51% 65% 75% 0%	4 395 623 2 963 068 0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000 5 259 601	4 4 4 3 2 10
Acquisitions foncières - détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	7 049 261 375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	28% 2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36%	4 086 193 375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	58% 100% 0% 56% 51% 65% 75% 0%	2 963 068 0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	4 4 3 2 10
- détail acquisitions * dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	375 000 6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	2% 0% 27% 2% 5% 7% 1% 36%	375 000 3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	100% 0% 56% 51% 65% 75% 0%	0 0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	4 4 3 2 10
* dont foncier métropolitain * dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Fravaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	0% 27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	0% 56% 51% 65% 75% 0%	0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	4 3 2 10
* dont foncier communal * dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Fravaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	6 674 261 527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	0% 27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	3 711 193 267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	0% 56% 51% 65% 75% 0%	0 2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	10 10
* dont foncier privé Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	27% 2% 5% 7% 1% 36% 2%	267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	56% 51% 65% 75% 0%	2 963 068 259 766 422 789 450 000 300 000	10
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	527 470 1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	2% 5% 7% 1% 36% 2%	267 705 802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	51% 65% 75% 0%	259 766 422 789 450 000 300 000 5 259 601	10 10
Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	1 224 972 1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	5% 7% 1% 36% 2%	802 183 1 372 150 0 3 653 118 291 070	65% 75% 0% 41%	422 789 450 000 300 000 5 259 601	10
Indemnités d'éviction Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	1 822 150 300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	7% 1% 36% 2%	1 372 150 0 3 653 118 291 070	75% 0% 41%	450 000 300 000 5 259 601	10
Aléas Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	300 000 8 912 718 581 914 7 884 970	1% 36% 2%	0 3 653 118 291 070	0% 41%	300 000 5 259 601	10
Frais d'aménagement (*) Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	8 912 718 581 914 7 884 970	36% 2%	3 653 118 291 070	41%	5 259 601	į
Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	581 914 7 884 970	2%	291 070			
Travaux et aléas Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics	7 884 970			50%	290 844	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom) Participation aux equipements publics		32%				!
Participation aux equipements publics	445 834	32/0	3 315 886	42%	4 569 084	
		2%	46 162	10%	399 673	(
donoraires concession	0	0%	0	0%	0	
donoraires concession		0%		0%	0	
Honoraires concession		0%		0%	0	
Honoraires concession		0%		0%	0	
	2 050 000	8%	1 600 000	78%	450 000	:
	2 050 000	8%	1 600 000	78%	450 000	
rais de communication	479 205	2%	270 642	56%	208 564	4
rais divers	180 777	1%	11 544	6%	169 233	
Frais financiers	82 249	0%	-	0%	82 249	10
Frais divers (Assurance, Taxes)	98 528	0%	11 544	12%	86 984	į
Actualisation	450 000	2%	0	0%	450 000	10
Fravaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	450 000	2%	-	0%	450 000	1
VA encaissée (-) / reversée (+)	413 465	2%	1 351 674	327%	-938 209	-2
TOTAL DES DEPENSES 2	413 405			57%	10 578 050	-

RECETTES EN TTC €

	Bilan origine	CRFA 2024]					
Cessions charges foncières	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	5 904 801	24%	2 549 449	43%	3 355 352	57%
Accession libre	393	493	2 798 345	11%	1 851 785	66%	946 560	34%
Abordable	143	143	165 758	1%	165 758	100%	0	0%
Locatif social	220	220	1 515 818	6%	175 176	12%	1 340 641	88%
Accession sociale	207	207	899 553	4%	69 559	8%	829 994	92%
BRS		0	0	0%	0	0%	0	0%
Commerces et services	224	224	523 337	2%	285 180	54%	238 157	46%
Activités			1 991	0%	1 991	100%	0	0%
	Bilan origine	CRFA 2024						
Participation constructeurs	Prix unit m ² SP	Prix unit m ² SP	0	0%	0	0%	0	0%
Accession libre			0	0%	0	0%	0	0%
Abordable			0	0%	0	0%	0	0%
Locatif social			0	0%	0	0%	0	0%
Accession sociale			0	0%	0	0%	0	0%
Commerces et services			0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	-	0%
Subventions				0%		0%	0	0%
Participation métropolitaine			18 732 046	76%	16 604 530	89%	2 127 516	11%
Participation équilibre			7 352 019	30%	5 775 549	79%	1 576 470	21%
Participation remise d'ouvrages			11 380 027	46%	10 828 981	95%	551 046	5%
Participation complément prix			0	0%	-	0%	0	0%
Participation communale			22 716	0%	0	0%	22 716	100%
Participation Commune			22 716	0%	0	0%	22 716	100%
Autres recettes			138 256	1%	182 453	132%	-44 197	-32%
Produit divers			62 961	0%	107 158	170%	-44 197	-70%
Produits financiers			75 295	0%	75 295	100%	0	0%
				0%	, 3 2 3 3	0%	0	0%
	Accusé d	e réception en բ	réfecture			0%	0	0%
	033-2433	e reception en p 300316-202509:	6-lmc1110107	′-DE ₀ 1∠	1	0%	n	0%
	Date de t	élétransmissior	: 03/10/2025	0%		0%	ő	0%
		éception préfec		125			-	
TOTAL DES RECETTES	Publié le	: 03/10/2025	24 797 819	100%	19 336 432	78%	5 461 387	22%

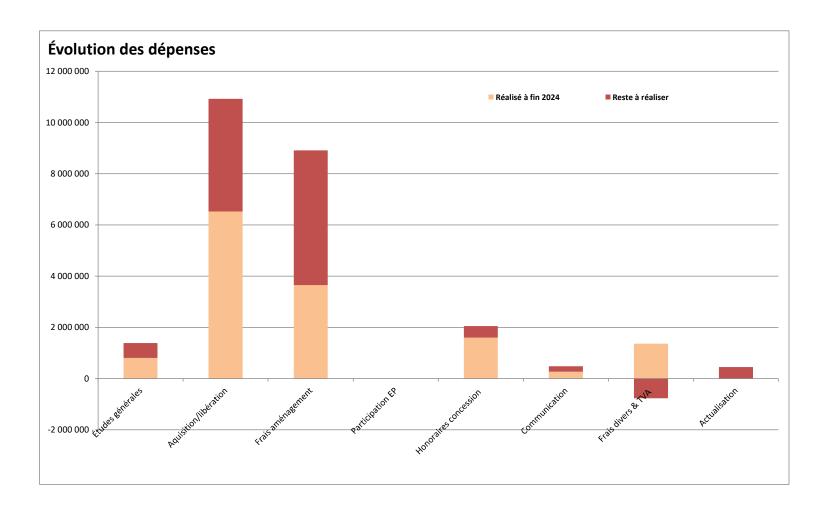

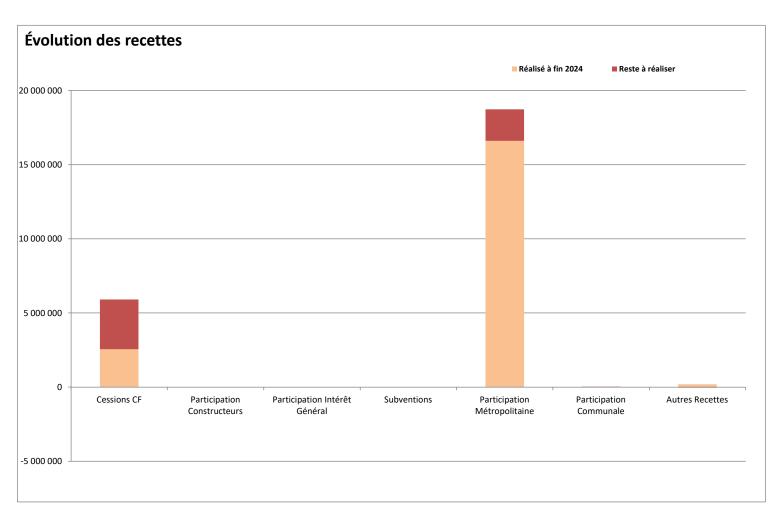

Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps - CRFA 2024

ANNEXE 2c

															AN	INEXE 2c
LA FAB	2 017 valeur	%	2 018 valeur %	2 019 valeur %	2 020 valeur %	2 021 valeur %	2 022 valeur %	2 023 valeur %	2 024 valeur %	2 025 %	2 026 valeur %	2 027 valeur %	2 028 valeur %	2 029 valeur %	2 030 valeur %	TOTAL
DEPENSES Études de définition et d		0%	73 460 0%	129 572 9%	87 590 6%	114 435 8%	105 069 8%	150 072 11%	144 363 10%	146 078 11%	129 527 9%	100 800 7%	73 887 5%	72 000 5%	60 946 4% 1	387 800 100%
Frais d'acquisition et de Acquisitions foncières - détail acquisitions * Fonciers privés * Foncier BM Frais (notariés, frais de ge- Libération des terrains Indemnités d'éviction Aléas	-	0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	70 020 -1% 375 000 5% - 0% - 0% 375 000 100% 21 674 4% - 0% - 0% - 0% - 0%	1031 558 10% 424 696 6% - 0% 424 696 5% - 0% 34 426 7% 2 436 0% 570 000 31% - 0%	1 355 252 13% 365 900 5% - 0% 365 900 5% - 0% 40 015 8% 298 873 24% 650 464 36% - 0%	1 773 418	128 747	39 924 0% 9 240 0% - 0% 9 240 0% - 0% 29 318 6% 1 366 0% - 0% - 0%	1802 448 17% 1 586 377 23% - 0% 1 586 377 20% - 0% 60 463 11% 153 0% 155 455 9% - 0%	1028 529 10% 156 902 2% - 0% 1771 351 22% - 0% 57 600 11% 124 027 10% 450 000 25% 240 000 80%	2 695 896 26% 2 391 946 34% - 0% 2 395 660 30% - 0% 123 950 24% 144 000 12% - 0% 36 000 12%	466 200 4% 394 000 6% - 0% - 0% - 0% 48 200 9% - 0% 24 000 8%	198 654	6 344 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 6 344 1% - 0% - 0% - 0%	- 0% 7 - 0% 7 - 0% 7 - 0% 7 - 0% 7 - 0% 1 - 0% 1	10456 950 100% 1 049 261 100% - 0% 8 898 424 100% 375 000 100% 527 260 100% .224 972 100% .822 150 100% 300 000 100%
Frais d'aménagement Maîtrise d'œuvre Travaux et aléas Autres travaux de	- - -	0% 0% 0% 0%	92 877 1% 92 877 16% - 0% - 0%	203 835	301 197 3% 38 796 7% 262 401 3% - 0%	189 977 2% 53 310 9% 136 667 2% - 0%	1 733 183 20% 50 353 9% 1 636 668 22% 46 162 10%	227 348 3% 10 048 2% 217 300 3% - 0%	904 700 10% 43 115 7% 861 585 11% - 0%	1 600 518 18% 60 600 10% 1 440 000 18% 99 918 22%	857 207 10% 47 400 8% 709 889 9% 99 918 22%	1 371 318 15% 35 400 6% 1 236 000 16% 99 918 22%	937 140 11% 147 444 25% 689 778 9% 99 918 22%	427 699 5% - 0% 427 699 5% - 0%	- 0% 65 718 1% 7	8 912 718 100% 5 81 914 100% 2 884 970 100% 445 834 100%
Participation aux equiper	-	0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%
Honoraires concession	100 000	6%	200 000 42%	200 000 42%	200 000 42%	300 000 63%	300 000 15%	150 000 7%	150 000 7%	150 000 7%	100 000 5%	70 000 3%	50 000 2%	50 000 2%	30 000 1% 2	2 050 000 100%
Frais de communication	-	0%	1 748 1%	94 605 53%	56 978 32%	65 322 36%	18 918 4%	9 529 2%	23 752 5%	64 800 14%	27 600 6%	36 000 8%	27 600 6%	26 400 6%		479 415 100%
Frais divers Frais financiers Frais divers (Assurance, Taxes)	- -	0% 0% 0%	- 0% - 0% 755 0%	9 087 9% - 0% 9 087 2%	252 0% - - 0% 252 0% -	788 -1% - 0% 788 0%	1 639 1% - 0% 1 639 1%	236 0% - 0% 236 0%	362 0% - 0% 362 0%	32 200 18% 14 000 17% 18 200 18%	32 200 18% 14 000 17% 18 200 18%	32 200 18% 14 000 17% 18 200 18%	27 984 16% 14 000 17% 13 984 14%	26 200 15% 14 000 17% 12 200 12%	18 449 10% 12 249 15% 6 200 6%	180 022 100% 82 249 100% 98 528 100%
Actualisation	-	0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	120 000 27%			60 000 13%	60 000 13%		450 000 100%
TVA encaissée / reversée TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	0% 0%	- 0% - 0%	1 030 039 0% 1 030 039 4%	- 0%	321 635 0% 321 635 1%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0% -	409 208 -99% 409 208 -99%	- 143 834 -35% - 143 834 -35%	- 271 753 -66% - 271 753 -66%	15 412 4% - 15 412 4% -	99 941 -24% - 99 941 -24% -		413 465 100% 413 465 100%
TOTAL DES DEPENSES (100 000	0%	765 515 0%	2 698 696 0%	2 001 269 0%	2 763 999 0%	2 287 556 9%	577 109 2%	3 025 625 12%	2 732 917 11%	3 818 596 15%	1 864 765 8%	1 390 677 6%	568 703 2%	202 391 1% 24	797 819 100%
RECETTES Cession charges foncières Libre Abordable Locatif social Accession sociale BRS Commerces Activités	-	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	532 751 321% 198 537 13% 48 859 5% 153 559 0% 60 975 12% 0% 0% 69 077 0% 1 745 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	75 000 1% 27 950 1% 6 878 4% 21 618 1% 8 584 1% - 0% 9 725 2% 246 12%	1 941 697 33% 1 625 299 58% 110 020 66% - 0% - 0% - 0% 206 379 39% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% 1 128 164 74% 436 682 49%	- 0% - 0%	1790 505 30% 946 560 34% - 0% 212 477 14% 393 311 44% - 0% 238 157 46% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% 2 - 0% - 0% 1 - 0% - 0%	1 904 801 100% 1 798 345 100% 165 758 100% 5 15 818 100% 899 553 100% 5 23 337 100% 1 991 100%
Participations constructe Libre Abordable Locatif social Accession sociale BRS Commerces Activités	-	0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
Parcitipation Métropolita Participation équilibre Participation remise d'ouvra Participation complément p	- - - -	0% 0% 0% 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	8 802 331 77% 2 216 718 0% 6 585 613 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	3 371 312 30% 842 119 0% 2 529 193 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	4 430 887 24% 2 716 712 37% 1 714 175 15% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	2 127 516 11% 1 576 470 21% 551 046 5% - 0%	- 0% - 0% - 0%	- 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0% - 0%	- 0% 7	732 046 100% 7352 019 100% .380 027 100% - 0%
Participation Communale	-	0% 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	6 000 26% 6 000 26%		- 0% - 0%	- 0% - 0%	- 0% - 0%	10 716 47% 10 716 47%	22 716 100% 22 716 100%
Autres produits Produits divers Produits financiers	-	0% 0% 0%	5 333	6 825 9% - 0% 6 825 0%	14 367 19% 4 506 0% 9 861 0%	57 482 76% 48 992 0% 8 490 0%	8 819 10% 4 728 8% 4 090 12%	2 370	87 258 63% 47 125 75% 40 132 53%	- 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0%		- 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0%	- 0% - 0% - 0%	138 256 100% 62 961 100% 75 295 100%
TOTAL DES RECETTES C		0%	5 333 0%	8 809 156 36%	547 118 2%	3 428 794 14%	8 819 0%	4 508 257 18%	2 028 955 8%	2 133 516 9%	1 570 847 6%	- 44 197 0%	1 790 505 7%	- 0%	10 716 0% 24	1797 819 100%
RECETTES - DEPENSE Balance cumulée	-100 000 -100 000		-760 182 -860 182	6 110 460 5 250 278	-1 454 151 3 796 127	664 795 4 460 921	-2 278 738 2 182 184	3 931 148 6 113 332	-996 669 5 116 662	-599 401 4 517 261	-2 247 749 2 269 512	-1 908 962 360 550	399 828 760 378	-568 703 191 675	-191 675 0	0 0
Avance Collectivités ou e Remboursement Avance o	- ou Emprunts		2 100 000	réception en profes	- ture				6 600 000	-		· ·		- - 8		3 700 000 3 700 000
Avances inter OP	120 000	-	120 000 Date de té	00316 20250926 Im Hétransmission : 03/	10/2025 -			-	•							-
SOLDE TRESORERIE CUMULEE	20 000		Date de ré 1 239 818 blié le :	ception préfecture 03/130330235	5 896 127	6 560 921	4 282 184	8 213 332	13 816 662	13 217 261	10 969 512	9 060 550	9 460 378	8 891 675	0	0



Mérignac Marne - CRF 2024 Annexe 3 - Tableau des acquisitions et cessions

Jugements Actes

ACQUISITIONS EN 2024

Ilots	Parcelles	Surfaces terrains m ²	Vendeur(s) / Propriétaire(s)	Date promesse	Date acte/jugement	Prix HT hors remploi	HT remploi	Indemnités diverses
A8	BW 153	1 803	SCI	néant	31/01/2024	1 544 545 €	155 455 €	0€
B1 B7	AY 715	1 162	SAS	néant	12/03/2024	34 860 €	0€	0€

CESSION EN 2024


llots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
В3	BX n°846, 848, 853, 857, 872	2791	SNC	Accession libre 3428,9 m ² Accession abordable 632,3 m ² Commerce micro crèche 778,2 m ²	4839,4	14/02/2024	21/11/2024	1 618 081,20 €

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110107-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025

Description du programme de construction (en m² SP et %)


Nature du programme	Programmation	n initiale	Prévisions actualis	sées 2024	Variation %
Nature du programme	m² SP	%	m² SP	%	variation %
Locatif social	24 892	35%	26 906	34,3%	8%
PLAI	7 468	10%	8 072	10,0%	8%
PLUS	17 425	25%	18 834	25,0%	8%
PLS	_	_			
Accession sociale	8 890	12,5%	13 063	16,6%	47%
Accession abordable	8 890	12,5%	4 965	6,3%	-44%
Accession libre	28 448	40,0%	33 583	42,8%	18%
Sous total logements	71 121	76%	78 517	80%	10%
Commerces et activités	22 575	24%	19 292	20%	-15%
Total	93 696		97 809		4%






Nature du programme	Programmation initiale	%	Programmation actualisée 2024	%	Variation%
Locatif social	383	35,0%	404	36,1%	5%
PLAI	115	10,0%	121	10,8%	5%
PLUS	268	24,5%	283	25,0%	5%
PLS	_	_			
Accession sociale	137	12,5%	184	16,4%	34%
Accession abordable	137	12,5%	61	5,5%	-55%
Accession libre	438	40,0%	469	42,0%	7%
Sous total logements	1 095		1 118		2%

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

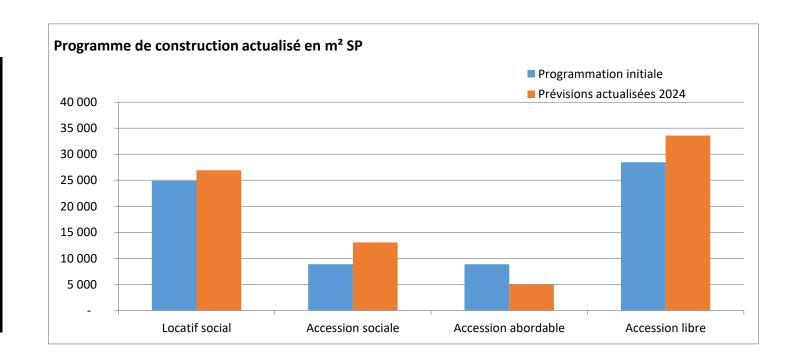

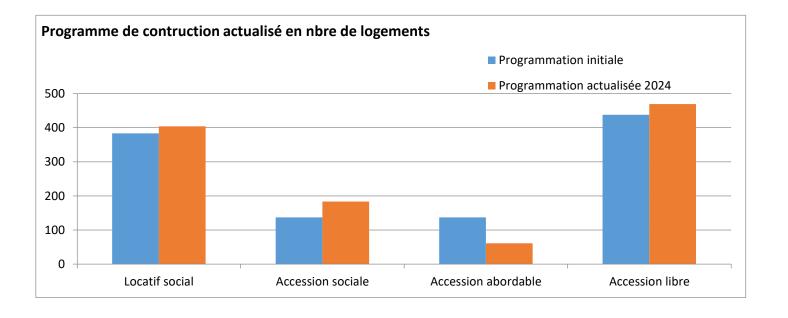

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110107-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025



Opération d'aménagement Marne - CRF 2024 Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % à l'étape de cession des charges foncières ou de délivrance des PC

				Etat d'ava	ancement	
Nature du programme	Programme	actualisé 2024	Réa	lisé	Reste à	réaliser
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	26906	34%	8 675	32%	18231	68%
PLAI	8072	8%	2 603	32%	5469	68%
PLUS	18834	25%	6 073	32%	12761	68%
PLS	_	_	_	_	_	_
Accession sociale	13063	17%	2 901	22%	10162	78%
Accession abordable	4965	6%	3 914	79%	1051	21%
Accession libre	33583	43%	16 959	50%	16625	50%
Sous total logements	78 517		32449	41%	46068	59%
Commerces et activités	19 292		4465	23%	14826	77%
Total	97 809		36914	38%	60895	62%

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements à l'étape de cession des charges foncières ou de délivrance des PC


	ou uc uciii							
		Etat d'avancement						
Nature du programme	Programme actualisé 2024	Réa	lisé	Reste à	réaliser			
		m² SP	%	m² SP	%			
Locatif social	404	119	29%	285	71%			
PLAI	115	36	31%	79	69%			
PLUS	268	100	37%	168	63%			
PLS	_	_	_	_	_			
Accession sociale	184	41	22%	143	78%			
Accession abordable	61	55	90%	6	10%			
Accession libre	469	232	50%	237	50%			
Sous total logements	1 118	447	40%	670	60%			


Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-lmc1110107-DE-1-1

Date de télétransmission : 03/10/2025 Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025

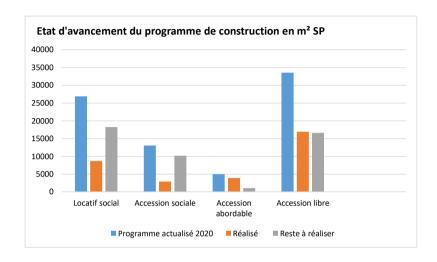

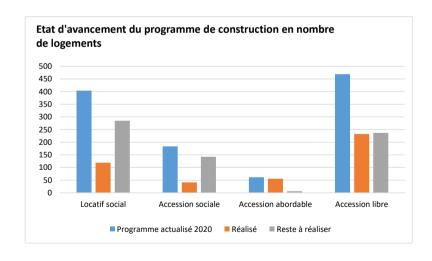



Opération d'aménagement Marne - CRF 2024 Programme de construction échelonné dans le temps*

ANNEXE 4c

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

		1				р									
Nature du programme	Programmation	Programmation													
	initiale	actualisée 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Locatif social	24 892	26 906	2 546	622	0	5 507	0	0	0	4 304	10 937	848	2 142	0	
PLAI (30%)	7 468	8 072	764	187	0	1 652	0	0	0	1 291	3 281	254	642	0	
PLUS (70%)	17 425	18 834	1 782	435	0	3 855	0	0	0	3 013	7 656	594	1 499	0	
PLS	_	_													
Accession sociale	8 890	13 063	1 011	0	0	1 890	0	0	0	2039	6 415	485	1 224	0	
Accession abordable	8 890	4 965	725	544	0	2 645	0	0	632	0	418	0	0	0	
Accession libre	28 448	33 583	2 946	933	0	9 651	0	0	3429	0	12 781	1 090	2 754	0	
Sous total logements	71 121	78 517	7 228	2 099	0	19 693	0	0	4 061	6 343	30 551	2 423	6 119	0	0
Variation		7 396													
Commerces et activités	22 575	19 292	1 051	113	0	2 202	0	1 100	778	2 670	7 668	2 412	1 298	0	
Variation		-3 283													
Total	93 696	97 809	8 279	2 212	0	21 895	0	1 100	4 839	9 013	38 219	4 835	7 417	0	0

Nature du programme	Programmation	Programmation													
	initiale	actualisée 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Locatif social	383	404	34	8	0	77	0	0	0	87	155	10	33	0	
PLAI	115	121	10	2	0	23	0	0	0	26	47	3	10	0	
PLUS	268	283	24	6	0	54	0	17	0	61	109	7	23	0	
PLS	_	_													
Accession sociale	137	184	12	0	0	29	0	0	0	27	91	6	19	0	
Accession abordable	137	61	10	5	0	32	0	0	8	0	6	0	0	0	
Accession libre	438	469	41	13	0	134	0	0	44	0	182	13	42	0	
Sous total logements	1 095	1118	97	26	0	272	0	0	52	114	434	28	94	0	0

^{*} Cession des charges foncières ou délivrance PC

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110107-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025

Date de réception préfecture : 03/10/2025

Publié le : 03/10/2025



BILAN AMENAGEUR

Mérignac Marne BILAN PRÉVISIONNEL CRFA 2024

ANNEXE 5

Aménageur

Column C	DEPENSES			€HT	CRFA 2023 € TVA	€TTC	€ HT	CRFA 2024 € TVA	€ TTC	Ecarts € HT	Commentaires
Total Content	DEFENSES			EHI	EIVA	ETIC	EIII	ETVA	EIIC	EHI	
Communication											
March Services 1,500		S									Prise en compte des depenses de maitrise d'œuvre urbaine realisees annuellement
March Services 1,500	Frais d'acquisition et de libération	n des sols		10 429 021	353 007	10 782 028	10 590 641	333 212	10 923 854	161 620	
Transport 1979 19 19 19 19 19 19	•										
Transport Company Transport Transpor	- détail acquisitions										
Text State And everywhat a factor work of the last 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* Fonciers privés			6 279 281	12 546	6 291 827	6 654 743	19 518	6 674 261	375 462	Augmentation prévisionnelle des acquisitions foncières secteur Jardiland
1.00.000 1.00.000											
Transfer 1	•	autres frais								-113 843	Ajustement
20.5 20.5					204 972			204 972		0	
Triangle					70,000			50,000		100,000	Dissipution des alées
Miles of Section 1909 19	Aleas (5%)			350 000	70 000	420 000	250 000	50 000	300 000	-100 000	Diminution des aleas
March September 1995 199	Frais d'aménagement			7 375 515	1 469 125	8 844 639	7 430 279	1 482 439	8 912 718	54 765	
Security				486 000	95 914	581 914	486 000	95 914			
Part	Travaux et aléas			6 517 985	1 298 905	7 816 891	6 572 750	1 312 220	7 884 970	54 765	
Transported naive equipments public de superintative	·	edis, Suez,		371 529	74 306	445 834	371 529	74 306	445 834	0	ionale. Not so dopres de sim
Homoconies concession	(Sabom)										
Trail of communication	Participation aux equipements pu	blics de supers	tructure								
Trail of communication							T	Т			
Trail of communication											
Fails decommunication	Honoraires concession										
First Stores				2 050 000		2 050 000	2 050 000		2 050 000		
Faith Contents 10 10 10 10 10 10 10 1	Frais de communication			360 000	69 406	429 406	402 000	77 205	479 205	42 000	
Faith Contents 10 10 10 10 10 10 10 1	Fuels divisus			242 200	16.050	220.240	171 200	0.537	100 777	42,000	
Section Sect					16 050			95//		-42 000	
Activation 380 000 76 000 456 000 55 0					16.050			9 577		-42 000	
TVA enclased / reverse 394 011 394 011 394 011 141 445 413 465 141 445	Trais divers (Assarance, Taxes)			130 331	10 050	147 000	88 331	3317	36 328	-42 000	
TVA enclased / reverse 394 011 394 011 394 011 141 445 413 465 141 445	Actualisation			380 000	76 000	456 000	375 000	75 000	450 000	-5 000	
TOTAL DES DEPENSES 21 945 786 2 605 199 24 550 934 22 177 121 2 620 698 24 797 819 22 3385											
TOTAL DES DEPENSES 21 945 786 2 605 199 24 550 934 22 177 121 2 620 698 24 797 819 22 3385	TVA ancaissán / royarsán				204 011	204 011		412.465	412.465		
TOTAL DES DEPENSES 21 945 786 2 605 199 24 550 934 22 117 121 2 620 688 24 787 819 231 385	·										
Size	TVA encaissee / reversee				394 011	394 011		413 465	413 465		
Size	TOTAL DES DEPENSES			21 945 736	2 605 199	24 550 934	22 177 121	2 620 698	24 797 819	231 385	
Silan origine CRA 2024 4 999 007 701 970 5700 977	101112 220 221 211020			220.0700	2 000 200	1.000 50 .		2 020 000	21707 020		
Cession charges foncières Neume a' 99 June 1970 719	RECETTES	- · ·			€TVA	€ TTC	€HT	€TVA	€ TTC	€ HT	
Accession Note 333 93 2304344 460 850 2765 213 184 Accession abordable 133 143 1343 18 26 664 161318 133131 27 676 165786 1616788 14 Accession abordable 133 143 1343 18 26 664 161318 133131 27 676 165786 184 14 Accession abordable 127 147 147 147 147 147 147 147 147 147 14	Cessions charges foncières				701 970	5 700 977	5 187 819 20	716 981	5 904 801	188 812	
Locatif Scale (PULS-PLAI - PLS) 220 220 270 849 959 49 938 889 553 889											Cession des charges foncières de l'îlot B8
Accession sociale (PSIA) 207 207 849 959 49 933 89 953 89											Ajustement de la programmation de l'îlot A8
Commerce et services 224 224 435 678 87126 522 759 436 114 872 23 523 337 1991										130 902	
Retricipation constructeurs 1639 332 1991 1659 332 1991 1659 332 1991 1659 1891 1659 1		224	224	425 629	97 126	E22 7E2	426 114	97 222	E22 227	496	
Participation constructeurs Pris unit m ¹ 99 unit m ¹		224	224							460	
Participation équipements d'intérêt Participation métropolitaine au titre: 16 835 375 1896 671 18 732 046 7 352 019 7 352 019 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 1896 671 18 80027 9 483 356 18 80027 18 80027											
Participation équipements d'intérêt Subventions		Prix unit m² SP	x unit m²								
Subventions											
Subventions											
Subventions	Participation équipoments diretés	ât									
Participation métropolitaine au titre : 16 835 375 1 896 671 18 732 046 Participation équilibre 7 352 019 Participation remise d'ouvrages 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation complément prix Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 7	ratticipation equipements d'inter	ei									
Participation métropolitaine au titre : 16 835 375 1 896 671 18 732 046 Participation équilibre 7 352 019 Participation remise d'ouvrages 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation complément prix Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 3 356 22 7	Subventions										
Participation équilibre 7 352 019 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation complément prix 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 356 1 896 671 11 380 027 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 356 1 896 671 11 380 027 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 356 1 896 671 11 380 027 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 948 356 1 896 671 11 380 027 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22	Jupremions										
Participation remise d'ouvrages 9 483 356 1 896 671 11 380 027 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation complément prix 9 483 356 1 896 671 11 380 027 Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communes 18 930 3 78		tre :			1 896 671			1 896 671			
Participation complément prix Participation communale à la remise d'ouvrage 18 930 3 786 22 716 Participation communes 18 9					1 896 671			1 896 671			
Participation communes 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716				1 130 000			3 .55 550				
Participation communes 18 930 3 786 22 716 18 930 3 786 22 716	Participation communate à la rem	ise d'ouvrage		10 020	2 706	22.716	10 020	2 706	22.716		
Autres recettes 92 424 2 772 95 195 Produits divers Produits financiers Accusé de réceptigg 167 préfecture 033-243 00316-20250926-lmc1110107-DE-1-1 Date de télétransmission: 03/10/2025 TOTAL DES RECETTES Date de réceptiggappréfecture 2 60/19/2025 24 550 934 134 996 3 260 3 3 260 3 260 5 9701 3 260 6 2 961 75 295 75 295 75 295 42 573 40 132 40 132 Produits financiers 2024 Froduits financiers 2024 Total Des Recettes Date de réceptiggappréfecture 2 60/19/2025 24 550 934 22 177 121 2 620 698 2 4 797 819 2 31 385	•	ise u ouvrage									
Produits divers					•						
033-243 00316-20250926-Imc1110107-DE-1-1				92 424	2 772						Produits financiers 2024
033-243 00316-20250926-Imc1110107-DE-1-1		Ac	cusé d	e réception p	oréfecturé ''	35 162		3 200			
TOTAL DES RECETTES Date de réceptions pap réfecture 2 602/199/2025 24 550 934 22 177 121 2 620 698 24 797 819 231 385		03	33-243	B00316-2025092	26-lmc11101 07	/-DE-1-1					
	TOTAL DES RECETTES					025 24 550 93 4	22 177 121	2 620 698	24 797 819	231 385	

Annexe 6

C0004 Mérignac Marne - Liste des dépenses réglées à fin 2024

		1
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture
1 DEPENSES	Date Factore	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
A ETUDES GENERALES		
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste		
24-06887 Ilot B8 Indemnisation consultation MOE - FABRIQUE ATELIER ARCHITECTURE		
019977 SOLDE	01/02/2024	FA FAA-
24-06888 Ilot B8 Indemnisation consultation MOE - TECTONE	02/02/2021	
019976 SOLDE	30/01/2024	FA
24-07009 Ilot B8 Indemnisation consultation MOE - DAUPHINS	33, 32, 232 :	
020146 SOLDE	23/02/2024	FA
M2014-017 Moe urbaine - DEBARRE-DUPLANTIERS	23/02/2021	177
005370 SOLDE BDC10	20/10/2017	FA 017DDA107
005983 SOLDE BDC 12	15/03/2018	FA 018DDA026
006624 SOLDE BDC 14	12/09/2018	FA 018DDA072
006625 SOLDE BDC 16	12/09/2018	FA 018DDA073
006761 SOLDE BDC 18	05/10/2018	FA 018DDA085
007027 SOLDE BDC 17	21/11/2018	FA 018DDA095
007694 SOLDE BDC 21	05/03/2019	FA 19DDA24
008027 AC1 BDC 24	07/05/2019	FA 019DDA37
008028 SOLDE BDC 25	09/05/2019	FA 019DDA38
008029 SOLDE BDC 26	09/05/2019	FA 019DDA39
008030 SOLDE BDC 27	09/05/2019	FA 019DDA40
008183 BDC28	11/06/2019	FA 019DDA56
008338 SOLDE BDC 29	05/07/2019	FA 019DDA68
008339 SOLDE BDC 30	05/07/2019	FA 019DDA69
008744 SOLDE BDC 19	27/09/2019	FA 019DDA97
008745 SOLDE BDC 20	27/09/2019	FA 019DDA98
008747 SOLDE BDC 23	27/09/2019	FA 019DDA100
008748 SOLDE BDC 24	27/09/2019	FA 019DDA101
008746 SOLDE BDC 22	27/09/2019	FA 019DDA99
008938 SOLDE BDC 34	25/10/2019	FA 019DDA110
009136 REGUL REVISIONS BDC27-28 et 30	26/11/2019	FA26112019
009188 SOLDE	27/11/2019	FA 019DDA121
009189 SOLDE	27/11/2019	FA 019DDA120
010709 SOLDE BDC 36	31/07/2020	FA 020DDA46
010710 SOLDE BDC 38	31/07/2020	FA 020DDA47
010711 SOLDE BDC 39	31/07/2020	FA 020DDA48
010712 SOLDE BDC 40	31/07/2020	FA 020DDA49
010713 SOLDE BDC 26	31/07/2020	FA 020DDA45
011223 SOLDE BDC 35	28/10/2020	FA 019DDA126
012021 SOLDE	27/01/2021	FA 021DDA16
012020 SOLDE	27/01/2021	FA 021DDA15
012019 SOLDE	27/01/2021	FA 021DDA14
012207 BDC 43	22/03/2021	FA 021DDA40
012208 BDC 44	22/03/2021	FA 021DDA41
012428 SOLDE	26/04/2021	FA 021DDA58

	07/04/0004	
012429 SOLDE	27/04/2021	FA 021DDA59
012431 SOLDE	28/04/2021	FA 021DDA61
013526 SOLDE BDC 49	20/10/2021	FA 021DDA136
014067 SOLDE BDC 48	01/01/2022	FA 021DDA165
M2014-017 Moe urbaine - FRANCK BOUTTE		
005371 SOLDE BDC10	27/10/2017	FA F.17277
005984 SOLDE BDC12	20/03/2018	FA F.18050
006626 SOLDE BDC 13	12/09/2018	FA F.18267
007286 SOLDE BDC 11	19/12/2018	FA F.18434
013525 SOLDE	20/10/2021	FA 21269
M2014-017 Moe urbaine - VERDI INGENIERIE		
006656 SOLDE BDC15	31/08/2018	FA 55-18-08-
M2021-030/Lot1/BDC1 M2 : Etudes capacitaires ilot B8 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
013720 SOLDE	15/11/2021	FA 021DDA143
M2021-030/lot1/BDC10 M2.2 Etude capacitaire à l'échelle des îlots A3 – A4 - DEBARRE-		
018581 SOLDE	30/08/2023	FA 023DDA053
M2021-030/lot1/BDC11 M4.1 Participation aux jurys de selection du projet A5-A6 - DEBARRE-		
018574 SOLDE	30/08/2023	FA 023DDA056
M2021-030/lot1/BDC11 M4.1 Participation aux jurys de selection du projet A5-A6 - SOMMER		
019012 SOLDE	28/07/2023	FA 23/07/190
M2021-030/lot1/BDC12 M2.2 Etudes capacitaires à l'échelle de l'ilot - foncier LAMECOL -	.,.,.	1,1,1
018582 SOLDE	30/08/2023	FA 023DDA054
M2021-030/lot1/BDC13 M3.1 : Elaboration d'une fiche de lot / lot B8 - DEBARRE-DUPLANTIERS	55, 55, 2525	
018575 SOLDE	30/08/2023	FA 023DDA057
M2021-030/lot1/BDC14 Mission 4.1 Participation aux jurys de selection 2 archi - projet A5-A6 -	30,00,2023	1710230071037
018040 SOLDE	31/05/2023	FA 023DDA038
M2021-030/lot1/BDC14 Mission 4.1 Participation aux jurys de selection 2 archi - projet A5-A6 -	31/03/2023	174 0230071030
018036 SOLDE	30/04/2023	FA 23/04/090
M2021-030/lot1/BDC15 M1.1 & M2.2 ilots Jardiland et ex-Citroën - DEBARRE-DUPLANTIERS	30/04/2023	1 A 23/04/030
020733 SOLDE	24/04/2024	FA 024DDA016
M2021-030/lot1/BDC16 M4.3 avis sur PCM îlot B3 - DEBARRE-DUPLANTIERS	24/04/2024	1 A 024DDA010
018573 SOLDE	30/08/2023	FA 023DDA055
M2021-030/lot1/BDC17 M2.2 Etude capacitaire & M3.2 fiche d'îlot A8 - DEBARRE-DUPLANTIERS	30/08/2023	FA 023DDA033
022699 SOLDE	07/11/2024	FA
M2021-030/lot1/BDC18 M3.1 : Elaboration fiche de lot ilot A9 - DEBARRE-DUPLANTIERS	07/11/2024	ГА
	07/11/2024	EA 034DDA063
022700 SOLDE	07/11/2024	FA 024DDA062
M2021-030/lot1/BDC19 M4.1 Participation sélection projets et particiation aux jurys - îlot B8 -	44/04/2024	FA 034DD 4004
019785 SOLDE	11/01/2024	FA 024DDA001
M2021-030/lot1/BDC19 M4.1 Participation sélection projets et particiation aux jurys - îlot B8 -	04 /04 /2024	5 A 22 /42 /227
019806 SOLDE	01/01/2024	FA 23/12/327
M2021-030/Lot1/BDC2 M1.1 Actualisation des ambitions environnementales du projet urbain à	04 /04 /0000	5. 00155.160
014069 SOLDE	01/01/2022	FA 021DDA163
014585 SOLDE	02/03/2022	AV 021DDA163
015545 SOLDE	23/06/2022	FA 022DDA053
M2021-030/Lot1/BDC2 M1.1 Actualisation des ambitions environnementales du projet urbain à		
015555 SOLDE	23/06/2022	FA 22/06/166
M2021-030/lot1/BDC20 M4.2 Participation réunion mise au point projet / îlot B5 - DEBARRE-		
019724 SOLDE	01/01/2024	FA 023DDA095
M2021-030/lot1/BDC21 M.4.2 îlots A5-A6 & B5 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
020583 SOLDE	28/03/2024	FA 024DDA015
M2021-030/lot1/BDC21 M.4.2 îlots A5-A6 & B5 - SOMMER (LE) ENVIRONNEMENT		
020584 AC1	05/04/2024	FA

M2021-030/lot1/BDC22 M.4.2 îlot B8 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
022204 SOLDE	26/09/2024	FA 024DDA051
M2021-030/lot1/BDC22 M.4.2 îlot B8 - SOMMER (LE) ENVIRONNEMENT		
022673 SOLDE	30/10/2024	FA
M2021-030/lot1/BDC23 M4.7 îlot Jardiland - DEBARRE-DUPLANTIERS		
020734 SOLDE	24/04/2024	FA 024DDA017
M2021-030/lot1/BDC24 M.4.2 îlot B8 : atelier de projet n°3 APD Bis [pension de famille] -		
022656 SOLDE	05/11/2024	FA 024DDA060
M2021-030/lot1/BDC24 M.4.2 îlot B8 : atelier de projet n°3 APD Bis [pension de famille] -		
022663 SOLDE	05/11/2024	FA
M2021-030/Lot1/BDC3 M2 : Etude capacitaire ilot A5 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
014070 SOLDE	01/01/2022	FA 021DDA164
M2021-030/Lot1/BDC4 M4.4 : Avis DCE ilots B3 et B5 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
018037 SOLDE	30/05/2023	FA 023DDA037
M2021-030/Lot1/BDC5 M3 - Elaboration des fiches d'ilots (architecte urbaniste + BE	30/03/2023	TA 023DDA037
015548 SOLDE	23/06/2022	FA 022DDA054
M2021-030/Lot1/BDC5 M3 - Elaboration des fiches d'ilots (architecte urbaniste + BE	23/00/2022	1 A 022DDA034
	23/06/2022	EA 22/00/107
015546 SOLDE	23/06/2022	FA 22/06/167
M2021-030/Lot1/BDC6 M3 - Elaboration des fiches d'ilots (architecte urbaniste + BE	22/25/222	5. 00055.055
015551 SOLDE	23/06/2022	FA 022DDA055
M2021-030/Lot1/BDC6 M3 - Elaboration des fiches d'ilots (architecte urbaniste + BE		
015549 SOLDE	23/06/2022	FA 22/06/168
M2021-030/Lot1/BDC7 M4.2 Dans le cadre de la mise au point des PC - participation à des		
016155 SOLDE	26/09/2022	FA 022DDA086
M2021-030/Lot1/BDC8 M3.2 : Elaboration de fiches d'ilots (architecte urbain + BE		
016037 SOLDE	13/09/2022	FA 022DDA077
M2021-030/Lot2/BDC1 M2 : FICHE TECHNIQUE ILOT AA5 A6 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
014068 SOLDE	01/01/2022	FA 021DDA162
M2021-030/Lot2/BDC3 M2 : fiche technique ilot B8 Sud - DEBARRE-DUPLANTIERS		
018206 SOLDE	28/06/2023	FA023DDA048
M2021-030/Lot2/BDC4 M2 Elaboration fiche d'îlot - ilot A9 - DEBARRE-DUPLANTIERS		
018207 SOLDE	28/06/2023	FA023DDA049
M2021-030/lot2/BDC6 M3.1 Particpation sélection projets & participation jury îlot A5 A6 -		
020806 SOLDE	30/04/2024	FA 024DDA020
M2021-030/lot2/BDC7 M1.2 Modif piste cyclable Mendes France & Reprise PRO DCE nouvelle		
019338 AC1 11/23	28/11/2023	FA FA2023-
022802 AC2	19/11/2024	FA FA2024-
M2021-030/lot2/BDC7 M1.2 Modif piste cyclable Mendes France & Reprise PRO DCE nouvelle		
019344 AC1 10/23	28/11/2023	FA 023DDA090
022774 SOLDE	18/11/2024	FA 024DDA066
M2021-030/lot2/BDC8 M1.2 Reprise plan et notice [dossier de séciruté] - CAB INGENIERIE		
020802 SOLDE	29/04/2024	FA FA2024-
A102 Etude commerciale		
M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE		
008976 AC1	31/10/2019	FA 1910-223
009950 AC2	28/02/2020	FA 2002-041
M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO DEVELOPPEMENT		
008981 AC1	30/10/2019	FA 19-10-135
009957 AC2	09/03/2020	FA 2003167
M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA VILLE	03/03/2020	1 A 2003107
	21/10/2010	FA 2010 10 FO
008978 AC1	31/10/2019	FA 2019,10,58
009955 AC2	06/03/2020	FA 20200309

M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE		
008982 AC1	30/10/2019	FA 20191030a
009952 AC2	09/03/2020	FA 20200306B
M2018-032/BDC 10 M2 Diagnostic et préconisation à l'échelle de secteurs prioritaires de	03/03/2020	174 20200300B
015291 AC1	22/02/2022	FA 2202-
015876 AC2	30/06/2022	FA 2206-
M2018-032/BDC 11 Etude de programmation des RDC actifs (complément du BDC 9) - SENS DE	30,00,2022	17(2200
015870 SOLDE	31/05/2022	FA 2022,05,52
M2018-032/BDC 3 M2 Diagnostic et préconisations merchandising 4 cheminsl - BERENICE	31/03/2022	17(2022,03,32
010493 AC1	26/06/2020	FA 2006-119
011777 AC2	01/01/2021	FA 2007-
012067 SOLDE	26/02/2021	FA 2102-
M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - BERENICE	20/02/2021	17/2102
012018 AC1	01/01/2021	FA 2011-
012468 SOLDE	30/04/2021	FA 2104-
M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - PRO DEVELOPPEMENT	30/04/2021	1 A 2104-
012016 AC1	01/01/2021	FA 20-12-222
012980 AC2	26/07/2021	FA 20-12-222 FA 21-07-282
M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - SENS DE LA VILLE	20/07/2021	FA 21-07-202
012017 AC1	01/01/2021	FA 2020 12 44
013978 SOLDE	01/01/2021	FA 2020,12,44
014486 REGUL		FA 2021-12-
M2018-032/BDC 5 M2 Appui llot B3 et accompagnement A5 - BERENICE	01/01/2022	FA 2021-12-
012689 AC1	20/02/2021	FA 2012
	29/03/2021	FA 2013-
013274 SOLDE	30/04/2021	FA 2104-
M2018-032/BDC 8 M3.3 Assistance en phase commercialisation : réunion du 15/10/21 -	40/44/2024	54.2444
013752 SOLDE	19/11/2021	FA 2111-
M2018-032/BDC9 Etude de programmation des RDC actifs - SENS DE LA VILLE	10/00/0000	
014733 AC1	18/03/2022	FA 2022,03,21
016610 AC2	15/11/2022	FA
017763 SOLDE	04/04/2023	FA 20230427
M2024-017 Etude de marché et faisabilité économique d'exploitation - ATIS		
021841 AC2	22/07/2024	FA 2024-31
022711 AC3	09/12/2024	FA 2024-14
M2024-017 Etude de marché et faisabilité économique d'exploitation - FONCIERE SOLIDAIRE		
021629 AC1	19/07/2024	FA 2024-12
022711 AC3	09/12/2024	FA 2024-14
A103 Coordination OPC urbain		
M2018-035/BDC 8 Mission 3 : mars 2022 à août 2022 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
014798 AC1	31/03/2022	FA 22F0131
015053 AC2	29/04/2022	FA 22F0200
015224 AC3	30/05/2022	FA 22F0256
015593 AC4	30/06/2022	FA 22F0317
015783 AC5	29/07/2022	FA 22F0404
015950 SOLDE	30/08/2022	FA 22F0469
M2018-035/BDC 9 M3 et M4 : sept 2022 à janv 2023 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
016207 AC1	03/10/2022	FA 22F0547
016500 AC2	31/10/2022	FA 22F0631
016721 AC3	30/11/2022	FA 22F0737
017009 AC4	01/01/2023	FA 22F0785
017235 SOLDE	31/01/2023	FA 23F0015
M2018-035/BDC1 Mission 1 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		

207C04 COURE BRC 4	20/02/2010	EA 4050422
007681 SOLDE BDC 1	28/02/2019	FA 19F0123
007829 AC2	28/03/2019	FA 19F0252
008006 SOLDE BDC1	30/04/2019	FA 19F0304
008663 REGUL REV	17/09/2019	FA 17/09/19
M2018-035/BDC2 Mission 2 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)	2 . /2 . /2	
009772 SOLDE	31/01/2020	FA 20F0088
M2018-035/BDC3 Missions 2 et 4 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
010195 AC 1	30/04/2020	FA 20F0294
M2018-035/BDC4 Mission 2 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)	2 . /2 . /2	
010689 SOLDE	31/07/2020	FA 20F0518
M2018-035/BDC5 Mission 3 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
011081 AC1	28/09/2020	FA 20F0656
011382 AC2	30/10/2020	FA 20F0789
011533 AC3	01/01/2021	FA 20F0827
011843 AC4	01/01/2021	FA 20F0917
012006 AC 5	29/01/2021	FA 21F0011
012113 AC6	26/02/2021	FA 21F0051
012303 SOLDE	31/03/2021	FA 21F0107
M2018-035/BDC6 Mission 3 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
012302 AC1	31/03/2021	FA 21F0109
012659 AC2	31/05/2021	FA 21F0270
012503 AC3	30/04/2021	FA 21F0187
012836 AC4	30/06/2021	FA 21F0302
013068 AC5	30/07/2021	FA 21F0360
013177 SOLDE	30/08/2021	FA 21F0422
M2018-035/BDC7 Mission 3 : septembre 2021 à février 2022 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
013390 AC1	30/09/2021	FA 21F0492
013633 AC2	29/10/2021	FA 21F0565
013851 AC3	30/11/2021	FA 21F0636
014165 AC4	01/01/2022	FA 21F0723
014400 AC5	31/01/2022	FA 22F0008
014624 SOLDE	28/02/2022	FA 22F0055
M2022-060/BDC1 Mission OPC-IC / M2 - MI 01.23 à 03.23 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
017764 SOLDE	31/03/2023	FA 23F0174
M2022-060/BDC2 Mission OPC-IC / M2 - MI 04.23 à 06.23 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
018273 SOLDE	30/06/2023	FA F23F0352
M2022-060/BDC3 Mission OPC-IC / M2 07.23 à 12.23 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
018955 AC1	29/09/2023	FA 23F0642
019771 SOLDE	01/01/2024	FA 23F0939
M2022-060/BDC4 Mission OPC-IC / M2 01.24 à 06.24 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
020632 AC1	29/03/2024	FA 24F0207
021867 SOLDE	28/06/2024	FA 24F0435
M2022-060/BDC5 Mission OPC-IC / M2 07.24 à 12.24 - SETEC OPENCY (ex PLANITEC)		
022383 AC1 09/24	30/09/2024	FA 24F0722
A105 Etudes environnementales		
M2015-016/046 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE		
007019 AC1	19/11/2018	FA 18-267
M2015-016/MS35 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE		
006232 AC1	25/05/2018	FA 18-081
006920 SOLDE	31/10/2018	FA 18-261
007648 SOLDE	28/02/2019	FA 19-022
	_	+

007578 SOLDE	15/02/2019	FA 1902953
M2018-015/BDC 4 Etude qualité de l'air - TECHNISIM		
007629 SOLDE	15/02/2019	FA 1902953
M2018-015/BDC 5-2 Etude qualité de l'air - TECHNISIM		
007229 SOLDE BDC 5-2	30/11/2018	FA 1811936
M2018-024/BDC 6 BDC 6 SSP llot Speedo Fils du boucher - ARCAGEE		
010083 AC1	31/03/2020	FA 20-054
M2018-024/BDC1 BDC 1 llot B2 B6 - ARCAGEE		
007764 SOLDE	18/03/2019	FA 19-037
M2018-024/BDC19 BDC19 PLAN DE GESTION ILOT A9 - ARCAGEE		
010708 AC1	29/07/2020	FA 20-128
011979 AC 2	08/02/2021	FA 21-026
M2018-024/BDC4 BDC 4 Jardin des essais - ARCAGEE		
007766 SOLDE	21/03/2019	FA 19-039
M2018-024/BDC5 BDC5 Ilot B2/B6 - ARCAGEE		
008160 BDC5	31/05/2019	FA 19-101
M2019-046 Tableau de bord suivi des mesures ERC - INGEROP		
010124 AC 1	20/04/2020	FA 2020 02810
M2020-005 Expertise naturaliste - NYMPHALIS		1 1 1 1 1 1
010932 SOLDE	17/09/2020	FA F2009110
M2021-030/lot1/BDC13 M3.1 : Elaboration d'une fiche de lot / lot B8 - SOMMER (LE)	27,0372020	
019011 SOLDE	30/06/2023	FA 23/06/158
M2022-028 Etude "gestion décentralisée des biodéchets - SOMMER (LE) ENVIRONNEMENT	30,00,2023	177 23/00/130
016750 AC1	30/11/2022	FA 22/11/351
017770 SOLDE	31/03/2023	FA 23/03/053
M2023-055/BDC1 Gisements et gestion biodéchets : Missions 1 à 4 - ELCIMAI ENVIRONNEMENT	31/03/2023	TA 23/03/033
021012 AC1	27/05/2024	FA EV 004014
		FA EV-004014
021688 AC2	29/07/2024	FA EV-004364
022216 AC3	27/09/2024	FA EV-004632
022644 AC4	31/10/2024	FA EV-004855
A106 Etude mobilité		
M2019-039 Lot 1/BDC12 MARNE enquête circulation pied/vélo - NOVA 7		
019658 AC1	05/10/2023	FA 231002
019660 AC1 S/BDCBIS	18/10/2023	FA231006
M2022-081 Etude de circulation sur le secteur Mérignac Marne - Av de la Marne - TRANSITEC		
017657 AC1	28/03/2023	FA 23200
018003 SOLDE	23/05/2023	FA 23339
M2023-052/BDC1 Marne Atelier de lancement et réunion - VELIPRO (VIRAJ)		
020368 AC1 SOLDE	18/03/2024	FA F-347
M2023-052/BDC4 Marne Expérimentation prêt vélo Marne - VELIPRO (VIRAJ)		
020668 AC1 SOLDE	16/04/2024	FA F-385
A107 Sondages géotechniques		
M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 3 - GEOTEC		
006193 SOLDE	14/05/2018	FA 182387
006989 AC1	09/11/2018	FA 186 678
007004 AC2	15/11/2018	FA 186 838
009352 REGUL AFFECTATION	30/11/2019	FA30112019
M2016-015/BDC19 Etude géotechnique avant démol Speedy - GEOTEC		
010766 AC1	14/08/2020	FA 205084
M2016-015/BDC4 2/2 Etudes géotechniques lot 3 - GEOTEC		
M2016-015/BDC4_2/2 Avance	29/01/2018	
005877 AC 2	28/02/2018	FA 180 889
000077 NO E	20,02,2010	177 100 003

000004 AC2	00/02/2010	EA 40400E
005954 AC3	09/03/2018	FA 181095
006445 AC 4	20/07/2018	FA 184090
006540 AC 5	24/08/2018	FA 184 732
M2018-024/BDC 29 Diag complémentaire après démolition CD33 - ARCAGEE		
013623 SOLDE	28/10/2021	FA 21-255
M2018-024/BDC 30 Etude sols travaux Fourchateau - ARCAGEE		
013977 SOLDE	01/01/2022	FA 21-295
M2020-052 LOT 1/BDC18 llot B8 études et essais géotechniques Secteur ouest (études G1) -		
018996 AC1	20/10/2023	FA
022404 SOLDE	15/10/2024	FA
M2020-052 LOT 1/BDC7 Diagnostic amiante / enrobés existants - accès locaux commerciaux :		
014726 AC1	21/03/2022	FA
014789 AC2	30/03/2022	FA
A108 Géomètre		
M2016-003/BDC22 Plan topo jardin des essais - MAGEO		
005585 SOLDE	30/11/2017	FA FC8765
M2016-003/BDC24 Géo detection réseaux classe A - ADRE RESEAUX		
006556 SLDE	11/04/2018	FA F2018-426
M2016-003/BDC24 Géo detection réseaux classe A - MAGEO	, , , , , ,	
006594 SLDE	31/08/2018	FA FC9897
M2016-003/BDC27 Plan topo AZ285 286 287 - MAGEO	31/00/2010	1711 03037
006499 SOLDE	31/07/2018	FA FC9820
M2016-003/BDC35 Collecte renseignements rue de la Somme - MAGEO	31/07/2018	17103020
007173 SOLDE BDC 35	30/11/2018	FA FC10363
M2016-003/BDC44 Complément levée topo avenue de Belfort - MAGEO	30/11/2018	FA FC10303
008621 SOLDE	30/08/2019	FA FC11645
	30/06/2019	FA FC11045
M2019-034 Lot 1/BDC 5 Recherche réseaux souterrains_parcelle gironde Habitat - MAGEO	20/04/2020	EA EC120EC
010199 AC 1	29/04/2020	FA FC12956
M2019-034 Lot 1/BDC12 Mesures geodetection Speedy Speedo - MAGEO		
010792 SOLDE	19/08/2020	FA FC13575
M2019-034 Lot 1/BDC15 Plan de copro, plan topo, levé surfacique ilot B3 - MAGEO		
015284 AC1	31/05/2022	FA FC17508
M2019-034 Lot 1/BDC28 Déclaration préalable Ilôt B5 - MAGEO		
012636 AC1	31/05/2021	FA FC15236
014427 AC2	31/01/2022	FA FC16709
M2019-034 Lot 1/BDC34 Levées intérieures ilot B3 - MAGEO		
012637 SOLDE	31/05/2021	FA FC15234
M2019-034 Lot 1/BDC51 Bornage AY 511, 544, 545, 813, 825, 710, 700, 793 - MAGEO		
014426 AC1	31/01/2022	FA FC16696
M2019-034 Lot 1/BDC56 Document d'arpentage et plan de division llots B3-B5 - MAGEO		
014423 AC1	31/01/2022	FA FC16697
M2019-034 Lot 1/BDC70 Scission copropriété « Quick » - MAGEO		
015301 AC1	31/05/2022	FA FC17513
M2019-034 Lot 1/BDC91 Etablissement d'un document d'arpentage ilot B5 - MAGEO		
	28/04/2023	FC19448
017864 AC1	+	1
		1
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC15 Diagnostic amiante / HAP sur enrobé - SEREA	28/09/2023	FA 230623
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC15 Diagnostic amiante / HAP sur enrobé - SEREA 018816 SOLDE	28/09/2023	FA 230623
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC15 Diagnostic amiante / HAP sur enrobé - SEREA 018816 SOLDE M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC16 Dosage des HAP-Recherche d'amiante dans des enrobés -		
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC15 Diagnostic amiante / HAP sur enrobé - SEREA 018816 SOLDE M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC16 Dosage des HAP-Recherche d'amiante dans des enrobés - 019073 SOLDE	28/09/2023 27/10/2023	FA 230623 FA 230706
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC15 Diagnostic amiante / HAP sur enrobé - SEREA 018816 SOLDE M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC16 Dosage des HAP-Recherche d'amiante dans des enrobés -		

204.450.501.75	22/25/2224	T
021463 SOLDE	30/06/2024	Fa FC22448
M2023-043/Lot1/BDC4 Métré ECO CUISINE - GEOSAT		
020764 SOLDE	26/04/2024	FA F24040674
M2023-043/Lot1/BDC5 Levé topo îlots A3 A4 A A6 [secteur Kennedy] - GEOSAT		
022028 SOLDE	26/06/2024	FA F24060674
M2023-043/Lot3/BDC1 Marne - M2.1 et 2.3 îlot A8 - MAGEO		
020833 AC1	30/04/2024	FA FC21949
M2023-043/Lot3/BDC8 Parcelle Quick M2.1.2 & M.2.3 - MAGEO		
020836 AC1	30/04/2024	FA FC21950
A110 Etude et expertise juridique		
M2018-036/BDC2 BDC2 SPEEDY - Analyse indemnité - PCHIBICH		
007808 BDC2 SPEEDY	30/03/2019	NH F2019-3-A
M2021-001 Lot 1/BDC2 Presta juridique : llot A9 Tiers lieu Consultation opérateurs - CENTAURE		
012969 AC 1	20/07/2021	FA
A112 Autres		
2023-001 Mission d'Economiste de la construction ilot A5/A6 - OVERDRIVE		
017391 SOLDE	22/02/2023	FA 2302057E
2023-007 Mission d'Economiste de la construction ilot A5/A6 - OVERDRIVE		1772502572
017778 SOLDE	17/04/2023	FA 2304153E
23-06172 Ilot A5 A6 Indemnisation concepteur non retenu - GREENWICH	17/04/2023	177 230 4133E
017674 SOLDE	08/02/2023	FA 23-02-0013
23-06217 Ilot A5 A6 Indemnisation concepteur non retenu - 2 PM ARCHITECTURES	08/02/2023	TA 23-02-0013
017673 INDEM N RET A5 A6	29/03/2023	ΓΛ Γ 22 026
	29/03/2023	FA F_23-036
23-06261 Ilot A5 A6 Indemnisation concepteur non retenu - GOLDFINGER	24/04/2022	EA 22/04/0020
017821 SOLDE	24/04/2023	FA 23/04/0028
23-06404 Ilot A5 A6 Indemnisation concepteur retenu - NRAU	/ /	
018256 SOLDE	21/06/2023	FA2023FABMA
M2019-066/BDC37 Atelier et analyse mise au point pré PC llot B8 - CANCAN		
022371 AC1	08/10/2024	FA 24-019-075
B FONCIER		
B101 Coût aquisition terrain		
17-01658/1 Acquisition BX793 ilot B3 B5 CONSEIL DEPARTEMENTAL GIRONDE - LEBEAU-		
17-01658/1 Provision	27/07/2017	
18-02124/1 Acquisition BM (speedy) BX 797 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)		
18-02124/1 Provision	28/06/2018	
19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
014317 REMBT TROP VERSE S/ACQ SCI TY KENTA	07/01/2022	FA 07/01/22
19-03193/1 Acquisition Domofrance BX 819 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
19-03193/1 Provision	15/11/2019	
009263 ACQ DOMOFRANCE BX 819	15/11/2019	FA 15/11/19
20-03905 Provision	07/10/2020	
20-03905 Provision	07/10/2020	
22-05110 Acquisition FAYAT AY 717, 719, 721, 723 - ADENIS-LAMARRE (NOT)		1
22-05110 Provision	16/02/2022	
23-06398/1 Acquisition BM Av de la Marne BX846 et BX848 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
23-06398/1 Provision	27/06/2023	
23-06401/1 Acquisition FAST BX697 700 702- BX853-855-857-858-859 - LEBEAU-CABANAC (NOT)	= 1,00,2020	+
23-06401/1 Provision	27/06/2023	+
23-06401/1 Provision	27/06/2023	+
23-06619/1 Acquisition SCI Majothio 76 av Marechal Leclerc BW 153 - LEBEAU-CABANAC (NOT)	2770072023	+
23-00013/1 ACQUISITION SCI INIUJUTNIO 70 UN INIUTECNIUI LECIEIL DIN 133 - LEDEAU-CABANAC (NUT)		

23-06619/1 Provision	24/10/2023	
24-07035/1 Acquisition FAYAT AY715 - 254 av. de la Marne - ADENIS-LAMARRE (NOT)	24/10/2023	
	06/02/2024	
24-07035/1 Provision	06/03/2024	FA 12/02/24
020410 ACQ° FAYAT AY715	12/03/2024	FA 12/03/24
B201 Frais d'actes 17-01658/2 Frais d'acquisition BX793 ilot B3 B5 CONSEIL DEPARTEMENTAL GIRONDE - LEBEAU-		
17-01658/2 Provision	28/01/2021	
·		
17-01658/2 Provision	28/01/2021	EA 20/40/24
013669 FAIS ACQ CONSEIL DEPARTEMENTAL GIRONDE	29/10/2021	FA 29/10/21
18-02124/2 Frais d'acquisition BM (speedy) - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	18/12/2018	
18-02124/2 Provision		FA 12/06/10
008207 FRAIS ACQ° BM (SPEEDY)	13/06/2019	FA 13/06/19
19-02692/2 Frais notaire - Protocole résiliation bail - SARL LE PICOTIN HGR - LEBEAU-CABANAC	02/07/2010	EA 27/06/40
008267 HONORAIRES	02/07/2019	FA 27/06/19
19-02834/2 Frais d'acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - LEBEAU-CABANAC	20/05/2010	
19-02834/2 Provision	20/05/2019	
19-02834/2 Provision	20/05/2019	
008125 FRAIS ACQUISITION PV	03/06/2019	FA 03/06/19
014316 FRAIS ACQ SCI KENTA BX697P-700P	07/01/2022	FA 07/01/2022
19-03193/2 Frais d'acquisition DOMOFRANCE BX 819 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
19-03193/2 Provision	12/11/2019	
012180 FRAIS ACQ DOMOFRANCE BX 819	15/03/2021	FA 15/03/21
19-03194/2 Frais d'acte pour sequestre cession DOMOFRANCE BX 822 823 824 - LEBEAU-		
010686 SEQUESTRE CESSION DOMOFRANCE	28/07/2020	FA 28/07/20
19-03194/3 Frais copie d'acte - Cession DOMOFRANCE BX 822 823 824 - LEBEAU-CABANAC		
010703 FRAIS COPIE D'ACTE	23/07/2020	23/07/20
22-05110/2 Frais d'acquisition FAYAT AY 717, 719, 721, 723 - ADENIS-LAMARRE (NOT)		
22-05110/2 Provision	16/02/2022	
016348 FRAIS S/ACQ FAYAT AY 717, 719, 721, 723	04/10/2022	FA 04/10/22
22-05455 Frais de servitude ASL Fourchateau et European Home - BX449 et 523 - LEBEAU-		
22-05455 Provision	29/06/2022	
019150 FRAIS S/ASL FOURCAHTEAU SERVIT BX449-523	18/09/2023	FA 18/09/2023
23-06398/2 Frais acquisition BM av de la Marne BX846 BX848 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
23-06398/2 Provision	27/06/2023	
019597 FRAIS ACQ°	20/11/2023	FA 20/11/23
23-06619/2 Frais acquisition FAST BX697 700 702 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
23-06619/2 Provision	27/06/2023	
019599 FRAIS ACQ° FAST BX697 700 702	20/11/2023	FA 20/11/23
24-06872 Frais acquisition SCI Majothio BW153 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
24-06872 Provision	18/01/2024	
24-06872 Provision	18/01/2024	
021124 FRAIS ACQ° SCI MAJOTHIO BW153	24/05/2024	FA 27/05/24
24-07035/2 Frais acquisition FAYAT -AY715 -254 av. de la Marne - ADENIS-LAMARRE (NOT)		
24-07035/2 Provision	06/03/2024	
B302 Géomètres foncier		
M2019-034 Lot 1/BDC53 Établissement de DMPC pour dossier de cessibilité - MAGEO		
019458 DMPC DOSSIER DE CESSIBILITE	30/11/2023	FA FC20899
M2019-034 Lot 1/BDC53bis Complément DMPC à la parcelle pour cessibilité - MAGEO		1
018064 AC1	31/05/2023	FA FC19704
M2019-034 Lot 1/BDC53Ter Etablissement DMPC AY656 cessibilité - MAGEO		1
019867 SOLDE	25/01/2024	FA FC21265
B303 Expertises foncières	1,1 ,111	
F		

	1	
M2017-021/BDC12 Expertise immobilière LA PERLERIE - IPFEC		
006176 BDC12 EXPERTISE LA PERLERIE	30/04/2018	FA 43/2018
M2017-021/BDC2 Expertise immobilière BX706P - IPFEC		
005227 BDC2 MARNE	02/10/2017	FA 85/2017
005262 BDC2 MARNE	09/10/2017	FA 89/2017
M2017-021/BDC24 Expertise immobilière AY304 305 HUYNH - IPFEC		
012195 BDC24	05/02/2021	FA 5/2021
M2017-021/BDC7 Expertise immobilière FILS DU BOUCHER - IPFEC		
005720 BDC7 EXPERTISE FILS DU BOUCHER	24/01/2018	FA 2 / 2018
M2021-080/BDC 12 Expertise immobilière et eviction La Bouquinerie - SEGAT		
018026 AC1	26/05/2023	FA FC-23-05-
M2021-080/BDC4 SCI Majothio Marne - SEGAT		
D16488 BDC 4 EXPERTISE SCI MAJOTHIO MARNE	02/11/2022	FA FC-22-11-
3401 Indemnités de remploi		
19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
014317 REMBT TROP VERSE S/ACQ SCI TY KENTA	07/01/2022	FA 07/01/22
23-06619/1 Acquisition SCI Majothio 76 av Marechal Leclerc BW 153 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
23-06619/1 Provision	24/10/2023	
B402 Indemnités d'évictions (résiliations)		
19-02692/1 Protocole - Indemnité résiliation du bail - SARL LE PICOTIN HGR- BX 697 et 700 -		
19-02692/1 Provision	26/03/2019	
19-03251 Indemnité eviction Speedy - SPEEDY		
19-03251 Avance	25/11/2019	
009830 INDEMNITE EVICTION SPEEDY	20/02/2020	20/02/2020
B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers)		
19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
19-02834/1 Provision	20/05/2019	
014317 REMBT TROP VERSE S/ACQ SCI TY KENTA	07/01/2022	FA 07/01/22
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux		
21-04202 Dépose du réseau SFR - Bowling - SFR FIBRE		
012187 AC1 SOLDE	15/03/2021	FA
21-04536 Sécurisation site CD33 - VPSITEX		
D13056 AC1	31/07/2021	FA
D13104 AVOIR	12/08/2021	AVOIR S/FAC
013105 AC1 FINAL	13/08/2021	FA
	06/04/2022	AV
016953 AVOIR	00/04/2022	
	00/04/2022	
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES	01/09/2021	FA FC973
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES D13240 AC1		FA FC973
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 013240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI		FA FC973
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 013240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 015288 AC1	01/09/2021	
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 013240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 015288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI	01/09/2021	
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 013240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 015288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 015287 AC1	01/09/2021	FA F00230
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 213240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 215288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 215287 AC1 24-06938 Abonn EDF 76 av MI Leclerc_ECO CUISINE - EDF	01/09/2021	FA F00230
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 213240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 215288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 215287 AC1 24-06938 Abonn EDF 76 av MI Leclerc_ECO CUISINE - EDF 20470 AC1- 02/02/24-31/03/24	01/09/2021 05/04/2022 05/04/2022 09/03/2024	FA F00230
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 213240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 215288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 215287 AC1 24-06938 Abonn EDF 76 av MI Leclerc_ECO CUISINE - EDF 2020470 AC1- 02/02/24-31/03/24 2020877 AC2- 01/04/24-30/04/24	01/09/2021 05/04/2022 05/04/2022 09/03/2024 09/04/2024	FA F00229 FA FA FA
21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 213240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 215288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 215287 AC1 24-06938 Abonn EDF 76 av MI Leclerc_ECO CUISINE - EDF 200470 AC1- 02/02/24-31/03/24 2020877 AC2- 01/04/24-30/04/24 201127 AC3- 01/05/24-31/05/24	01/09/2021 05/04/2022 05/04/2022 09/03/2024 09/04/2024 14/05/2024	FA F00229 FA FA FA FA
016953 AVOIR 21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES 013240 AC1 22-05183 Diags lot B5 BX793 - HDI 015288 AC1 22-05184 Diags lot B3 - BX697, 700, 793, 711 et 710 - HDI 015287 AC1 24-06938 Abonn EDF 76 av MI Leclerc_ECO CUISINE - EDF 020470 AC1- 02/02/24-31/03/24 020877 AC2- 01/04/24-30/04/24 021127 AC3- 01/05/24-31/05/24 021392 AC4- 01/06/24-30/06/24	01/09/2021 05/04/2022 05/04/2022 09/03/2024 09/04/2024	FA F00229 FA FA FA

	1	I
022119 AC7- 01/09/24-30/09/24	10/09/2024	FA
022676 AC8- 01/10/24-31/10/24	09/10/2024	FA
022822 AC9-REGUL ABONNT 21/10/24	22/10/2024	FA
24-07051 Installation verrou - MGB		
021217 AC1	14/03/2024	FA
24-07368 Réfection faux plafond du local Eco Cuisine / 76 av Maréchal Leclerc - COMPAGNONS		
022185 SOLDE	23/09/2024	FA 20230617
24-07420 Nettoyage ext ECO CUISINE - MERIGNAC ASSO. SERVICES		
023110 SOLDE	09/12/2024	FA
24-07502 Evacuation archives Eco Cuisine - RECYCLEXPERT		
022476 SOLDE	22/10/2024	FA F-
M2016-001 Lot 2/BDC19 Désencombrement Jardin des essais - AQUITANIS		
M2016-001 Lot 2/BDC19 Avance	21/03/2019	
008075 BDC19 - TPS 04/19	17/05/2019	FA 042019/11
008214 BDC 19 - TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/18
011601 GESTION TERRAIN 2019	01/01/2020	FA 31/12/19
M2016-001 Lot 2/BDC21 Démolition SPEEDY BX 797 - AQUITANIS		
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
009966 BDC21 - TPS 02/20	10/04/2019	FA
010498 BDC 21 TPS 05/2020	18/06/2020	DHC/GLS/HSIS/
010498 BDC 21 173 03/2020 010619 TPS 06/2020	16/00/2020	FA
010789 BDC21 TPS 07/20	17/08/2020	FA
	-	
010923 BDC 21- TPS 08/20	10/09/2020	FA
011164 TPS 09/20	13/10/2020	FA
011409 BDC21TPS 10/20	16/11/2020	FA
M2017-025/BDC22 Diagnostics avant démolition (le fils du boucher + centre routier CD33) - AED	24 /25 /2224	5. 5. 0.0010
012605 AC1	31/05/2021	FA FA-212318
012832 AC2	30/06/2021	FA FA-213764
008542 09/07-08/08/19	21/08/2019	FA
008678 09/08-08/09/19	17/09/2019	FA
009040 09/09-08/10/19	31/10/2019	FA
009321 09/10-08/11/19	30/11/2019	FA
009332 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2020-042 Dépose d'un panneau publicitaire (le fils du boucher) - BDS		
011158 DEPOSE PANNEAU PUB	27/09/2020	FA F-2009-
M2020-071bis/BDC7 MARNE Sécurisation Bordelaise de literie - VPSITEX		1
015759 AC1-09/21-03/22	30/06/2022	FA
	30/00/2022	1
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX		
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX 020271 AC1	29/02/2024	FA
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX		FA FA
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX 020271 AC1	29/02/2024	
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX 020271 AC1 020578 AC2	29/02/2024	
M2021-046 Lot 1/BDC56 Sécurisation ECO Cuisine 76 av Leclerc 02/24 à 04/24 - VPSITEX 020271 AC1 020578 AC2 M2021-046 Lot 1/BDC56bis Location alarme ECO Cuisine 76 av. MI Leclerc 06/04/24 au	29/02/2024 31/03/2024	FA

		1
020577 SOLDE	31/03/2024	FA
M2021-046 Lot 1/BDC58bis Surplus tôlage ECO cuisine - VPSITEX		
020864 AC1	24/04/2024	FA
M2021-054/BDC1 Pose de MAGIC BLOC - DAXAP		
012966 AC1	19/07/2021	FA 21-07-151
M2021-077/BDC5 Diags termites et ERP sur BX 793 - AED EXPERTISES		
016611 BDC5 AC1	16/11/2022	FA FA-231630
M2024-030 Nettoyage toiture 76 Av. du Maréchal Leclerc - AB RENOVATION		
021868 AC1	09/08/2024	FA 2024-
B502 Gardiennage		
M2021-084/BDC41 Rondes Eco cuisine 31/01/24 au 29/02/24 - DRAKKAR		
020248 AC1	28/02/2024	FA F-
M2021-084/BDC42 Rondes Eco cuisines 01/03/24 au 31/03/24 - DRAKKAR		
020502 AC1 SOLDE	31/03/2024	FA
M2021-084/BDC48 Rondes supp Eco cuisine du 08/03/24 au 13/03/24 - DRAKKAR	31,03,2021	177
020403 SOLDE	18/03/2024	FA
M2024-002/BDC25-1 MM Eco cuisine alarme - VPSITEX	10/03/2024	17
022277 SOLDE	30/09/2024	FA
	30/09/2024	FA
M2024-002/BDC25-2 MM Eco cuisine alarme - VPSITEX	/ /	
022343 AC1	30/09/2024	FA
022696 AC2	31/10/2024	FA
023095 AC3	30/11/2024	FA
B503 Impots Foncier		
18-02124/3 Taxes foncières 2019 SPEEDY - TRESOR PUBLIC (TF)		
009236 TAXES FONCIERES 2019 SPEEDY	16/10/2019	FA
009238 TAXES FONCIERES 2019 SPEEDY	16/10/2019	FA
20-03902 Taxe foncière 2020 SPEEDY - TRESOR PUBLIC (TF)		
010974 TF 2020 SPEEDY	24/08/2020	AV
B601 Assistance Juridique		
19-02699 Signification Speedy - CASIMIRO (HUISSIER)		
007855 SIGNIFICATION SPEEDY	04/04/2019	FA 55 392
19-02969 Signification assignation SPEEDY - CASIMIRO (HUISSIER)		
008513 CONSTAT AFFICHAGE SPEEDY	26/07/2019	FA 57 906
19-03053 Constat (X4) panneau permis de démolir SPEEDY - CASIMIRO (HUISSIER)		
008819 AC 1	07/10/2019	FA 59 119
009129 3 CONSTAT HUISSIER	21/11/2019	FA 60 315
014303 AC2	01/01/2022	FA 72906
20-03565 Constat huissier mise à disposition voie partagée DOMOFRANCE - CASIMIRO	01,01,1011	,2500
010552 PV CONSTAT	19/06/2020	FA 63153
010634 CONSTAT 2EME PASSAGE	16/07/2020	FA 63 535
20-03838 Constat huissier fin de travaux démolition Speedy - CASIMIRO (HUISSIER)	10/07/2020	FA 03 333
	10/10/2020	FA 64 700
011251 CONSTAT FIN TRAVAUX SPEEDY	10/10/2020	FA 64 709
21-04437 Constat huissier affichage PD et DP 236/240 av. de la Marne (3 passages) - CASIMIRO	47/44/2021	FA 72 007
013725 AC1	17/11/2021	FA 72 097
013860 AC2	29/07/2021	FA 70 112
21-04524 Signification par huissier courriers SCI JPPS et SCI Edouard - CASIMIRO (HUISSIER)	<u> </u>	
012892 SOLDE	06/07/2021	FA 69 729
21-04770 Etat des lieux parking relais 4 chemin - CASIMIRO (HUISSIER)		
013356 AC 1	27/09/2021	FA 70 839
013861 AC2	04/11/2021	FA 71 815
22-05065 Etat des lieux parking relais 4 chemins - avenue de la Marne - 33700 Mérignac -		
014615 AC1	06/03/2022	FA 74127

22-05191 Etat des lieux parking relais 4 chemins pour restitution - avenue de la Marne - 33700		
014833 SOLDE	03/04/2022	FA 74551
22-05449 Etat des lieux après travaux - ASL Fourchateau - CASIMIRO (HUISSIER)		
015816 AC1	28/06/2022	FA 76 226
22-05518 Signification visite SCI MOJOTHIO - CASIMIRO (HUISSIER)		
015526 AC1	20/06/2022	FA 76067
22-05522 Signification préemption SCI MOJOTHIO - CASIMIRO (HUISSIER)		
015736 AC1	25/07/2022	FA 76 462
22-05710 PV constat liberation emprise Av Marne - CASIMIRO (HUISSIER)		
016298 AC1	06/10/2022	FA 77 597
23-06006 Non recours TA - CASIMIRO (HUISSIER)		
017220 AC1	02/01/2023	FA 79712
23-06066 PV constat dalle Parvis - CASIMIRO (HUISSIER)		
017386 SOLDE	14/02/2023	FA 80306
23-06368 PV DP 230 avenue de la Marne - CASIMIRO (HUISSIER)	, , , , , ,	
018124 AC1	11/06/2023	FA 82651
23-06418 PV Constat non recours TA avenue de la Marne - CASIMIRO (HUISSIER)	, ,	
018272 SOLDE	07/07/2023	FA83291
23-06706 Constat bâtiment P1 Aqprim av de la Marne - CASIMIRO (HUISSIER)	0770772023	17.03231
019350 AC1 SOLDE	11/04/2023	FA 81604
M2016-039/BDC 7 Réprésentation juridique contre SARL LE PICOTIN HGR BX 697 - 700 -	11/04/2023	17/01004
008234 BDC 7	13/06/2019	FA 201903406
M2016-039/BDC10 Assistance juridique préemption BX 257 - ADALTYS (ADAMAS)	13/00/2013	1 A 201303400
011135 BDC 10	30/09/2020	FA PB 20 46
011759 BDC 10	01/01/2021	FA PB 20 46
013644 BDC 10	29/01/2021	FA AB 21 46
M2016-039/BDC6 Assistance juridique : partenariat PSA PEUGEOT - CMS FRANCIS LEFEBVRE	29/01/2021	1 A AB 21 40
005972 BDC6 PSA PEUGEOT	28/02/2018	NH H1802445
	26/02/2016	INI I I 1002445
M2016-039/BDC7 Assistance juridique : DIA préemption de PSA - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON 006336 BDC7	14/06/2019	NH H1806039
	14/06/2018	
006646 REV° S/ NH H1806039	21/09/2018	FA 21/09/2018
M2018-036/BDC1 SPEEDY - Assistance éviction - PCHIBICH	05 /44 /2040	NUL 2040 44 A
006931 AC1	05/11/2018	NH 2018-11-A
M2018-036/BDC3 SPEEDY - éviction - PCHIBICH	20/02/2010	NUL 2040 2 I
007806 BDC 3 SPEEDY	30/03/2019	NH 2019-3-J
M2018-036/BDC4 SPEEDY - éviction - PCHIBICH	20/00/00/0	
007807 BDC4 SPEEDY	30/03/2019	NH 2019-3-K
M2018-036/BDC5 SPEEDY - éviction - PCHIBICH	07/05/0010	
008173 BDC5 AC1	07/06/2019	NH 2019-6-A-1
008174 BDC 5 AC 2	08/06/2019	FA F2019-6-A-1
008309 BDC5 AC 3	05/07/2019	FA 2019-7-A-1
008541 BDC5 AC4	20/08/2019	FA 2019-8-B
009491 BDC5 AC 5	01/01/2020	FA F2019-12-A
M2018-036/BDC6 Eviction speedy - PCHIBICH		
008596 BDC6	06/09/2019	NH 2019-9-B
M2018-036/BDC7 Rédaction protocole Speedy - PCHIBICH		
009691 BDC 7	30/01/2020	NH 2020-1-I
M2021-001 Lot 2/BDC 2-5 Incidences juridiques de l'appartenance à un lotissement du terrain		
019448 AC 1	31/08/2023	FA 019662
M2021-001 Lot 2/BDC2-1 PREPA ET PARTICIPAT° REUNION + DOSSIER HUYNH - DS AVOCATS		
014100 PREPA ET PARTICIPAT° REUNION + DOSSIER HUYNH	01/01/2022	FA 017047
M2021-001 Lot 2/BDC2-2 Expertise juridique - DS AVOCATS		

014593 AC1	28/02/2022	FA 017440
M2021-001 Lot 2/BDC2-3 Dossier préemption SCI MOJOTHIO - DS AVOCATS		
015742 AC1	26/07/2022	FA 018055
M2021-001 Lot 2/BDC2-4 Analyse critique, prénis° sur montage Ilôt A9 - DS AVOCATS		
018203 SOLDE	28/06/2023	FA275066
M2021-001 Lot 2/BDC2-4Bis Analyse critique, prénis° sur montage Ilôt A9 - DS AVOCATS		
018204 SOLDE	28/06/2023	FA275067
M2021-001 Lot 2/BDC2-8 Réunion de lancement et suivi procedures - DS AVOCATS		
020772 AC1	15/04/2024	FA 020726
M2021-001 Lot 2/BDC2bis-7 Consultation montage opérationnel SCI Majothio - DS AVOCATS		
020752 SOLDE	25/04/2024	FA 020741
M2021-001 Lot 2/BDC2bis-8 Assistance négos LA BOUQUINERIE - DS AVOCATS		
023104 SOLDE	29/11/2024	FA 021664
M2021-001 Lot 2/BDC2bis1 Assistance 1ère instance expro DUPART (MIDAS) - DS AVOCATS		
020774 AC1	15/04/2024	FA 020727
M2021-001 Lot 2/BDC2bis2 Assistance 1ère instance expro SCI Edouard (CARGLASS) - DS		
020775 AC1	15/04/2024	FA 020728
M2021-001 Lot 2/BDC2bis3 Assistance 1ère instance expro Sté JPPS (ROC ECLAIR) - DS AVOCATS		
020776 AC1	15/04/2024	FA 020729
B602 DUP, expro		
18-01842 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - BUREAU HYPOTHEQUES		
005630 COPIE D'ACTES DUP MARNE	04/01/2018	FA 04/01/2018
005724 COPIES D'ACTES	25/01/2018	FA 25/01/2018
005797 DEMANDE RSU MARNE	08/02/2018	FA 08/02/2018
006929 COPIE ACTE MERIGNAC MARNE	05/11/2018	FA 05/11/2018
006930 MERIGNAC MARNE RSU	05/11/2018	FA 05/11/2018
19-02616 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES		
007558 DEMANDE DE RSU	15/02/2019	FA 15/02/2019
007794 COPIE ACTE	01/04/2019	FA 01/04/19
009029 RSU	05/11/2019	FA 05/11/19
19-03120 Constats + significations hussier EP Marne - CASIMIRO (HUISSIER)	, ,	12, , 2
009027 CONSTAT PV	21/10/2019	FA 59 584
009048 SIGNIFICATION	08/11/2019	FA 60 077
009070 SIGNIFICATION	13/11/2019	FA 60 158
009806 SIGNIFICATIONS	17/02/2020	FA 61 917
009814 CONSTAT PV-3	01/01/2020	FA 60320
009815 CONSTAT PV-4	01/01/2020	FA 60604
009816 SIGNIFICATION	01/01/2020	FA 60315
009817 CONSTAT PV-2	01/01/2020	FA 60052
009960 TROP PERCU	05/03/2020	FA 184604
19-03130 Publicité avis enquete publique - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS	, , , , , ,	
008848 SOLDE	11/10/2019	FA 903530
008895 SOLDE RECTIFICATIF	18/10/2019	FA 903615
009056 AC2	08/11/2019	FA 903867
010793 AVIS ENQUETE 21/08/20	21/08/2020	FA 20002022
19-03138 Publicité avis enquete publique - SUD OUEST		
008883 SOLDE	11/10/2019	FA
19-03225 Avis enquete publique - SUD OUEST PUBLICITE	11/10/2013	
009077 ENQUETE PUBLIQUE	08/11/2019	FA
010850 AVIS ENQUETE PUBLIQUE	30/08/2020	FA
	30/00/2020	17
19-03303 Notification sondages Speedy - CASIMIRO (HUISSIER) 009375 NOTIFICATION SONDAGES SPEEDY	01/01/2020	FA 60644
003373 NOTIFICATION SONDAGES SPEEDT	01/01/2020	rA 00044

21-04782 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1		1
013522 DDE RSU PARCELLES AY/BW/BX	20/10/2021	FA 19/10/21
23-05915 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2023 - SPF BDX 1	20/10/2021	FA 19/10/21
016991 DMD RSU SABOIE	04/01/2022	FA 04/01/22
	04/01/2023	FA 04/01/23-
017685 DMD RSU-ACTES CESSIBILITE	31/03/2023	FA 31/03/2023
019424 DMD RSU ET COPIES ACTES CESSIB	04/12/2023	FA 04/12/23
24-07413 Acte d'huissier 2024 - CASIMIRO (HUISSIER)		
022115 SOLDE	04/09/2024	FA 92304
B701 Dépollution		
M2018-024/BDC 11 BDC 11 SSEP SPEEDY FILS DU BOUCHER - ARCAGEE		
010141 AC 1	14/04/2020	FA 20-062
M2018-024/BDC 12 BDC 12 EXPRESTISE CONSEIL DEPARTEMENTAL - ARCAGEE		
010123 AC 1	10/04/2020	FA 20-059
M2018-024/BDC 14 Investigations complémentaires Speedy - ARCAGEE		
010812 SOLDE	21/08/2020	FA 20-141
M2018-024/BDC 15 Remise en état sols Speedy Speedo - ARCAGEE		
010084 AC1	31/03/2020	FA 20-055
011856 AC2	13/01/2021	FA 21-005
012108 AC3	02/03/2021	FA 21-050
012186 AC4	15/03/2021	FA 21-060
012320 AC5	05/04/2021	FA 21-077
017017 AC6	01/01/2023	FA 22-297
M2018-024/BDC 24 BDC 24 SITE A9 SHELL - ARCAGEE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
011981 AC1	08/02/2021	FA 21-025
M2018-024/BDC 28 DIAG ENROBES 4 CHEMINS - ARCAGEE	00,02,2022	17122020
012683 SOLDE	31/05/2021	FA 21-127
M2018-024/BDC8 BDC 8 ILOT B2/B6 - ARCAGEE	52,00,2022	
008837 AC 1	04/06/2019	FA 19-106
011600 AC2	01/01/2021	FA 20-258
M2020-023 Dépollution site Speed'o - SUEZ RR IWS REMEDIATION	01/01/2021	17120 230
011030 AC1	25/09/2020	FA 12001442
011430 AC2	17/11/2020	FA 12001442
011463 AC3	26/11/2020	FA 12001782
011716 AC4	01/01/2021	FA 12001943
011907 AC5	27/01/2021	FA 12100131
012068 AC 6	25/02/2021	FA 12100330
012552 AC7	05/05/2021	FA 12100755
B702 Démolition - Désamiantage		
2021-075 Replantation de 3 arbres sur la parcelles B5 Conseil Dépatemental 33 - BRETTES		
013967 SOLDE	01/01/2022	FA P2112077
21-04589 Dépose réseaux EDF - Démolition 236/240 Av de la Marne - ENEDIS (EX : ERDF)		
014586 AC1	02/03/2022	FA 0326-
21-04718 Dépose réseaux Orange - 236/240 Av de la Marne - ORANGE TRAVAUX		
015273 AC1	30/05/2022	FA
M2016-001 Lot 2/BDC21 Démolition SPEEDY BX 797 - AQUITANIS		
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	1

	1	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance	16/04/2019	
011707 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/20
M2017-025/BDC29 Diagnostics avant démolition (centre routier CD33) - AED EXPERTISES		
013109 AC1	17/08/2021	FA 214857
M2020_062/BDC1 Diag et PD ilots B3 B5 - CAB INGENIERIE		
012626 AC1	31/05/2021	FA
M2020_062/BDC1		
012625 SOLDE	31/05/2021	FA DH1803863
M2020_062/BDC2 Diag-PD-DCE Démolition llot Fils du boucher - CAB INGENIERIE		
012716 AC1	31/05/2021	FA00000333
M2020_062/BDC2 Diag-PD-DCE Démolition Ilot Fils du boucher - CETAB		
012717 SOLDE	31/05/2021	DH1803863
M2021-035/BDC 4 Travaux d'évacuation d'enrobés amaintés CD 33 PN - AVENIR		
014056 11/21 - SOLDE	01/01/2022	FA AC5
M2021-035/BDC 5 Dépose de joints / poteaux et conduites amiantés sur le CD 33 PN - AVENIR		
014057 11/21	01/01/2022	FA AC6
M2021-035/BDC1+BDC2 Travaux de démolition : Démolition du Fils du Boucher - 2DSO		
013904 10/21	29/11/2021	10/21
M2021-035/BDC1+BDC2 Travaux de démolition : Démolition du Fils du Boucher - AVENIR		
013660 09/21	06/10/2021	AC1
013904 10/21	29/11/2021	FA AC2
014054 11/21	01/01/2022	FA AC3
M2021-035/BDC3 Travaux de dépose d'appuis fenêtres amaintés CD 33 PN - AVENIR	, , , ,	1
014055 11/21	01/01/2022	FA AC4
M2021-077/BDC48 Diagnostic termites 240 Av de la Somme Mérignac B3 B5 - AED EXPERTISES	01,01,101	
022283 SOLDE	02/10/2024	FA01125255
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	02/10/2021	17101123233
D103 VRD		_
18-02329 Canalisation Bowling - REGAZ		
010446 SOLDE	24/06/2020	FA FCO-
M2019-006 Travaux VRD Phase 1 ilot B2-B6 - MOTER	24/00/2020	TATEO
008374 06/2019	28/06/2019	AC1
008930 09/2019	23/10/2019	AC 2
	06/02/2020	AC3
009746 01/2020	-	
009958 02/20	28/02/2020	AC4
010070 03/20	02/04/2020	AC5
011109 08/2020	31/08/2020	AC 06
M2019-006 Travaux VRD Phase 1 ilot B2-B6 - SOBEBO	20/25/2212	1.04
008374 06/2019	28/06/2019	AC1
009958 02/20	28/02/2020	AC4
010070 03/20	02/04/2020	AC5
011109 08/2020	31/08/2020	AC 06
M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - TF & TO - ADRE RESEAUX		
016506 AC8 06/22	03/11/2022	FA284363229
M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - TF & TO - EIFFAGE ENERGIE		
M2020-009/Lot 1 Avance	13/02/2020	
014042 09/21	30/09/2021	AC1
015538 04/22	27/06/2022	FA AC7
016506 AC8 06/22	03/11/2022	FA284363229
016514 AC9 08/22	03/11/2022	FA 284363964
016688 AC10 10/22	28/11/2022	FA

019587 AC13 11/23	01/01/2024	FA Lot 1 - EA13
M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - TF & TO - EIFFAGE ROUTE SO	01/01/2021	177.200.2 277.20
M2020-009/Lot 1 Avance	13/02/2020	
014042 09/21	30/09/2021	AC1
014172 10/21	01/01/2022	AC2
014071 11/21	01/01/2022	AC3
014959 12/21	18/04/2022	AC4
014958 02/22	18/04/2022	AC5
015530 03/22	24/06/2022	AC6
015538 04/22	27/06/2022	AC7
016506 AC8 06/22	03/11/2022	FA284363229
016514 AC9 08/22	03/11/2022	FA 284363964
016688 AC10 10/22	28/11/2022	FA 289397990
017401 AC11 01/23	24/02/2023	FA A21681
019066 AC12 03/23	20/10/2023	Lot 1 - EA12
019587 AC13 11/23	01/01/2024	FA Lot 1 - EA13
020165 AC14 01/24	28/02/2024	AC14
020724 AC15 03/24	22/04/2024	SIT 15
020915 AC16 04/24	13/05/2024	FA Lot 1 - EA16
021572 AC17 06/24	26/06/2024	FA Lot 1 - EA17
021847 AC18 07/24	07/08/2024	FA Lot 1 - EA18
022900 AC19 10/24	25/11/2024	FA Lot 1 - EA19
M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - TF & TO - ORTEC		
016688 AC10 10/22	28/11/2022	FA
M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - TF & TO - SOPEGA TP		
014172 10/21	01/01/2022	AC2
014959 12/21	18/04/2022	AC4
014958 02/22	18/04/2022	AC5
015530 03/22	24/06/2022	AC6
016514 AC9 08/22	03/11/2022	FA 284363964
021572 AC17 06/24	26/06/2024	FA Lot 1 - EA17
M2020-009/Lot 3 Travaux espaces publics _ Lot 3 Fontainerie - TERIDEAL		
022230 AC1 09/24	26/09/2024	FA
022500 AC2 10/24	24/10/2024	FA fte
022899 AC3 11/24	22/11/2024	FA 349002281
M2020-009/Lot 4 Travaux espaces publics _ lot 4 Bétons - SOLS AQUITAINE		
M2020-009/Lot 4 Avance	13/02/2020	
016780 11/22	01/01/2023	AC 1
016990 12/22	01/01/2023	AC 2
020097 AC3 01/24	16/02/2024	AC3
D106 Arrosage - Espaces verts		
M2018-031 Travaux Jardin des essais - TECHNIVERT		
007758 02/19	26/02/2019	AC 1
007910 03/19	02/04/2019	AC 2
010928 04/20	14/09/2020	AC 3
011167 09/2020	30/09/2020	AC 4
016945 12/22	01/01/2023	AC 5
M2020-009/Lot 2 Travaux espaces publics Lot 2 espaces verts - CAP VERT	,,,,,,	1
017438 02/23	20/02/2023	AC1-FA 230205
·		AC2 F230333
017833 03/23	28/03/2023	IACZ FZSUSSS
017833 03/23 019773 AC3 12/23	28/03/2023 10/01/2024	FA 231236

D203 Electricité		
22-05591 Déplacement et suppression de coffrets électriques (sur emprise de la future piste		
22-05591 Avance	01/09/2022	
016464 SOLDE	21/10/2022	FA 0326-
D208 Autres travaux raccordements	21, 10, 2022	171 0320
22-05050 Raccordement BI avenue de la Marne - action 6 - rue du Bowling - Mérignac 33700 -		
22-05050 Avance	02/02/2022	
014632 AC1	01/03/2022	FA 192200620
22-05053 Raccordement DN150 - action 7 - rue de la Fourgeraie - Mérignac 33700 - devis	01/03/2022	TA 132200020
22-05053 Avance	03/02/2022	
014633 AC1	01/03/2022	FA 192200619
016106 SOLDE	15/09/2022	FA 192202407
22-05054 Raccordement DN100 - action 2 - rue du Parking Relais Sud - Mérignac 33700 - devis	13/03/2022	TA 192202407
22-05054 Ruaccordement DN100 - action 2 - rue du Farking Reidis 3dd - Menghat 35700 - devis	03/02/2022	
		FA 102200622
014630 AC1	01/03/2022	FA 192200622
22-05055 Dévoiement réseau DN100 sur 21 ml - action 1 - rue du Parking Relais Sud - Mérignac	02/02/2022	
22-05055 Avance	03/02/2022	5. 100000510
014631 AC1	01/03/2022	FA 192200618
22-05057 Raccordement BI - Action 3 - rue du Bowling - devis 192100619 - LYONNAISE DES EAUX		
22-05057 Avance	03/02/2022	
014628 AC1	01/03/2022	FA 192200624
22-05058 Raccordement BI au niveau de la Place - Action 4 - devis 192100620 - LYONNAISE DES		
22-05058 Avance	03/02/2022	
014629 AC1	01/03/2022	FA 192200623
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)		
M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - ANTON-OLANO YON		
006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1	13/04/2018	FA/13/04/2018
M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - DEBARRE-DUPLANTIERS		
006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1	13/04/2018	FA/13/04/2018
M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - VERDI INGENIERIE		
006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1	13/04/2018	FA/13/04/2018
M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - ANTON-OLANO YON		
005399 SOLDE AVP COMPLEMENT	03/11/2017	FA
006130 REGUL REV MS2	26/04/2018	FA 26/04/18
M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - DEBARRE-DUPLANTIERS		
005401 SOLDE AVP COMPLEMENT	31/10/2017	NH N°3
006130 REGUL REV MS2	26/04/2018	FA 26/04/18
M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - VERDI INGENIERIE		
005400 SOLDE AVP COMPLEMENT	27/10/2017	NH N°1
006130 REGUL REV MS2	26/04/2018	FA 26/04/18
M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - ANTON-OLANO YON		
005901 AC1	05/03/2018	FA
006590 SOLDE	06/09/2018	FA
M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - DEBARRE-DUPLANTIERS		
005899 AC1	05/03/2018	FA NH N°4
006587 SOLDE	04/09/2018	NH 6
M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - VERDI INGENIERIE		1
005900 AC 1	28/02/2018	NH N°1
006588 NH 2	30/05/2018	FA 55-18-05-
006589 SOLDE	31/07/2018	FA 55-18-07-
M2016-040/MS4 MO espaces publics Jardin des essais - DEBARRE-DUPLANTIERS	, - : ,	1122 20 07
006143 AC 1	27/04/2018	FA
0002.07.02	27/04/2010	· /\

200007 40 2	20/00/2040	A.I.I. A.IO.7
006657 AC 2	20/09/2018	NH N°7
007082 AC3	30/11/2018	FA 8
012459 SOLDE	01/01/2021	FA 020DDA87
M2016-040/MS5 Prépa phase travaux VRD B2-B6 - VERDI INGENIERIE	22/22/22	
006677 AC1	25/09/2018	FA 55-18-09-
008171 AC2	29/05/2019	FA 55-19-05-
008569 AC 3	19/07/2019	FA 55-19-07-
008570 AC 4	29/08/2019	FA 55-19-08-
009884 AC 5	27/02/2020	FA 55-20-02-
010719 SOLDE	30/07/2020	FA 55-20-07-
011450 REGUL REV MS5	30/11/2020	FA11/2020
M2016-040/MS6 Expertise cas par cas - DEBARRE-DUPLANTIERS		
010575 AC1	06/07/2020	FA 020DDA40
011360 SOLDE	06/11/2020	FA 020DDA87
M2016-040/MS6 Expertise cas par cas - VERDI INGENIERIE		
011351 SOLDE	29/10/2020	FA 55-20-10-
M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - ANTON-OLANO YON		
010574 AC1	26/06/2020	FA
M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - DEBARRE-DUPLANTIERS		
011349 SOLDE	06/07/2020	FA 9
M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - VERDI INGENIERIE		
011063 AC1	29/09/2020	FA 55-20-09-
013532 AC2	01/01/2021	FA 55-20-10-
M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - ANTON-OLANO YON		
012507 AC1	05/05/2021	FA
012925 AC2	09/07/2021	FA
015953 AC4	31/08/2022	AV
M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - CAB INGENIERIE		
012507 AC1	05/05/2021	FA 330-331
012924 AC2	30/06/2021	FA FA348
013419 AC3	30/09/2021	FA
015248 AC4	31/05/2022	FA 2022-0045
015570 AC5	28/06/2022	FA 2022-0050
016467 AC6	31/10/2022	FA FA2022-
016468 AC7	31/10/2022	FA FA2022-
016692 AC8	28/11/2022	FA FA2022-
017407 AC9	27/02/2023	FA FA2023-
019036 AC10	24/10/2023	FA FA2023-
019589 AC11	01/01/2024	FA 2023-0190
020735 AC12	22/04/2024	FA FA2024-
021720 AC13	22/07/2024	FA FA2024-
022027 AC14	13/08/2024	FA FA2024-
022911 AC15 M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - DEBARRE-DUPLANTIERS	26/11/2024	FA FA2024-
012507 AC1	05/05/2021	FA NH11
012923 AC2	09/07/2021	FA NH12
	· · ·	AV 021DDA98
015945 AC4	01/01/2022	
022736 AC5	12/11/2024	FA 024DDA063
006552 AC1	02/08/2018	NH
007365 AC2	20/12/2018	FA 174/181220
007617 AC3	12/02/2019	FA 188/190212
009346 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019

M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - BALZA XAVIER	1	
006548 AC1	02/00/2010	FA
	02/08/2018	111
007369 AC2	24/12/2018	FA
007370 AC2	20/12/2018	FA
007621 AC3	21/02/2019	FA
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
006550 AC1	23/08/2018	FA
007367 AC2	24/12/2018	FA
007619 AC3	13/02/2019	FA
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
007371 AC2	08/01/2019	FA F-19-01-
007617 AC3	12/02/2019	FA 188/190212
009346 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - GUIRAUD ANDRE		
006551 AC1	02/08/2018	NH
007366 AC2	20/12/2018	FA 002/181221
007618 AC3	15/02/2019	FA 003/190215
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
006549 AC1	03/08/2018	NH 2018-08-
007368 AC2	20/12/2018	FA 2018-12-
007620 AC3	13/02/2019	FA 2019-02-
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2019-010 AMO pour aménagement d'un ERP - SOD.I.A	30/11/2013	17/30112013
008491 AC1	28/05/2019	FA 19207026
008491 AC1 008492 AC2	26/07/2019	FA 19207020
010400 SOLDE	15/06/2020	FA 20600792
	13/00/2020	FA 20000792
M2020-062/BDC 3 MOE Démolition-Mission 3 ACT-Fils du Boucherl - CAB INGENIERIE	27/07/2024	FA FA 25 4
013010 AC1	27/07/2021	FA FA354
M2020-062/BDC 3 MOE Démolition-Mission 3 ACT-Fils du Boucherl - CETAB	27/27/2224	
013009 AC1	27/07/2021	FA DH1804071
M2020-062/BDC 4 MOE Démolition-Mission 3 ACT-CD_Mission 4 Fils du boucher et CDI - CAB	22/22/22	
013402 AC 1	30/09/2021	FA
013678 AC2	31/10/2021	FA
014147 SOLDE	01/01/2022	FA
M2020-062/BDC 4bis MOE Démolition - Mission 4 Direction de l'exécution des travaux et		
014374 AC1	31/01/2022	FA 2022-0004
M2021-036 PLANS ET TABLEAU DE SYNTHESE DES RESEAUX SUR 4 CHEMINS - CAB INGENIERIE		
013156 AC1 - SOLDE	31/08/2021	FA
M2023-054/BDC1 Evaluation dossier de sécurité pour instruction / STRMTG - CERTIFER FRANCE		
021669 SOLDE	28/06/2024	FA 0623
D302 Coordonnateur SPS		
M2018-013 Misssion de coordination CSPS niveau 1 - FORSECO		
008043 AC1	13/05/2019	FA 19 092
009543 AC2	06/01/2020	FA 20 004
016030 AC3	12/09/2022	FA 22 075
017958 AC4	06/03/2023	FA 23014
018559 SOLDE	28/08/2023	FA 23 078
M2023-017 Mission CSPS niveau 2 - PRESENTS	1	1
018462 AC1	31/07/2023	FA P23-07-
019663 AC2	01/01/2024	FA P23-12-
020581 AC3	31/03/2024	FA P24-03-
020381 AC3 020821 AC4	30/04/2024	FA P24-04-
U2U021 AC4	30/04/2024	TA F24-U4-

022040 ACE 00/24	21 /09 /2024	FA D24 00
022010 AC5 08/24	31/08/2024	FA P24-08-
022668 AC6 10/24	31/10/2024	FA P24-10-
023009 AC7 11/24	30/11/2024	FA P24-11-
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR		
G101 Rémunération		
17-01743 Rémunération aménageur 2017 - FAB		
005569 C0004 - REM 20/09-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-10
18-02134 Rémunération aménageur 2018 - FAB		
006346 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-04
006944 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-08
007252 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-14
19-02793 Rémunération aménageur 2019 - FAB		
008472 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-04
008703 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-14
009213 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-24
20-03700 Rémunération aménageur 2020 - FAB		
010421 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-04
011016 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-15
011685 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-26
21-04296 Rémunération aménageur 2021 - FAB		
012213 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-04
012914 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-15
013475 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-26
014087 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-37
22-05221 Rémunération aménageur 2022 - FAB	01,11,1011	110 2022 07
014868 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-04
015352 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-15
016051 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-26
016845 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-37
23-06244 Rémunération aménageur 2023 - FAB	31/12/2022	140 2022 37
017802 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-04
01/302 REM 01/01-31/03/23 018361 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-04
019495 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-28
019507 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-40
24-07297 Rémunération aménageur 2024 - FAB	25 /05 /2024	ND 2024 05
021324 REM 01/01/24-30/06/24	25/06/2024	ND 2024-05
022571 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-17
023285 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-27
H FRAIS DIVERS		
H101 Communication		
19-02624 Panneau chantier Jardin des essais - ACSD		
007670 SOLDE	28/02/2019	FA 19.00609
19-02999 MDP "Citröen Fayat" Charges courantes - FAYAT		
008501 APPEL PROV T3 2019	17/07/2019	APPEL PROV
008648 APPEL PROV T4 2019	09/09/2019	FA
009248 REGUL TVA 3T19	17/07/2019	FA 17072019
009313 APPEL PROV T1 2020	05/12/2019	FA 30.12.2020
009349 REGUL AFFFECT° - MDP	30/11/2019	031219
009920 APPEL PROV T2 2020	05/03/2020	FA 62.03.2020
010327 APPEL A PROV T3 2020	01/06/2020	FA 95.06.2020
010533 REGULARISATION CHARGES 2019	30/06/2020	FA
010869 APPEL PROV T4 2020	04/09/2020	FA

044527 ADDEL DD0V T4 2024	04 /04 /0024	FA 22 42 2024
011537 APPEL PROV T1 2021	01/01/2021	FA 32.12.2021
011670 REGUL CHARGES REELLES	01/01/2021	AV 40.12.2021
012152 APPEL PROV T2 2021	03/03/2021	FA 68.03.2021
012660 APPEL PROV T3 2021	01/06/2021	FA
013170 APPEL PROV T4 2021	01/09/2021	FA
013900 APPEL PROV T1 2022	01/01/2022	FA 37.12.2022
19-03011 MDP "Citröen Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL PROTECTION INCENDIE		
008908 AC1	13/09/2019	FA FC1823
009249 REGUL AFFECT° MDP	30/11/2019	FA FC 1823
19-03185 MDP "Citröen Fayat" Ligne fixe 100% Marne - ORANGE		
009010 ABONN 09/19 + MISE EN SERVICE	22/10/2019	FA
009011 ABONN 10/19 + INSTALLATION	22/10/2019	FA
009131 ABONN 11/19 + AVOIR	21/11/2019	AV
009512 ABONN 12/19 + FRAIS	01/01/2020	FA
009659 ABONN 01/20 (1/2)	21/01/2020	FA
009714 ABONN 01/20 (2/2)	21/01/2020	FA
009852 ABONN 02/20	21/02/2020	FA
010170 ABONN 03/20	23/03/2020	FA
010292 ABONN 04/20	21/04/2020	FA
010293 ABONN 05/20	22/05/2020	FA
010515 ABONN 06/20	23/06/2020	FA
010751 ABONN 07/20	21/07/2020	FA
010813 ABONN 08/20	21/08/2020	FA
010983 ABONN 09/20	22/09/2020	FA
011232 ABONN 10/20	21/10/2020	FA
011439 ABONN 11/20	23/11/2020	FA
011726 ABONN 12/20	01/01/2021	FA
011890 ABONN 01/21	21/01/2021	FA
012078 ABONN 02/2021	23/02/2021	FA
012249 ABONN 03/2021	23/03/2021	FA
012410 ABONN 04/2021	21/04/2021	FA
012596 ABONN 05/2021	21/05/2021	FA
012768 ABONN 06/2021	22/06/2021	FA
012977 ABONN 07/2021	21/07/2021	FA
013139 ABONN 08/2021	23/08/2021	FA
013292 ABONN 09/2021	21/09/2021	FA
013559 ABONN 10/2021	21/10/2021	FA
013803 ABONN 11/2021	23/11/2021	FA
014064 ABONN 12/2021	01/01/2022	FA
014312 ABONN 01/2022	21/01/2022	FA
014558 ABONN 02/2022	22/02/2022	FA
014747 ABONN 03/2022	22/03/2022	FA
015006 ABONN 04/2022	22/04/2022	FA
015544 ABONN 05/2022	23/05/2022	FA
015524 ABONN 06/2022	21/06/2022	FA
015734 ABONN 07/2022	21/07/2022	FA
015885 CLOTURE DE LIGNE	10/08/2022	FA
19-03211 MDP "Citröen Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE	10,00,2022	10
009186 SOLDE	26/11/2019	FA 096 011607
19-03263 MDP "Citröen Fayat" Maintenance porte automatique 1S20 - THYSSENKRUPP	20/11/2019	1 A 030 011007
010472 MAINTENANCE DES PORTES MDP	17/06/2020	FA
19-03300 MDP "Citröen Fayat" Réparation fuite d'eau - CAZSO	17/00/2020	17
15-05500 MDF Citiven ruyut Reputation Juite a eau - CA250		

009330 AC1	27/11/2019	FA 1708
	27/11/2019	FA 1708
20-03465 MDP "Citröen Fayat" Pose d'un programmateur sur le chauffage - CONFORT HOME 33	42/02/2020	EA 400074
009788 PROGRAMMATEUR- MDP	12/02/2020	FA 190071
20-03538 MDP "Citröen Fayat" Réparation porte entrée - THYSSENKRUPP	10/05/0000	
010415 REPARATION PORTE MDP	12/06/2020	FA
20-04004 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (à cpter du 2S20) + entrée secondaire	/ /	
011633 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA
011825 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA
012931 MAINTENANCE AC3	06/07/2021	FA
21-04099 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage conférence de presse - MIKAYILLI-C'+CLAIR		
012010 NETTOYAGE MDP CONF DE PRESSE	01/02/2021	FA 2021-0102
21-04665 Distribution flyer journée mobilité active du 16/10 - DISTRIPUB		
013458 SOLDE	05/10/2021	FA FA0701
22-05118 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (2022) + entrée secondaire (2022) -		
014494 MAINTENANCE 01/01 au 30/06/22	10/01/2022	CEH825155576
015701 MAINTENANCE 01/07 AU 31/12/22	11/07/2022	FA
016041 AV 2ND SEM 2022 - EDL 31/03/22	08/09/2022	AV
016040 AV 1ER SEM 2022 - EDL 31/03/22	08/09/2022	AV
22-05180 Déménagt/emmenagt MDP 40% - DEMENAGEURS BRETONS		
014776 AC1	23/03/2022	FA
22-05343 Adhésion association Domaine de Fataisie Mérignac - DOMAINE DE FANTAISIE		
015653 SOLDE	23/06/2022	FA 22/06/001
22-05889 Distribution lettre infos 5 le 17/01/2022 - DISTRIMAG FRANCE		
017318 SOLDE	18/01/2023	FA F20230118-
M2014-017 Moe urbaine - DEBARRE-DUPLANTIERS		
008686 SOLDE BDC 32	18/09/2019	FA 19DDA92
M2015-045 AMO concertation - BRUNELOT RUBEN		
006583 SOLDE	19/06/2018	FA 08_18
M2015-045 AMO concertation - HAZGUI MEHDI		_
006585 SOLDE	20/06/2018	FA 2018008
M2015-045 AMO concertation - MAISON DES ARTISTES	-,,	
006584 COTIS° S/FA 08 18	19/09/2018	BRUNELOT
M2016-015/BDC13 Maison des projets _ Etude G2 AVP/PRO - GEOTEC		
009352 REGUL AFFECTATION	30/11/2019	FA30112019
M2016-040/MS4 MO espaces publics Jardin des essais - DEBARRE-DUPLANTIERS	55, 22, 2525	
012459 SOLDE	01/01/2021	FA 020DDA87
M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets urbains Marne/Soleil -	01,01,1011	
007219 AC1/2	30/11/2018	FA 20180126
007815 SOLDE 1/2	18/03/2019	FA 20190011
M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets urbains Marne/Soleil -	10/03/2013	17/20130011
007261 AC 1/2	06/12/2018	FA 211/2018
007782 AC3/2	13/03/2019	FA 037/2019
007783 AVOIR AC3/2	25/03/2019	AV040/2019
007783 SOLDE 1/2	25/03/2019	FA 041/2019
007984 AV/AC2		
M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets urbains Marne/Soleil -	24/04/2019	AV 064/2019
	20/11/2019	ΕΛ N°211
007216 AC1/2	29/11/2018	FA N°311
007403 AC2/2	12/10/2018	FA 252
007812 SOLDE 1/2	27/02/2019	FA 353
M2017-036/MS2 AMO communication médiation animation projets urbains Marne/Soleil -	20/41/25:5	FA2012217
007221 AC1/4	30/11/2018	FA20180126
007840 SOLDE1/2	18/03/2019	FA 201190011

008092 AV/AC2	18/03/2019	FA 02_avoir
007850 SOLDE 1/2	25/03/2019	FA 041/2019
007630 30LDE 1/2 008097 AV/AC2	24/04/2019	AV 064/2019
M2017-036/MS2 AMO communication médiation animation projets urbains Marne/Soleil -	24/04/2019	AV 064/2019
007222 AC1/2	26/11/2018	FA 4013
007222 ACI/2 007814 SOLDE 1/2	13/03/2019	FA 4430
·	13/03/2019	FA 4430
M2017-036/MS3 BDC1 BDC 1 Ouverture jardin des essais - DEUX DEGRES 008851 AC1	27/06/2019	NH-4
008852 SOLDE 009260 REGUL AFFECTATION MDP	27/06/2019	NH 03_2
	30/11/2019	FA 05122019
M2017-036/MS3 BDC2 BDC 2 Carte globale projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES	27/00/2040	NII 5
008853 SOLDE	27/09/2019	NH 5
M2017-036/MS3 BDC3 BDC 3 Kit du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES	04 /04 /0000	
009591 AC1	01/01/2020	NH 9
009935 SOLDE	05/03/2020	NH 18
M2017-036/MS3 BDC4 BDC 4 Site internet projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES		
009594 AC1	01/01/2020	NH 12
009938 SOLDE	05/03/2020	NH 21
M2017-036/MS3 BDC5 BDC 5 Exposition (ancien showroom "DS") du projet Marne/Soleil - DEUX		
008854 SOLDE	27/09/2019	NH 6
M2017-036/MS3 BDC6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - CANCAN		
008893 SOLDE	15/10/2019	FA 19-069-002
M2017-036/MS3 BDC6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES		
008856 SOLDE	27/09/2019	NH 7
009976 SOLDE	20/02/2020	NH 17
M2017-036/MS3 BDC7 BDC 7 Lettre d'information n°1 - DEUX DEGRES		
009274 SOLDE	01/01/2020	FA 20190090
M2017-036/MS3 BDC8 BDC 8 Evenement Jardin des essais - DEUX DEGRES		
009831 SOLDE	01/01/2020	NH 8
M2017-036/MS3/BDC 9 BDC 9 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES		
009828 SOLDE	20/02/2020	NH 15
M2017-036/MS3/BDC10 BDC 10 Elaboration palissades B1/B7 - DEUX DEGRES		
012198 SOLDE	18/01/2021	FA 20210003
M2017-036/MS3/BDC10 BDC 10 Elaboration palissades B1/B7 - SEPPA		
012202 SOLDE	18/03/2021	FA 6918
M2017-036/MS3/BDC12 BDC 12 Lettre d'information n°2 - DEUX DEGRES		
011244 AC 1	21/10/2020	FA 20200070
012115 AC 2	01/01/2021	FA 20200085
M2017-036/MS3/BDC13 BDC 13 Site Internet Page occupations temporaires - DEUX DEGRES		
011242 SOLDE	21/10/2020	FA 20200072
M2017-036/MS3/BDC14 BDC 14 Permanence projet urbain - DEUX DEGRES		
011239 SOLDE	21/10/2020	FA 20200075
M2017-036/MS3/BDC15 BDC 15 Conception palissades chantier B2-B6 - DEUX DEGRES		
012200 SOLDE	05/03/2021	FA 2020009
M2017-036/MS3/BDC15 BDC 15 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA		
012200 SOLDE	05/03/2021	FA 6920
M2017-036/MS3/BDC16 BDC 16 Panonceaux réemploi - DEUX DEGRES		
011653 SOLDE	01/01/2021	FA 20200104
M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES		
011656 SOLDE	01/01/2021	FA 20200101
M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes ouvertes - DEUX DEGRES		
012117 AC1	08/03/2021	FA 20200086

013550 AC2	13/10/2021	FA NH N°46
013547 SOLDE	13/10/2021	FA 20210060
M2017-036/MS3/BDC19 BDC 19 Permanence Maison du projet - DEUX DEGRES	13/10/2021	1 A 20210000
014542 SOLDE	01/01/2022	NH 47
	01/01/2022	NI 47
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - CANCAN	42/04/2024	FA 24 440 020
013003 AC1	12/04/2021	FA 21-118-030
M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES	10/01/0001	251/6/2200
013003 AC1	12/04/2021	REV S/BDC20
M2017-036/MS3/BDC21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA		
012204 SOLDE	18/03/2021	FA 6919
M2017-036/MS3/BDC22 BDC 22 lettre d'informations N° 3 - DEUX DEGRES		
014540 SOLDE	01/01/2022	NH 41
M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 coordination acteurs, boitage & MAJ site web - DEUX DEGRES		
013496 SOLDE	27/07/2021	FA 20210044
M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journéee de la mobilité : 16 oct 2021 - DEUX		
013554 SOLDE	13/10/2021	FA 20210053
M2017-036/MS3/BDC26 BDC 26 Evenement Jardin des essais - DEUX DEGRES		
014274 AC1	11/01/2022	FA 20220001
014275 SOLDE	11/01/2022	FA 20220002
M2017-036/MS3/BDC28 BDC 28 gestion de projets (semestre 2) - DEUX DEGRES		
014276 SOLDE	11/01/2022	FA 20220003
M2017-036/MS3/BDC29 BDC 29 lettre d'informations N° 4 - DEUX DEGRES		
016608 SOLDE	15/11/2022	FA 20220070
M2017-036/MS3/BDC30 Lettre info n°5 Lettre chantier Actu site internet Marne-Soleil Gestion		
016933 AC1	01/01/2023	FA 20220085
017831 AC2	25/04/2023	FA F2300023
019322 AC3	28/11/2023	FA F2300068
M2017-036/MS3/BDC31 M3 : bilan / 5 années de médiation - DEUX DEGRES		
018046 SOLDE	25/04/2023	FA F2300021
M2017-036/MS3/BDC32 M3 : lettre info travaux et gestion de projets - DEUX DEGRES		
019425 AC1	24/11/2023	FA 2300064
M2017-036/MS3/BDC33 M3 : info travaux et gestion de projets - DEUX DEGRES	, ,	
019426 AC1	24/11/2023	FA 2300065
020149 AC2	23/02/2024	FA 2400004
022297 AC3	03/10/2024	FA F2400053
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - A6A	00, 00, 000	
009346 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - BALZA XAVIER	30/11/2013	17130112013
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - CESMA	30/11/2013	17/30112013
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - ETBA THOMAS	30, 11, 2013	1730112013
009346 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - GUIRAUD ANDRE	30/11/2019	1 420112013
009347 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	EA20112010
M2018-001 MOE Maison du Projet "Citröen Fayat" - VIVIEN (BET)	30/11/2019	FA30112019
009347 REGUL AFFECTATION MDP	20/11/2010	EA20112010
	30/11/2019	FA30112019
M2018-011 MDP "Citröen Fayat" Controle technique locaux - VERITAS	00/40/2012	FA 40001055
006829 AC1	08/10/2018	FA 18334057
007446 AC2	15/01/2019	FA 19206462
007626 INDEMNITE RESILIATION- DGD	23/04/2019	FA 23/04/19
009334 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019

M2018-017 MDP "Citröen Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - DEKRA		
006710 AC1	26/09/2018	FA I3566335
009319 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA I3566335
M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISOIRE	30/11/2013	1 1 13300333
010144 AC 1	21/04/2020	FA 20-015
010362 AC2	29/05/2020	FA NH 20-026
010482 AC3	29/06/2020	FA 20-032
010688 SOLDE	30/07/2020	FA 20-042
M2019-015/BDC 4 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE		
010146 AC 1	21/04/2020	FA 20-017
010364 AC2	29/05/2020	FA NH 20-028
011029 AC2	28/09/2020	FA 20-056
011248 AC3	27/10/2020	FA 20-064
011541 AC4	01/01/2021	FA 20-073
011669 SOLDE	01/01/2021	FA 20-087
M2019-015/BDC10 Montage de la maquette à la MDP & actualisation ilots Fiat & B1 B7 -		
019769 AC1	01/01/2024	NH 23-077
M2019-015/BDC6 Actualisation des ilots C5, B5, B3 et B2/B6 - ATELIER PROVISOIRE		
013354 AC1	28/09/2021	FA 21-068
013625 AC2	29/10/2021	FA 21-082
014361 AC3	26/01/2022	FA 22-009
M2019-015/BDC8 Démontage et remontage de la maquette - ATELIER PROVISOIRE		
015105 SOLDE	05/04/2022	FA 22-035
M2019-015/BDC9 Réalisation des boîtes de transport de la maquette - ATELIER PROVISOIRE		
016356 SOLDE	13/10/2022	NH 22-081 40%
M2019-021 MDP "Citröen Fayat" Aménagement locaux - CONFORT HOME 33		
008625 AC1	24/08/2019	FA 190027
009261 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA190027
009247 SOLDE AVENANT	01/01/2020	FA 190031
M2019-029 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage post chantier - DERICHEBOURG	01,01,1010	
008796 SOLDE	26/09/2019	FA 002/19
009301 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 002/19
M2019-030 Lot 1/BDC39 40% Impression lettre d'information et lettre de chantier Mérignac	30/11/2013	17 002/13
017388 AC1	13/01/2023	FA 39839
017418 REGUL REV/AC1	13/01/2023	FA 39839
·	30/07/2024	
021310 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC39
M2019-030 Lot 2/BDC10 Panneaux habillage palissades chantier Mérignac Marne B2 B6 - MIPP	20/02/2024	FA 240720
012084 AC1	28/02/2021	FA 210739
021282 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC10
M2019-030 Lot 2/BDC15 3 Panneaux PD - MIPP		
012662 PANNEAU PERMIS DE DEMOLIR	31/05/2021	FA 211942
021739 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC15
M2019-030 Lot 2/BDC22 1 Panneau PD au 236 avenue de la Marne à Mérignac - MIPP		
013395 AC1	30/09/2021	FA 213166
021740 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC22
M2019-030 Lot 2/BDC32 1 Panneau Déclaration Préalable - MIPP		
017873 PANNEAU DP 240 AV MARNE	28/04/2023	FA F231258
021741 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC32
M2019-030 Lot 2/BDC33 1 Panneau info riverains Mérignac Marne - MIPP		
017874 PANNEAU INFO RIVERAINS	28/04/2023	FA F231257
021743 REV DEF	02/08/2024	DGD BDC33
M2019-033 Sécurisation MDP "Citröen Fayat" - VPSITEX		

009332 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019
009633 09/11-08/12/19	01/01/2020	FA
M2019-057 MDP "Citröen Fayat" Travaux complémentaires locaux - CONFORT HOME 33		
009602 SOLDE	10/01/2020	FA 190058
M2020-001 MDP "Citröen Fayat" Travaux mise aux normes - MODEX BTP		
011166 SOLDE MARNE	02/10/2020	FA 02102020-
M2020-002 MDP "Citröen Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - VPSITEX		
009758 AC 1	31/01/2020	FA
M2020-002/BDC1 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2020 - VPSITEX		
009930 BDC1 ABONN 01/2020	29/02/2020	FA
010147 BDC1-ABONN 02/2020	31/03/2020	FA
010176 BDC1 ABONN 03/2020	27/04/2020	FA
010360 BDC1 ABONN 04/2020	31/05/2020	FA
010522 BDC1 ABONN 05/2020	30/06/2020	FA
010728 BDC1 ABONN 06/2020	31/07/2020	FA
010854 BDC1 ABONN 07/2020	31/08/2020	FA
011320 BDC1 ABONN-09/2020	31/10/2020	FA
011531 BDC1 ABONN-10/20	01/01/2021	FA
011801 BDC1 ABONN 11/20	01/01/2021	FA
012000 BDC1 ABONN 12/2020	31/01/2021	FA
014229 BDC1 ABONN 08/2020	01/01/2022	FA
M2020-002/BDC2 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2021 - VPSITEX		
012099 ABONN 01/2021	28/02/2021	FA
012317 ABONN 02/2021	31/03/2021	FA
012472 ABONN 03/2021	30/04/2021	FA
012700 ABONN 04/2021	31/05/2021	FA
012975 ABONN 05/2021	30/06/2021	FA
013079 ABONN 06/2021	31/07/2021	FA
013191 ABONN 07/2021	31/08/2021	FA
013436 ABONN 08/2021	30/09/2021	FA
013687 ABONN 09/2021	31/10/2021	FA
014034 ABONN 10/2021	01/01/2022	FA
014184 ABONN 11/2021	01/01/2022	FA
014439 ABONN 12/2021	31/01/2022	FA
M2020-002/BDC3 MDP "Citröen Fayat" Abonnt trimestriel sécurisation 2022 - VPSITEX	, , , ,	
014602 ABONN 01/2022	28/02/2022	FA
014843 ABONN 02-03/2022	31/03/2022	FA
M2021-046 Lot 2/BDC2 Gardiennage BDL - DRAKKAR	,,	
013452 AC1	30/09/2021	FA 21-5728
M2023-020/Lot 1/BDC10 40% Lettre présentation des permanences Marne-Soleil 320 ex	00,00,2022	17123723
022175 SOLDE	20/09/2024	FA 0106208
M2023-020/Lot 1/BDC16 40% Lettre d'information Marne/Soleil décembre 2024 - IMPRIMERIE	,,	
023167 SOLDE	13/12/2024	FA 0107525
M2023-020/Lot 4/BDC5 Lettre de chantier Mérignac-Marne - GRAPHI 33		
022014 SOLDE	31/08/2024	FA
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - ALGA MEDIATION	31,00,2024	1.0
021068 AC1	31/05/2024	FA 24-05-69
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX DEGRES	31/03/2024	17 24 03-03
021060 AC1	28/05/2024	EV E340003E
M2023-025/Lot1/MS1 Lot 1 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE	20/03/2024	FA F2400025
•	02/05/2024	ΓΛ 170
020975 AC1	02/05/2024	FA 170
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info Travaux - DEUX DEGRES		

020547 AC1	02/04/2024	FA F2400007
M2023-025/Lot1/MS2/BDC2 Lot 1 - MS2 / Info Travaux - GARLUCHE	02/04/2024	17(12400007
020536 AC1	03/04/2024	FA 163
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - DEUX DEGRES	03/04/2024	17 103
022580 AC1	30/10/2024	FA F2400066
M2023-025/Lot1/MS2/BDC3 Lot 1 - MS2 / Actualisation Plan Guide - GARLUCHE	30/10/2024	FA F2400000
022555 AC1	29/10/2024	FA 197
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - DEUX DEGRES	29/10/2024	FA 197
021077 AC1	28/05/2024	FA F2400024
M2023-025/Lot2/MS1 Lot 2 - MS1 / Mission 1 : Diag-Plan d'actions - GARLUCHE	28/03/2024	FA F2400024
020974 AC1	02/05/2024	FA 160
	02/05/2024	FA 169
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - Travaux - DEUX DEGRES	02/04/2024	FA F3 400000
020545 AC1	02/04/2024	FA F2400009
M2023-025/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / Info projet urbain - Travaux - GARLUCHE	24 /22 /222 4	
020497 AC1	31/03/2024	FA 162
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - GARLUCHE		
020978 AC1	21/05/2024	FA F2416018
M2023-025/Lot2/MS2/BDC3 Lot 2 - MS2 / Identité Marne-Soleil - VAYSSETTES ROMAIN		
020978 AC1	21/05/2024	FA F2416018
M2023-025/Lot2/MS2/BDC5 Lot 2 - MS2 / Façades BDR - DEUX DEGRES		
022305 AC1	03/10/2024	FA F2400056
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 - DEUX DEGRES		
022581 AC1	30/10/2024	FA F2400067
M2023-025/Lot2/MS2/BDC6 Lot 2 - MS2 / Actualisation Plan Guide-Eté 2025 - GARLUCHE		
022551 AC1	29/10/2024	FA 199
022994 AC2	28/11/2024	FA 208
M2023-038/BDC-AD-3 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - AGESSA		
020512 CONTRIBUT° 1.1%/AC1	31/03/2024	FA 20240331-
021536 CONTRIBUT° 1.1%/AC2	11/07/2024	FA
023036 CONTRIBUT° 1.1%/AC3	02/12/2024	FA
M2023-038/BDC-AD-3 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 -		
020500 AC1	31/03/2024	FA
021529 AC2	10/07/2024	FA
023032 AC3	02/12/2024	FA
H105 Divers (repro,AAPC,affichage)		
17-01805 Frais gestion bancaire 2017 - CAISSE D'EPARGNE		
005447 COMM GEST° 3TR17	02/10/2017	FA 02/10/17
005448 REMISE S/COMM GEST° 3TR17	06/10/2017	FA 06/10/17
005663 COMM GEST° 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17
18-02059 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE		
006126 COMM° GEST° 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18
006424 COMM° GEST° 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18
006822 COMM° GEST° 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18
007377 COMM° GEST° 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18
19-02838 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE		
008060 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19
008454 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 01/07/19
008916 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19
20-03399 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE	, ,	35,55,25
		54.04/04/00
·	01/01/2020	IFA 01/01/20
009575 COMM° GEST° 4TR19 010209 COMM° GESTION 1TR20	01/01/2020	FA 01/01/20 FA 01/04/20

011198 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020
21-04119 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE		
011882 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21
012380 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21
012935 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21
013491 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21
014336 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22
22-05283 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE		
014971 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22
015679 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22
016264 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22
22-05456 Frais de convocat° et tenue AGE Clos Fougeraie - IMMO DE FRANCE (CLOS FOUGERAIE)		
22-05456 Avance	29/06/2022	
017378 FRAIS CONVOCAT° AGE	02/02/2023	FA 2023/01/10
22-05844 Frais de convocat° et tenue AGE bis Clos Fougeraie - IMMO DE FRANCE (CLOS	02, 02, 2020	
22-05844 Provision	02/12/2022	
017379 FRAIS CONVOCAT° AGE	02/02/2023	FA 2023/01/11
23-05967 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE	02/02/2023	1 A 2023/01/11
017120 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023
017900 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23
017926 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23
018349 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23
018887 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23
24-06920 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE		
019918 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24
020623 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24
021610 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24
022512 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24
H106 Contentieux		
19-02789 Assignation TGI SPEEDY - CARPA BORDEAUX		
008101 ASSIGNATION TGI SPEEDY	14/05/2019	FA 14/05/19
19-03290 Avance	09/12/2019	
19-03290 Avance	09/12/2019	
21-04537 Condamnation dépens Carrosserie Castera - CARPA BORDEAUX		
012707 SOLDE	26/04/2021	FA 21/00015
2 RECETTES		
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES		
R101 Libre		
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -		
20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
24-07655 Cession SNC Airis Montesquieu BX846 848 852 857 873 - LEBEAU-CABANAC (NOT)	,,	
24-52541 CESS° AIRIS MONTESQ BX846 848 852 857 873	21/11/2024	ACTE 21/11/24
R102 Abordable	21/11/2024	ACTE 21/11/24
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -		
20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
·	22/07/2020	ACTE 22/07/20
24-07655 Cession SNC Airis Montesquieu BX846 848 852 857 873 - LEBEAU-CABANAC (NOT)	21/11/2024	ACTE 24 /44 /24
24-52541 CESS° AIRIS MONTESQ BX846 848 852 857 873	21/11/2024	ACTE 21/11/24
R103 PLAI, PLUS, PLS		
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 llot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -	00/07/5555	1.075.05.45=45.5
20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
R104 PSLA,Accession soc		
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -		

20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
R105 Commerces		
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -	
20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
24-07655 Cession SNC Airis Montesquieu BX846 848 852 857 873 - LEBEAU-CABANAC (NOT)		
24-52541 CESS° AIRIS MONTESQ BX846 848 852 857 873	21/11/2024	ACTE 21/11/24
R107 Activités		
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac) -	
20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6	22/07/2020	ACTE 22/07/20
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE		
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA		
19-02726 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE		
19-19052 PART EQUILIBRE 2019	02/05/2019	AC1
21-28654 PART EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC2
23-41130 PART EQUILIBRE 2023	21/03/2023	AC4
V102 Participations à la remise d'ouvrage		
19-02725 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE	1	
19-19051 PART REMISE OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2
21-28655 PART REMISE OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC2
23-41129 PART REMISE OUVRAGE 2023	21/03/2023	AC3
X PRODUITS DIVERS		
X101 Loyers		
19-02660 Loyer Aquitanis (locataire Speedy) - AQUITANIS		
20-27988 LOYER SPEEDY 2019	01/01/2020	FA 31/12/19
20-28126 LOYER SPEEDY 2020	31/12/2020	FA 31/12/20
21-28834 LOYERS SPEEDY FRANCHISE 2020	01/01/2021	FA 01/01/21
X102 Refacturations	01,01,101	
19-02574 Régul pénalité Mageo M2016-015 - GEOTEC		
19-18088 REGUL PENALITE BDC4	31/12/2018	
20-03493 Refacturation des charges MDP Mérignac - LEON A VELO	. ,	
20-23539 CHARGES 1TR2020	01/02/2020	FA 2020-15-
20-24217 CHARGES 2EM TR 2020	01/04/2020	FA2020-33-
20-25238 CHARGES 4TR2019	12/06/2020	FA 2020 44
20-25557 CHARGES 3TR 2020	01/07/2020	FA 2020 52
20-26759 CHARGES 4TR 2020	01/10/2020	FA 2020 70
20-27051 REGULARISATION ELEC ET EAU 2019	05/10/2020	FA 2020-73-
21-28874 CHARGES 1ER TR 2021	01/01/2021	FA 2021 04
	,,	FA 2021 20
21-29520 CHARGES 2EM TR 2021	01/04/2021	
	01/04/2021	FA 2021-25-
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21	03/05/2021	FA 2021-25- FA 2022-31-
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21 ; 4TR21 ; 1TR22	03/05/2021 24/03/2022	FA 2022-31-
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21 ; 4TR21 ; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022	FA 2022-31- FA 2022-33-
22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT	03/05/2021 24/03/2022	FA 2022-31-
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31-
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020 17/03/2020	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20 FA 17/03/20
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMBS SINISTRE 240 AV MARNE	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 24-07556 Refacturation TF 2024 - FRANCE TRAVAIL	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020 17/03/2021	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20 FA 17/03/20 FA 17/03/21
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 24-07556 Refacturation TF 2024 - FRANCE TRAVAIL 24-51762 TF 9/10-31/12/24	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020 17/03/2020	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20 FA 17/03/20
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 24-07556 Refacturation TF 2024 - FRANCE TRAVAIL 24-51762 TF 9/10-31/12/24 X103 Dépot de Garantie	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020 17/03/2021	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20 FA 17/03/20 FA 17/03/21
21-29885 REFACTURATION CHARGES 09/19-04/21 22-35430 CHARGES 3TR21; 4TR21; 1TR22 22-35461 REFACTURATION CHARGES 05/21-03/22 22-38099 ECART DE RGT 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - DIVERS 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE 24-07556 Refacturation TF 2024 - FRANCE TRAVAIL 24-51762 TF 9/10-31/12/24	03/05/2021 24/03/2022 24/03/2022 22/09/2022 17/03/2020 17/03/2021	FA 2022-31- FA 2022-33- FA 2022-31- FA 17/03/20 FA 17/03/20 FA 17/03/21

24-53203 DG COT INSTALL CHANTIER ILOT B3	20/12/2024	EA 20/12/24
	20/12/2024	FA 20/12/24
X201 Produits financiers		
18-01850 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE	24 /42 /2047	5A 24 /42 /47
18-12929 REM° CPTE COURANT 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17
19-18094 REGUL ERR AFFECTAT° C/C	31/12/2017	
19-18095 REGUL ERR AFFECTAT° C/C	31/12/2017	
18-02060 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE	02/04/2010	
18-14481 REM° CPTE COURANT 1TR18	03/04/2018	
18-15181 REM° CPTE COURANT 2TR18 18-16237 REM° CPTE COURANT 3TR18	02/07/2018	
	02/10/2018	21/12/10
19-17815 REM° CPTE COURANT 4TR18	31/12/2018	31/12/18
19-18096 REGUL ERR C/C AFFECT°	31/12/2018	
19-18097 REGUL ERR C/C AFFECT°	31/12/2018	
19-02848 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE	04 /04 /2040	EA 24 /02 /40
19-19506 REM° CPTE COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19
19-20544 REM° CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19
19-21758 REM° CPTE COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19
19-03194/1 Cession BX 822-823-824 llot B2/B6 - 242 Avenue de la Marne (Not Lebeau Cabanac)		5. 00 /00 /00
23-40757 INT S/CESSION BX 822-823-824 llot B2/B6	15/02/2023	FA 20/02/23
20-03410 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE	0.1 (0.1 (0.000	
20-23254 REM° CPTE COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/2020
20-24903 REM° CPTE COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20
20-25710 REM° CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020
20-27167 REM° CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020
21-04130 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE		
21-28549 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21
21-29739 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21
21-30905 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21
21-32217 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21
22-34289 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/2022
22-34399 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT	01/01/2022	FA 01/01/22
22-34400 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22
22-05277 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE		
22-35803 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22
22-36937 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22
22-38161 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22
22-05311 Intérêts sur remboursement consignation CASTERA - CONSIGNATION CAISSE DES		
22-35887 INT S/REMB CONSIGNATION CASTERA	04/04/2022	FA 31/03/22
23-05978 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE		
23-40032 INTERETS CREDITEURS 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023
23-41721 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23
23-42925 INTERETS CREDITEURS 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23
23-44026 INTERETS CREDITEURS 3TR3	06/10/2023	FA 06/10/23
24-06840 Rémunération compte courant 2024 - CAISSE D'EPARGNE		
24-46766 INTERETS CREDITEURS 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24
24-48312 INTERETS CREDITEURS 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24
24-50294 INTERETS CREDITEURS 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24
24-51794 INTERETS CREDITEURS 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24
3 AMORTISSEMENT		
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE		
O200 Rembousement avances internes		

18-14294 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne)	27/02/2018	
Z TVA A REVERSER		
Z102 TVA à reverser		
19-03057 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)		
19-21001 CA3 06/2019	01/06/2019	
21-04374 CA3 03/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)		
21-29787 CA3 03/2021	31/03/2021	31/03/21
4 MOBILISATION		
M AVANCES		
M100 Avances collectivités		
17-01741 Avance de trésorerie C0004 - BORDEAUX METROPOLE		
17-12271 AVCE DE TRESORERIE	13/12/2017	DMD DE VERST
24-49166 AVCE DE TRESORERIE N°02	05/04/2024	FA 05/04/24
O AVANCES INTERNE		
O100 Avances interne		
18-01869 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne) - FAB		
18-13977 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne)	21/12/2017	
SOLDE		

Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	Réglé cum HT	Réglé HT	Réglé cum HT
A fin	A fin	A fin	A fin	A fin	A fin
2023	2024	2024	2023	2024	2024
9 842 470,67	3 025 624,77	12 868 095,44	9 062 844,50	2 832 288,98	11 895 133,48
660 198,80	144 362,59	804 561,39	550 165,65	121 802,16	671 967,81
168 389,55	64 250,27	232 639,82	140 324,62	53 541,89	193 866,51
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00
100 098,81		100 098,81	83 415,67		83 415,67
1 480,32		1 480,32	1 233,60		1 233,60
3 392,40		3 392,40	2 827,00		2 827,00
987,36		987,36	822,80		822,80
5 740,80		5 740,80	4 784,00		4 784,00
493,44		493,44	411,20		411,20
3 744,00		3 744,00	3 120,00		3 120,00
499,20		499,20	416,00		416,00
2 789,28		2 789,28	2 324,40		2 324,40
1 255,97		1 255,97	1 046,64		1 046,64
3 485,95		3 485,95	2 904,96		2 904,96
499,20		499,20	416,00		416,00
499,20		499,20	416,00		416,00
5 895,36		5 895,36	4 912,80		4 912,80
499,20		499,20	416,00		416,00
1 216,80		1 216,80	1 014,00		1 014,00
3 744,00		3 744,00	3 120,00		3 120,00
499,20		499,20	416,00		416,00
6 508,32		6 508,32	5 423,60		5 423,60
499,20		499,20	416,00		416,00
1 537,92		1 537,92	1 281,60		1 281,60
40,32		40,32	33,60		33,60
512,64		512,64	427,20		427,20
3 844,80		3 844,80	3 204,00		3 204,00
3 844,80		3 844,80	3 204,00		3 204,00
5 049,90		5 049,90	4 208,25		4 208,25
3 062,52		3 062,52	2 552,10		2 552,10
5 277,96		5 277,96	4 398,30		4 398,30
871,49		871,49	726,24		726,24
1 025,28		1 025,28	854,40		854,40
5 929,56		5 929,56	4 941,30		4 941,30
1 694,16		1 694,16	1 411,80		1 411,80
4 039,92		4 039,92	3 366,60		3 366,60
2 215,44		2 215,44	1 846,20		1 846,20
3 844,80		3 844,80	3 204,00		3 204,00
521,28		521,28	434,40		434,40

3 909,60		3 909,60	3 258,00		3 258,00
526,08		526,08	438,40		438,40
2 663,28		2 663,28	2 219,40		2 219,40
5 957,86		5 957,86	4 964,88		4 964,88
20 933,04		20 933,04	17 444,20		17 444,20
493,44		493,44	411,20		411,20
2 713,92		2 713,92	2 261,60		2 261,60
3 700,80		3 700,80	3 084,00		3 084,00
11 657,52		11 657,52	9 714,60		9 714,60
2 367,36		2 367,36	1 972,80		1 972,80
2 880,00		2 880,00	2 400,00		2 400,00
2 880,00		2 880,00	2 400,00		2 400,00
2 888,64		2 888,64	2 407,20		2 407,20
2 888,64		2 888,64	2 407,20		2 407,20
3 075,84		3 075,84	2 563,20		2 563,20
3 075,84		3 075,84	2 563,20		2 563,20
1 153,44		1 153,44	961,20		961,20
1 153,44		1 153,44	961,20		961,20
1 154,52		1 154,52	962,10		962,10
1 154,52		1 154,52	962,10		962,10
3 075,84		3 075,84	2 563,20		2 563,20
3 075,84		3 075,84	2 563,20		2 563,20
2 563,20		2 563,20	2 136,00		2 136,00
2 563,20		2 563,20	2 136,00		2 136,00
517,44		517,44	431,20		431,20
517,44		517,44	431,20		431,20
646,80		646,80	539,00		539,00
646,80		646,80	539,00		539,00
	6 238,08	6 238,08		5 198,40	5 198,40
	6 238,08	6 238,08		5 198,40	5 198,40
1 025,28		1 025,28	854,40		854,40
1 025,28		1 025,28	854,40		854,40
	3 127,68	3 127,68		2 606,40	2 606,40
	3 127,68	3 127,68		2 606,40	2 606,40
	1 824,48	1 824,48		1 520,40	1 520,40
	1 824,48	1 824,48		1 520,40	1 520,40
	3 237,00	3 237,00		2 697,50	2 697,50
	3 237,00	3 237,00		2 697,50	2 697,50
	1 944,00	1 944,00		1 620,00	1 620,00
	1 944,00	1 944,00		1 620,00	1 620,00
3 751,20		3 751,20	3 126,00		3 126,00
5 060,16		5 060,16	4 216,80		4 216,80
-5 060,16		-5 060,16	-4 216,80		-4 216,80
3 751,20		3 751,20	3 126,00		3 126,00
1 500,48		1 500,48	1 250,40		1 250,40
1 500,48		1 500,48	1 250,40		1 250,40
	517,92	517,92		431,60	431,60
	517,92	517,92		431,60	431,60
	2 079,36	2 079,36		1 732,80	1 732,80
	2 079,36	2 079,36		1 732,80	1 732,80
	1 559,52	1 559,52		1 299,60	1 299,60
	1 559,52	1 559,52		1 299,60	1 299,60

1 086,00	1 086,00		1 303,20	1 303,20	
1 086,00	1 086,00		1 303,20	1 303,20	
1 086,00	1 086,00		1 303,20	1 303,20	
1 086,00	1 086,00		1 303,20	1 303,20	
433,20	433,20		519,84	519,84	
433,20	433,20		519,84	519,84	
543,00	543,00		651,60	651,60	
543,00	543,00		651,60	651,60	
543,00	543,00		651,60	651,60	
543,00	543,00		651,60	651,60	
1 807,20		1 807,20	2 168,64		2 168,64
1 807,20		1 807,20	2 168,64		2 168,64
2 425,50		2 425,50	2 910,60		2 910,60
2 425,50		2 425,50	2 910,60		2 910,60
2 084,00		2 084,00	2 500,80		2 500,80
2 084,00		2 084,00	2 500,80		2 500,80
416,80		416,80	500,16		500,16
416,80		416,80	500,16		500,16
2 709,20		2 709,20	3 251,04		3 251,04
2 709,20		2 709,20	3 251,04		3 251,04
416,80		416,80	500,16		500,16
416,80		416,80	500,16		500,16
842,40		842,40	1 010,88		1 010,88
842,40		842,40	1 010,88		1 010,88
3 685,50		3 685,50	4 422,60		4 422,60
3 685,50		3 685,50	4 422,60		4 422,60
301,20		301,20	361,44		361,44
301,20		301,20	361,44		361,44
321,00		321,00	385,20		385,20
321,00		321,00	385,20		385,20
428,00		428,00	513,60		513,60
428,00		428,00	513,60		513,60
1 462,05	1 462,05		1 754,46	1 754,46	
1 462,0	1 462,05		1 754,46	1 754,46	
5 224,23	3 166,38	2 057,85	6 269,08	3 799,66	2 469,42
2 057,85		2 057,85	2 469,42		2 469,42
3 166,38	3 166,38		3 799,66	3 799,66	
8 686,32	6 910,92	1 775,40	10 423,58	8 293,10	2 130,48
1 775,40		1 775,40	2 130,48		2 130,48
6 910,92	6 910,92		8 293,10	8 293,10	
6 204,64	6 204,64		7 445,57	7 445,57	
6 204,64	6 204,64		7 445,57	7 445,57	
117 774,3	14 400,00	103 374,37	139 529,26	15 480,00	124 049,26
11 211,10		11 211,10	13 453,33		13 453,33
5 885,79		5 885,79	7 062,95		7 062,95
5 325,3		5 325,31	6 390,38		6 390,38
8 488,58		8 488,58	10 186,29		10 186,29
4 679,49		4 679,49	5 615,39		5 615,39
3 809,09		3 809,09	4 570,90		4 570,90
7 042,62		7 042,62	8 451,15		8 451,15
2 202,13		2 202,11	2 642,53		2 642,53
4 840,5		4 840,51	5 808,62		5 808,62

3 936,38		3 936,38	4 723,66		4 723,66
825,79		825,79	990,95		990,95
3 110,59		3 110,59	3 732,71		3 732,71
1 818,48		1 818,48	2 182,18		2 182,18
507,84		507,84	609,41		609,41
1 310,64		1 310,64	1 572,77		1 572,77
9 783,00		9 783,00	11 739,60		11 739,60
9 783,00		9 783,00	11 739,60		11 739,60
5 490,45		5 490,45	6 588,54		6 588,54
2 732,40		2 732,40	3 278,88		3 278,88
1 377,00		1 377,00	1 652,40		1 652,40
1 381,05		1 381,05	1 657,26		1 657,26
5 032,30		5 032,30	6 038,76		6 038,76
3 748,50		3 748,50	4 498,20		4 498,20
1 283,80		1 283,80	1 540,56		1 540,56
10 441,20		10 441,20	12 529,44		12 529,44
8 032,50		8 032,50	9 639,00		9 639,00
2 408,70		2 408,70	2 890,44		2 890,44
10 080,01		10 080,01	12 096,01		12 096,01
7 675,50		7 675,50	9 210,60		9 210,60
2 404,51		2 404,51	2 885,40		2 885,40
			0,01		0,01
10 893,75		10 893,75	13 072,50		13 072,50
5 428,50		5 428,50	6 514,20		6 514,20
5 465,25		5 465,25	6 558,30		6 558,30
1 882,80		1 882,80	2 259,36		2 259,36
1 882,80		1 882,80	2 259,36		2 259,36
17 273,70		17 273,70	20 728,44		20 728,44
7 632,00		7 632,00	9 158,40		9 158,40
5 830,11		5 830,11	6 996,13		6 996,13
3 811,59		3 811,59	4 573,91		4 573,91
9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
5 400,00	5 400,00		6 480,00	6 480,00	
3 600,00	3 600,00		4 320,00	4 320,00	
1 800,00	1 800,00		2 160,00	2 160,00	
122 122,28	28 700,97	93 421,31	146 546,75	34 441,16	112 105,59
10 983,26		10 983,26	13 179,92		13 179,92
1 783,98		1 783,98	2 140,78		2 140,78
1 783,98		1 783,98	2 140,78		2 140,78
1 890,00		1 890,00	2 268,01		2 268,01
1 839,52		1 839,52	2 207,42		2 207,42
1 829,42		1 829,42	2 195,30		2 195,30
1 856,36		1 856,36	2 227,63		2 227,63
11 763,08		11 763,08	14 115,70		14 115,70
1 859,72		1 859,72	2 231,66		2 231,66
1 866,44		1 866,44	2 239,73		2 239,73
1 863,08		1 863,08	2 235,70		2 235,70
5 297,00		5 297,00	6 356,40		6 356,40
876,84		876,84	1 052,21		1 052,21
16 079,49		16 079,49	19 295,39		19 295,39

6 417,53		0 417,53	5 347,94		5 347,94
9 804,53		9 864,53 6 417,53	8 220,44 5 347,94	-	8 220,44 5 347,94
9 864,53					
4 782,96 4 782,96		4 782,96 4 782,96	3 985,80 3 985,80		3 985,80
4 782,96	10 014,73	4 782,96	3 985,80	0 343,01	3 985,80
94 969,26	9 235,98 10 014,73	104 983,99	79 141,06	8 345,61	87 486,67
	9 235,98 9 235,98	9 235,98 9 235,98		7 696,65 7 696,65	7 696,65 7 696,65
	10 259,23	10 259,23		8 549,36 7 696 65	8 549,36 7 696,65
	6 813,49	6 813,49		5 677,91	5 677,91 8 540 36
	17 072,72 6 813 40	6 913 49		14 227,27	14 227,27
	8 132,46	8 132,46		6 777,05	6 777,05
5 316,96	0.422.45	5 316,96	4 430,80	6 777 05	4 430,80
5 316,96	8 132,46	13 449,42	4 430,80	6 777,05	11 207,85
5 295,84	0.400.40	5 295,84	4 413,20	6 777 07	4 413,20
5 295,84		5 295,84	4 413,20		4 413,20
4 269,17		4 269,17	3 557,64		3 557,64
4 269,17		4 269,17	3 557,64		3 557,64
3 522,62		3 522,62	2 935,51		2 935,51
2 144,82		2 144,82	1 787,34		1 787,34
2 122,60		2 122,60	1 768,83		1 768,83
2 112,50		2 112,50	1 760,42		1 760,42
2 112,50		2 112,50	1 760,42		1 760,42
2 106,44		2 106,44	1 755,37		1 755,37
14 121,48		14 121,48	11 767,89		11 767,89
3 450,97		3 450,97	2 875,82		2 875,82
2 104,41		2 104,41	1 753,68		1 753,68
2 108,47		2 108,47	1 757,05		1 757,05
2 088,27		2 088,27	1 740,22		1 740,22
2 088,27		2 088,27	1 740,22		1 740,22
2 080,19		2 080,19	1 733,49		1 733,49
13 920,58		13 920,58	11 600,48		11 600,48
1 339,75		1 339,75	1 116,46		1 116,46
2 084,23		2 084,23	1 736,86		1 736,86
2 089,37		2 089,37	1 741,15		1 741,15
2 088,02		2 088,02	1 740,02		1 740,02
2 055,95		2 055,95	1 713,29		1 713,29
3 359,51		3 359,51	2 799,59		2 799,59
3 546,66		3 546,66	2 955,55		2 955,55
16 563,49		16 563,49	13 802,92		13 802,92
818,29		818,29	681,91		681,91
818,29		818,29	681,91		681,91
3 701,49		3 701,49	3 084,58		3 084,58
3 701,49		3 701,49	3 084,58		3 084,58
1 507,28		1 507,28	1 256,06		1 256,06
1 507,28		1 507,28	1 256,06		1 256,06
120,70		120,70	100,58		100,58
4 153,09		4 153,09	3 460,91		3 460,91
4 144,80		10 876,80 4 144,80	3 454,00		9 064,00 3 454,00
10 876,80		10.876.80	9 064,00		

17 520,00		17 520,00	14 600,00		14 600,00
6 000,00		6 000,00	5 000,00		5 000,00
6 000,00		6 000,00	5 000,00		5 000,00
720,00		720,00	600,00		600,00
720,00		720,00	600,00		600,0
13 103,51		13 103,51	10 919,60		10 919,60
13 103,51		13 103,51	10 919,60		10 919,60
10 026,00		10 026,00	8 355,00		8 355,00
10 026,00		10 026,00	8 355,00		8 355,00
2 208,60		2 208,60	1 840,50		1 840,50
1 092,96		1 092,96	910,80		910,80
1 115,64		1 115,64	929,70		929,70
8 601,60		8 601,60	7 168,00		7 168,00
8 601,60		8 601,60	7 168,00		7 168,00
5 213,42		5 213,42	4 344,52		4 344,52
5 213,42		5 213,42	4 344,52		4 344,52
7 776,00		7 776,00	6 480,00		6 480,00
7 776,00		7 776,00	6 480,00		6 480,00
3 240,00		3 240,00	2 700,00		2 700,00
3 240,00		3 240,00	2 700,00		2 700,00
512,64		512,64	427,20		427,20
512,64		512,64	427,20		427,20
5 400,00		5 400,00	4 500,00		4 500,00
3 600,00		3 600,00	3 000,00		3 000,00
1 800,00		1 800,00	1 500,00		1 500,00
	10 014,73	10 014,73		8 345,61	8 345,61
	2 486,48	2 486,48		2 072,07	2 072,07
	4 998,23	4 998,23		4 165,19	4 165,19
	912,37	912,37		760,31	760,3
	1 617,65	1 617,65		1 348,04	1 348,04
26 875,26	8 721,60	35 596,86	22 396,05	7 268,00	29 664,0
9 865,26		9 865,26	8 221,05		8 221,05
8 791,20		8 791,20	7 326,00		7 326,00
1 074,06		1 074,06	895,05		895,05
17 010,00		17 010,00	14 175,00		14 175,00
10 194,00		10 194,00	8 495,00		8 495,00
720,00 720,00 720,00 13 103,51 10 026,00 10 026,00 10 026,00 10 092,96 1 115,64 8 601,60 8 601,60 7776,00 7776,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00 1 800,		6 816,00	5 680,00		5 680,00
	960,00	960,00		800,00	800,00
	960,00	960,00		800,00	800,00
	7 761,60	7 761,60		6 468,00	6 468,00
	7 761,60	7 761,60		6 468,00	6 468,00
41 880,27	512,78	42 393,05	34 900,23	427,32	35 327,5
1 872,00		1 872,00	1 560,00		1 560,00
1 872,00		1 872,00	1 560,00		1 560,00
6 321,28		6 321,28	5 267,73		5 267,73
1 309,14		1 309,14	1 090,95		1 090,9
-7 630,42		-7 630,42	-6 358,68		-6 358,6
4 774,50		4 774,50	3 978,75		3 978,75
4 774,50		4 774,50	3 978,75		3 978,7
18 115,20		18 115,20	15 096,00		15 096,00
1 806,50		1 806,50	1 806,50		1 806,50
9 165,60		9 165,60	7 638,00		7 638,00

					2 331,9
	550,49	550,49		458,74	458,7
	550,49	550,49		458,74	458,7
645,49		645,49	537,91		537,9
645,49		645,49	537,91		537,9
4 604,58		4 604,58	3 837,15		3 837,1
4 604,58		4 604,58	3 837,15		3 837,1
357,37		357,37	297,81		297,8
357,37		357,37	297,81		297,8
1 129,31		1 129,31	941,09		941,0
1 129,31		1 129,31	941,09		941,0
233,37		233,37	194,48		194,
233,37		233,37	194,48		194,4
1 890,72		1 890,72	1 575,60		1 575,
1 890,72		1 890,72	1 575,60		1 575,6
1 260,30		1 260,30	1 050,25		1 050,
1 260,30		1 260,30	1 050,25		1 050,2
2 196,58		2 196,58	1 830,49		1 830,
1 716,05		1 716,05	1 430,04		1 430,
3 912,63		3 912,63	3 260,53		3 260,5
2 297,04		2 297,04	1 914,20		1 914,
2 297,04		2 297,04	1 914,20		1 914,2
620,36		620,36	516,96		516,
620,36		620,36	516,96		516,
1 136,20		1 136,20	946,83		946,
1 136,20		1 136,20	946,83		946,8
871,08		871,08	725,90		725,
871,08		871,08	725,90		725,
1 132,44		1 132,44	943,70		943,
1 132,44		1 132,44	943,70		943,
735,84		735,84	613,20		613,
735,84		735,84	613,20		613,
1 740,00		1 740,00	1 450,00		1 450,
1 740,00		1 740,00	1 450,00		1 450,
4 320,00		4 320,00	3 600,00		3 600,
4 320,00		4 320,00	3 600,00		3 600,0
600,00		600,00	500,00		500,
600,00		600,00	500,00		500,0
27 486,73	10 273,05	37 759,78	22 905,61	8 560,87	31 466,
1 334,88		1 334,88	1 112,40		1 112,
1 495,56		1 495,56	1 246,30		1 246,
2 830,44		2 830,44	2 358,70		2 358,
	512,78	512,78		427,32	427,
7 990,27		7 990,27	6 658,56		6 658,
7 990,27	512,78	8 503,05	6 658,56	427,32	7 085,
3 015,56		3 015,56	2 512,97		2 512,
3 015,56		3 015,56	2 512,97		2 512,
3 282,30		3 282,30	2 735,25		2 735,
3 282,30		3 282,30	2 735,25		2 735,2
1 710,00		1 710,00	1 314,00		1 314,
1 413,00		1 413,00	1 017,00		1 017,
1 412 00					

1 960,00 2 200,00 -240,00		2 200,00	2 200,00		2 200, -240,
-		2 200,00	2 200,00		2 200,
1 960,00					
-		1 960,00	1 960,00		1 960,0
7 280,00		7 280,00	7 280,00		7 280,
7 280,00		7 280,00	7 280,00		7 280,0
50 580,00		50 580,00	42 150,00		42 150,
50 580,00		50 580,00	42 150,00		42 150,0
-120 600,00		-120 600,00	-120 600,00		-120 600,
120 600,00		120 600,00	120 600,00		120 600,
			-4 116,00		-4 116,
24 696,00		24 696,00	24 696,00		24 696,
24 696,00		24 696,00	20 580,00		20 580,
-3 277,43		-3 277,43	-3 277,43		-3 277
300 704,51		300 704,51	300 704,51		300 704
347 872,93		347 872,93	347 872,93		347 872
645 300,00		645 300,00	645 300,00		645 300,
375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000
375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,
1 395 000,00		1 395 000,00	1 395 000,00		1 395 000
1 395 000,00		1 395 000,00	1 395 000,00		1 395 000,
2 499 816,00	1 586 377,45	4 086 193,45	2 487 270,00	1 579 405,45	4 066 675
4 725 782,90	1 802 447,69	6 528 230,59	4 548 344,06	1 787 881,40	6 336 225
	669,00	669,00		557,50	557
,	669,00	669,00	,	557,50	557,
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000,
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000,
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000,
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000
12 000,00		12 000,00	10 000,00		10 000,
5 400,00		5 400,00	4 500,00		4 500
5 400,00		5 400,00	4 500,00		4 500,
5 400,00		5 400,00	4 500,00		4 500
5 400,00		5 400,00	4 500,00		4 500,
58 800,00	669,00	59 469,00	49 000,00	557,50	49 557,
1 442,88		1 442,88	1 202,40		1 202,
1 442,88		1 442,88	1 202,40		1 202,
4 200,00 4 200,00		4 200,00	3 500,00 3 500,00		3 500, 3 500,
-		4 200,00	-		3 500,
5 642,88	2 100,46	5 642,88	4 702,40	1 803,40	4 702
	2 166,48	2 166,48		1 805,40	1 805,
	2 166,48	2 166,48		1 805,40	1 805,
	2 308,50	2 308,50 2 308,50		1 923,75 1 923,75	1 923, 1 923,
	1 372,10	1 372,10		1 143,42	1 143,
	1 372,10	1 372,10		1 143,42	1 143,
	1 077,10	1 077,10		897,58	897,
	1 077,10	1 077,10		897,58	897,

	1 544 545,45	1 544 545,45		1 544 545,45	1 544 545,45
	41 832,00	41 832,00		34 860,00	34 860,00
	41 832,00	41 832,00		41 832,00	41 832,00
				-6 972,00	-6 972,00
53 648,62	29 073,61	82 722,23	46 446,33	26 178,53	72 624,86
14 889,35		14 889,35	12 494,46		12 494,46
500,00		500,00	500,00		500,00
15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
-610,65		-610,65	-3 005,54		-3 005,54
7 920,81		7 920,81	7 114,01		7 114,01
8 300,00		8 300,00	8 300,00		8 300,00
-379,19		-379,19	-1 185,99		-1 185,99
6 600,00		6 600,00	5 600,00		5 600,00
6 600,00		6 600,00	5 600,00		5 600,00
12 181,72		12 181,72	10 841,77		10 841,77
125,00		125,00	125,00		125,00
12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
12,00		12,00	12,00		12,00
44,72		44,72	-1 295,23		-1 295,23
1 636,35		1 636,35	1 417,59		1 417,59
2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
-863,65		-863,65	-1 082,41		-1 082,41
1 200,00		1 200,00	1 000,00		1 000,00
1 200,00		1 200,00	1 000,00		1 000,00
212,62		212,62	212,62		212,62
212,62		212,62	212,62		212,62
1 952,67		1 952,67	1 695,88		1 695,88
2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
-147,33		-147,33	-404,12		-404,12
1 402,92		1 402,92	1 250,79		1 250,79
1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
2,92		2,92	-149,21		-149,21
1 080,26		1 080,26	943,80		943,80
1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
-619,74		-619,74	-756,20		-756,20
4 571,92		4 571,92	3 875,41		3 875,41
4 560,00		4 560,00	4 560,00		4 560,00
11,92		11,92	-684,59		-684,59
11,52	27 273,61	27 273,61	004,55	24 378,53	24 378,53
	22 300,00	22 300,00		22 300,00	22 300,00
	9 409,29	9 409,29		9 409,29	9 409,29
	-4 435,68	-4 435,68		-7 330,76	-7 330,76
	1 800,00			1 800,00	<u> </u>
	1 800,00	1 800,00 1 800,00			1 800,00
F 140 CO			4 204 22	1 800,00	1 800,00
5 149,60	249,53	5 399,13	4 291,33	207,94	4 499,27
2 907,84		2 907,84	2 423,20		2 423,20
2 907,84		2 907,84	2 423,20		2 423,20
2 241,76		2 241,76	1 868,13		1 868,13
2 241,76	340.50	2 241,76	1 868,13	207.04	1 868,13
	249,53	249,53		207,94	207,94
	249,53	249,53		207,94	207,94 12 974,73

1 800,00		1 800,00	2 160,00		2 160,00
1 800,0		1 800,00	2 160,00		2 160,00
1 800,00		1 800,00	2 160,00		2 160,00
1 000,0		1 000,00	1 200,00		1 200,00
800,0		800,00	960,00		960,00
1 408,05		1 408,05	1 689,66		1 689,66
1 408,0		1 408,05	1 689,66		1 689,66
1 800,00		1 800,00	2 160,00		2 160,00
1 800,0		1 800,00	2 160,00		2 160,00
4 764,17		4 764,17	5 717,00		5 717,00
4 764,1		4 764,17	5 717,00		5 717,00
1 402,51		1 402,51	1 683,01		1 683,01
1 402,5		1 402,51	1 683,01		1 683,01
227 154,5	155 454,55	71 700,00	227 154,55	155 454,55	71 700,00
71 700,00		71 700,00	71 700,00		71 700,00
38 652,5		38 652,55	38 652,55		38 652,55
33 411,6		33 411,61	33 411,61		33 411,61
-364,1		-364,16	-364,16		-364,16
155 454,55	155 454,55		155 454,55	155 454,55	
155 454,5	155 454,55		155 454,55	155 454,55	
1 120 000,0	,	1 120 000,00	1 120 000,00		. 120 000,00
570 000,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00
570 000,0		570 000,00	570 000,00		570 000,00
550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00
165 000,0		165 000,00	165 000,00		165 000,00
385 000,0		385 000,00	385 000,00		385 000,00
24 995,0		24 995,08	24 995,08		24 995,08
24 995,08		24 995,08	24 995,08		24 995,08
13 474,5		13 474,53	13 474,53		13 474,53
11 647,5		11 647,50	11 647,50		11 647,50
-126,9		-126,95	-126,95		-126,95
63 655,1	13 083,09	50 572,06	74 744,40	15 030,34	59 714,06
130,26		130,26	156,31		156,31
130,2		130,26	156,31		156,31
12 702,00		12 702,00	15 242,40		15 242,40
15 198,0		15 198,00	18 237,60		18 237,60
-15 198,0		-15 198,00	-18 237,60		-18 237,60
16 848,0		16 848,00	20 217,60		20 217,60
-4 146,0		-4 146,00	-4 975,20		-4 975,20
60,00		60,00	72,00		72,00
60,0		60,00	72,00		72,00
100,00		100,00	120,00		120,00
100,0		100,00	120,00		120,00
100,00		100,00	120,00		120,00
100,0		100,00	120,00		120,00
1 567,14	1 567,14		1 861,77	1 861,77	-,
477,0	477,08		572,50	572,50	
163,0	163,03		195,64	195,64	
149,8	149,80		179,76	179,76	
153,0	153,02		183,62	183,62	
149,5	149,54		179,45	179,45	
149 5		1		±1 J, TJ	

	5 941,51	5 941,51		4 951,26	4 951,2
	241,70	241,70		201,41	201,4
	241,70	241,70		201,41	201,4
	483,40	483,40		402,82	402,8
	241,70	241,70		201,41	201,4
	516,35	516,35		430,29	430,2
	758,05	758,05		631,70	631,7
1 608,26		1 608,26	1 340,21		1 340,2
1 608,26		1 608,26	1 340,21		1 340,2
4 200,00		4 200,00	3 500,00		3 500,0
4 200,00		4 200,00	3 500,00		3 500,0
-1 407,60		-1 407,60	-1 173,00		-1 173,0
361,20		361,20	301,00		301,0
469,20		469,20	391,00		391,
216,00		216,00	180,00		180,
361,20		361,20	301,00		301,
1 080,00		1 080,00	900,00		900,
14 001,12		14 001,12	11 667,60		11 667,
15 081,12		15 081,12	12 567,60		12 567,0
266,92		266,92	222,44		222,
133,46		133,46	111,22		111,
1 534,83		1 534,83	1 279,03		1 279,
1 401,37		1 401,37	1 167,81		1 167,
734,05		734,05	611,71		611,
333,66		333,66	278,05		278,
667,32		667,32	556,10		556,
622,97		622,97	622,97		622,
2 325,55		2 325,55	2 325,55		2 325,
14,03		14,03	14,03		14,
1 201,69		1 201,69	1 201,69		1 201,
78,69		78,69	78,69		78,
134,87		134,87	134,87		134,
201,10		201,10	201,10		201,
169,62		169,62	169,62		169,
113,44		113,44	113,44		113,
9 933,57		9 933,57	9 088,32		9 088,
-84,00		-84,00	-140,00		-140,
133,46		133,46	111,22		111,
261,36		261,36	217,80		217,
420,00		420,00	420,00		420,
730,82		730,82	609,02		609,0
	1 752,12	1 752,12		1 460,10	1 460,
	1 752,12	1 752,12		1 460,10	1 460,
	1 046,07	1 046,07		1 046,07	1 046,
	1 046,07	1 046,07		1 046,07	1 046,
	946,90	946,90		946,90	946,
	946,90	946,90		946,90	946,
	420,00	420,00		350,00	350,
	420,00	420,00		350,00	350,0
	142,18	142,18		134,15	134,
	185,14 40,46	40,46		154,28 33,72	33,

	5 941,51	5 941,51		4 951,26	4 951,2
	560,52	560,52		467,10	467,1
	560,52	560,52		467,10	467,2
12 254,40		12 254,40	10 212,00		10 212,0
12 254,40		12 254,40	10 212,00		10 212,
195,18		195,18	162,65		162,0
195,18		195,18	162,65		162,
	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,0
	1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,
	4 947,11	4 947,11		4 122,59	4 122,
	1 188,86	1 188,86		990,72	990,
	1 188,86	1 188,86		990,72	990,
	1 228,49	1 228,49		1 023,74	1 023,
	1 228,49	1 228,49		1 023,74	1 023,
	237,77	237,77		198,14	198,
	237,77	237,77		198,14	198,
	364,80	364,80		304,00	304,0
	364,80	364,80		304,00	304,
	1 927,19	1 927,19		1 605,99	1 605,
	1 372,10	1 372,10		1 143,42	1 143,
	451,90	451,90		376,58	376,
	103,19	103,19		85,99	85,
6 768,50		6 768,50	6 768,50		6 768,
3 415,00		3 415,00	3 415,00		3 415,
1 848,00		1 848,00	1 848,00		1 848,
1 567,00		1 567,00	1 567,00		1 567,
3 353,50		3 353,50	3 353,50		3 353,
3 353,50		3 353,50	3 353,50		3 353,
54 375,86	11 120,23	65 496,09	45 446,47	9 266,86	54 713,
567,53		567,53	542,53		542,.
567,53		567,53	542,53		542,
226,49		226,49	226,49		226,
226,49		226,49	226,49		226,
476,92		476,92	414,37		414,.
140,00		140,00	119,15		119,
56,92		56,92	56,92		56,
280,00		280,00	238,30		238,
540,00		540,00	454,96		454,
270,00		270,00	227,48		227,
270,00		270,00	227,48		227,
300,00		300,00	252,48		252,
300,00		300,00	252,48		252,
1 173,61		1 173,61	978,01		978,
		390,00	324,99		324,
390,00					653,
390,00 783,61		783,61	653,02		
		783,61 145,36	653,02 121,87		121,
783,61					
783,61 145,36		145,36	121,87		121,
783,61 145,36 145,36		145,36 145,36	121,87 121,87		121, 450,
783,61 145,36 145,36 540,00		145,36 145,36 540,00	121,87 121,87 450,00		121, 121, 450, 225, 225,
783,61 145,36 145,36 540,00 270,00		145,36 145,36 540,00 270,00	121,87 121,87 450,00 225,00		121, 450, 225,

300,00	300,00	250,00	250,00
300,00	300,00	250,00	250,00
273,20	273,20	227,67	227,67
273,20	273,20	227,67	227,67
234,40	234,40	195,34	195,34
234,40	234,40	195,34	195,34
239,10	239,10	200,04	200,04
239,10	239,10	200,04	200,04
540,00	540,00	450,00	450,00
540,00	540,00	450,00	450,00
270,00	270,00	225,00	225,00
270,00	270,00	225,00	225,00
624,00	624,00	520,00	520,00
624,00	624,00	520,00	520,00
390,00	390,00	324,99	324,99
390,00	390,00	324,99	324,99
300,00	300,00	250,00	250,00
300,00	300,00	250,00	250,00
270,00	270,00	225,00	225,00
		225,00	
270,00 2 932,80	270,00	2 444,00	225,00
,	2 932,80		2 444,00
2 932,80	2 932,80	2 444,00	2 444,00
5 006,96	5 006,96	4 172,47	4 172,47
1 841,35	1 841,35	1 534,46	1 534,46
2 421,50	2 421,50	2 017,92	2 017,92
744,11	744,11	620,09	620,09
900,00	900,00	750,00	750,00
900,00	900,00	750,00	750,00
3 502,08	3 502,08	2 918,40	2 918,40
3 420,00	3 420,00	2 850,00	2 850,00
82,08	82,08	68,40	68,40
1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
1 260,00	1 260,00	1 050,00	1 050,00
1 260,00	1 260,00	1 050,00	1 050,00
720,00	720,00	600,00	600,00
720,00	720,00	600,00	600,00
6 255,00	6 255,00	5 212,50	5 212,50
1 440,00	1 440,00	1 200,00	1 200,00
1 215,00	1 215,00	1 012,50	1 012,50
1 950,60	1 950,60	1 625,50	1 625,50
209,40	209,40	174,50	174,50
1 440,00	1 440,00	1 200,00	1 200,00
3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00
3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00
1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
4 734,78	4 734,78	3 945,65	3 945,65
4 734,78	4 734,78	3 945,65	3 945,65
6 387,24	6 387,24	5 322,70	5 322,70
6 387,24	6 387,24	5 322,70	5 322,70
1 176,19	1 176,19	980,16	980,16

980,16		980,16	1 176,19		1 176,19
839,20		839,20	1 007,04		1 007,04
839,20		839,20	1 007,04		1 007,04
2 757,12		2 757,12	3 308,54		3 308,54
2 757,12		2 757,12	3 308,54		3 308,54
1 895,52		1 895,52	2 274,62		2 274,62
1 895,52		1 895,52	2 274,62		2 274,62
654,00	654,00		784,80	784,80	
654,00	654,00		784,80	784,80	
1 395,20	1 395,20		1 674,24	1 674,24	
1 395,20	1 395,20		1 674,24	1 674,24	
677,66	677,66		813,19	813,19	
677,66	677,66		813,19	813,19	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
2 180,00	2 180,00		2 616,00	2 616,00	
10 366,43	35,19	10 331,24	12 057,42	42,23	12 015,19
692,00		692,00	692,00		692,00
435,00		435,00	435,00		435,00
75,00		75,00	75,00		75,00
14,00		14,00	14,00		14,00
60,00		60,00	60,00		60,00
108,00		108,00	108,00		108,00
53,00		53,00	53,00		53,00
26,00		26,00	26,00		26,00
15,00		15,00	15,00		15,00
12,00		12,00	12,00		12,00
2 857,94		2 857,94	3 379,59		3 379,59
607,67		607,67	729,20		729,20
164,01		164,01	175,84		175,84
75,94		75,94	87,77		87,77
179,87		179,87	199,18		199,18
610,15		610,15	729,20		729,20
610,15		610,15	729,20		729,20
56,92		56,92	56,92		56,92
610,15		610,15	729,20		729,20
-56,92		-56,92	-56,92		-56,92
2 496,12		2 496,12	2 995,34		2 995,34
1 059,24		1 059,24	1 271,09		1 271,09
174,72		174,72	209,66		209,66
1 059,24		1 059,24	1 271,09		1 271,09
202,92		202,92	243,50		243,50
1 429,84		1 429,84	1 715,81		1 715,81
1 429,84		1 429,84	1 715,81		1 715,81
1 787,88		1 787,88	2 145,46		2 145,46
1 429,84		1 429,84	1 715,81		1 715,81
358,04		358,04	429,65		429,65
114,46		114,46	133,99		133,99
114,46		114,46	133,99		133,99

276,00		276,00	276,00		276,00
276,00		276,00	276,00		276,00
624,00		624,00	624,00		624,00
12,00		12,00	12,00		12,00
291,00		291,00	291,00		291,00
321,00		321,00	321,00		321,00
35,19	35,19	,	42,23	42,23	,
35,19	35,19		42,23	42,23	
186 644,55		186 644,55	223 973,42		223 973,42
9 717,37		9 717,37	11 660,84		11 660,84
9 717,37		9 717,37	11 660,84		11 660,84
9 888,39		9 888,39	11 866,06		11 866,06
9 888,39		9 888,39	11 866,06		11 866,06
5 295,90		5 295,90	6 355,08		6 355,08
5 295,90		5 295,90	6 355,08		6 355,08
27 674,45		27 674,45	33 209,33		33 209,33
4 339,25		4 339,25	5 207,10		5 207,10
4 426,48		4 426,48	5 311,78		5 311,78
12 113,47		12 113,47	14 536,16		14 536,16
3 923,14		3 923,14	4 707,77		4 707,77
1 733,79		1 733,79	2 080,54		2 080,54
1 138,32		1 138,32	1 365,98		1 365,98
5 007,13		5 007,13	6 008,55		6 008,55
5 007,13		5 007,13	6 008,55		6 008,55
3 882,12		3 882,12	4 658,54		4 658,54
3 882,12		3 882,12	4 658,54		4 658,54
8 451,33		8 451,33	10 141,59		10 141,59
2 030,00		2 030,00	2 436,00		2 436,00
6 421,33		6 421,33	7 705,59		7 705,59
116 727,86		116 727,86	140 073,43		140 073,43
108 758,36		108 758,36	130 510,03		130 510,03
2 502,91		2 502,91	3 003,50		3 003,50
1 396,50		1 396,50	1 675,80		1 675,80
1 026,00		1 026,00	1 231,20		1 231,20
1 026,00		1 026,00	1 231,20		1 231,20
1 026,00		1 026,00	1 231,20		1 231,20
992,09		992,09	1 190,50		1 190,50
481 030,97	127,20	480 903,77	578 209,54	152,64	578 056,90
16 130,00		16 130,00	19 356,00		19 356,00
16 130,00		16 130,00	19 356,00		19 356,00
2 924,16		2 924,16	3 508,99		3 508,99
2 924,16		2 924,16	3 508,99		3 508,99
483,40		483,40	580,08		580,08
483,40		483,40	580,08		580,08
106 921,53		106 921,53	129 278,21		129 278,21
3 000,38		3 000,38	3 000,38		3 000,38
4 486,38		4 486,38	4 486,38		4 486,38
5 318,90	-	5 318,90	5 318,90		5 318,90
3 567,13		3 567,13	3 567,13		3 567,13
2 081,31		2 081,31	2 081,31		2 081,31
_ 00_,01					
31 783,67		31 783,67	31 783,67	Į.	31 783,67

1 508,76		61 508,76	61 508,76		61 508,76
6 477,03		16 477,03	16 477,03		16 477,03
683,48		683,48	-21 673,20		-21 673,20
382,18		382,18	318,48		318,48
382,18		382,18	318,48		318,48
1 445,76		1 445,76	1 204,80		1 204,80
1 445,76		1 445,76	1 204,80		1 204,80
1 445,76		1 445,76	1 204,80		1 204,80
1 445,76		1 445,76	1 204,80		1 204,80
2 138,52		2 138,52	1 782,10		1 782,10
2 138,52		2 138,52	1 782,10		1 782,10
2 138,52		2 138,52	1 782,10		1 782,10
2 138,52		2 138,52	1 782,10		1 782,10
8 584,00		88 584,00	73 820,00		73 820,00
8 584,00		88 584,00	73 820,00		73 820,00
1 608,00		31 608,00	26 340,00		26 340,00
1 608,00		31 608,00	26 340,00		26 340,00
1 433,00		21 433,00	21 433,00		21 433,00
1 433,00		21 433,00	21 433,00		21 433,00
4 005,08		274 005,08	224 765,40		224 765,40
9 303,60		99 303,60	82 753,00		82 753,00
5 816,44		135 816,44	109 608,20		109 608,20
8 885,04		38 885,04	32 404,20		32 404,20
2 152,80		2 152,80	1 794,00		1 794,00
2 152,80		2 152,80	1 794,00		1 794,00
	152,64	152,64	2731,00	127,20	127,20
	-				127,20
1	152.64	152.64		127.20	12/.20
8 417,05	152,64 904 700,48	152,64 3 653 117,53	2 295 329,46	127,20 751 949,21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8 417,05 2 793,24	152,64 904 700,48 798 782,68	3 653 117,53	2 295 329,46 1 889 570,83	751 949,21 663 684,38	3 047 278,67
8 417,05 2 793,24 7 791,19	904 700,48		2 295 329,46 1 889 570,83 6 492,66	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21
2 793,24	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92	1 889 570,83	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66
2 793,24 7 791,19	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19	1 889 570,83 6 492,66	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66
2 793,24 7 791,19 7 791,19	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48	751 949,21	3 047 278,65 2 553 255,25 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,27 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,27
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,22 73 853,33
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,27 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,27 73 853,37 3 951,09
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,32 3 951,09 232,87
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,23 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,23 73 853,33 3 951,09 232,83 22 011,50 180 000,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,22 73 853,33 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 19 530,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00	751 949,21	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,32 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00	751 949,21	3 047 278,6; 2 553 255,2; 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,2; 73 853,3; 3 951,09 232,8; 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00	904 700,48 798 782,68	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00	1 889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00	751 949,21	3 047 278,6; 2 553 255,2; 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,56 4 210,2; 73 853,3; 3 951,09 232,8; 22 011,56 180 000,06 79 000,06 19 530,06 10 300,06 6 672,06 6 672,06
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00 6 672,00	904 700,48	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00	751 949,21 663 684,38	3 047 278,6: 2 553 255,2: 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,2: 73 853,3: 3 951,00 232,8: 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 311 911,23
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00 6 672,00 9 066,13	904 700,48 798 782,68	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 373 221,95	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 208 448,05 5 357,64	751 949,21 663 684,38	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,22 73 853,32 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 6 672,00 6 672,00 311 911,23
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00 6 672,00 9 066,13 5 357,64	904 700,48 798 782,68	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 373 221,95 5 357,64	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 208 448,05	751 949,21 663 684,38	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 6 672,00 6 672,00 311 911,23 5 357,64
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00 6 672,00 9 066,13 5 357,64 1 841,14	904 700,48 798 782,68	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 373 221,95 5 357,64 31 841,14	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 208 448,05 5 357,64 26 534,28	751 949,21 663 684,38	3 047 278,67 2 553 255,21 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 311 911,23 5 357,64 26 534,28 44 419,25
2 793,24 7 791,19 7 791,19 7 815,77 2 505,00 5 052,25 8 623,97 8 975,31 4 185,44 8 473,80 0 000,00 9 000,00 1 170,00 9 530,00 0 300,00 6 672,00 6 672,00 9 066,13 5 357,64 1 841,14 3 303,10	904 700,48 798 782,68	3 653 117,53 3 061 575,92 7 791,19 7 791,19 167 815,77 22 505,00 5 052,25 88 623,97 18 975,31 4 185,44 28 473,80 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 5 373 221,95 5 357,64 31 841,14 53 303,10	1889 570,83 6 492,66 6 492,66 109 846,48 5 587,50 4 210,21 73 853,31 3 951,09 232,87 22 011,50 180 000,00 79 000,00 71 170,00 19 530,00 10 300,00 6 672,00 6 672,00 208 448,05 5 357,64 26 534,28 44 419,25	751 949,21 663 684,38	3 047 278,67 2 553 255,21

	124 155,82	124 155,82		103 463,18	103 463,1
1 189 261,27	544 793,77	1 734 055,04	939 695,74	448 500,83	1 388 196,5
23 714,53		23 714,53	23 714,53		23 714,5
69 912,11		69 912,11	58 260,09		58 260,0
42 419,62		42 419,62	27 110,52		27 110,
100 945,38		100 945,38	82 795,31		82 795,3
67 428,43		67 428,43	42 929,32		42 929,
77 156,09		77 156,09	52 964,56		52 964,
348 816,97		348 816,97	282 335,20		282 335,
151 324,19		151 324,19	126 103,49		126 103,
34 019,01		34 019,01	27 237,18		27 237,
189 272,52		189 272,52	146 035,19		146 035,
22 510,77		22 510,77	18 758,97		18 758,
44 483,77		44 483,77	37 069,81		37 069,
17 257,88		17 257,88	14 381,57		14 381,
17 237,00	188 819,04	188 819,04	11301,57	157 349,20	157 349,
	17 414,28	17 414,28		14 511,90	14 511,
	39 394,84	39 394,84		32 829,03	32 829,
	17 184,00	17 184,00		14 320,00	14 320,
	132 976,32	132 976,32		107 287,47	107 287,
	74 345,05	74 345,05		61 612,72	61 612,
70.516.33	74 660,24	74 660,24	F0 7C2 F2	60 590,51	60 590,
70 516,22		70 516,22	58 763,52		<i>58 763,</i>
70 516,22	21.172.77	70 516,22	58 763,52	24 472 77	58 763,
313 719,38	21 156,77	334 876,15	313 719,38	21 156,77	334 876,
49 435,00		49 435,00	49 435,00		49 435,
79 566,21		79 566,21	79 566,21		79 566,
64 493,08		64 493,08	64 493,08		64 493,
50 073,66		50 073,66	50 073,66		50 073,
70 151,43		70 151,43	70 151,43		70 151,
	21 156,77	21 156,77		21 156,77	21 156,
	78 483,58	78 483,58		65 402,98	65 402,
	25 207,44	25 207,44		21 006,20	21 006,
	13 992,10	13 992,10		11 660,08	11 660,
	39 284,04	39 284,04		32 736,70	32 736,
77 951,28	30 192,74	108 144,02	65 933,00	25 160,62	91 093,
5 841,62		5 841,62	5 841,62		5 841,
33 296,45		33 296,45	27 747,04		27 747,
38 813,21		38 813,21	32 344,34		32 344,
	30 192,74	30 192,74		25 160,62	25 160,
191 507,36	62 802,64	254 310,00	159 589,47	52 335,52	211 924,
117 231,52		117 231,52	97 692,93		97 692,
67 609,34		67 609,34	56 341,11		56 341,
27 098,08		27 098,08	22 581,73		22 581,
7 715,33		7 715,33	6 429,44		6 429,
5 636,22		5 636,22	4 696,85		4 696,
9 172,55		9 172,55	7 643,80		7 643,
74 275,84	62 802,64	137 078,48	61 896,54	52 225 52	114 232,
54 122,92	02 802,04	54 122,92	45 102,44	52 335,52	45 102,
20 152,92	35 731,52	20 152,92 35 731,52	16 794,10	29 776,26	16 794, 29 776,

7 834,51		7 834,51	6 528,76		6 528,76
7 834,51		7 834,51	6 528,76		6 528,76
3 917,26		3 917,26	3 917,26		3 917,26
3 917,25		3 917,25	2 611,50		2 611,50
38 327,15		38 327,15	31 939,29		31 939,29
4 525,84		4 525,84	3 771,53		3 771,53
4 525,84		4 525,84	4 525,84		4 525,84
-			-754,31		-754,31
10 275,29		10 275,29	8 562,74		8 562,74
9 025,54		9 025,54	9 025,54		9 025,54
			-1 504,26		-1 504,26
1 249,75		1 249,75	1 041,46		1 041,46
5 069,73		5 069,73	4 224,78		4 224,78
5 069,73		5 069,73	5 069,73		5 069,73
-			-844,95		-844,95
9 404,61		9 404,61	7 837,18		7 837,18
9 404,61		9 404,61	9 404,61		9 404,61
,,,			-1 567,43		-1 567,43
4 525,84		4 525,84	3 771,53		3 771,53
4 525,84		4 525,84	4 525,84		4 525,84
			-754,31		-754,31
4 525,84		4 525,84	3 771,53		3 771,53
4 525,84		4 525,84	4 525,84		4 525,84
			-754,31		-754,31
228 465,10	36 589,67	265 054,77	191 459,70	30 491,40	221 951,10
2,26		2,26	1,88		1,88
2,26		2,26	1,88		1,88
18,71		18,71	15,59		15,59
18,71					
18,71 11,29		18,71	15,59 9,41		15,59
			15,59 9,41		15,59 9,41
11,29		18,71 11,29 11,29	15,59 9,41 9,41		15,59 9,41 9,41
11,29 11,29		18,71 11,29	15,59 9,41		15,59 9,41 9,41 633,01
11,29 11,29 759,61		18,71 11,29 11,29 759,61	15,59 9,41 9,41 633,01		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36
11,29 11,29 759,61 752,83		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,69 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,69 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6237,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78		15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,35 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,33 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45		15,55 9,41 9,4: 633,01 627,36 5,6: 5 234,55 5 198,16 36,3: 3 158,78 3 136,8: 21,96 3 554,78 2 112,1: 1 442,66 21 836,45
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6287,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73 2534,54 1731,19 26203,74 15569,37	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6287,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73 2534,54 1731,19 26203,74 15569,37 10634,37		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6281,46 6237,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73 2534,54 1731,19 26203,74 15569,37 10634,37	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,46 8 861,97
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23		15,55 9,41 9,4: 633,01 627,36 5,6: 5 234,55 5 198,16 36,3: 3 158,78 3 136,8: 21,9: 3 554,78 2 112,12 1 442,6: 21 836,45 12 974,48 8 861,9: 25 391,23
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6281,46 6237,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73 2534,54 1731,19 26203,74 15569,37 10634,37 30469,47 18103,91		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47 18 103,91	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23 15 086,59		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,33 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23 15 086,55
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47 18 103,91 4 721,30		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47 18 103,91 4 721,30	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23 15 086,59 3 934,43		15,55 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23 15 086,59 3 934,43
11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6281,46 6281,46 6237,79 43,67 3790,53 3764,18 26,35 4265,73 2534,54 1731,19 26203,74 15569,37 10634,37 30469,47 18103,91		18,71 11,29 11,29 759,61 752,83 6,78 6 281,46 6 237,79 43,67 3 790,53 3 764,18 26,35 4 265,73 2 534,54 1 731,19 26 203,74 15 569,37 10 634,37 30 469,47 18 103,91	15,59 9,41 9,41 633,01 627,36 5,65 5 234,55 5 198,16 36,39 3 158,78 3 136,82 21,96 3 554,78 2 112,12 1 442,66 21 836,45 12 974,48 8 861,97 25 391,23 15 086,59		15,59

3 873,60		3 873,60	3 228,00		3 228,00
485,28		485,28	404,40		404,40
-165,60		-165,60	-138,00		-138,00
19 504,66		19 504,66	16 253,88		16 253,88
2 688,00		2 688,00	2 240,00		2 240,00
2 457,60		2 457,60	2 048,00		2 048,00
4 070,40		4 070,40	3 392,00		3 392,00
2 688,00		2 688,00	2 240,00		2 240,00
3 225,60		3 225,60	2 688,00		2 688,00
4 070,40		4 070,40	3 392,00		3 392,00
304,66		304,66	253,88		253,88
2 306,88		2 306,88	1 922,40		1 922,40
1 384,13		1 384,13	1 153,44		1 153,44
922,75		922,75	768,96		768,96
2 274,00		2 274,00	1 895,00		1 895,00
2 274,00		2 274,00	1 895,00		1 895,00
2 175,29		2 175,29	1 812,74		1 812,74
2 175,29		2 175,29	1 812,74		1 812,74
14 961,52		14 961,52	12 467,94		12 467,94
14 961,52		14 961,52	12 467,94		12 467,94
13 980,63		13 980,63	11 650,53		11 650,53
7 542,80		7 542,80	6 285,67		6 285,67
6 437,83		6 437,83	5 364,86		5 364,86
195,97		195,97	163,30		163,30
195,97		195,97	163,30		163,30
1 086,68		1 086,68	905,56		905,56
-1 086,68		-1 086,68	-905,56		-905,56
53 291,77	17 808,34	71 100,11	44 409,82	14 840,29	59 250,11
5 457,07		5 457,07	4 547,57		4 547,57
10 866,73		10 866,73	9 055,61		9 055,61
5 524,61		5 524,61	4 603,84		4 603,84
9 310,39		9 310,39	7 758,65		7 758,65
5 502,56		5 502,56	4 585,47		4 585,47
2 646,02		2 646,02	2 205,02		2 205,02
6 959,15		6 959,15	5 799,29		5 799,29
5 229,13		5 229,13	4 357,61		4 357,61
909,06		909,06	757,55		757,55
887,05		887,05	739,21		739,21
	7 980,00	7 980,00		6 650,00	6 650,00
	1 800,98	1 800,98		1 500,82	1 500,82
	4 435,15	4 435,15		3 695,96	3 695,96
	1 777,31	1 777,31		1 481,09	1 481,09
	1 814,90	1 814,90		1 512,42	1 512,42
1 483,75	14 513,60	15 997,35	1 236,45	12 094,67	13 331,12
1 483,75		1 483,75	1 236,45		1 236,45
8 023,60		8 023,60	6 686,34		6 686,34
-8 023,60		-8 023,60	-6 686,34		-6 686,34
	14 513,60	14 513,60		12 094,67	12 094,67
3 516,24		3 516,24	2 930,20		2 930,20
1 546,27		1 546,27	1 288,56		1 288,56
910,73		910,73	758,94		758,94
-5 973,24		-5 973,24	-4 977,70		-4 977,70

	855,4
	800,8
	1 000,0
	163,8
	-2 820,0
	1 419,6
	655,2
	109,2
	-2 184,0
	1 281,2
	229,3
+	-1 510,6
+	
+	2 457,0
	997,3
+	158,3
	-3 612,7
	1 983,8
	1 383,2
	273,0
	-3 640,0
	4 420,0
	2 540,0
+	940,0
	940,0
+	378,0
+	378,0
+	378,0
	378,0
	16 376,7
	5 686,4
	9 004,5
	1 685,7
+	7 620,8
	7 620,8
+	4 144,0
+	4 144,0
14	3 556,4
44	3 556,4
_	21 679,3
_	15 921,7
	743,8
	672,4
	7 948,3
+	3 472,2
+	3 084,8
91	5 757,5
, <u> </u>	319,6
27	295,2
92	931,9
	931,5

411,30		411,30		342,75	342,75
2 595,14		2 595,14		2 162,62	2 162,62
1 730,68		1 730,68		1 442,23	1 442,23
150 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00
150 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00
75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00
37 500,00		37 500,00		37 500,00	37 500,00
37 500,00		37 500,00		37 500,00	37 500,00
24 114,01	258 071,92	282 185,93	219 005,33	20 656,21	239 661,54
23 751,75	246 890,03	270 641,78	207 903,44	20 293,95	228 197,39
	801,60	801,60	668,00		668,00
	801,60	801,60	668,00		668,00
	28 227,21	28 227,21	23 522,67		23 522,67
	4 968,00	4 968,00	4 968,00		4 968,00
	4 968,00	4 968,00	4 140,00		4 140,00
			-828,00	<u> </u>	-828,00
	4 968,00	4 968,00	4 140,00		4 140,00
	-5 961,60	-5 961,60	-4 968,00		-4 968,00
	1 987,20	1 987,20	1 656,00		1 656,00
	1 987,20	1 987,20	1 656,00		1 656,00
	4 403,21	4 403,21	3 669,34		3 669,34
	1 987,20	1 987,20	1 656,00		1 656,00

1 987,20	1 987,20	1 656,00	1 656,00
-1 016,00	-1 016,00	-846,67	-846,67
1 987,20	1 987,20	1 656,00	1 656,00
1 987,20	1 987,20	1 656,00	1 656,00
1 987,20	1 987,20	1 656,00	1 656,00
1 987,20	1 987,20	1 656,00	1 656,00
218,06	218,06	181,72	181,72
545,16	545,16	454,30	454,30
-327,10	-327,10	-272,58	-272,58
1 779,72	1 779,72	1 483,10	1 483,10
83,16	83,16	69,30	69,30
95,40	95,40	79,50	79,50
-118,20	-118,20	-98,50	-98,50
137,76	137,76	114,80	114,80
21,60	21,60	18,00	18,00
32,40	32,40	27,00	27,00
-6,00	-6,00	-5,00	-5,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
· ·			
54,00 54,00	54,00 54,00	45,00 45,00	45,00 45,00
54,00 54,00	54,00 54,00	45,00 45,00	45,00 45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
-			
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
54,00	54,00	45,00	45,00
-32,40	-32,40	-27,00	-27,00
146,40	146,40	146,40	146,40
146,40	146,40	146,40	146,40
96,00	96,00	80,00	80,00
96,00	96,00	80,00	80,00
401,50	401,50	365,00	365,00

365,0	365,00	401,50	401,50
340,00	340,00	408,00	408,00
340,0	340,00	408,00	408,00
165,20	165,20	198,24	198,24
165,2	165,20	198,24	198,24
176,28	176,28	211,54	211,54
40,0	40,00	48,00	48,00
38,5	38,50	46,20	46,20
97,7	97,78	117,34	117,34
120,00	120,00	120,00	120,00
120,0	120,00	120,00	120,00
360,00	360,00	432,00	432,00
360,0	360,00	432,00	432,00
41,32	41,32	49,58	49,58
83,0	83,09	99,71	99,71
83,0	83,09	99,70	99,70
-83,0	-83,09	-99,70	-99,70
-41,7	-41,77	-50,13	-50,13
532,00	532,00	638,40	638,40
532,0	532,00	638,40	638,40
50,00	50,00	50,00	50,00
	-		•
50,0	50,00	50,00	50,00
388,00	388,00	465,60	465,60
388,0	388,00	465,60	465,60
7 622,80	7 622,80	9 147,36	9 147,36
7 622,8	7 622,80	9 147,36	9 147,36
708,34	708,34	708,34	708,34
708,3	708,34	708,34	708,34
300,00	300,00	360,00	360,00
300,0	300,00	360,00	360,00
7,79	7,79	7,79	7,79
7,7	7,79	7,79	7,79
2 543,48	2 543,48	3 052,18	3 052,18
2 543,4	2 543,48	3 052,18	3 052,18
3 826,60	3 826,60	4 591,92	4 591,92
3 826,6	3 826,60	4 591,92	4 591,92
4 390,00	4 390,00	5 268,00	5 268,00
2 195,0	2 195,00	2 634,00	2 634,00
2 195,0	2 195,00	2 634,00	2 634,00
8 434,00	8 434,00	10 120,80	10 120,80
4 375,0	4 375,00	5 250,00	5 250,00
4 375,0	4 375,00	5 250,00	5 250,00
-4 375,0	-4 375,00	-5 250,00	-5 250,00
4 869,0	4 869,00	5 842,80	5 842,80
-810,0	-810,00	-972,00	-972,00
3 770,00	3 770,00	4 524,00	4 524,00
1 688,0	1 688,00	2 025,60	2 025,60
1 266,0	1 266,00	1 519,20	1 519,20
816,0	816,00	979,20	979,20
2 660,00	2 660,00	3 192,00	3 192,00
2 030,0	2 030,00	2 436,00	2 436,00
2 030,0	2 030,00	2 436,00	2 436,00

-1 680,00	-1 680,00	-1 400,00	-1 400,00
1 099,20	1 099,20	916,00	916,00
-1 099,20	-1 099,20	-916,00	-916,00
3 780,00	3 780,00	3 150,00	3 150,00
2 730,00	2 730,00	2 275,00	2 275,00
1 050,00	1 050,00	875,00	875,00
6 939,60	6 939,60	5 783,00	5 783,00
1 992,00	1 992,00	1 660,00	1 660,00
783,84	783,84	653,20	653,20
4 163,76	4 163,76	3 469,80	3 469,80
2 688,00	2 688,00	2 240,00	2 240,00
2 688,00	2 688,00	2 240,00	2 240,00
1 344,00	1 344,00	1 120,00	1 120,00
1 008,00	1 008,00	840,00	840,00
336,00	336,00	280,00	280,00
3 528,00	3 528,00	2 940,00	2 940,00
2 646,00	2 646,00	2 205,00	2 205,00
882,00	882,00	735,00	735,00
1 824,00	1 824,00	1 520,00	1 520,00
1 824,00	1 824,00	1 520,00	1 520,00
10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00
10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00
5 765,18	5 765,18	4 804,32	4 804,32
4 032,00	4 032,00	3 360,00	3 360,00
1 733,18	1 733,18	1 444,32	1 444,32
504,00	504,00	420,00	420,00
504,00	504,00	420,00	420,00
2 196,57	2 196,57	1 830,48	1 830,48
2 196,57	2 196,57	1 830,48	1 830,48
2 696,06	2 696,06	2 246,72	2 246,72
2 696,06	2 696,06	2 246,72	2 246,72
778,01	778,01	648,34	648,34
778,01	778,01	648,34	648,34
3 386,61	3 386,61	2 822,18	2 822,18
3 386,61	3 386,61	2 822,18	2 822,18
1 754,01	1 754,01	1 461,67	1 461,67
1 013,04	1 013,04	844,20	844,20
740,97	740,97	617,47	617,47
675,36	675,36	562,80	562,80
675,36	675,36	562,80	562,80
205,02	205,02	170,85	170,85
205,02	205,02	170,85	170,85
1 556,01	1 556,01	1 296,68	1 296,68
1 556,01	1 556,01	1 296,68	1 296,68
3 173,04	3 173,04	2 644,20	2 644,20
3 173,04	3 173,04	2 644,20	2 644,20
545,40	545,40	454,50	454,50
545,40	545,40	454,50	454,50
2 666,40	2 666,40	2 222,00	2 222,00
2 666,40	2 666,40	2 222,00	2 222,00
2 583,62	2 583,62	2 153,02	2 153,02
549,18	549,18	457,65	457,65

351,26		351,26	292,72		292,72
1 683,18		1 683,18	1 402,65		1 402,65
1 710,34		1 710,34	1 425,28		1 425,28
1 710,34		1 710,34	1 425,28		1 425,28
2 352,00		2 352,00	1 960,00		1 960,00
2 352,00		2 352,00	1 960,00		1 960,00
70,56		70,56	58,80		58,80
70,56		70,56	58,80		58,80
4 839,54		4 839,54	4 032,95		4 032,95
4 839,54		4 839,54	4 032,95		4 032,95
1 835,09		1 835,09	1 529,24		1 529,24
1 835,09		1 835,09	1 529,24		1 529,24
2 287,49		2 287,49	1 906,24		1 906,24
2 287,49		2 287,49	1 906,24		1 906,24
349,10		349,10	290,92		290,92
349,10		349,10	290,92		290,92
2 279,79		2 279,79	1 899,83		1 899,83
911,92		911,92	759,93		759,93
1 367,87		1 367,87	1 139,90		1 139,90
1 898,78		1 898,78	1 582,32		1 582,32
1 898,78		1 898,78	1 582,32		1 582,32
2 671,99		2 671,99	2 226,66		2 226,66
2 671,99		2 671,99	2 226,66		2 226,66
4 897,54		4 897,54	4 081,28		4 081,28
2 610,72		2 610,72	2 175,60		2 175,60
1 150,80		1 150,80	959,00		959,00
1 136,02		1 136,02	946,68		946,68
841,46		841,46	701,22		701,22
841,46		841,46	701,22		701,22
1 517,37		1 517,37	1 264,48		1 264,48
1 517,37		1 517,37	1 264,48		1 264,48
1 185,46	3 061,26	4 246,72	987,88	2 551,05	3 538,93
1 185,46		1 185,46	987,88		987,88
	2 752,42	2 752,42		2 293,68	2 293,68
	308,84	308,84		257,37	257,37
2 389,29		2 389,29	1 991,08		1 991,08
2 389,29		2 389,29	1 991,08		1 991,08
1 353,60		1 353,60	1 128,00		1 128,00
1 353,60		1 353,60	1 128,00		1 128,00
1 048,32		1 048,32	873,60		873,60
1 048,32		1 048,32	873,60		873,60
725,09		725,09	604,24		604,24
725,09		725,09	604,24		604,24
1 734,10		1 734,10	1 445,08		1 445,08
1 734,10		1 734,10	1 445,08		1 445,08
1 747,20		1 747,20	1 456,00		1 456,00
1 747,20		1 747,20	1 456,00		1 456,00
646,90		646,90	553,30		553,30
468,00		468,00	390,00		390,00
936,00		936,00	780,00		780,00
213,25		213,25	213,25		213,25
-970,35		-970,35	-829,95		-829,95

68,00		68,00	81,60		81,60
170,00		170,00	204,00		204,00
-102,00		-102,00	-122,40		-122,40
7 988,00		7 988,00	9 585,60		9 585,60
2 006,00		2 006,00	2 407,20		2 407,20
2 004,00		2 004,00	2 404,80		2 404,80
2 004,00		2 004,00	2 404,80		2 404,80
1 974,00		1 974,00	2 368,80		2 368,80
24 040,80		24 040,80	28 848,96		28 848,96
2 400,00		2 400,00	2 880,00		2 880,00
2 404,80		2 404,80	2 885,76		2 885,76
4 773,60		4 773,60	5 728,32		5 728,32
4 814,40		4 814,40	5 777,28		5 777,28
4 824,00		4 824,00	5 788,80		5 788,80
4 824,00		4 824,00	5 788,80		5 788,80
666,60	666,60	7.5	799,92	799,92	
666,60	666,60		799,92	799,92	
4 669,50	000,00	4 669,50	5 603,40	100,02	5 603,40
1 545,00		1 545,00	1 854,00		1 854,00
1 548,00		1 548,00	1 857,60		1 857,60
1 576,50		1 576,50	1 891,80		1 891,80
627,60		627,60	753,12		753,12
627,60		627,60	753,12		753,12
1 451,12		1 451,12	1 741,34		1 741,34
1 451,12		1 451,12	1 741,34		1 741,34
6 238,20		6 238,20	7 485,84		7 485,84
13 808,50		13 808,50	16 570,20		16 570,20
-8 285,10		-8 285,10	-9 942,12		-9 942,12
714,80		714,80	857,76		857,76
1 686,00		1 686,00	2 023,20		2 023,20
4 215,00		4 215,00	5 058,00		5 058,00
-2 529,00		-2 529,00	-3 034,80		-3 034,80
448,52	30,52	418,00	538,22	36,62	501,60
467,32	30,02	467,32	560,79	55,62	560,79
-49,32		-49,32	-59,19		-59,19
30,52	30,52	.0,02	36,62	36,62	55,25
7 495,34	-37,66	7 533,00	8 994,40	-45,20	9 039,60
7 533,00	07,00	7 533,00	9 039,60	.5,20	9 039,60
-37,66	-37,66	7 333,00	-45,20	-45,20	3 003,00
149,70	-0,30	150,00	179,64	-0,36	180,00
150,00	0,50	150,00	180,00	0,50	180,00
-0,30	-0,30	130,00	-0,36	-0,36	100,00
50,15	0,15	50,00	60,18	0,18	60,00
50,00	0,13	50,00	60,00	0,10	60,00
0,15	0,15	30,00	0,18	0,18	00,00
60,05	10,05	50,00	72,06	12,06	60,00
50,00	10,03	50,00	60,00	12,00	60,00
10,05	10,05	30,00	12,06	12,06	00,00
60,05	10,05	50,00	72,06	12,06	60,00
50,03	10,03	50,00	60,00	12,00	60,00
10,05	10,05	30,00	12,06	12,06	00,00
10,05	10,03	589,60	12,00	12,00	

	542,16 528,53	542,16 528,53		451,80 440,44	451,80 440,44
	542,16	542,16		451,80	451,80
	722,88 542.16	722,88 542.16		602,40	602,40 451.80
	722,88				602,40
		722,88		602,40	
	5 783,04 5 783,04	5 783,04 5 783,04		4 819,20	4 819,20 4 819,20
	50,40 5 783,04	50,40		42,00 4 819,20	42,00 4 819,20
	50,40	50,40		42,00	42,00
	853,44	853,44		711,20	711,20
	853,44	853,44		711,20	711,20
	430,08	430,08		358,40	358,40
	430,08	430,08		358,40	358,40
754,27	430.00	754,27	628,56	350.40	628,56
754,27		754,27	628,56		628,56
288,96		288,96	240,80		240,80
144,48		144,48	120,40		120,40
433,44		433,44	361,20		361,20
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
1 733,76		1 733,76	1 444,80		1 444,80
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
144,48		144,48	120,40		120,40
1 733,76		1 733,76	1 444,80		1 444,80
144,48		144,48	120,40		120,40
1 760,00 144,48		1 760,00 144,48	1 600,00 120,40		1 600,00 120,40
1 760,00		542,40 1 760,00	452,00 1 600,00		452,00 1 600,00
542.401		-	-		452,00
542,40 542,40		542.40			
144,48 542,40 542,40		144,48 542,40	120,40 452,00		120,40

	528,53	528,53	I	440,44	440,44
	288,29	288,29		240,24	240,24
	288,29	288,29		240,24	240,24
	799,13	799,13		665,94	665,94
	799,13	799,13		665,94	665,94
	266,38	266,38		221,98	221,98
	266,38	266,38		221,98	221,98
	385,54	385,54		321,28	321,28
	385,54	385,54		321,28	321,28
	1 542,14	1 542,14		1 285,12	1 285,12
	1 542,14	1 542,14		1 285,12	1 285,12
	696,69	696,69		580,58	580,58
	696,69	696,69		580,58	580,58
	1 129,13	1 129,13		940,94	940,94
	1 129,13	1 129,13		940,94	940,94
	7,20	7,20		7,20	7,20
	7,20	7,20		7,20	7,20
	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
	410,86	410,86		342,38	342,38
	410,86	410,86		342,38	342,38
	339,02	339,02		282,52	282,52
	339,02	339,02		282,52	282,52
	2 102,61	2 102,61		1 752,18	1 752,18
	1 162,37	1 162,37		968,64	968,64
	940,24	940,24		783,54	783,54
	12,87	12,87		12,87	12,87
	4,29	4,29		4,29	4,29
	4,29	4,29		4,29	4,29
	4,29	4,29		4,29	4,29
	1 184,82	1 184,82		1 184,82	1 184,82
	390,00	390,00		390,00	390,00
	398,58	398,58		398,58	398,58
	396,24	396,24		396,24	396,24
5 528,99	362,26	5 891,25	5 448,99	362,26	5 811,25
55,10		55,10	55,10		55,10
55,00		55,00	55,00		55,00
-55,00		-55,00	-55,00		-55,00
55,10		55,10	55,10		55,10
2 127,39		2 127,39	2 127,39		2 127,39
125,60		125,60	125,60		125,60
206,23		206,23	206,23		206,23
368,30		368,30	368,30		368,30
1 427,26		1 427,26	1 427,26		1 427,26
519,92		519,92	519,92		519,92
7,02		7,02	7,02		7,02
181,19		181,19	181,19		181,19
331,71		331,71	331,71		331,71
252,42		252,42	252,42		252,42
78,97		78,97	78,97		78,97
38,23		38,23	38,23		38,23
85,30		85,30	85,30		85,30

69 558,70		69 558,70	63 235,18		63 235,18
69 558,70		69 558,70	63 235,18		63 235,18
175 176,44		175 176,44	159 251,31		159 251,31
175 176,44		175 176,44	159 251,31		159 251,31
175 176,44		175 176,44	159 251,31		159 251,31
	110 020,20	110 020,20		91 683,50	91 683,50
	110 020,20	110 020,20		91 683,50	91 683,50
55 737,47		55 737,47	46 447,89		46 447,89
55 737,47		55 737,47	46 447,89		46 447,89
55 737,47	110 020,20	165 757,67	46 447,89	91 683,50	138 131,39
	1 625 298,60	1 625 298,60		1 354 415,50	1 354 415,50
	1 625 298,60	1 625 298,60		1 354 415,50	1 354 415,50
226 486,32		226 486,32	188 738,60		188 738,60
226 486,32		226 486,32	188 738,60		188 738,60
226 486,32	1 625 298,60	1 851 784,92	188 738,60	1 354 415,50	1 543 154,10
607 751,35	1 941 697,44	2 549 448,79	525 000,00	1 618 081,20	2 143 081,20
17 307 476,57	2 028 955,31	19 336 431,88	15 417 123,36	1 704 851,00	17 121 974,36
513,00		513,00	513,00		513,00
513,00		513,00	513,00		513,00
-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
5 139,90		5 139,90	5 139,90		5 139,90
5 139,90		5 139,90	5 139,90		5 139,90
5 652,90		5 652,90	5 652,90		5 652,90
	55,20	55,20		55,20	55,20
	52,25	52,25		52,25	52,2
	224,06	224,06		224,06	224,06
	30,75	30,75		30,75	30,75
	362,26	362,26		362,26	362,26
19,13		19,13	19,13		19,13
40,33		40,33	40,33		40,33
-3,76		-3,76	-3,76		-3,70
10,28		10,28	10,28		10,28
170,24		170,24	170,24		170,24
236,22		236,22	236,22		236,22
			-40,00		-40,00
571,42		571,42	571,42		571,42
571,42		571,42	531,42		531,42
			-40,00		-40,00
571,42		571,42	571,42		571,42
571,42		571,42	531,42		531,42
157,42		157,42	157,42		157,42
123,61		123,61	123,61		123,63
64,27		64,27	64,27		64,27
345,30		345,30	345,30		345,30
150,92		150,92	150,92		150,92
388,06		388,06	388,06		388,06
73,84		73,84	73,84		73,84
42,01		42,01	42,01		42,01
194,97		194,97	194,97		194,97
0.15,00		849,80	849,80		849,80
849,80					

69 558,70		69 558,70	63 235,18		63 235,1
78 801,25	206 378,64	285 179,89	65 667,71	171 982,20	237 649,9
78 801,25		78 801,25	65 667,71		65 667,72
78 801,25		78 801,25	65 667,71		65 667,7
	206 378,64	206 378,64		171 982,20	171 982,2
	206 378,64	206 378,64		171 982,20	171 982,2
1 991,17		1 991,17	1 659,31		1 659,3
1 991,17		1 991,17	1 659,31		1 659,3
1 991,17		1 991,17	1 659,31		1 659,3
16 604 530,00		16 604 530,00	14 799 699,83		14 799 699,8
5 775 549,00		5 775 549,00	5 775 549,00		5 775 549,0
5 775 549,00		5 775 549,00	5 775 549,00		5 775 549,00
2 216 718,00		2 216 718,00	2 216 718,00		2 216 718,0
842 119,00		842 119,00	842 119,00		842 119,0
2 716 712,00		2 716 712,00	2 716 712,00		2 716 712,0
10 828 981,00		10 828 981,00	9 024 150,83		9 024 150,8
10 828 981,00		10 828 981,00	9 024 150,83		9 024 150,8
6 585 613,00		6 585 613,00	5 488 010,83		5 488 010,8
2 529 193,00		2 529 193,00	2 107 660,83		2 107 660,8
1 714 175,00		1 714 175,00	1 428 479,17		1 428 479,1
95 195,22	87 257,87	182 453,09	92 423,53	86 769,80	179 193,3
37 746,10		37 746,10	37 746,10		37 746,1
37 746,10		37 746,10	37 746,10		37 746,10
37 746,10		37 746,10	37 746,10		37 746,1
9 138,53		9 138,53	9 138,53		9 138,5
-9 138,53		-9 138,53	-9 138,53		-9 138,5
22 286,68	2 928,43	25 215,11	19 514,99	2 440,36	21 955,3
1 806,50		1 806,50	1 806,50		1 806,50
1 806,50		1 806,50	1 806,50		1 806,5
16 630,18		16 630,18	13 858,49		13 858,49
1 212,19		1 212,19	1 010,16		1 010,1
1 212,19		1 212,19	1 010,16		1 010,1
869,62		869,62	724,68		724,6
1 212,19		1 212,19	1 010,16		1 010,1
1 212,19		1 212,19	1 010,16		1 010,1
2 685,95		2 685,95	2 238,29		2 238,2
592,43		592,43	493,69		493,6
1 212,19		1 212,19	1 010,16		1 010,1
1 693,02		1 693,02	1 410,85		1 410,8
3 636,58		3 636,58	3 030,48		3 030,4
1 091,64		1 091,64	909,70		909,7
-0,01		-0,01			
3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,00
3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,0
-3 850,00		-3 850,00	-3 850,00		-3 850,0
3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,0
	2 928,43	2 928,43		2 440,36	2 440,3
	2 928,43	2 928,43		2 440,36	2 440,3
	44 197,00	44 197,00		44 197,00	44 197,0
				24427.22	24427.0
	24 197,00	24 197,00		24 197,00	24 197,00
	24 197,00 24 197,00	24 197,00 24 197,00		24 197,00 24 197,00	24 197,0 0 24 197,0

	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
35 162,44	40 132,44	75 294,88	35 162,44	40 132,44	75 294,88
5,10		5,10	5,10		5,10
5,10		5,10	5,10		5,10
-5,10		-5,10	-5,10		-5,10
5,10		5,10	5,10		5,10
4 573,71		4 573,71	4 573,71		4 573,71
851,64		851,64	851,64		851,64
1 451,20		1 451,20	1 451,20		1 451,20
1 218,84		1 218,84	1 218,84		1 218,84
1 052,03		1 052,03	1 052,03		1 052,03
-4 573,71		-4 573,71	-4 573,71		-4 573,71
4 573,71		4 573,71	4 573,71		4 573,71
5 773,09		5 773,09	5 773,09		5 773,09
724,06		724,06	724,06		724,06
1 610,81		1 610,81	1 610,81		1 610,81
3 438,22		3 438,22	3 438,22		3 438,22
856,57		856,57	856,57		856,57
856,57		856,57	856,57		856,57
9 860,58		9 860,58	9 860,58		9 860,58
2 869,96		2 869,96	2 869,96		2 869,96
2 482,78		2 482,78	2 482,78		2 482,78
2 252,94		2 252,94	2 252,94		2 252,94
2 254,90		2 254,90	2 254,90		2 254,90
9 487,77		9 487,77	9 487,77		9 487,77
1 604,79		1 604,79	1 604,79		1 604,79
2 917,52		2 917,52	2 917,52		2 917,52
2 505,39		2 505,39	2 505,39		2 505,39
1 462,10		1 462,10	1 462,10		1 462,10
1 124,04		1 124,04	1 124,04		1 124,04
-1 124,04		-1 124,04	-1 124,04		-1 124,04
997,97		997,97	997,97		997,97
2 162,22		2 162,22	2 162,22		2 162,22
1 038,11		1 038,11	1 038,11		1 038,11
720,99		720,99	720,99		720,99
403,12		403,12	403,12		403,12
930,12		930,12	930,12		930,12
930,12		930,12	930,12		930,12
1 513,28		1 513,28	1 513,28		1 513,28
348,93		348,93	348,93		348,93
403,63		403,63	403,63		403,63
340,89		340,89	340,89		340,89
419,83		419,83	419,83		419,83
	40 132,44	40 132,44		40 132,44	40 132,44
	5 900,49	5 900,49		5 900,49	5 900,49
	10 355,24	10 355,24		10 355,24	10 355,24
	7 207,41	7 207,41		7 207,41	7 207,41
	16 669,30	16 669,30		16 669,30	16 669,30
1 471 674,00		1 471 674,00	120 000,00		120 000,00
120 000,00					120 000,00
120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
120 000,00		120 000,00 120 000,00	120 000,00		120 000,00

120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
1 351 674,00		1 351 674,00			
1 351 674,00		1 351 674,00			
1 030 039,00		1 030 039,00			
1 030 039,00		1 030 039,00			
321 635,00		321 635,00			
321 635,00		321 635,00			
2 220 000,00	6 600 000,00	8 820 000,00	2 220 000,00	6 600 000,00	8 820 000,00
2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00
2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00
2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	6 600 000,00	8 700 000,00
2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00
	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00	6 600 000,00
120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
8 213 331,90	5 603 330,54	13 816 662,44	8 454 278,86	5 472 562,02	13 926 840,88

CRFA 2024 Mérignac Marne

Annexe 7 Suivi clauses insertion

Marché	s	Montant marché (HT)	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprise
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 2	3 343 956,00	1 600,00	1 300,00	Eiffage route
LOT 2 Espaces verts Arrosage	TRAVAUX PHASE 2	571 568,00	300,00		Cap vert
LOT 3 Fontainerie	TRAVAUX PHASE 2	70 000,00	Sans objet	Sans objet	Sans objet
LOT 4 Bétons	TRAVAUX PHASE 2	551 931,00	200,00		Sols aquitaine

Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-Imc1110107-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025
