


ZAC Les Vergers du Tasta Bilan prévisionnel actualisé en € TTC

	BILAN INITIAL	(1) CRAC 2010	(2) CRAC 2011	(2-1) variat en %
	%	%	%	%

DEPENSES en € TTC

1- Etudes de définition et de suivi	296 536	1%	502 168	1%	557 964	1%	11.1%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 961 417	36%	14 911 076	27%	14 911 076	27%	0.0%
2.1- Acquisitions foncières	12 961 417		14 911 076		14 911 076		0.0%
- acquisition CUB	8 700 000		8 657 450		8 657 450		0.0%
- acquisition Commune							0.0%
- reste à acquérir	4 261 417		6 253 625		6 253 625		0.0%
2.2- Frais							
2.3- Libération des terrains							
3- Frais d'aménagement	21 135 743	59%	31 193 740	56%	30 838 086	56%	-1.1%
3.1- Etudes liées aux travaux	747 019		606 433		756 299		24.7%
3.2- Travaux et aléas	20 388 724		30 502 231		29 996 788		-1.7%
3.3- Honoraires							
3.4- Autres frais			85 076		85 000		-0.1%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	7 628 752	14%	7 628 752	14%	0.0%
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération			4 072 535		4 072 535		0.0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)							
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville			2 414 057		2 414 057		0.0%
4.4. participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33			1 142 160		1 142 160		
5- Honoraires concession		0%		0%		0%	
6- Frais de communication	1 341 680	0%	150 000	0%	150 000	0%	0.0%
7- Frais divers	1 175 331	4%	1 142 302	2%	1 234 941	2%	8.1%
7.1. Frais divers			228 031		237 427		4.1%
7.2. TVA encaissée/reversée	186 349		914 271		997 514		9.1%
TOTAL DEPENSES	35 735 376	100%	55 528 038	100%	55 320 819	100%	-0.4%


Evolution des dépenses

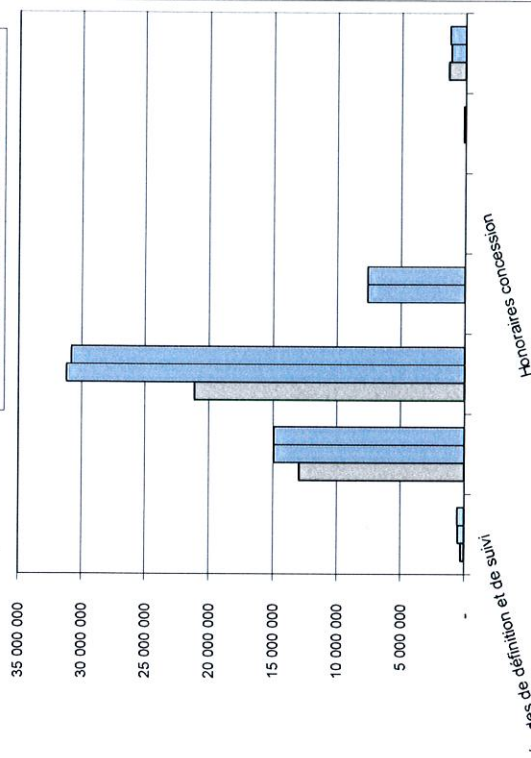

RECETTES en € TTC

1- Cessions	28 406 269	79%	44 049 409	89%	44 083 497	80%	0.1%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 408 012		4 651 174		4 667 181		0.3%
1-2. PLS	360 929		267 367		267 367		0.0%
1-3. Accession aidée	1 969 968		3 110 143		3 128 225		0.6%
1-4. Accession libre	14 347 183		22 519 940		22 519 940		0.0%
1-5. Commerces et services	4 559 069		3 121 537		3 121 537		0.0%
1-6. Programmes tertiaires			6 157 063		6 157 063		0.0%
1-7. Cessions diverses	761 109		4 222 185		4 222 184		0.0%
2- Participation des constructeurs							
3- Part. EPIG réalisés Améh.			820 000	1%	820 000	1%	0.0%
4- Subventions			2 414 057		3 556 217		47.3%
5- Participation communautaire :	7 066 484	20%	8 422 201	9%	6 856 566	12%	-18.6%
5-1. logement aidé (PLUS)	7 066 484		4 349 666		2 784 031		-36.0%
5-2. restructuration urbaine							
5-3. développement durable							
5-4. équipements scolaires			4 072 535		4 072 535		0.0%
5-5. maîtrise foncière							
6- Participation communale éventuelle							
6.1 maîtrise foncière							
7- Autres recettes diverses	262 623	1%	-177 628	1%	4 539	0%	-102.6%
TOTAL RECETTES	35 735 376	100%	55 528 038	100%	55 320 819	100%	-0.4%

Evolution des recettes


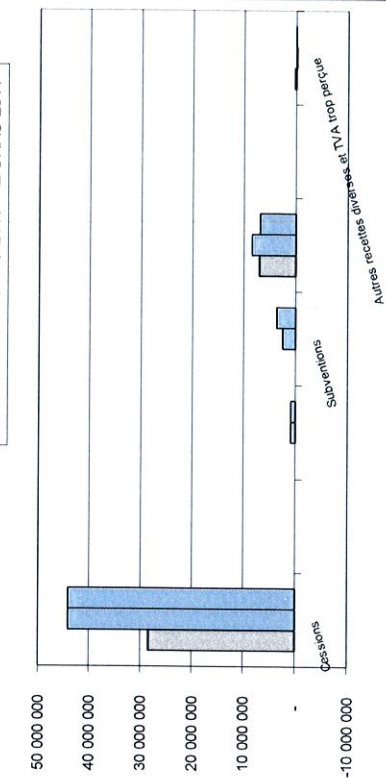


ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel : état d'avancement

	CRAC 2011 valeur recatée	%	Etat d'avancement			
			réalisé valeur	%	reste à réaliser valeur	%
DEPENSES en € TTC						
1- Études de définition et de suivi	557 964	1,0%	378 564	68%	179 400	32%
2- Frais d'acquisition/libération sols	14 911 076	27,0%	14 911 076	100%	-	0%
2.1- Acquisitions foncières	14 911 076	27,0%	14 911 076	100%	-	0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	8 657 450	-	8 657 450	100%	-	0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	-	-	-	-	-
- reste à acquérir	6 253 625	-	6 253 625	100%	-	0%
2.2- Frais	-	-	-	-	-	-
2.3- Libération des terrains	-	-	-	-	-	-
3- Frais d'aménagement	30 838 086	55,7%	20 747 834	67%	10 090 253	33%
3.1- Études liées aux travaux	756 299	-	569 962	75%	186 337	25%
3.2- Travaux et allées	29 996 788	-	20 111 966	67%	9 884 822	33%
3.3 - Honoraires	-	-	-	-	-	-
3.4.- Autres frais	85 000	-	65 906	78%	19 094	22%
4- Participation aux équipements publics	7 628 752	13,8%	7 628 752	100%	-	0%
4.1. Participation aux équipements	4 072 535	-	-	0%	4 072 535	100%
4.2 Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	4 072 535	-	-4 072 535	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	-	-	-
4.4 participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	2 414 057	-	2 414 057	100%	-	0%
4.5 sous maîtrise d'ouvrage CG 33	-	-	1 142 160	-	-	-
5- Honoraires concession	-	0,0%	-	-	1 142 160	-
6- Frais de communication	150 000	0,3%	-	0%	150 000	100%
7- Frais divers	1 234 941	2,2%	643 369	52%	591 573	48%
7.1. Frais divers	237 427	-	182 470	77%	54 957	23%
7.2.TVA encasée/reversée	997 514	-	460 898	46%	536 616	54%
TOTAL DEPENSES	55 320 819	100,0%	44 309 594	80%	11 011 225	20%

RECETTES en € TTC				
1- Cessions	44 083 497	79,7%	28 645 906	15 437 591 35%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 667 181	76%	3 525 391	1 141 790 24%
1-2. PLS	267 367	100%	267 368	-1 0%
1-3. Accession aidée	3 128 225	50%	1 555 796	1 572 429 50%
1-4. Accession libre	22 519 940	57%	12 818 364	9 701 576 43%
1-5. Commerces et services	3 121 537	100%	3 121 537	-0 0%
1-6. Programmes tertiaires	6 157 063	51%	3 135 268	3 021 795 49%
1-7. Cessions diverses	4 222 184	100%	4 222 184	-1 0%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	-
3- Part. EPG réalisés Amén.	820 000	1,5%	-	820 000 100%
4- Subventions	3 556 217	6,4%	3 556 218	-1 0%
5- Participation communautaire :	6 856 566	12,4%	2 784 031	4 072 535 59%
5-1. logement aidé (PLUS)	2 784 031	100%	2 784 032	-1 0%
5-2. restructuration urbaine	-	-	-	-
5-3. développement durable	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	4 072 535	0%	-	4 072 535 100%
5-5. maîtrise foncière	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses et TVA	4 539	100,0%	4 540	-1 0%
TOTAL RECETTES	55 320 819	100,0%	34 990 695	20 330 124 37%

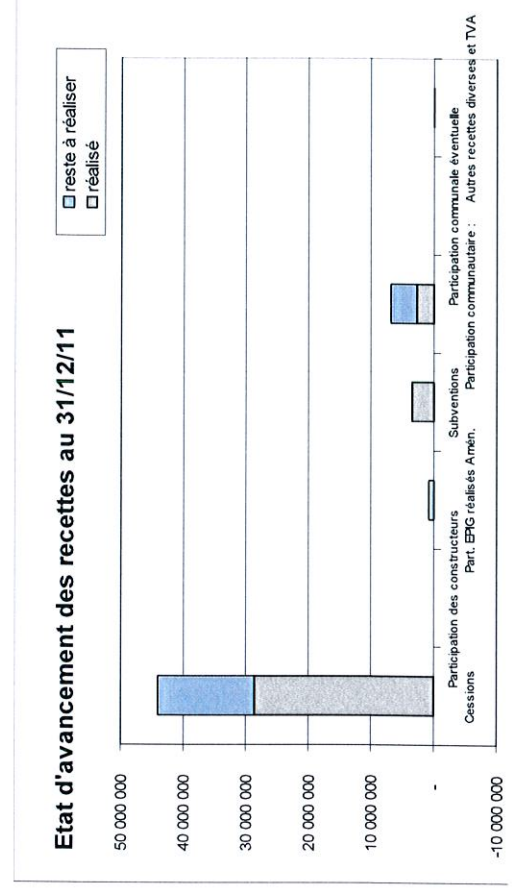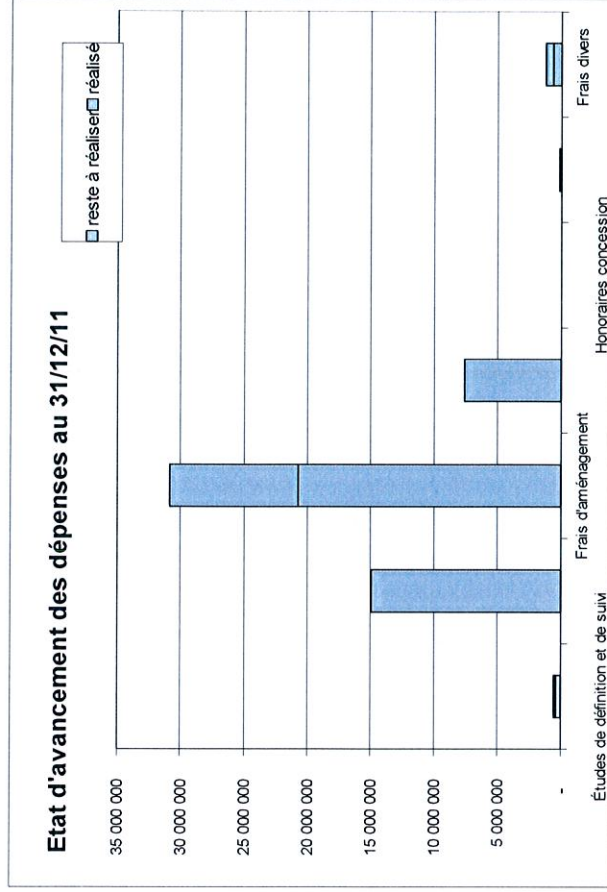

ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps en € TTC

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intérieur	TOTAL
	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur	valueur
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DEPENSES en € TTC													
1- Études de définition et de suivi	258 538	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13 388	2%	0%	79 400	557 944
2- Frais d'acquisition/libération sols	2 799 204	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81	0%	0%	0%	14 911 016
2.1- Acquisitions foncières	2 799 204	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81	0%	0%	0%	14 911 016
- acquisition CUB (valeur vénale)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81	0%	0%	0%	8 657 450
- acquisition Commune (valeur vénale)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.2- Frais		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.3- Libération des terrains		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3- Frais d'aménagement	785	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1- Études liées aux travaux	1 690 180	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30 838 088
3.2- Travaux et études	1 444 086	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	756 599
3.3 - Honoraires		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29 988 788
3.4- Autres frais		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4- Participation aux équipements publics	2 874 192	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85 000
4.1- Participation aux équipements		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.2- Participation aux équipements	2 574 192	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 628 752
4.3- Participation aux équipements		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.4- Participation aux équipements		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5- Honoraires concession		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6- Frais de communication	48 725	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150 000
7-1- Frais divers		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 254 441
7.2- TVA encasée/reversée	48 725	-5%	-13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	237 427
TOTAL DEPENSES	5 621 982	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	3 806 132	7%	0%	3 884 361	55 320 519
RECETTES en € TTC													
1- Cessions		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-1- Localité social (PLUS-PLAI)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-2- PLS		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-3- Accession aidée		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-4- Accession libre		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-5- Commerces et services		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1-7- Programmes locaux		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2- Participation des constructeurs		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3- Part. EPIC réalisés Amén.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4- Subventions		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5- Participation communautaire :		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5-1- logement aide (PLUS)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5-2- restructuration urbaine		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5-3- développement durable		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5-4- équipements scolaires		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5-5- équipements sportifs		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6- Participation communale éventuelle		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6-1- maître foncier		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7- Autres recettes diverses		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL RECETTES	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10 744 061	18 839 655	-	18 839 655	55 320 519

BILAN de la ZAC **CRAC 2011**

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	466 525	91 439	557 964	1- Cessions	37 978 572	6 104 924	44 083 497
2- frais d'acquisition et de libération des sols	14 911 076	-	14 911 076	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 423 868	243 313	4 667 181
2.1.- Acquisitions foncières	14 911 076	-	14 911 076	1-2. PLS	253 428	13 939	267 367
- acquisition CUB	8 657 450	-	8 657 450	1-3. Accession aidée	2 962 731	165 494	3 128 225
- acquisition Commune	-	-	-	1-4. Accession libre	18 839 328	3 680 612	22 519 940
- reste à acquérir (auprès de tiers)	6 253 625	-	6 253 625	1-5. Commerces et services	2 622 292	499 245	3 121 537
2.2.- Frais	-	-	-	1-6. Programmes tertiaires	5 148 046	1 009 017	6 157 063
2.3.- Libération des terrains	-	-	-	1-7. Cessions diverses	3 728 879	493 305	4 222 184
3 - Frais d'aménagement	25 784 353	5 053 733	30 838 086	2-Participation constructeurs	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	632 357	123 942	756 299	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %) dont FIC	820 000	-	820 000
3.2.- Travaux et aléas	25 080 926	4 915 862	29 996 788	4- Subventions	3 556 217	-	3 556 217
3.3.- Autres frais	71 070	13 930	85 000	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	6 856 566	-	6 856 566
4- Participation équip. publics	7 628 752	-	7 628 752	5-1. logement social	-	-	-
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération (a)	4 072 535	-	4 072 535	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	5-3. développement durable	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville (a)	2 414 057	-	2 414 057	5-4. équipements scolaires	4 072 535	-	4 072 535
4.4 participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160	-	1 142 160	5-5. maîtrise foncière (1)	2 784 031	-	2 784 031
5 - Honoraires concession	-	-	-	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication	125 418	24 582	150 000	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	228 031	914 271	1 234 941	7 - Autres recettes	4 539	-	4 539
frais divers	228 031	-	237 427				
TVA encaissée / reversée	-	914 271	997 514				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	49 144 155	8 084 025	55 320 519	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	49 215 694	6 104 924	55 320 519
- dont bilan aménageur	45 071 620	6 084 025	51 248 284	- dont bilan aménageur	45 143 359	6 104 924	51 248 284
- dont hors aménageur (= 4.1.)	4 072 535	-	4 072 535	- dont hors aménageur (= 5.4.)	4 072 535	-	4 072 535

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE CRAC 2011

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune (a) - acquisition de foncier à l'aménageur - équipements publics (hors groupe scolaire)	8 353 333 1 830 000 6 523 333	1 637 253 358 680 1 278 573	9 990 586 2 188 680 7 801 906	Participation de l'aménageur aux équipements communaux sous MOA Commune	2 414 057	-	2 414 057
Equipements scolaires sous MOA Commune(a)	4 072 535	798 217	4 870 752	Participation CUB équip. scolaires récupération de TVA	4 072 535	-	4 072 535
SOUS TOTAL D2'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	SOUS TOTAL R2'	6 486 592	-	6 486 592
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 486 592	-	6 486 592
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3							
				-8 374 746 € TTC			

(a) : dont provisions permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements scolaires et municipaux

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB **CRAC 2011**

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménagement							
Acquisitions foncières à la valeur historique	2 609 635	-	2 609 635	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	8 657 450	-	8 657 450
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	820 000	-	820 000				
Subventions	3 556 217		3 556 217				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	6 856 566	-	6 856 566				
- logement social	-	-	-				
- restructuration urbaine	-	-	-				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	4 072 535	-	4 072 535				
- maîtrise foncière	2 784 031	-	2 784 031				
SOUS TOTAL D1	13 842 418	-	13 842 418	SOUS TOTAL R1	8 657 450	-	8 657 450
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB	3 354 734	657 528	4 012 262	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
- creusement des bassins / canaux	1 063 816	208 508	1 272 324				
- station eaux pluviales	1 805 968	353 970	2 159 938				
- collecteur eaux pluviales	484 950	95 050	580 000				
SOUS TOTAL D2	3 354 734	657 528	4 012 262	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	17 197 152	657 528	17 854 680	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 657 450	-	8 657 450
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-9 197 230 € TTC			

BRUGES - ZAC "DU TASTA"


Programme global de construction actualisé *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 17 août 2012


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prév. Recalées 2010		Prév. Recalées 2011		Variation bilan recalé 2010 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2011 / bilan recalé 2010 (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	37 566	27%	36 711	27%	36 711	27%	-2,4%	0,0%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLS	3 017	2%	2 871	2%	2 871	2%	-4,8%	0,0%
Accession aidée	15 778	11%	15 250	11%	15 250	11%	-3,3%	0,0%
Accession libre	82 449	59%	81 626	60%	81 626	60%	-1,0%	0,0%
Total logement	138 840	70%	136 458	69%	136 458	69%	-1,7%	0,0%
Bureaux	27 473	14%	27 434	14%	27 434	14%	-0,1%	0,0%
Commerces/services	13 448	7%	14 603	7%	14 603	7%	8,6%	0,0%
Autres	19 702	10%	18 010	9%	18 010	9%	-8,6%	0,0%
Total	199 463	100%	196 505	100%	196 505	100%	-1,5%	0,0%

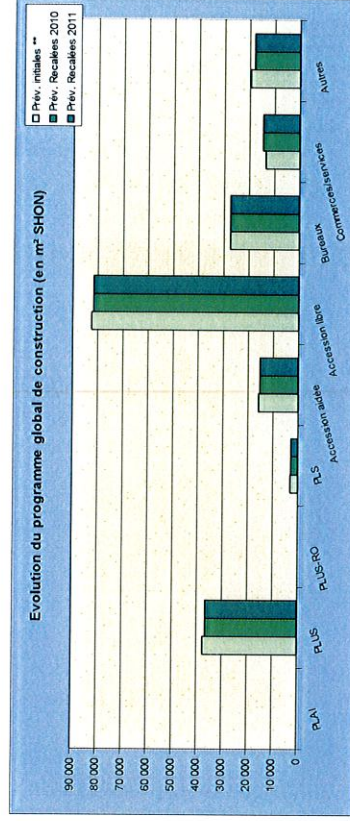

Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prév. Recalées 2010		Prév. Recalées 2011		Variation bilan recalé 2010 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2011 / bilan recalé 2010 (en %)
	Nb de logements	%	Nb de logements	%	Nb de logements	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	453	27%	453	27%	453	27%	0,00%	0,00%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLS	34	2%	34	2%	34	2%	0,00%	0,00%
Accession aidée	159	11%	176	11%	176	11%	10,69%	0,00%
Accession libre	1 011	59%	1 011	60%	1 011	60%	0,00%	0,00%
Total logement	1 657	100%	1 674	100%	1 674	100%	1,03%	0,00%

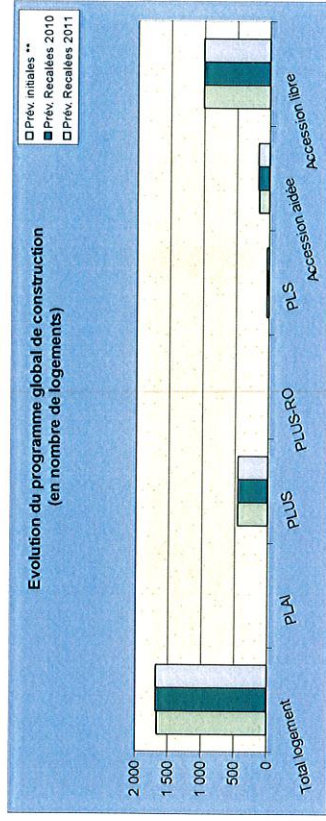

* par rapport aux données des permis de construire

** dossier modificatif de Création/Réalisation n° 2 du 21 janvier 2011


BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 17 août 2012


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalculées ****	Etat d'avancement			
	m² SHON	%	Réalisé m² SHON	%	Reste à réaliser m² SHON
PLAI	0	0%	0	0%	0
PLUS	36 711	19%	28 841	79%	7 870
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0
PLS	2 871	1%	2 871	100%	0
Accession aidée	15 250	8%	10 322	68%	4 928
Accession libre	81 626	42%	52 025	64%	29 601
Total logement	136 458	69%	94 059	69%	42 399
Bureaux	27 434	14%	20 384	74%	7 050
Commerces/Services	14 603	7%	14 603	100%	0
Autres	18 010	9%	18 010	100%	0
Total	196 505	100%	147 056	75%	49 449

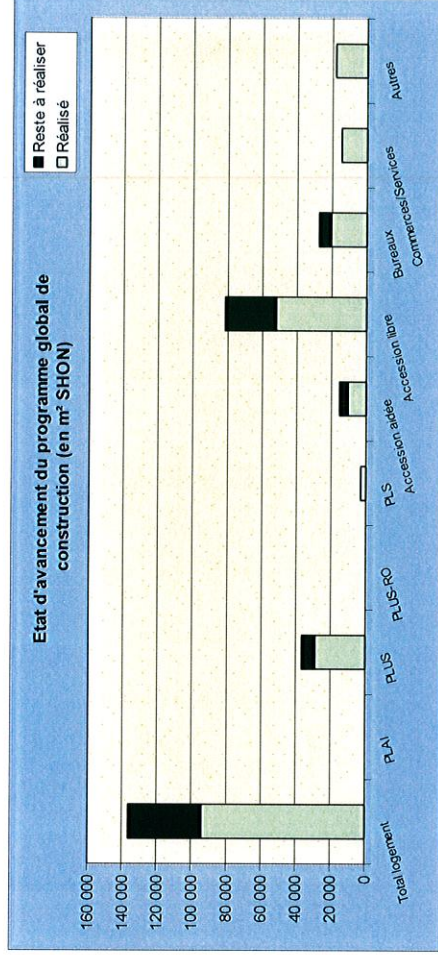

Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalculées (en nb log) ****	Etat d'avancement	
	Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)	
PLAI	0	0	0
PLUS	453	366	87
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	176	121	55
Accession libre	1 011	680	331
Total logement	1 674	1 201	473

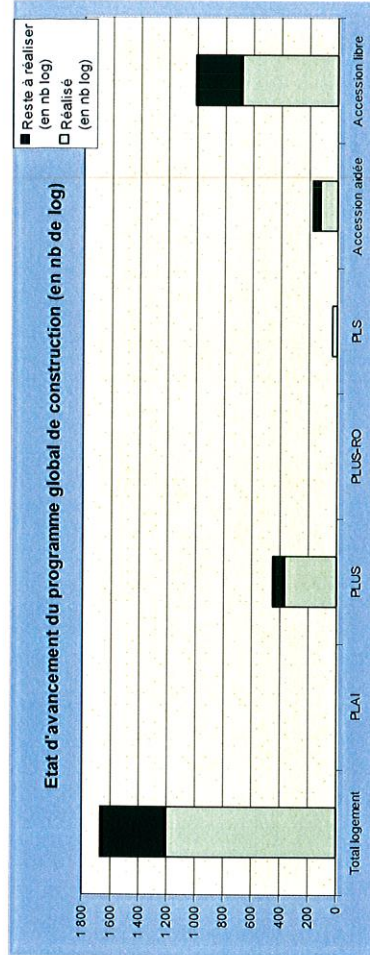

* par rapport aux données des permis de construire
**** CRAC 2011

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 17 août 2012

Détail des produits "logements"

Nature du programme		Echelonnement prévisionnel																				Vérification				
Préc. Rec. CRAC 2011 par m² SHON		CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	total m² SHON	total nb de logements
PLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS	36 711	7 500	996	12	0	0	3 160	36	13 151	178	4 034	51	0	0	0	0	0	0	0	7 870	87	0	0	0	36 711	453
PLUS-RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLS	2 871	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accession totale	15 250	0	4 853	53	0	0	2 775	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894	38	0	4 928	55	0	0	15 250	176	34
Accession libre	81 626	27 260	334	0	0	0	0	0	0	0	22 948	316	1 817	30	0	0	0	0	0	0	29 601	331	0	0	81 626	1 011
Total logement	138 468	37 631	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 982	367	1 817	30	0	0	2 894	38	0	42 399	473	0	0	136 458	1 674	1 011

Détail des autres produits

Total logement		37 631	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 982	367	1 817	30	0	0	2 894	38	0	42 399	473	0	0	0	Vérification m² SHON
Bureaux	27 434	12 874	0	0	0	0	0	0	0	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050	0	0	0	0	27 434
Commerces/Services	14 603	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	13 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 603
Autres	16 010	0	604	0	0	0	0	0	0	0	10 514	0	0	0	0	0	6 892	0	0	0	0	0	0	0	16 010
Total	198 047	51 802	6 453	65	0	0	5 935	66	13 151	178	58 312	367	1 817	30	0	0	9 586	38	0	48 449	473	0	0	0	198 047

* par rapport aux données des permis de construire

Commune de Bruges
Z.A.C. "LES VERGERS DU TASTA"

Plan de délimitation de la zone

Echelle : 1/4000²

Bordeaux, novembre 2012

