

BILAN de la ZAC CRAC 2011

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	202 887	39 766	242 653	1- Cessions	29 628 564	4 590 837	34 219 400
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 482 270	75 495	1 557 765
				1-2. PLS	3 309 489	182 022	3 491 511
2- frais d'acquisition et de libération des sols	15 531 695	172 979	15 704 675	1-3. Accession aidée	2 387 364	126 532	2 513 896
2.1- Acquisitions foncières	14 649 149	-	14 649 149	1-4. Accession libre	8 328 952	1 613 140	9 942 092
- acquisition CUB réserves foncières	10 208 561	-	10 208 561	1-5. Commerces et services	6 913 574	1 355 061	8 268 635
- revalorisation valeur vénale				1-6. Programmes tertiaires	2 742 000	827 807	3 569 807
- acquisition Commune		-	-	1-7. Cessions diverses	4 464 915	410 780	4 875 695
- reste à acquérir	4 440 588	-	4 440 588	2-Participation constructeurs	2 610 000	-	2 610 000
2.2- Frais	394 059	77 236	471 295	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
2.3- Libération des terrains	488 487	95 744	584 231				
3 - Frais d'aménagement	25 864 951	5 069 530	30 934 482	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	1 333 028	261 273	1 594 301	4- Subventions	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	24 228 082	4 748 704	28 976 786	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	16 439 538	1 254 400	17 693 938
3.3.- Autres frais	303 842	59 553	363 395	5-1. logement aidé	6 141 935	-	6 141 935
4- Participation équip. publics	6 800 000	1 254 400	8 054 400	5-2. restructuration urbaine	3 897 603	-	3 897 603
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	6 400 000	1 254 400	7 654 400				
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000	-	400 000	5-3. développement durable		-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	5-4. équipements scolaires	6 400 000	1 254 400	7 654 400
5 - Honoraires concession		-	-	5-5. maîtrise foncière		-	-
6 - Frais de communication		-	-	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
7- Frais divers	39 483	-84 382	-44 899	6.1 maîtrise foncière		-	-
frais financiers	39 483	-	39 483	7 - Autres recettes	367 973		367 973
TVA encaissée / reversée		-84 382	-84 382				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	48 439 017	6 452 293	54 891 311	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	49 046 075	5 845 237	54 891 311
- dont bilan aménageur	42 039 017	5 197 893	47 236 911	- dont bilan aménageur	42 646 075	4 590 837	47 236 911
- dont hors aménageur (= 4.1.)	6 400 000	1 254 400	7 654 400	- dont hors aménageur (= 5.4.)	6 400 000	1 254 400	7 654 400

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB CRAC 2011

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières à la valeur historique	10 208 561	-	10 208 561	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	10 208 561	-	10 208 561
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (Poste 3 recette bilan aménageur)							
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	16 439 538	1 254 400	17 693 938				
- logement aidé	6 141 935	-	6 141 935				
- restructuration urbaine	3 897 603	-	3 897 603				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	6 400 000	1 254 400	7 654 400				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	26 648 099	1 254 400	27 902 499	SOUS TOTAL R1	10 208 561	-	10 208 561
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB - assainissement primaire	2 371 189 2 371 189	464 753 464 753	2 835 942 2 835 942	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	400 000	-	400 000
SOUS TOTAL D2	2 371 189	464 753	2 835 942	SOUS TOTAL R2	400 000	-	400 000
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	29 019 288	1 719 153	30 738 441	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	10 608 561	-	10 608 561
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-20 129 880 € TTC			

ZAC des Quais de Floirac

Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL		(2) CRAC 2010		(3) CRAC 2011		(3) - (2) variat° en %
	valeur (1)	%	valeur	%	valeur	%	


DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	61 773	0,1%	427 716	0,9%	242 653	0,5%	-43,27
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 045 220	28,8%	15 710 519	31,4%	15 704 675	33,2%	-0,04
2.1- Acquisitions foncières	12 045 220		14 649 149		14 649 149		
- acquisition CUB	10 208 561		10 208 561		10 208 561		
- acquisition Commune	-		-		-		
- reste à acquérir	1 836 659		4 440 588		4 440 588		
2.2- Frais	-		477 139		471 295		
2.3- Libération des terrains	-		584 231		584 231		
3- Frais d'aménagement	29 080 650	69,5%	33 519 224	67,1%	30 934 482	65,5%	-7,71
3.1.- Études liées aux travaux	1 547 965		1 389 464		1 594 301		
3.2.- Travaux et aléas	27 446 713		31 762 265		28 976 786		
3.3 - Honoraires	-		-		-		
3.4.- Autres frais	85 972		367 495		363 395		
4- Participation aux équipements publics	400 000	1,0%	400 000	0,8%	400 000	0,8%	0
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-		
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000		400 000		400 000		
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-		
5- Honoraires concession	-						
6- Frais de communication	-			0,0%			
7- Frais divers	277 262	0,7%	-67 435	-0,1%	-44 899	-0,1%	-33,42
7.1. Frais divers	150 000		150 000		39 483		-73,68
7.2. TVA encaissée/reversée	127 262		-217 435		-84 382		-61,19
TOTAL DEPENSES	41 864 905	100%	49 990 024	100%	47 236 911	100%	-5,51


RECETTES en € TTC

1- Cessions	29 291 447	70,0%	36 972 513	74,0%	34 219 401	72,4%	-7,45
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 263 126		1 414 808		1 557 765		10,10
1-2. PLS	3 025 760		3 394 537		3 491 511		2,86
1-3. Accession aidée	3 141 366		3 436 192		2 513 896		-26,84
1-4. Accession libre	8 892 260		7 166 258		9 942 092		38,73
1-5. Commerces et services	7 057 070		12 468 300		8 268 635		-33,68
1-6. Programmes tertiaires	2 229 344		3 330 150		3 569 807		7,20
1-7. Cessions diverses	3 682 521		5 762 268		4 875 695		-15,39
2- Participation des constructeurs	2 533 920	6,1%	2 610 000	5,2%	2 610 000	5,5%	0,00
3- Part. EPIG réalisés Amén.							
4- Subventions							
5- Participation communautaire :	10 039 538	24,0%	10 039 538	20,1%	10 039 538	21,3%	0,00
6- Participation communale éventuelle	-		-				
6.1 maîtrise foncière	-		-		-		
7- Autres recettes diverses			367 973	0,7%	367 973	0,8%	0,00
TOTAL RECETTES	41 864 905	100,0%	49 990 024	100,0%	47 236 911	100,0%	-5,51

Evolution des dépenses

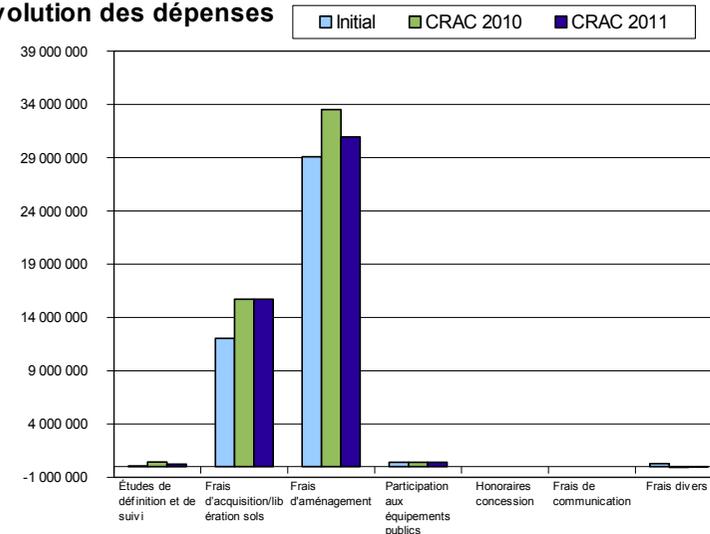

Evolution des recettes

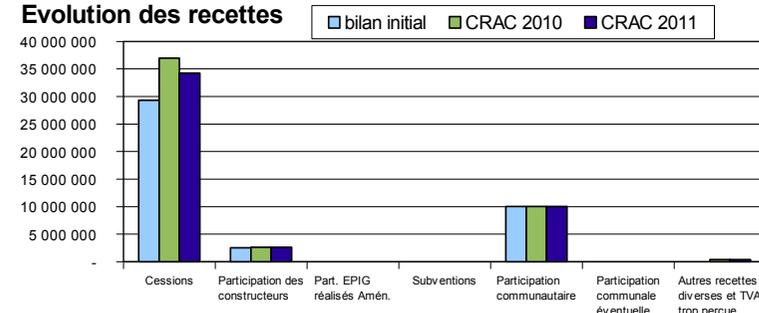


(1) mise en place du budget annexe et approbation d'un 1er dossier modificatif - novembre 2006

	CRAC 2011		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%


DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	242 653	1%	132 653	55%	110 000	45%
2- Frais d'acquisition/libération sols	15 704 675	33%	12 395 972	79%	3 308 703	21%
2.1- Acquisitions foncières	14 649 149		11 936 497		2 712 652	
- acquisition CUB (valeur vénale)	10 208 561		10 208 561		-	
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- acquisitions autres	4 440 588		1 727 936		2 712 652	
2.2- Frais	471 295		750		470 545	
2.3- Libération des terrains	584 231		458 726		125 505	
3- Frais d'aménagement	30 934 482	65%	21 082 779	68%	9 851 703	32%
3.1.- Études liées aux travaux	1 594 301		995 467		598 834	
3.2.- Travaux et aléas	28 976 786		19 831 557		9 145 229	
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4.- Autres frais	363 395		255 755		107 640	
4- Participation aux équipements publics	400 000	1%	400 000	100%	-	-
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000		400 000		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
5- Honoraires concession	-	-	-	-	-	-
6- Frais de communication	-	-	-	-	-	-
7- Frais divers	-44 899	0%	-2 711 899	-	2 666 999	-
7.1. Frais divers	39 483		30 000	76%	9 483	24%
7.2.TVA encaissée/reversée	-84 382		-2 741 899	3249%	2 657 516	-3149%
TOTAL DEPENSES	47 236 911	100%	31 299 506	66%	15 937 405	34%

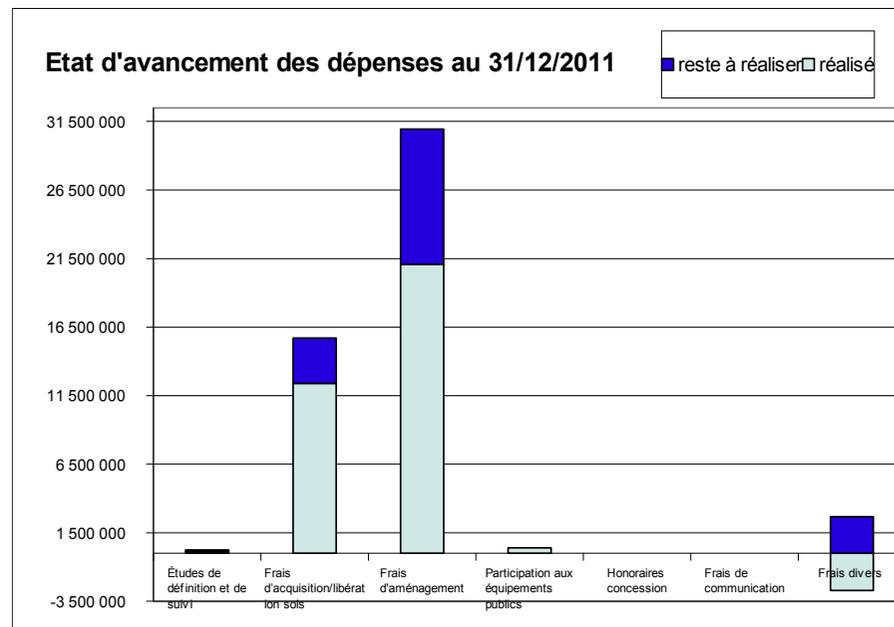

RECETTES en € TTC

1- Cessions	34 219 401	72%	7 308 958	21%	26 910 442	79%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 557 765		1 557 765	100%	-	0%
1-2. PLS	3 491 511		635 975	18%	2 855 536	82%
1-3. Accession aidée	2 513 896		2 513 896	100%	-	0%
1-4. Accession libre	9 942 092		2 601 322	26%	7 340 770	74%
1-5. Commerces et services	8 268 635		-	0%	8 268 635	100%
1-6. Programmes tertiaires	3 569 807		-	0%	3 569 807	100%
1-7. Cessions diverses	4 875 695		-	0%	4 875 695	100%
2- Participation des constructeurs	2 610 000	6%	1 606 800	62%	1 003 200	38%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	-	-	-	-	-
4- Subventions	-	-	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	10 039 538	21%	2 507 246	25%	7 532 293	75%
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-
-7 Autres recettes diverses et TVA	367 973	1%	367 973	100%	-	0%
TOTAL RECETTES	47 236 911	100%	11 790 976	25%	35 445 936	75%

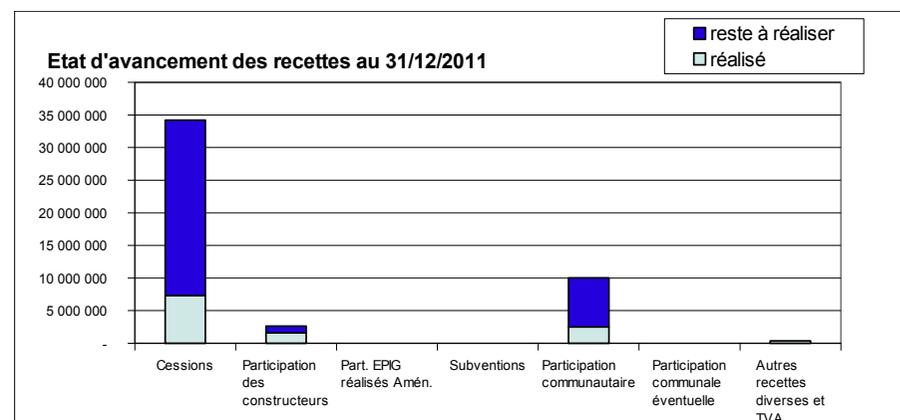

	antérieur 2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Ultérieur		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES en € TTC																								
1- Études de définition et de suivi	61 773	25%									20 190		50 690		60 000		30 000		10 000		10 000		242 653	1%
2- Frais d'acquisition/libération sols	-		10 208 990	65%	37 235	0%	946 621	6%	571 440	4%	80 186	1%	551 500	4%	1 759 345	11%	1 549 358	10%	-		-		15 704 675	33%
2.1.- Acquisitions foncières	-		10 208 561	70%	970	0%	610 399	4%	565 066	4%	-		551 500	4%	1 461 320	10%	1 251 332	9%	-		-		14 649 149	
- acquisition CUB (valeur vénale)			10 208 561	100%																			10 208 561	
- acquisition Commune (valeur vénale)																							-	
- reste à acquérir					970	0%	610 399	14%	565 066	13%			551 500	12%	1 461 320	33%	1 251 332	28%					4 440 588	
2.2.- Frais			429	0%			321	0%	-						235 273	50%	235 273	50%					471 295	
2.3.- Libération des terrains					36 265	6%	335 902	57%	6 373	1%	80 186	14%			62 753	11%	62 753	11%					584 231	
3- Frais d'aménagement	3 559 357	12%	3 085 003	10%	4 466 665	14%	2 975 212	10%	2 489 251	8%	856 547	3%	3 650 744	12%	6 374 539	21%	2 863 173	9%	433 201	1%	180 790	1%	30 934 482	65%
3.1.- Études liées aux travaux			393 515	25%	98 749	6%	129 948	8%	150 509	9%	87 424	5%	135 323	8%	284 256	18%	262 256	16%	52 321	3%	-	0%	1 594 301	
3.2.- Travaux et aléas	3 515 345	12%	2 691 487	9%	4 344 073	15%	2 792 329	10%	2 270 246	8%	703 555	2%	3 514 521	12%	6 054 402	21%	2 565 037	9%	345 000	1%	180 790	1%	28 976 786	
3.3.- Honoraires	-		-		-		-		-														-	
3.4.- Autres frais	44 012	12%			23 843	7%	52 935	15%	68 496	19%	65 569	18%	900	0%	35 880	10%	35 880	10%	35 880	10%	-	0%	363 395	
4- Participation aux équipements publics	400 000	100%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		400 000	1%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération																							-	
4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB	400 000	100%																					400 000	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville																							-	
5- Honoraires concession																							-	
6- Frais de communication																							-	
7- Frais divers	-593 429	1322%	-505 639	1126%	-737 831	1643%	-49 880	111%	-409 718	913%	-10 498	23%	-404 902	902%	1 593 032	-3548%	308 108	-686%	241 417	-538%	524 442	-1168%	-44 899	0%
7.1. Frais divers															30 000	76%	2 000	5%	2 000	5%	3 483	9%	39 483	
7.2. TVA encassée/reversée	-593 429	703%	-505 639	599%	-737 831	874%	-49 880	59%	-409 718	486%	-10 498		-434 902	515%	1 591 032	-1886%	306 108	-363%	239 417	-284%	520 959	-617%	-84 382	
TOTAL DEPENSES	3 427 701	7%	12 788 353	27%	3 766 069	8%	3 871 954	8%	2 650 972	6%	946 425	2%	3 848 032	8%	9 786 916	21%	4 750 639	10%	684 619	1%	715 232	2%	47 236 911	100%
RECETTES en € TTC																								
1- Cessions	-		-				3 448 471	10%	-		1 177 290	3%	2 683 197	8%	14 989 799	44%	4 721 808	14%	2 904 996	8%	4 293 839	13%	34 219 401	72%
1-1. Localif social (PLUS-PLAI)											417 121	27%	1 140 644	73%		0%							0	1 557 765
1-2. PLS							635 975	18%										0%	1 500 268	43%	1 355 267	39%	3 491 511	
1-3. Accession aidée							687 818	27%			760 170	30%	1 065 908	42%		0%		0%					0	2 513 896
1-4. Accession libre							2 124 678	21%					476 645	5%	2 308 863		4 721 808	47%	310 099				0	9 942 092
1-5. Commerces et services							-								6 325 135				0%	1 943 500	24%		8 268 635	
1-6. Programmes tertiaires															0	2 574 735	72%		0%	995 072			3 569 807	
1-7. Cessions diverses															3 781 065	78%			1 094 629			0	4 875 695	
2- Participation des constructeurs							698 400	27%					908 400	35%	943 200		60 000				0	0	2 610 000	6%
3- Part. EPIG réalisés Amén.																							-	
4- Subventions																							-	
5- Participation communautaire :	-						1 067 875	11%	-		560 668	6%	878 703	9%	1 348 160	13%	1 820 928	18%	2 032 406	20%	2 330 799	23%	10 039 538	21%
6- Participation communale éventuelle	-		-				-																-	
6.1 maîtrise foncière																							-	
7- Autres recettes diverses									367 580	100%	393	0%		0%										367 973
8- poste de TVA																							-	
TOTAL RECETTES	-		-				5 214 745	11%	367 580	1%	1 738 351	4%	4 470 300	9%	17 281 158	37%	6 602 736	14%	4 937 402	10%	6 624 638	14%	47 236 911	100%
RECETTES - DEPENSES	-3 427 701		-12 788 353		-3 766 069		1 342 791		-2 283 392		791 926		622 268		7 494 242		1 852 097		4 252 784		5 909 406		0	
Balance cumulée	-3 427 701		-16 216 054		-19 982 123		-18 639 332		-20 922 724		-20 130 798		-19 508 530		-12 014 288		-10 162 190		-5 909 407		-		-0	


FLOIRAC - ZAC "des Quais"

Programme global de construction actualisé *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 20 juillet 2012


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prév. Recalées 2010		Prév. Recalées 2011		Variation bilan recalé 2010 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2011 / bilan recalé 2010 (en %)
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	10 019	11%	3 530	4%	7 326	8%	-64,8%	107,5%
PLUS-RO	0	0%	8 709	10%	7 525	8%	0%	-13,6%
PLS	16 355	19%	17 213	19%	18 128	19%	5,2%	5,3%
Accession aidée	19 292	22%	17 325	20%	10 493	11%	-10,2%	-39,4%
Accession libre	41 494	48%	41 606	47%	49 759	53%	0,3%	19,6%
Total logement	87 160	57%	88 382	52%	93 231	43%	1,4%	5,5%
Bureaux	16 400	11%	21 875	13%	26 000	12%	33,4%	18,9%
Commerces/services	41 500	27%	42 061	25%	52 489	24%	1,4%	24,8%
Autres	7 936	5%	19 277	11%	46 256	21%	142,9%	140,0%
Total	152 996	100%	171 595	100%	217 976	100%	12,2%	27,0%

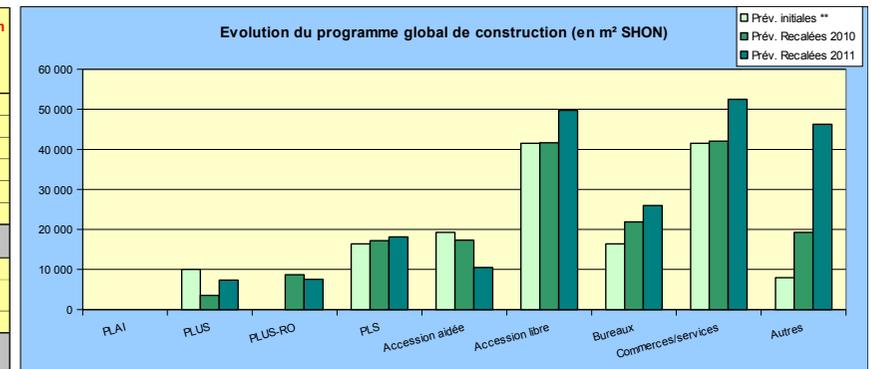

Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2010 Nb de logements	Prévision Recalée 2011 Nb de logements	Variation bilan recalé 2010 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2011 / bilan recalé 2010 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	125	35	90	-71,8%	155,0%
PLUS-RO	-	93	85	0%	-8,5%
PLS	197	175	183	-11,5%	4,8%
Accession aidée	248	172	120	-30,7%	-30,2%
Accession libre	384	455	636	18,5%	39,7%
Total logement	955	930	1 114	-2,6%	19,8%

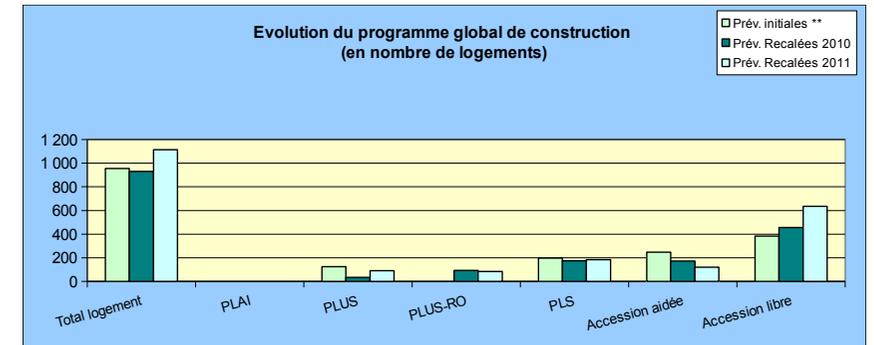

* par rapport aux données des permis de construire

** dossier modificatif de Création/Réalisation du 24 novembre 2006

FLOIRAC - ZAC "des Quais"

Programme global de construction - Etat d'avancement *




Direction Urbanisme

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 20 juillet 2012


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%
PLUS	7 326	3%	7 326	100%	0	0%
PLUS-RO	7 525	3%	7 525	100%	0	0%
PLS	18 128	8%	4 264	24%	13 864	76%
Accession aidée	10 493	5%	10 493	100%	0	0%
Accession libre	49 759	23%	26 873	54%	22 886	46%
Total logement	93 231	43%	56 481	61%	36 750	39%
Bureaux	26 000	12%	19 100	73%	6 900	27%
Commerces/Services	52 489	24%	45 989	88%	6 500	12%
Autres	46 256	21%	40 456	87%	5 800	13%
Total	217 976	100%	162 026	74%	55 950	26%

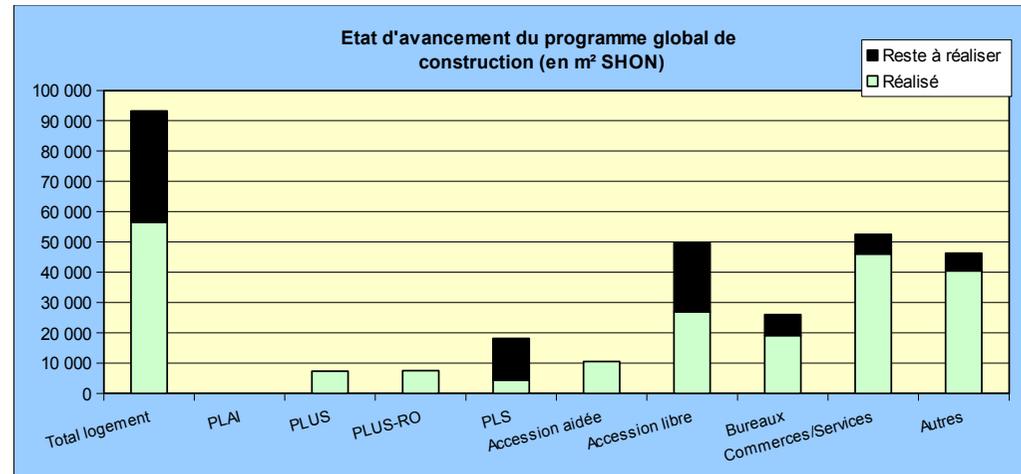

Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées ****	Etat d'avancement	
		Réalisé	Reste à réaliser
PLAI	0	0	0
PLUS	90	90	0
PLUS-RO	85	85	0
PLS	183	44	139
Accession aidée	120	120	0
Accession libre	636	342	294
Total logement	1 114	681	433

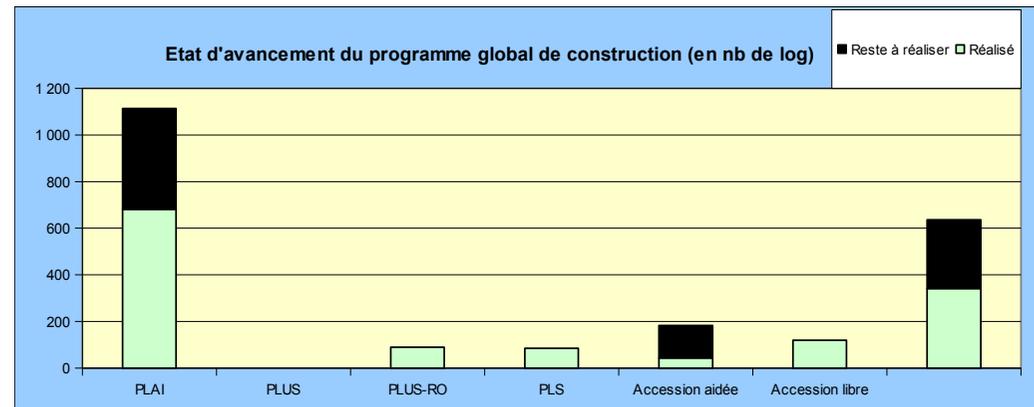

* par rapport aux données des permis de construire

**** CRAC 2011

FLOIRAC - ZAC "des Quais"

Programme global de construction échelonné dans le temps *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 20 juillet 2012

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. CRAC 2011 par m ² SHON	Echelonnement prévisionnel																										Vérification total m ² SHON	Vérification total nb de logements						
		CUMUL FIN 2003 : m ² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m ² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m ² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m ² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m ² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m ² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m ² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m ² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m ² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m ² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m ² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m ² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m ² SHON	2015 : Nb de log			2016 : m ² SHON	2016 : Nb de log				
PLAI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLUS	7 326	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372	12	0	0	5 954	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 326	90
PLUS-RO	7 525	0	0	0	0	0	0	1 920	24	3 163	32	0	0	2 442	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525	85
PLS	18 128	0	0	0	0	3 349	36	0	0	915	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 284	73	0	0	0	0	6 580	66	18 128	183			
Accession aidée	10 493	0	0	0	0	3 277	35	0	0	1 716	15	0	0	5 501	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 493	120	
Accession libre	49 759	0	0	0	0	0	0	11 033	111	0	0	334	4	0	0	0	0	15 506	227	0	0	21 960	285	926	9	0	0	0	0	0	0	49 759	636		
Total logement	93 231	0	0	0	0	6 626	71	12 953	135	7 166	67	334	4	13 897	177	0	0	15 506	227	0	0	21 960	285	8 210	82	0	0	6 580	66	93 231	1 114				

Détail des autres produits

	93 231	0	0	0	0	6 626	71	12 953	135	7 166	67	334	4	13 897	177	0	0	15 506	227	0	0	21 960	285	8 210	82	0	0	6 580	66	Vérification m ² SHON
Total logement	93 231	0	0	0	0	6 626	71	12 953	135	7 166	67	334	4	13 897	177	0	0	15 506	227	0	0	21 960	285	8 210	82	0	0	6 580	66	93 231
Bureaux	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100	0	0	0	500	0	0	0	0	0	6 400	0	26 000
Commerces/Services	52 489	0	0	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	44 978	0	0	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	52 489
Autres	46 256	4 000	0	0	0	0	0	174	0	0	0	122	0	23 060	0	0	0	13 100	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	46 256
Total	217 976	4 000	0	0	0	6 971	71	13 127	135	7 166	67	456	4	81 935	177	0	0	48 372	227	0	0	22 460	285	14 010	82	0	0	19 480	66	217 976

* par rapport aux données des permis de construire
