

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	351 087	68 688	419 775	1- Cessions	6 636 176	962 217	7 598 393
2- frais d'acquisition et de libération des sols	5 324 058	308 688	5 632 746	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 700 507	102 749	1 803 257
2.1.- Acquisitions foncières	4 494 866	159 201	4 654 067	1-2. PLS	534 888	29 419	564 306
- acquisition CUB	2 038 107	90 049	2 128 156	1-3. Accession aidée	357 497	21 392	378 889
- acquisition Commune	-	-	-	1-4. Accession libre	2 777 500	555 500	3 333 000
- foncier privé	2 456 760	69 152	2 525 912	1-5. Commerces et services	32 000	6 400	38 400
2.2.- Frais	128 398	9 729	138 126	1-6. Programmes tertiaires	-	-	-
2.3.- Libération des terrains	700 794	139 758	840 552	1-7. Cessions diverses	1 233 784	246 757	1 480 540
3 - Frais d'aménagement	3 937 671	786 597	4 724 268	2-Participation constructeurs (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	210 378	-	210 378
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	574 678	114 564	689 441	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	728 135	145 627	873 762
3.2.- Travaux et aléas	3 362 793	672 033	4 034 827	4- Subventions	-	-	-
3.3.- Autres frais	-	-	-	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	5 636 736	-	5 636 736
4- Participation équip. publics	2 743 099	-	2 743 099	5-1. logement social	-	-	-
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	2 000 000	-	2 000 000	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	3 636 736	-	3 636 736
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 827	-	615 827	5-3. développement durable	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 272	-	127 272	5-4. équipements scolaires	2 000 000	-	2 000 000
5 - Honoraires concession	805 454	159 668	965 121	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
6 - Frais de communication	39 750	7 950	47 700	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
7- Frais divers	10 306	-223 747	-213 440	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
Frais financiers	5 063	-	5 063	7 - Autres recettes	-	-	-
TVA encaissée / reversée	5 243	-223 747	-223 747	8. TVA trop perçue sur participation	-	-	-
Impôts locaux et taxes	-	-	-				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	13 211 424	1 107 844	14 319 268	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	13 211 424	1 107 844	14 319 268
- dont bilan aménageur	13 211 424	1 107 844	14 319 268	- dont bilan aménageur	11 211 424	1 107 844	12 319 268
- dont hors aménageur (= 4.1.)	2 000 000	-	2 000 000	- dont hors aménageur (= 5.4.)	2 000 000	-	2 000 000

TVA encaissée / reversée

-

0

= résultat du calcul à copier / coller valeur dans la colonne E = dépenses / ligne 42 - de façon à équilibrer les recettes et les dépenses TTC du bilan

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	2 038 107	90 049	2 128 156	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur	2 038 107	90 049	2 128 156
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	728 135	145 627	873 762	(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)			
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	3 636 736	-	5 636 736				
- logement aidé	-	-	-				
- restructuration urbaine	3 636 736	-	3 636 736				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	2 000 000	-	2 000 000				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	6 402 978	235 676	8 638 654	SOUS TOTAL R1	2 038 107	90 049	2 128 156
Au titre des équipements structurants							
Acquisitions foncières	-	-	-	Recettes de cessions foncières aux constructeurs	-	-	-
VRD sous MOA de la CUB - acquisitions foncières - études - travaux - MOE - SPS - fonds de concours à la Commune pour éclairage public	3 622 678	710 045	4 332 723	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	615 827	-	615 827
	327 255	-	327 255				
SOUS TOTAL D2	3 949 933	710 045	4 659 978	SOUS TOTAL R2	615 827	-	615 827
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	10 352 911	945 721	13 298 632	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	2 653 934	90 049	2 743 983
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-10 554 649 € TTC			


DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières			-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)			-
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)		-	-				
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune (a)	1 424 726	234 613	1 659 339	Participation de l'aménageur aux équipements communaux sous MOA de la Commune	127 272	-	127 272
Equipements scolaires sous MOA Commune (b)	2 000 000	392 000	2 392 000	Participation CUB équip. scolaires	2 000 000		2 000 000
				Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	327 255		327 255
SOUS TOTAL D2'	3 424 726	626 613	4 051 339	SOUS TOTAL R2'	2327255	-	2 454 527
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	3 424 726	626 613	4 051 339	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	2 327 255	-	2 454 527
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3				-1 596 812 € TTC			

AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEUR - CRAC 2013


Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL valeur 0.00	(2) CRAC 2012 valeur %	(3) CRAC 2013 valeur %	(3-2) variati en %
DEPENSES en € TTC				
1- Etudes de définition et de suivi	318 375	2.3%	419 775	34.4%
2- Frais d'acquisition/libération sols	6 820 268	49.7%	5 632 746	43.7%
2.1- Acquisitions foncières	5 607 735	40.8%	4 654 067	37.8%
- acquisition CUB	1 880 313	13.7%	2 128 156	17.3%
- reste à acquir	164 137	1.2%	-	-
2.2- Frais	3 963 285	26.0%	2 525 912	20.5%
2.3- Libération des terrains	245 711	1.8%	138 126	1.1%
3- Frais d'aménagement	966 822	7.0%	840 552	6.8%
3.1- Etudes liées aux travaux	4 403 216	32.1%	4 724 268	38.3%
3.2- Travaux et aléas	654 883	4.8%	689 441	5.6%
3.3 - Honoraires	3 748 333	27.3%	4 034 827	32.8%
3.4 - Autres frais				
4- Participation aux équipements publics	743 099	5.4%	743 099	6.0%
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération				
4.2- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 828	4.5%	615 827	5.0%
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 271	0.9%	127 272	1.0%
5- Honoraires concession	1 064 241	7.8%	965 121	7.8%
6- Frais de communication	63 388	0.5%	47 700	0.4%
7- Frais divers	317 797	2.3%	213 440	1.7%
7.1. Frais divers	248 605	1.8%	5 063	0.0%
7.2. TVA encaissée/reversée	69 192	0.5%	223 747	119.1%
7.3. Impôts locaux et taxes	-	0.0%	5 243	0.0%
TOTAL DEPENSES	13 730 384	100.0%	12 910 141	100.0%
RECETTES en € TTC				
1- Cessions	8 700 501	63.4%	7 588 393	61.7%
1.1 Locatif social (PLUS-PLAI)	1 356 389	9.7%	1 803 257	14.6%
1.2- PLUS	1 192 572	8.7%	594 306	4.6%
1.3- Accession aidée	539 316	3.9%	378 889	3.1%
1.4- Accession libre	3 767 400	27.4%	3 333 000	27.1%
1.5- Commerces et services	75 960	0.6%	38 400	0.3%
1.6- Programmes tertiaires	-	0.0%	-	0.0%
1.7- Cessions diverses	1 788 884	13.0%	1 480 540	12.0%
2- Participation des constructeurs	305 569	2.2%	210 378	1.7%
3- Part EPIG réalisées Amén.	1 087 578	7.9%	873 762	7.1%
4- Subventions	-	0.0%	-	0.0%
5- Participation communautaire :	3 636 736	26.5%	3 636 736	29.5%
5-1 logement social	-	0.0%	-	0.0%
5-2 restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	3 636 736	26.5%	3 636 736	29.5%
5-3 développement durable	-	0.0%	-	0.0%
5-4 équipements scolaires	-	0.0%	-	0.0%
5-5 maîtrise foncière	-	0.0%	-	0.0%
6- Participation communale éventuelle	-	0.0%	-	0.0%
6.1 maîtrise foncière	-	0.0%	-	0.0%
7- Autres recettes diverses	-	0.0%	-	0.0%
TOTAL RECETTES	13 730 384	100.0%	12 910 141	100.0%

Evolution des dépenses

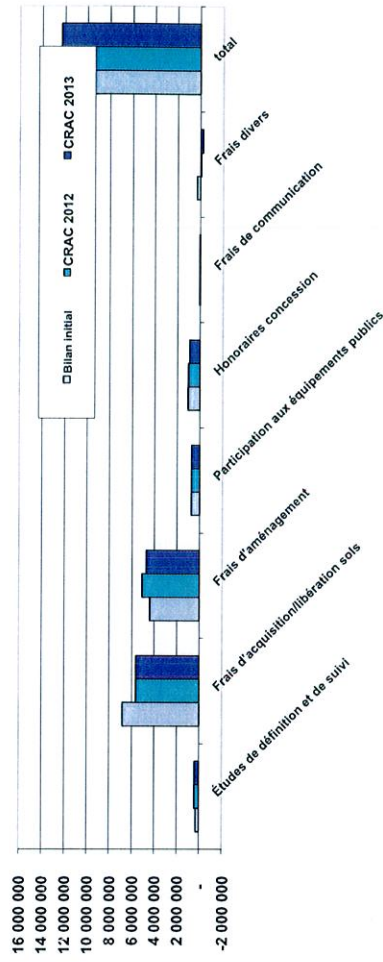


Evolution des recettes

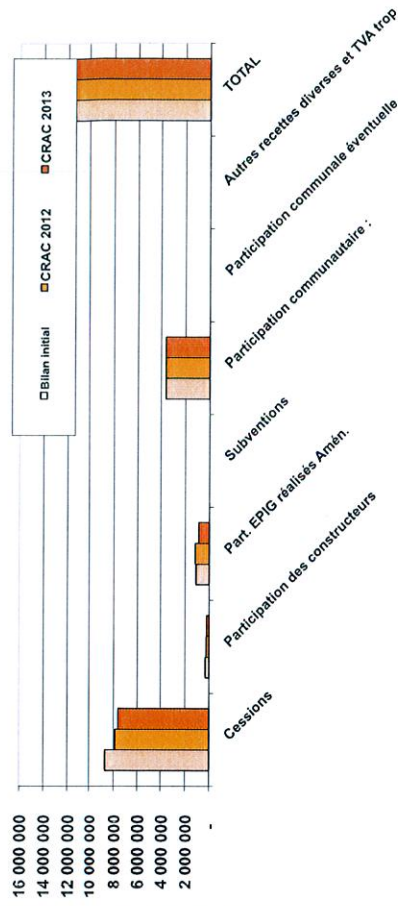


Bilan prévisionnel : Etat d'avancement

	CRAC 2013		Etat d'avancement	
	valeur	%	réalisé	reste à réaliser
			valeur	valeur
			%	%
DEPENSES en € TTC				
1- Etudes de définition et de suivi	419 775	3,41%	245 321	174 454
2- Frais d'acquisition/libération sols	5 632 746	45,72%	1 905 559	3 727 187
2.1- Acquisitions foncières	4 664 067	37,76%	1 748 768	2 905 300
- acquisition CUB (valeur vénale)	2 128 156	17,29%	549 318	1 578 838
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	0,00%	-	-
- autres acquisitions	2 535 912	20,50%	1 199 450	1 326 462
2.2- Frais	138 126	1,12%	38 559	99 567
2.3- Libération des terrains	840 552	6,82%	118 232	722 320
3- Frais d'aménagement	4 724 268	38,35%	279 618	4 444 650
3.1- Etudes liées aux travaux	689 441	5,60%	123 052	566 389
3.2- Travaux et aléas	4 034 827	32,75%	156 565	3 878 261
3.3 - Honoraires	-	-	-	-
3.4 - Autres frais	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	743 099	6,03%	-	743 099
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	615 827	5,00%	-	615 827
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	127 272	1,03%	-	127 272
5- Honoraires concession	965 121	7,85%	425 463	539 658
6- Frais de communication	47 700	0,39%	-	47 700
7- Frais divers	213 440	-1,73%	132 954	80 487
7.1. Frais divers	5 063	0,04%	5 063	-
7.2. TVA encasée/reversée	223 747	-1,82%	143 260	80 487
7.3 Impôts locaux et taxes	5 243	0,04%	5 243	-
7.4. TVA trop perçue	-	-	-	-
TOTAL DEPENSES	12 319 268	100,00%	2 723 008	9 596 260
RECETTES en € TTC				
1- Cessions	7 598 393	61,68%	781 194	6 817 199
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 803 257	14,64%	657 783	1 145 473
1-2. PLS	564 306	4,58%	-	564 306
1-3. Accession aidée	378 889	3,08%	123 410	255 479
1-4. Accession libre	3 333 000	27,06%	-	3 333 000
1-5. Commerces et services	38 400	0,31%	-	38 400
1-6. Programmes tertiaires	-	-	-	-
1-7. Cessions diverses	1 480 540	-	-	1 480 540
2- Participation des constructeurs	210 378	1,71%	-	210 378
3- Part. EPIG réalisés Amén.	873 762	7,10%	-	873 762
4- Subventions	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	3 636 736	29,52%	2 500 000	1 136 736
5-1. logement social	-	-	-	-
5-2. restructuration urbaine	3 636 736	-	2 500 000	1 136 736
5-3. développement durable	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	-	-	-	-
5-5. maîtrise foncière	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses et TVA	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	12 319 268	100,00%	3 281 194	9 038 074
			26,63%	73,37%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/13

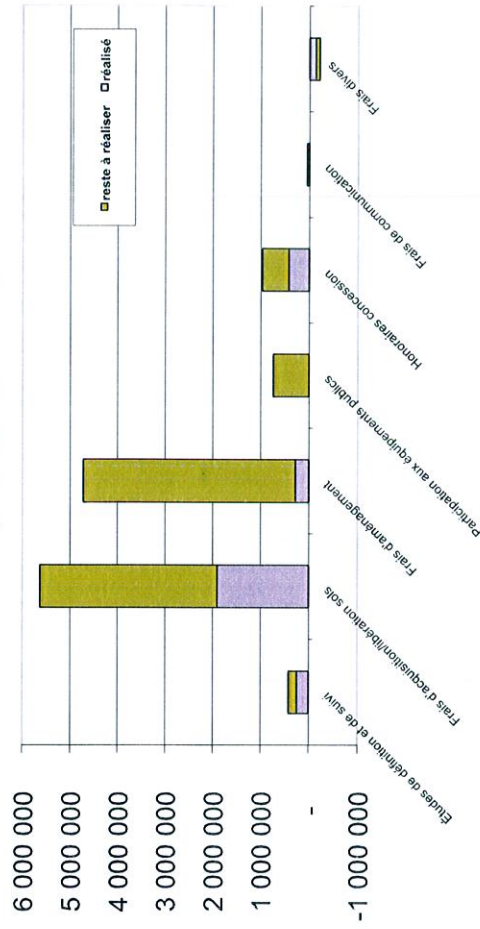

Etat d'avancement des recettes au 31/12/13

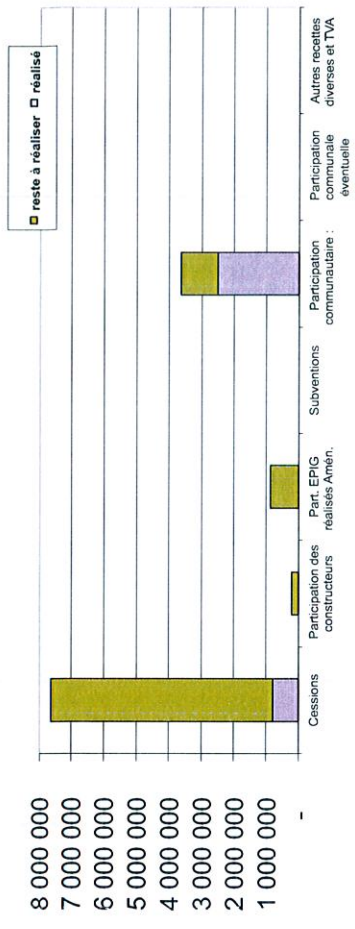

AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - BILAN AMENAGEUR - CRAC 2013

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 et suivantes	TOTAL
	val	val	val	val	val	val	val	val	val
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DEPENSES en € TTC									
1- Etudes de définition et de suivi	12 191	32 869	27 448	63 391	109 422	54 454	60 000	60 000	419 775
2- Frais d'acquisition/libération sols	167	857 346	5 118	113 428	685 611	243 891	569 741	3 157 446	5 632 746
2.1- Acquisitions foncières	-	840 770	-	95 000	586 768	226 505	414 314	2 490 711	4 654 067
- acquisition CUB	0%	-	0%	-	549 318	275	414 314	1 164 249	2 128 156
- autres acquisitions	0%	840 770	-	95 000	37 450	226 230	-	1 326 462	2 525 912
2.2- Frais	167	16 576	5 118	7 597	1 839	6 988	27 179	72 664	138 126
2.3- Libération des terrains	0%	-	-	10 831	97 004	10 398	128 248	594 072	840 552
3- Frais d'aménagement	-	29 772	48 851	8 510	152 290	40 194	1 316 304	3 128 346	4 724 268
3.1- Etudes liées aux travaux	-	29 772	48 851	8 510	17 372	18 546	240 000	326 389	689 441
3.2- Travaux et aléas	-	-	-	-	134 918	21 648	1 076 304	2 801 957	4 034 827
3.3 - Honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 - Autres frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- Honoraires concession	45 917	97 617	47 425	54 068	94 439	85 998	173 828	365 830	965 121
6- Frais de communication	-	23 984	20 164	22 200	47 594	9 750	15 900	31 800	47 800
7- Frais divers	9 262	3 279	1 550	-	-	-	49 038	129 525	213 440
7.1. Frais divers	235	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. TVA encaissée/reversée	9 497	27 262	21 714	22 200	52 837	9 750	49 038	129 525	223 747
7.3. Impôts locaux et taxes	-	-	-	-	5 243	-	-	-	5 243
TOTAL DEPENSES	49 012	993 620	108 679	217 197	994 167	414 788	2 184 811	7 356 996	12 319 268
	0%	8%	1%	2%	8%	3%	18%	60%	100%

RECETTES en € TTC									
1- Cessions	-	-	-	-	446 593	334 601	2 861 765	3 955 434	7 598 393
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	0%	0%	0%	0%	323 183	334 601	2 861 765	3 955 434	7 598 393
1-2. PLS	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3. Accession libre	0%	-	-	-	123 410	-	170 319	253 479	364 306
1-4. Accession libre	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
1-5. Commerces et services	0%	-	-	-	-	-	1 320 000	2 013 000	3 333 000
1-6. Programmes tertiaires	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
1-7. Cessions diverses	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
2- Participation des constructeurs	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3- Part. EPIG réalisés Amén.	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
4- Subventions	-	1 000 000	1 000 000	500 000	-	-	-	1 136 736,00	3 636 736
5- Participation communautaire :	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1. logement social	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5-2. restructuration urbaine	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA sur PE	0%	1 000 000	1 000 000	500 000	-	-	-	1 136 736,00	3 636 736
5-3. développement durable	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5. maîtrise foncière	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	-	1 000 000	1 003 000	500 000	446 593	334 601	3 044 258	5 993 816	12 319 268
RECETTES - DEPENSES	-	6 380	891 321	282 803	-	80 187	859 448	-	-
Balance cumulée	49 012	42 632	848 689	1 131 493	547 573	503 732	1 363 180	1	-
	49 012	42 632	848 689	1 131 493	547 573	503 732	1 363 180	1	-

AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2013 Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 4
Date d'actualisation : 03-avr-14

Description du programme de construction (en m² SHON et %)					
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		CRAC 2012		Variation (3-2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	
	m² SHON	%	m² SHON	%	

1 - SHON Cédée par l'aménageur

PLAI	220	1%	210	1%	495	2%	135,6%
PLUS	5 260	17%	8 903	30%	8 917	33%	1,3%
PLUS-RO	4 680	15%	1 819	6%	1 819	7%	0,0%
PLS	6 280	20%	4 948	17%	2 875	10%	-44,8%
Accession aidée	2 840	9%	3 152	11%	2 940	11%	-6,7%
Accession libre	12 560	39%	10 066	35%	10 484	38%	4,2%
Sous-Total logement	31 840	100%	28 897	100%	27 331	100%	-5,4%
Logements	31 840	98%	28 897	99%	27 331	99%	-5,4%
Bureaux	-	0%	-	0%	-	0%	0,0%
Commerces/services	720	2%	400	1%	400	1%	0,0%
Autres	-	0%	-	0%	-	0%	0,0%
Sous-Total (1)	32 560	100%	29 297	100%	27 731	100%	-5,3%

2 - SHON Autres

Logements	4 172	74%	2 992	68%	2 992	100%	0%
Commerces/services	1 429	26%	1 429	32%	-	0%	-100%
Sous-Total (2)	5 601	100%	4 421	100%	2 992	100%	-32%

TOTAL (1) + (2)	38 161	100%	33 718	100%	30 723	100%	-8,9%
dont total logement	36 012	94%	31 889	95%	30 323	95%	-4,9%

Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)	en %	CRAC 2012	en %	CRAC 2013	en %	Variation (3-2)%
---------------------	--------------------------	------	-----------	------	-----------	------	------------------

1 - nombre de logements cédés par l'aménageur

PLAI	2	1%	3	1%	8	2,469%	167%
PLUS	57	17%	104	32%	98	30%	-6%
PLUS-RO	61	18%	20	6%	20	6%	0%
PLS	64	19%	50	15%	18	6%	-64%
Accession aidée	27	8%	34	11%	31	10%	-9%
Accession libre	429	38%	112	35%	149	46%	34%
Total logement (1)	340	100%	322	100%	324	100%	1%


(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

2 - Nombre de logements / Autres


Accession libre (2)	46	12%	41	11%	41	11%	-11%
TOTAL (1) + (2)	386	100%	363	100%	365	100%	1%

PLUS - PLAI	120	31%	127	35%	126	35%	-1%
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Evolution du programme global de construction (en m² SHON)

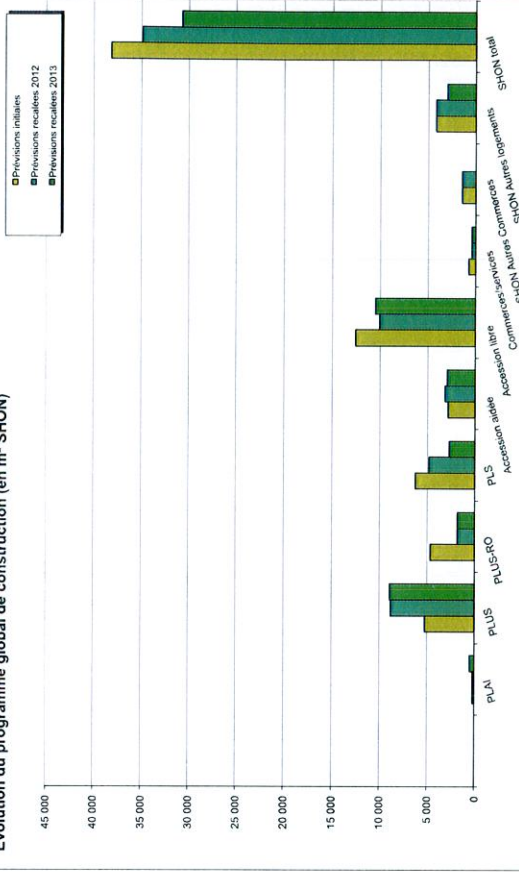

Evolution du programme global de construction (en nb de log)

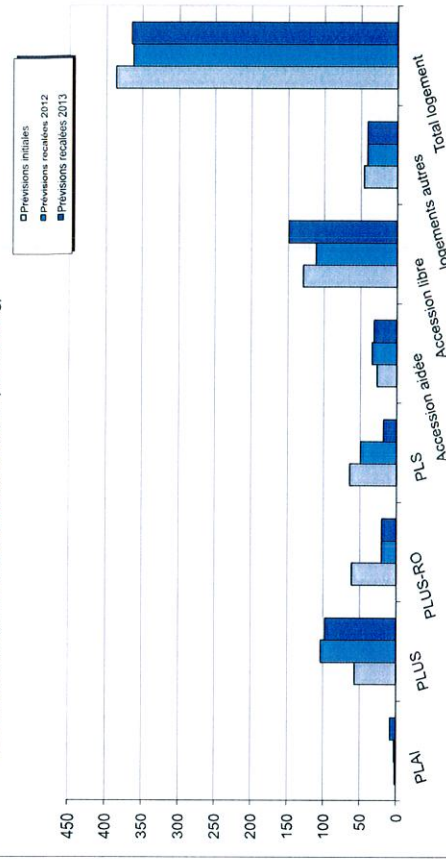


AMBAIRES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2013


Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement :
Date d'actualisation :

Description du programme de construction (en m² SHON et %)						
Nature du programme	Prévisions recalculées 2013		Etat d'avancement			
	Réalisé		Reste à réaliser			
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	495	2%	-	0%	495	100%
PLUS	8 917	29%	-	0%	8 917	100%
PLUS-RO	1 819	6%	-	0%	1 819	100%
PLS	2 675	9%	-	0%	2 675	100%
Accession aidée	2 940	10%	-	0%	2 940	100%
Accession libre	10 484	34%	-	0%	10 484	100%
Total logement	27 331	89%	-	0,00%	27 331	100,00%
Commerces/Services	400	1%	-	0%	400	100%
SHON non cédée par l'aménageur						
Logements	2 992	10%		0%	2 992	100%
Commerces/Services	-	0%		0%	-	0%
Total	30 723	1,30%	-	0,00%	30 723	100,00%

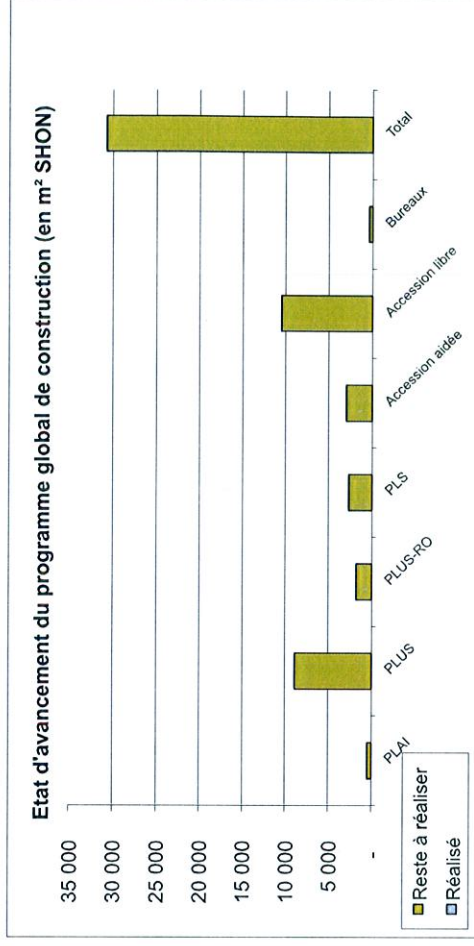

Détail du programme de construction (en nombre de logements)				
Nature du programme	Prévisions recalculées (en nb log) 2013	Etat d'avancement		
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)	
PLAI	8	-	-	8
PLUS	98	-	-	98
PLUS-RO	20	-	-	20
PLS	18	-	-	18
Accession aidée	31	-	-	31
Accession libre	190	-	-	190
Total logement	365	-	-	365
Logements non cédés par l'aménageur	41			41
PLAI ET PLUS	126	-	-	126

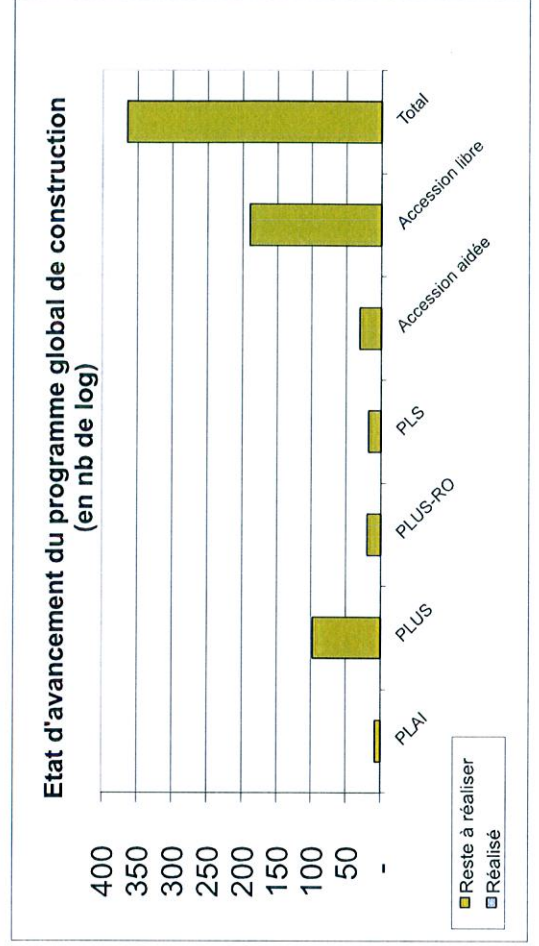

AMBARES ET LAGRAVE - ZAC DU CENTRE VILLE - CRAC 2013 **Programme global de construction échelonné dans le temps**

Etat d'avancement : 4
 Date d'actualisation :

03-avr-14

1 - SHON et nombre de logements cédés par l'aménageur

Détail des produits "logements"																	
Nature du programme		Prév. Rec. 2012 par m² SHON												Vérification total m² SHON		Vérification total nb de logements	
		2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON	2015 : Nb de log	2016 : m² SHON	2016 : Nb de log		
PLAI		-	0	-	0					494,84	8					495	8
PLUS		-	0		0	487	5	2 387	32	1818	23			2 850,00	38,00	7 542	98
PLUS-RO		-	0	-	0	1 819	20									1 819	20
PLS		-	0	-	0					1550	18					1 550	18
Accession aidée		-	0	-	0	612	6			1129	13			1 200,00	12,00	2 940	31
Accession libre		-	0	-	0					4384	49			8 600,00	100,00	12 984	149
Sous-Total logement		-	0	-	0	2 918	31	2 387	32	9 376	111	-	0	12 650,00	150,00	27 331	324
Détail des autres produits																	

Détail des autres produits

Sous-Total logement	27 331	-	0	-	0	2 918	31	2 387	32	9 376	111	-	0	12 650,00	150,00	Vérification m² SHON
Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commerces/Services	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total (1)	27 731	-	0	-	0	2 918	31	2 787	32	9 376	111	-	0	12 650,00	150,00	27 731

2 - SHON et nombre de logements (autres)

Nature du programme	Prév. Rec. 2012 par m² SHON	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON	2015 : Nb de log	2016 : m² SHON	2016 : Nb de log	Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements
Commerces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Logements	2 992	-	-	-	-	-	-	2 992	41	-	-	-	-	-	-	2 992	41
Sous-Total (2)	2 992	-	-	-	-	-	-	2 992	41	-	-	-	-	-	-	2 992	41
TOTAL (1) + (2)	30 723	-	-	-	-	2 918	31	5 779	73	9 376	111	-	-	12 650,00	150,00	30 723	365

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières
