


Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SP et %\*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%
Locatif social	28 250	34%	4 160	15%	24 090	85%
PLAI	8 475	9%	1 248		7 227	
PLUS	19 775	25%	2 912		16 863	
PLS	-	-	-			
Accession sociale	12 276	15%	2 530	21%	9 746	79%
Accession abordable	7 225	9%	2 359	33%	4 866	67%
Accession libre	36 475	43%	4 372	12%	32 103	88%
<b>Sous total logements</b>	<b>84 225</b>		<b>13 420</b>	<b>16%</b>	<b>70 805</b>	<b>84%</b>
<b>Commerces et activités</b>	<b>8 166</b>		<b>2 150</b>	<b>26%</b>	<b>6 016</b>	<b>74%</b>
<b>Total</b>	<b>92 392</b>		<b>15 571</b>	<b>17%</b>	<b>76 821</b>	<b>83%</b>

\* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

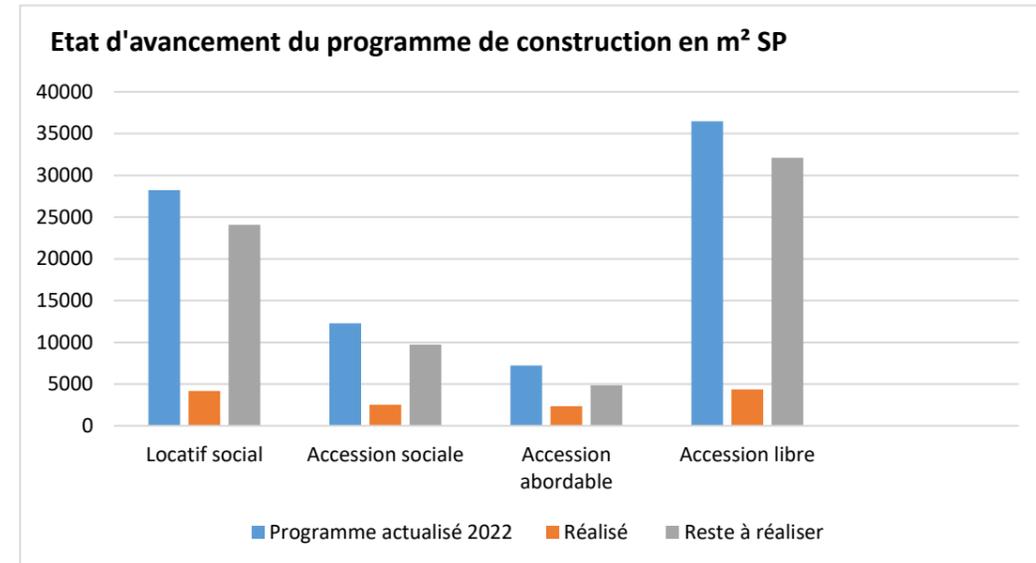

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements\*

Nature du programme	Programme actualisé 2022		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
		%		%		%
Locatif social	401		64	16%	337	84%
PLAI	120		19		101	
PLUS	281		45		236	
PLS	-		-		-	
Accession sociale	169		34	20%	135	80%
Accession abordable	88		23	26%	65	74%
Accession libre	532		70	13%	462	87%
<b>Sous total logements</b>	<b>1 190</b>		<b>191</b>	<b>16%</b>	<b>999</b>	<b>84%</b>

\* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

