

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2024

EYSINES
ZAC Carès Cantinolle

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	4
1.1	Préambule	4
1.2	Cadre juridique de l'intervention	8
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement.....	9
1.4	Programme prévisionnel de constructions	10
1.5	Programme prévisionnel des espaces publics.....	11
2.	Actions menées du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2024	16
2.1	Procédures administratives.....	16
2.2	Etudes.....	16
a)	Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination	16
b)	Mise en œuvre du plan d'actions mobilité.....	16
c)	Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain	16
d)	Etudes environnementales.....	17
e)	Etudes techniques	17
2.3	Démarches foncières.....	17
2.4	Gestion du patrimoine	17
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	18
2.6	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	18
2.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	18
2.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	18
3.	Actions à mener en 2025.....	20
3.1	Procédures administratives.....	20
3.2	Etudes.....	20
3.3	Démarches foncières.....	21
3.4	Gestion du patrimoine	21
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	21
3.6	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	21
3.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	21
3.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	22
4.	Analyse financière	22

4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2024.....	22
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2025.....	23
4.3	Participation du concédant	24
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie.....	25
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	25
5.	Annexes	26

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le site de Carès Cantinolle se situe au nord de la commune d'Eysines sur un secteur traversé par un réseau d'infrastructures urbaines fortement fréquenté (avenue du Médoc et route de Lacanau). Ce secteur se situe en limite des communes du Haillan et du Taillan-Médoc.

Aujourd'hui, ce secteur très routier est en cours de restructuration et requalification fortes avec :

- l'arrivée de la ligne D du tramway et l'implantation du P+R depuis 2020 qui viennent donner un signal fort dans le paysage et accompagner de nouveaux usages en terme de mobilité,
- la ZAC Carès Cantinolle avec l'apport de logements, la requalification et création d'espaces publics, la création d'un gymnase et d'un groupe scolaire,
- le réaménagement du rond-point de Cantinolle pour améliorer les déplacements,
- la requalification de la route du Médoc en avenue plus apaisée.

En terme urbain et paysager, ce site, même s'il est en pleine évolution, reste encore marqué par un paysage peu homogène, des situations urbaines disparates qui font de ce site un lieu peu valorisé (zones commerciales mono fonctionnelles, friches, habitat diffus sans réelle logique d'aménagement) et à la proximité avec le Parc des Jalles peu lisible.

Le travail en cours depuis plus de dix ans, engagé avec la ZAC, mais aussi entre autres avec la desserte de ce secteur par la ligne D du tramway, de la station des Sources jusqu'au terminus au rond-point de Cantinolle, permettent d'envisager une mutation urbaine profonde.

Avec la ZAC, il s'agissait aussi de maîtriser l'urbanisation de manière à protéger la zone des sources de Cantinolle et l'aqueduc du Taillan-Médoc.

Le parti d'aménagement du projet urbain initial, en considération des enjeux métropolitains, développait les principes suivants :

- le respect du « génie du lieu » comme le disait Alexandre Chemetoff, paysagiste, avec la protection et la valorisation des éléments naturels existants : préservation d'un cœur de quartier vert, renforcement de la continuité écologique et de la trame paysagère avec les jalles qui deviennent une valeur pour les logements développés sur ses franges ;
- le respect de l'identité maraîchère de la commune : respect du parcellaire, habitat type « maraîcher » ;
- la recherche d'une intensification urbaine concentrée autour de l'axe de transport en commun, et des voiries existantes ;
- la recherche d'un équilibre entre l'économie globale du projet et la qualité des logements et du cadre de vie : limitation de la création de voies et de réseaux nouveaux, un habitat qualitatif parfaitement intégré et offrant des capacités évolutives, utilisation de l'aplomb de la ligne à haute tension (ligne 225 KV) pour les stationnements... ;
- une logique de projet opportuniste avec un développement en fonction des disponibilités du foncier ;
- l'apport de nouvelles fonctions dans la zone d'activités de Cantinolle ;
- des typologies de logements adaptées au contexte urbain et paysager pour une intervention en finesse.

Ce parti d'aménagement doit aujourd'hui s'adapter à de nouveaux enjeux et au regard du retour d'expériences sur les deux premiers îlots et les espaces publics livrés. Aujourd'hui, le projet validé dans

le cadre de la modification du dossier de réalisation (délibération n°2025-160 du 4 avril 2025) est en lien avec les enjeux suivants :

- une histoire de sol et d'eaux en recherchant ***une exemplarité de la gestion de l'eau en lien avec la spécificité de ce quartier situé en majeure partie dans la zone de captage des Sources de Cantinolle*** ;
- l'organisation d'***un quartier composite autour de plusieurs lieux de rencontres et d'activités en créant des continuités inter-îlots et avec le tramway*** ;
- ***faire quartier dans l'entre-ville*** en maillant finement, en hiérarchisant, en qualifiant les différents itinéraires et en développant des lieux de rencontre autour de placettes et de causettes (petits lieux de rencontre) ;
- ***déjouer l'insularité en recomposant et en liaisonnant pour retrouver la petite échelle dans chaque secteur de projet et en lien avec l'espace naturel de Carès*** ;
- ***améliorer la lisibilité du paysage existant et localiser les espaces à préserver***. Il s'agira de lier et mailler ce patchwork d'espaces naturels et paysagers par une trame paysagère qui structurera le quartier tout en étant attentif à la préservation des corridors écologiques, des habitats en lisières des îlots ou des fossés accueillant des espèces remarquables et protégées.

Une ZAC avec deux secteurs aux identités spécifiques

La ZAC Carès Cantinolle, dont le nom lui-même témoigne d'une juxtaposition de deux secteurs, a composé avec un paysage fragmenté et hétéroclite une opération multisites. Elle offre encore un paysage en transition, avec des secteurs récemment livrés, qui pour certains affirment une urbanité forte, des secteurs qui vont entrer en chantier et d'autres encore non aménagés.

Secteur de Cantinolle

Le secteur de Cantinolle est caractérisé par une articulation entre la zone commerciale et l'espace naturel de Carès.


La zone commerciale se distingue par ses bâtiments en tôle, souvent désignés comme des « boîtes à chaussures », ses infrastructures routières imposantes et ses étendues de parkings. La mutation du paysage d'entrée de ville en cours propose d'introduire une mixité des formes urbaines, d'améliorer l'accessibilité aux transports en commun, avec le tramway et son parc-relais, et d'apporter une qualité architecturale et paysagère au quartier. En termes de mobilité, on observe un développement à deux vitesses : d'une part, l'arrivée du tramway facilite l'accès aux transports en commun et au cœur de Bordeaux, d'autre part, le réaménagement des infrastructures routières renforcent l'accessibilité et la sécurité depuis les portes du Médoc, avec notamment le réaménagement du carrefour Cantinolle et le passage à une 2x2 voies sur la route de Lacanau.

Un territoire paysager caractérisé par des entités paysagères distinctes. Au nord, les jalles et sa plaine maraîchère se déploient. A l'ouest, les sources de Cantinolle, se trouve un secteur de ressource en eau potable pour la Métropole, avec un périmètre de captage et un aqueduc traversant le secteur. Au sud, l'espace naturel de Carès, ancien territoire agricole, conserve encore des vestiges de son passé agricole (fossés, bâti, vignes...).

Les îlots nommés dans le dossier de réalisation de la ZAC C1 à C4 sont implantés dans ce secteur.

- L'îlot C1 nommé désormais « L'Esprit des Jalles » : 133 logements, livré en 2022
- L'îlot C2, 40 logements, situé sur l'emplacement du parking du Super U, aujourd'hui abandonné et qui dans le cadre de la modification a été supprimé.

- L'îlot C3 nommé désormais « Médoc » bénéficie du déplacement du magasin Point-P vers l'emplacement du Dispano pour mener une opération de construction de logements
- L'îlot C4 nommé désormais « Les Lisières » s'intègre dans l'espace naturel de Carès. Il accueille le gymnase et le groupe scolaire.

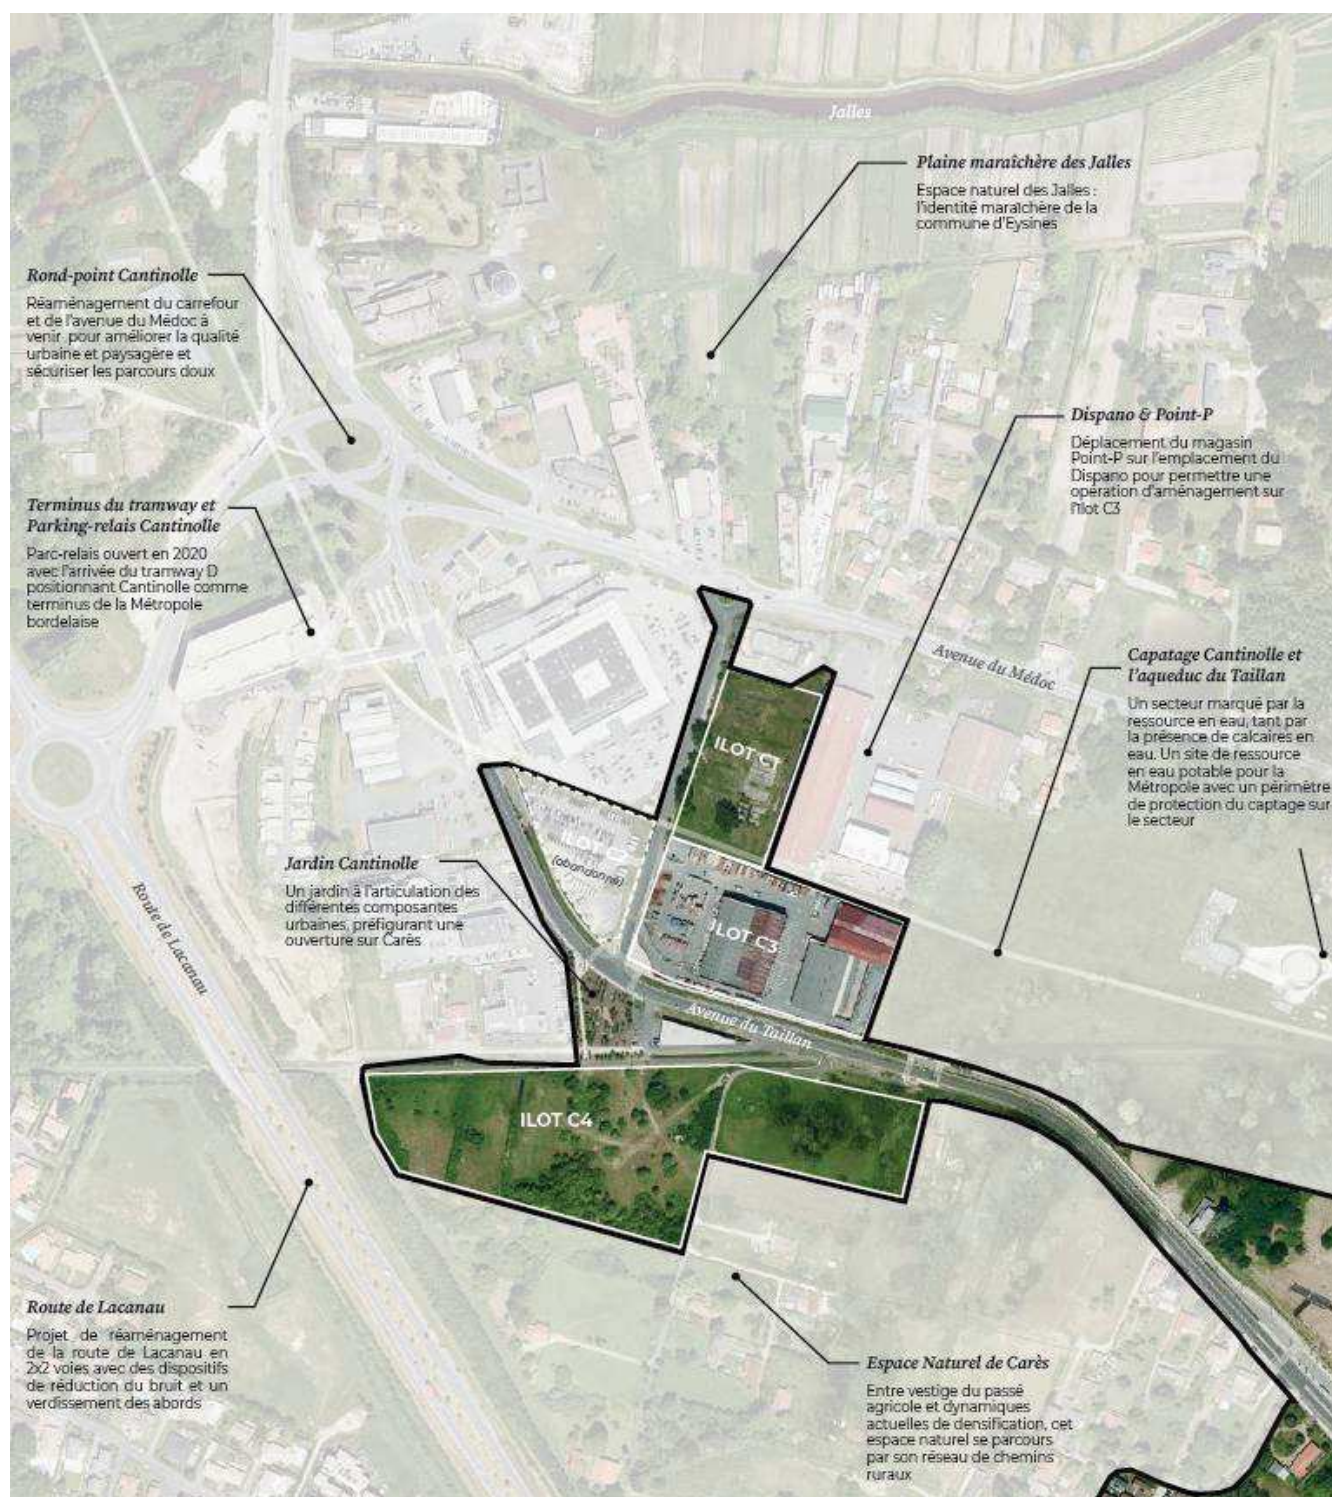

Secteur Carès


Le secteur de Carès se trouve entre le prolongement du centre-bourg d'Eysines et l'espace naturel de Carès, offrant un contraste entre urbanisation et nature.

Le secteur se caractérise par son lien avec un tissu constitué d'habitat pavillonnaire, en extension du centre-bourg d'une part, et de l'autre, par un ancien site rural témoignant d'un passé rural avec ses parcelles étroites, ses maisons isolées et des chemins ruraux, aujourd'hui en grande partie fermés.

L'Espace Naturel de Carès, composé de propriétés privées, a été récemment occupé illégalement puis nettoyé, créant une réticence à l'idée de rouvrir ces chemins ruraux aux véhicules.

Trois îlots, dont un déjà construit « Les Longères de Carès » (îlot C6, 40 logements) et deux en cours de montage, se déploient à l'articulation entre ces deux milieux, adoptant une morphologie mixte de petits collectifs, bâtiments intermédiaires et d'habitats individuels. Cette densification urbaine a pour objectif de faire couture avec le tissu pavillonnaire existant et l'Espace Naturel de Carès. L'objectif est aussi de dialoguer en terme urbain et paysager avec le secteur de Cantinolle qui affirme une intensité plus forte.

Concernant les rues de ce secteur, il est à préciser qu'elles ne sont plus destinées uniquement aux véhicules, elles deviennent un espace apaisé et agréable à parcourir. Le stationnement est réfléchi comme un espace paysager et reste à une certaine distance des habitations. Les rues Martin Porc et Bertrand Triat ont fait l'objet de travaux de requalification avec un apport paysager très fort et la mise en place de cheminements doux agréables et sécurisés. Ces aménagements ont permis de préparer l'arrivée des futurs habitants et de rendre le quartier plus agréable aux habitants déjà présents.

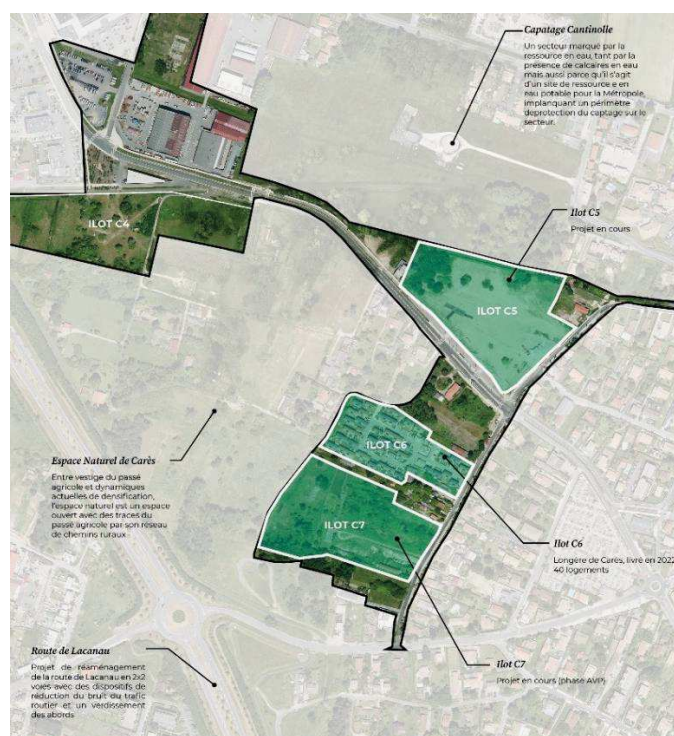

Au cœur du site, un espace naturel dit « l'Espace Naturel Carès »

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle mais en dehors du périmètre de la ZAC, l'espace naturel dit « Espace Naturel Carès » ne connaît pas d'intervention par l'aménageur. C'est un espace fédérateur, élément fondamental du projet, jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement. Il fait l'objet d'un projet paysager spécifique sous la responsabilité de la Ville d'Eysines et de Bordeaux Métropole.

Les interstices, un nouvel élément intégré dans le projet


Les îlots de la ZAC formant des enclaves, quatre stratégies ont été mises en place visant à reconstituer la petite échelle et du lien dans le secteur de Carès.

Ces interstices non intégrés initialement constituent une adaptation du projet au regard de l'évolution du site. Ils sont intégrés dans le dossier de modification de la ZAC.

Ils entraînent le déploiement de nouvelles stratégies d'aménagement :

- Subdiviser les îlots, en diversifiant les modes d'habiter, les ambiances, les formes architecturales et les matériaux utilisés.
- S'ouvrir aux bords, en adressant les constructions et liaisons douces sur les abords de l'îlot, favorisant les connexions entre les îlots et l'Espace Naturel de Carès.
- Investir les interstices, les espaces entre les îlots, avec des projets à petite échelle réintroduisant une variété d'échelle dans le tissu urbain.
- Créer des chemins de traverses, des voies permettant de liaisonner les îlots entre eux, créant ainsi des porosités à anticiper dans les projets à venir. Ils favorisent aussi les échanges à l'échelle du quartier.

La mise en œuvre de ces stratégies a permis d'identifier plusieurs sites potentiels de projet au sein de la ZAC, suscitant une réflexion sur les interstices qui sont devenus de nouveaux îlots.

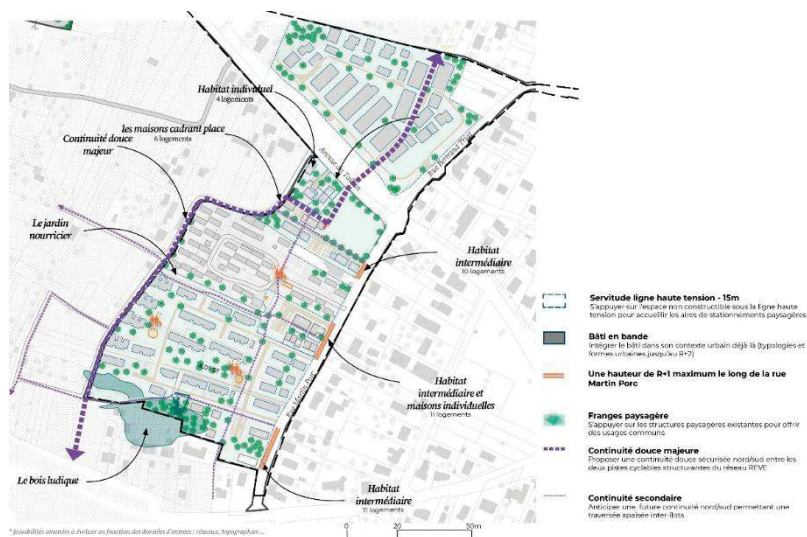

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n° 2015/0583 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,

- le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,
- le dossier de création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines,
- le programme prévisionnel de construction de la zone.

Par délibération n° 2016/029 du 22 janvier 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le dossier de réalisation de la ZAC Carès Cantinolle,
- le programme des équipements publics,
- le traité de concession confiant la conduite de l'opération à La Fab,
- la délégation de l'exercice du droit de préemption à La Fab dans le périmètre de la ZAC,
- le montant de la participation métropolitaine à l'opération d'aménagement.

Le traité de concession « Eysines ZAC Carès Cantinolle » a été notifié à l'aménageur le 13 avril 2016 pour une durée de 15 ans.

Par délibération n° 2017-835 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le Compte-Rendu Financier et d'Activités (CRFA) 2016 et l'avenant n° 1 au traité de concession portant sur la répartition des participations financières, suite à une modification de la répartition des compétences entre Bordeaux Métropole et la Ville d'Eysines.

Par délibération n° 2018-746 du 30 novembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2017 et l'avenant n° 1 de la convention d'avance de trésorerie.

Par délibération n°2019-726 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2018 et l'avenant n°2 au traité de concession portant sur l'intégration d'une participation financière de la ZAC à l'enfouissement des lignes aériennes basse tension et télécom sur les rues Martin Porc et Bertrand Triat et autorisant La Fab à gérer les trésoreries fusionnées des opérations sur un compte bancaire unique .

Par délibération n°2020-328 du 23 octobre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2019.

Par délibération n°2021-435 du 23 septembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2020.


Par délibération n°2022-599 du 24 novembre 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2021.

Par délibération n°2023-517 du 1^{er} décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2022 et l'avenant n°3 au traité de concession pour faire évoluer la participation du concédant au regard de la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques.

Par délibération n°2024-483 du 26 septembre 2024, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2023.

Par délibération n°2025-160 du 4 avril 2025, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le dossier de modification de la ZAC et l'avenant n° 4 au traité de concession portant sur l'augmentation de la participation du concédant en lien avec la modification du dossier de réalisation de la ZAC.

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement

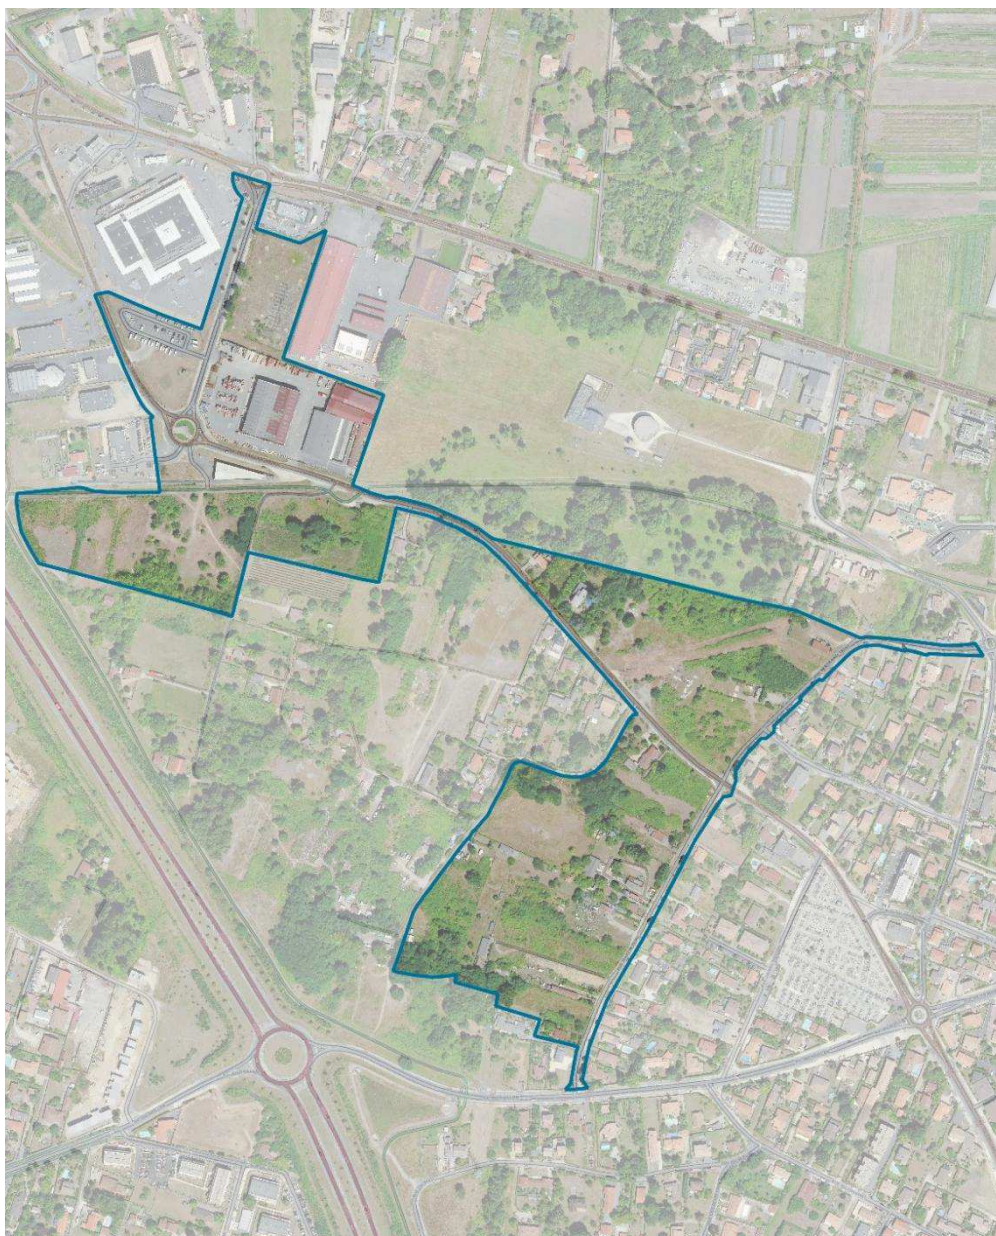

1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global initial des constructions fixait la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 52 000 m² environ pour les logements et 3 000 m² environ pour les commerces, services et activités. Dans le cadre de la modification du dossier de réalisation, il connaît une évolution et prévoit désormais la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à environ 45 760 m² de SDP pour les logements soit environ 666 logements, 616 m² pour les commerces et 6 400 m² pour les équipements publics.

Il convient de préciser que l'accès social n'est désormais proposée que sous la forme du BRS.

Concernant les prix de sortie pour le libre, il n'est pas demandé d'objectifs plafond. Les prix dépendent des prix du marché.

Concernant les typologies, la programmation prévoit une diversité de produits allant du T1 au T5.

La répartition initiale par typologie de logements était la suivante :

		m ² SDP	Nombre de logements
Logements en locatif social	30%	15 600	225
Logements en accession sociale ou abordable	35%	18 200	262
Logement libre	35%	18 200	263
	100%	52 000	750

Des locaux destinés à l'accueil des commerces ou de services étaient prévus en rez-de-chaussée dans le secteur de Cantinolle sur les îlots C1, C2 et C3 pour une surface de 3 000 m².

La nouvelle répartition programmée est la suivante :

		m ² SDP	Nombre de logements
Logements en locatif social	31%	14 352	198
Logements en accession sociale (PSLA)	4%	2 022	20
Logements en BRS	24 %	10 665	165
Logements en abordable	4%	1 983	24
Logement libre	37%	16 738	259
Total	100%	44 938	666

Des locaux destinés à l'accueil de commerces ou de services sont envisagés en rez-de-chaussée de l'îlot Médoc (ancien C3). Il est prévu une surface d'environ 500 m² visant en priorité l'installation d'un lieu de vie (brasserie, salon de thé ou toute autre activité permettant aux habitants de se retrouver). Une partie aussi de cette programmation pourra accueillir des activités en lien avec les besoins des habitants et des usagers du quartier.

1.5 Programme prévisionnel des espaces publics

L'aménagement de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines nécessite la réalisation échelonnée dans le temps d'un programme des équipements publics composé principalement de voies et d'espaces publics. Il a connu aussi une évolution dans le cadre du dossier de modification de la ZAC.

Ce programme comprend deux types d'équipements publics :

- Ceux en infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur,
- Ceux en infrastructure ou en superstructure qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

a) Les équipements publics d'infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Les principes d'aménagement initiaux des espaces publics

Le site est marqué par une forte présence d'infrastructures. Les axes de transport, qu'ils soient hydrauliques ou associés à la mobilité, irriguent et ouvrent le territoire tout en le fragmentant.

Les axes routiers agissent comme une limite au nord et au sud de Carès Cantinolle. Assurant la connexion du site au grand territoire, ils imposent un statut d'entrée de ville fonctionnelle. Dédiées principalement à la voiture, ces routes laissent peu de place aux piétons et aux modes actifs.

Le site est également traversé par un aqueduc enterré, imposant des servitudes et limitant le franchissement souterrain.

Le tracé de l'ancienne voie ferrée a été réhabilité en piste cyclable, constituant un axe principal à l'échelle métropolitaine et est identifié dans le schéma Réseau Express Vélo (REVE).

Depuis 2020, le tramway traverse le site jusqu'à Cantinolle, faisant du site un terminus.

Le projet Carès Cantinolle ambitionne de transformer ces espaces purement fonctionnels en des espaces publics permettant de développer d'autres usages et fonctions (mobilités actives, jeux, espaces verts, lieux de promenade ...).

Un travail a donc été engagé prioritairement sur la requalification des voiries existantes : rue Martin Porc, rue Bertrand Triat et l'allée de l'Europe. Ce réaménagement est aujourd'hui terminé et a déjà permis d'apaiser les circulations, de végétaliser le site et de développer les modes actifs.



© P. Filiquet - rue Martin Porc



© Olivier Panier des Touches – allée de l'Europe

Dans la poursuite de cette volonté de rendre le site plus agréable à vivre, le Jardin de Cantinolle a été aménagé. Cet espace, ancien parking imperméabilisé, a été complètement paysagé et crée aujourd'hui un îlot vert dans le quartier. Dans le cadre de la poursuite du développement du site, il a vocation à devenir un lieu de centralité liant les différents secteurs sur Cantinolle.



© P. Filiquet Jardin de Cantinolle

1.1.Des espaces publics nouveaux intégrés dans le cadre de la modification du dossier de réalisation

Dans le cadre de la modification, de nouveaux espaces publics ont été intégrés au Programme des Equipements Publics : une voie nouvelle, une frange urbaine et un corridor paysager en lien avec l’îlot les Lisières (ancien C4), deux traverses en lien avec l’Esprit des Jalles et l’îlot Médoc (ancien C3) et une venelle entre les Longères de Carès et le Jardin de Carès (ancien îlot C7).

Le tableau ci-après permet de récapituler les espaces publics prévus au Programme des Equipements Publics initial et ceux à venir intégrés dans le cadre de la modification.

Espaces Publics prévus au PEP		
	Statut	Phasage
Rue Martin Porc	Requalification	Réalisée
Rue Bertrand Triat	Requalification	Réalisée
Allée de l’Europe	Requalification	Réalisée
Jardin de Cantinolle	Création	Réalisé
Place de l’Europe	Création	2026
Nouveaux Espaces publics		
	Statut	Avancement
Voie Nouvelle	Création	2026
Frange Urbaine	Création	2026
Corridor Paysager	Création	2027

Le Gymnase

La Ville assure la maîtrise d'ouvrage du futur gymnase. L'objectif est la réalisation d'une salle de sports polyvalente, homologuée pour les compétitions de hand-ball, soit un ensemble de 1 850 m² environ, hors Voirie Réseaux Divers (VRD) (dont parking), plantations et abords.

Ce gymnase se situera dans la ZAC Carès Cantinolle au sein de l'îlot Les Lisières (îlot C4).

En 2023, la Ville a lancé un concours pour désigner une équipe de concepteurs pour ce gymnase. Elle a choisi l'agence d'architecture Hessmafar et Véron. **L'objectif de la Ville est de déposer un Permis de Construire au 1^{er} semestre 2025.**

Les équipements scolaires

Les besoins de création de classes estimés afin de répondre aux futurs besoins des habitants de la ZAC sont de **7 classes neuves**. La Ville d'Eysines a déjà construit 4 classes dans le cadre d'un groupe scolaire situé dans le centre-bourg. Les trois autres classes à venir seront construites dans un nouveau groupe scolaire qui sera implanté dans l'îlot Les Lisières (C4).

La ligne à haute tension

Le site est traversé par un réseau Très Haute Tension (THT). Les deux lignes concernées sont des lignes de 225 KV reliant Bruges à Eysines et 63 KV reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles.

La ligne 225 KV qui longe les rues Martin Porc et Bertrand Triat, de par sa puissance, ne sera pas enterrée. Si elle était enfouie, il serait nécessaire de mettre en place un système de refroidissement par huile qui serait techniquement compliqué au regard de la proximité avec la zone de captage et très impactant financièrement. Cette ligne a donc été intégrée comme un élément de contrainte avec lequel il faut faire le projet.

En revanche, la ligne reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles, ligne 63 KV pouvait être enterrée avec moins de contraintes techniques et financières. Une convention tripartite entre Rte, la Ville d'Eysines et Bordeaux Métropole, a permis à Rte de mener une étude sur son enfouissement. Au regard des conclusions, il a été décidé de poursuivre les études opérationnelles.

En 2019, Rte, La Fab et la Ville d'Eysines ont signé une convention de travaux permettant de démarrer l'enfouissement jusqu'au pylône 12 et non 11 comme prévu initialement.

Depuis août 2021, la ligne aérienne a été déposée et la ligne souterraine a été mise en service.

Les cheminements doux au cœur de l'Espace Naturel de Carès

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle, l'espace naturel Carès est un lieu fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement.

Ce site fait donc l'objet d'un projet paysager spécifique qui est en dehors du bilan de la ZAC et porté par la Ville et Bordeaux Métropole.

La volonté est de redonner à cet espace sa vocation d'espace naturel. Il n'est pas prévu une maîtrise foncière totale du site. Le projet se développe autour de la réouverture des chemins ruraux sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole, de l'entretien et de l'animation des parcelles publiques et éventuellement privées par le biais de convention de gestion. Le projet ne fait pas l'objet d'un dessin figé d'où l'expression d'un « projet en mouvement ». Il se révélera progressivement au gré des opportunités.

Bordeaux Métropole (Pôle Territorial Ouest) a initié une phase d'études préliminaires sur ces chemins. En 2022, Bordeaux Métropole a réaménagé une partie du chemin des Gleyzes pour l'ouvrir aux modes actifs.

2. Actions menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024

2.1 Procédures administratives

La Fab a engagé la préparation du dossier de modification de la ZAC et a présenté les éléments de projet et financiers à Bordeaux Métropole lors d'un Comité de Projet en date du 18 décembre 2024.

Concernant le foncier à maîtriser par l'aménageur, la publication des trois ordonnances d'expropriation obtenues au profit de La Fab ont toutes été publiées auprès du service de la publicité foncière de Bordeaux. Il n'y a donc plus de procédure en cours.

2.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La Moeu a finalisé la mise à jour du plan guide ainsi que du cahier de prescriptions. Elle a proposé des faisabilités sur les îlots Médoc et Lisières qui ont été validées au COPIL de mars 2024.

Elle a engagé sur les espaces publics les études préliminaires concernant la place de l'Europe (prévue au Programme des Equipements Publics) et les nouveaux ouvrages inclus dans le cadre du dossier de modification de la ZAC : voie nouvelle de desserte de l'îlot Lisières, venelles...

Elle a accompagné la préparation des Permis de Construire du gymnase, des îlots Triat, Jardin de Carès et des Sources.

Elle a rédigé les fiches de lots des îlots Médoc (C3) et Lisières (C4).

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Dans la poursuite de son accompagnement à l'échelle de tous ses projets sur les sujets mobilité/stationnement, La Fab a engagé des actions en vue d'accompagner l'arrivée des habitants.

Les ateliers avec les habitants se sont poursuivis. Deux actions ont été développées : une expérimentation d'un prêt de vélo pendant trois mois avec un suivi personnalisé d'avril à juin 2024 ainsi qu'un atelier visant à créer une communauté mobilité au sein de la Résidence L'Esprit des Jalles pour échanger sur les bonnes pratiques et créer une dynamique collective.

Un travail a été poursuivi avec Bordeaux Métropole pour essayer d'adapter les horaires du P+R aux demandes des habitants éventuellement intéressés par la possibilité d'y stationner leur véhicule.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

L'équipe de médiation a organisé deux soirées de projections sur les terrasses de l'Esprit des Jalles (C1) issues de balade sur site et d'échanges avec les habitants et usagers.

Ces deux soirées ont été l'occasion de favoriser un échange entre les habitants, de réfléchir à des actions d'appropriation des terrasses collectives et de discuter sur les difficultés rencontrées cette première année d'emménagement.

La deuxième soirée a été organisée le même jour que la remise des vélos dans le cadre de la démarche mobilité.

Dans le cadre du suivi photographique mené sur l'ensemble des opérations de La Fab, le photographe missionné sur la ZAC est intervenu lors d'une des soirées de projections et lors de la remise des vélos pour prendre des photos de ces actions.

d) Etudes environnementales

La Fab a engagé le dossier CNPN avec un objectif de dépôt auprès de l'Autorité Environnementale prévu pour 2025. Envolis a présenté les impacts de la ZAC sur les espèces protégées. La Fab a missionné Envolis pour trouver des terrains de compensation.

Envolis a aussi réalisé une mission hydraulique afin de mieux comprendre le fonctionnement du site dans le cadre d'un éventuel dossier Loi sur l'Eau mais aussi dans une démarche vertueuse de restauration du cycle de l'eau via la remise en état de fossés devant être conservés dans l'îlot Les Lisières.

e) Etudes techniques

Les études techniques se sont poursuivies avec des échanges avec l'ARS et un avis rendu par l'hydrogéologue agréé.

Le géomètre a été missionné afin d'approfondir les connaissances en termes de propriétés foncières et de nivellement.

2.3 Démarches foncières

Dans le cadre du dossier de réalisation initial, hormis la dernière emprise située sur le site de Point P pour laquelle des négociations amiables sont engagées, La Fab a finalisé les dernières acquisitions, par voie amiable ou par voie d'expropriation, des fonciers privés nécessaires à la réalisation des espaces publics et des îlots sous maîtrise foncière de l'aménageur de la ZAC, y compris la maison d'habitation située sur l'îlot C7 renommé Le Jardin de Carès.

La Fab a également finalisé l'acquisition des fonciers métropolitains situés dans l'îlot Le Jardin de Carès.

Dans le cadre du dossier de modification de la ZAC, de nouveaux fonciers nécessaires à la réalisation de nouveaux îlots sur le secteur Carès ont été identifiés afin d'être acquis par La Fab.


2.4 Gestion du patrimoine

La Fab a poursuivi la gestion des terrains non bâtis et a procédé à des travaux d'entretien en particulier sur l'îlot Le Jardin de Carès (C7) en fonction des besoins et de l'état des sites.

Le choix a été fait de laisser la végétation envahir l'îlot Les Lisières rendant ainsi le site difficilement accessible, afin d'éviter tout risque d'installation de caravanes.

La maison dans l'îlot Le Jardin de Carès est restée sous vidéosurveillance jusqu'à sa démolition.

Concernant la démolition de la maison d'habitation située dans Le Jardin de Carès (C7), les différentes démarches préalables ont été engagées : Permis de Démolir, diagnostics réalisés, devis pour consigner les réseaux en cours...

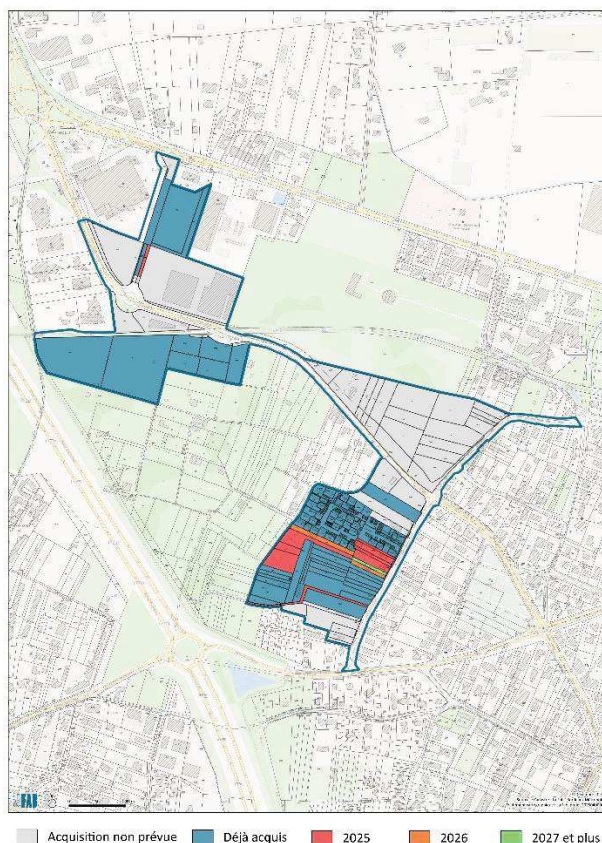

2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur

Il n’y a pas eu de travaux en 2024. Les ouvrages Martin Porc et allée de l’Europe ont été remis à Bordeaux Métropole et à la Ville concernant l’éclairage public.

2.6 Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d’ouvrage de l’aménageur


La Ville a lancé en février le concours sur le gymnase afin de désigner une équipe de Moe à l’été 2024 et d’engager les phases esquisse et AVP.

Il n’y a pas eu d’actions sur l’Espace Naturel de Carès.

2.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n’y a pas eu de cessions de charges foncières en 2024.

2.8 Accompagnement des projets immobiliers

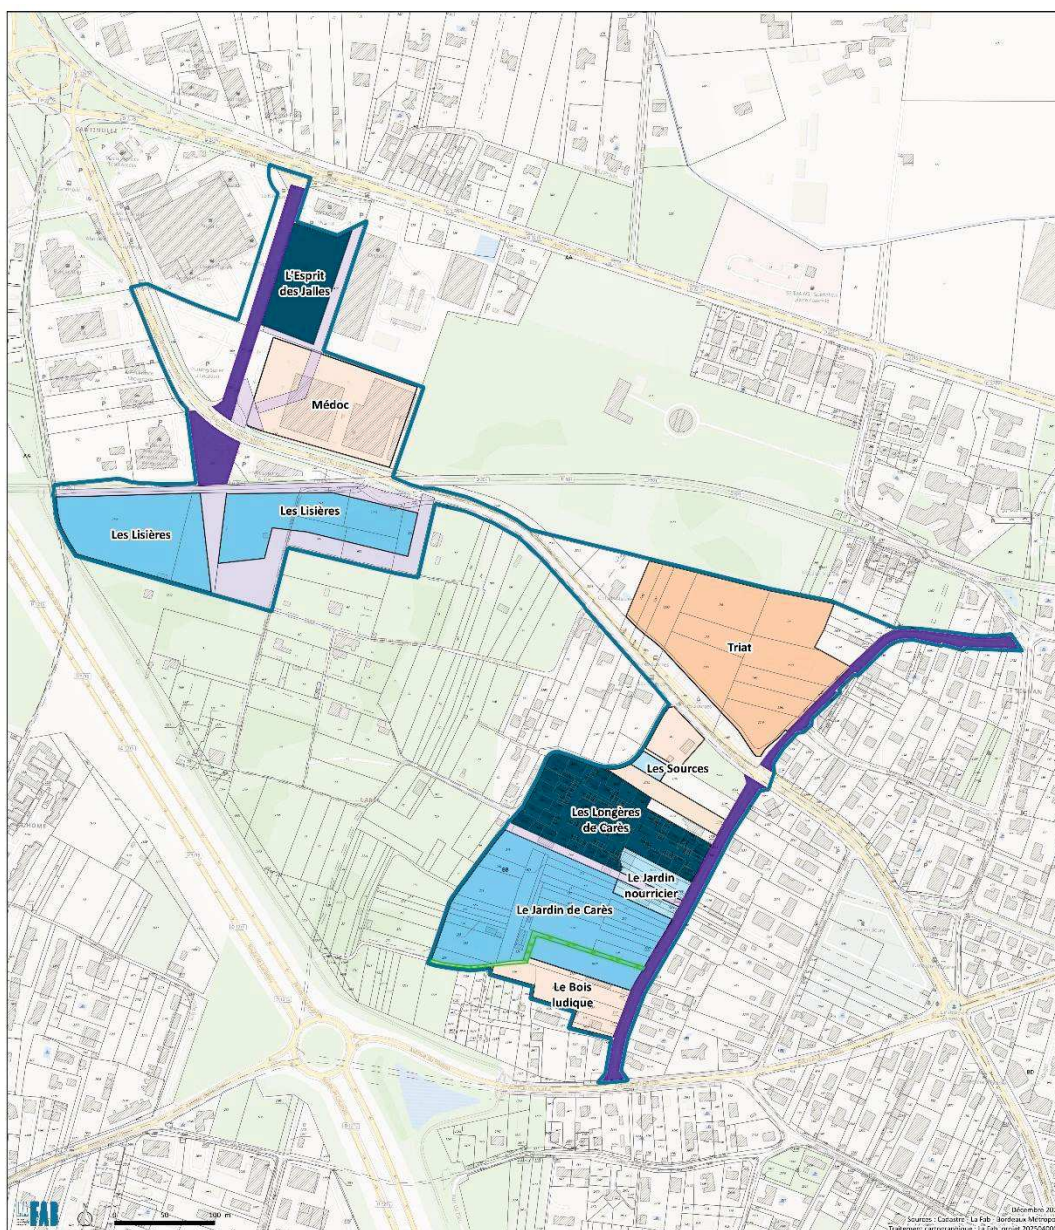

Ilots La Fab (cessions charges foncières)	Ilots opérateurs (acquisitions en direct)	ESPACE ET ÉQUIPEMENT PUBLICS	DÉCLASSEMENT
Ilots réalisés	Ilots réalisés	Livré	Déclassement en cours
Ilots en travaux	Ilots en travaux	En cours de réalisation	
Ilots en préparation	Ilots en préparation	À réaliser	
Ilots non engagés	Ilots non engagés		

a) Îlot C1 dit îlot témoin Cantinolle « L'Esprit des Jalles »

Crédit Agricole Immobilier a procédé aux travaux de compensation et les a remis à La Fab après validation de Bordeaux Métropole.

b) Îlot Médoc (C3)

La nouvelle équipe de coordination et MOE a proposé une nouvelle faisabilité sur cet îlot et une fiche de lot.

Un travail a été engagé avec Saint-Gobain Immobilier et les opérateurs désignés (Vinci/Eiffage Immobilier) afin de choisir des concepteurs pour cet îlot.

c) Îlot Les Lisières (C4)

L'intégration d'un gymnase et d'un groupe scolaire a nécessité une reprise des faisabilités et une diminution du nombre de logements prévus par le Programme Général de Construction de la ZAC.

L'intégration de ces deux équipements a aussi nécessité de revoir le programme des équipements publics car une voie de desserte est nécessaire pour accéder aux équipements publics et des cheminements piétons/vélos paysagers sont aussi nécessaires.

d) Îlot Triat (C5)

Les ateliers de préparation du PC se sont déroulés tout au long de l'année et ont abouti au dépôt d'un PC en fin d'année par Aquitanis.

e) Îlot Le Jardin de Carès (C7)

Les ateliers de préparation du PC se sont déroulés avec Le Col, Sobrim et Gironde Habitat mais ils ont dû être interrompus au regard des difficultés à financer ce projet.

f) Îlot Les Sources

Un PC a été déposé par un opérateur nommé Ravi pour 3 maisons et une réhabilitation sur l'îlot A des Sources.

3. Actions à mener en 2025

3.1 Procédures administratives

Bordeaux Métropole approuvera en date du conseil du 4 avril 2025 le dossier de modification de la ZAC et l'avenant n°4 au Traité de Concession.

Les ordonnances d'expropriation ayant été publiées, La Fab procédera avec le Pôle Territorial Ouest à la rétrocession des fonciers concernés par les espaces publics des rues Martin Porc et Triat et de l'allée de l'Europe.

La Fab déposera auprès de la DREAL un dossier de demande de dérogation espèces protégées dit CNPN sous réserve d'avoir trouvé des fonciers de compensation.

3.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La Moeu rendra les études préliminaires, les phases AVP et PRO/DCE pour les espaces publics de la ZAC et participera à la consultation des entreprises pour réaliser les travaux.

Elle poursuivra le travail d'accompagnement sur le gymnase avec un visa sur le PC, un accompagnement sur le PC de l'îlot Triat pendant la phase d'instruction, un accompagnement d'un PC dans l'îlot Des Sources (visa/suivi instruction) et la préparation du PC de l'îlot Le Jardin de Carès.

Elle accompagnera aussi la préparation du PC sur l'îlot Médoc et le déplacement du Point P sur le foncier accueillant actuellement Dispano (qui est déplacé au Haillan).

Suite aux échanges avec le SDIS et les concessionnaires, elle proposera une nouvelle faisabilité sur la partie logement de l'îlot Les Lisières.

La Fab missionnera un OPCIC chargé de planifier l'ensemble des actions en lien avec les travaux à venir.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Un nouvel atelier sera organisé avec les habitants pour évaluer les actions menées et leur impact sur leur motorisation et déplacement. Ce temps permettra aussi d'informer les habitants du nouveau dispositif mis en place pour stationner son véhicule dans le P+R (horaires élargis, paiement possible en plusieurs fois...).

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

Un nouveau marché médiation sera lancé.

d) Etudes environnementales

La Fab poursuivra la recherche de terrains de compensation et déposera un dossier de demande de dérogation auprès de la DREAL si les terrains de compensation sont trouvés.

e) Etudes techniques

Les études techniques se poursuivront dans le cadre de la mission des espaces publics :

- Le géomètre poursuivra ses missions de piquetage, bornage et division parcellaire.
- La Fab fera les démarches auprès d'Enedis et d'Orange pour déplacer les lignes aériennes présentes sur le site des Lisières et pour déplacer le transformateur présent sur site.

3.3 Démarches foncières

La Fab finalisera l'acquisition des fonciers de la ville et de l'ancien chemin rural suite à son déclassement situés dans l'îlot Le Jardin de Carès.

En fonction du départ du Dispano, La Fab préparera l'acquisition de l'emprise située sur le site actuel du Point P.

La Fab mènera des négociations amiables auprès des propriétaires dont les fonciers ont été identifiés pour les nouveaux îlots et espaces publics sur le secteur Carès.

3.4 Gestion du patrimoine

La Fab poursuivra la gestion des terrains non bâtis et procèdera à des travaux d'entretien en fonction des besoins et de l'état des sites.

La maison dans l'îlot Le Jardin des Sources restera sous vidéosurveillance jusqu'à sa démolition.

Démolition

La Fab réalisera la démolition de la maison au second semestre 2025.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Il n'y aura pas de travaux en 2025.

3.6 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

La Ville déposera le PC pour le gymnase et désignera des entreprises pour réaliser les travaux de construction.

Il n'y aura pas d'actions sur l'Espace Naturel de Carès.

3.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n'y aura pas de cessions foncières.

3.8 Accompagnement des projets immobiliers

a) Îlot « Esprit des Jalles » (C1)

Un travail sera engagé avec l'architecte du projet et le conseil syndical pour mettre en place des clôtures adaptées.

b) Îlot Médoc (C3)

Les opérateurs désignés Eiffage Immobilier et Vinci, La Fab, BM et la Ville désigneront un duo d'architectes pour concevoir le projet.

Un travail sera aussi partagé avec Saint Gobain Immobilier et Point P pour la requalification du site du Dispano qui doit accueillir le Point P.

c) Îlot Les Lisières (C4)

Un travail d'atelier se poursuivra avec la Ville pour le projet du gymnase. La moe émettra un avis préalablement au dépôt du PC.

Une nouvelle faisabilité sera proposée sur la partie logement afin de répondre aux enjeux du SDIS et aux retours des concessionnaires.

d) Îlot Triat (C5)

Des ateliers se poursuivront pendant la phase de pré-instruction afin de poursuivre la préparation des étapes à venir (DCE) et une réunion de présentation du projet aux riverains sera organisée le 20 mars.

e) Îlot Jardin de Carès (C7)

Des échanges se dérouleront entre La Fab et les maitres d'ouvrage de l'îlot afin de partager des pistes de sortie de cet îlot. Cet îlot est aujourd'hui bloqué pour des raisons économiques.

La DRAC informera La Fab de la nécessité de mener sur une partie du site un diagnostic archéologique.

f) Îlot Des Sources

Un PC sera délivré pour un premier projet de maisons sur une partie de l'îlot.

Des ateliers seront organisés avec un autre porteur de projet pour des logements en BRS (L'Abri Familial).

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2024

■ Les dépenses pour l'année 2024 correspondent à :

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Médiation
 - ✓ Etudes faune et flore
 - ✓ Etudes et accompagnement sur la mobilité
 - ✓ Etudes techniques

Le poste « études générales » représente 334 250 € TTC.

- Foncier :
 - ✓ Acquisition de fonciers
 - ✓ Frais liés aux acquisitions et aux indemnités

- ✓ Frais liés à la gestion
- ✓ Assistance juridique
- ✓ Fouilles archéologiques
- ✓ Etudes démolition

Le poste « foncier » représente 1 217 965 € TTC.

- Frais d'aménagement :
 - ✓ Entretien des espaces verts
 - ✓ Travaux
 - ✓ Maitrise d'œuvre et coordonnateur SPS

Le poste « frais d'aménagement » représente 37 617€ TTC

- Participation équipements publics :
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension. Il s'élève à 75 000 € TTC.

Honoraires de concession :

- Rémunération forfaitaire annuelle d'un montant de 120 000 € TTC

Frais de communication :

- Ses frais s'élèvent à 3 696 € TTC

Frais divers :

- Ses frais représentent un montant de 10 507 € TTC dont 10 507 € de redevance archéologique

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 1 659 034 € TTC.

■ **Les recettes pour l'année 2024 correspondent à :**

- Charges foncières : pas de cession de Charges Foncières
- Participations constructeurs : pas de participation constructeur
- Subventions : 167 488 € (Fonds National d'Archéologie Préventive et AMI Transformation des zones commerciales)
- Participation métropolitaine : pas de participation métropolitaine
- Participation communale : 30 000 € TTC
- Produits divers : Les produits financiers dus à une trésorerie positive d'un montant de 32 431 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 229 919 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2025

■ **Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2025 correspondent à :**

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes environnementales : préparation et dépôt dossier CNPN
 - ✓ Etudes de programmation : mission OPCIC afin de préparer la coordination des travaux à venir
 - ✓ Etudes techniques : sondages et géomètre

- ✓ Animation, concertation, médiation et communication : engagement d'un nouveau marché
- ✓ Etudes stationnement/déplacements : accompagnement sur la mise en œuvre du plan d'actions
- Foncier :
 - ✓ Frais en lien avec la procédure d'expropriation
 - ✓ Entretien des terrains
 - ✓ Acquisitions
- Participation aux équipements publics
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension
- Travaux infrastructures et honoraires techniques
 - ✓ Maîtrise d'œuvre : AVP et DCE des ouvrages sur le secteur de Cantinolle
 - ✓ Démolition de la maison sur l'îlot Jardin de Carès (C7)
 - ✓ Travaux des concessionnaires : ENEDIS, Orange...
- Honoraires concession :
 - ✓ Rémunération forfaitaire
- Frais de communication : en lien avec la mission d'AMO animation, concertation, médiation et communication
- Frais divers

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 2 548 006 € TTC

■ **Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2025 correspondent à :**

- Participations constructeurs : 382 378 € TTC
- Subventions : 61 215 € TTC
- Participation métropolitaine : 236 500 € TTC
- Participation de la ville : pas de participation

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 680 093 € TTC

4.3 Participation du concédant

Dans le cadre de l'avenant n°4 au traité de concession, la participation de Bordeaux Métropole a évolué.

L'échéancier est donc le suivant :

2018 :	2 200 000 € TTC	(versée en 2018)
2019 :	3 302 742 € TTC	(versée en 2019)
2020 :	3 095 598 € TTC	(versée en 2020)
2021 :	1 822 384 € TTC	(versée en 2021),
2025 :	236 500 € TTC	
2026 :	2 520 000 € TTC	
2027 :	2 128 344 € TTC	
2028 :	800 000 € TTC	

2029 : 800 000 € TTC

2030 : 1 191 801 € TTC

4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2024, la trésorerie présente un solde négatif de 2 122 052 € et un solde négatif prévisionnel de 3 989 965 € au 31 décembre 2025.

Conformément à la convention d'avance de trésorerie, le concédant a versé une avance de 1 734 000 € en 2016 dès la notification de la concession et 900 000 € en 2017. Ce CRFA s'accompagne d'un avenant n° 2 à la convention d'avance de trésorerie qui modifie les modalités de versement et de remboursement de l'avance de trésorerie. Cet avenant prévoit un remboursement en 2028 pour un montant de 2 634 000 €.

Conformément à l'article 15.6 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le bilan prévisionnel a fait l'objet de nombreuses évolutions sur les postes liées à une modification du dossier de réalisation : nouveaux équipements publics, nouveaux îlots avec des acquisitions foncières à réaliser, études complémentaires...

Ces évolutions ont été actées par le conseil de Bordeaux Métropole en date du 4 avril 2025 et ont donné lieu à une modification du dossier de réalisation de la ZAC et à un avenant (avenant n°4 au Traité de Concession).

Suite à l'avenant 4, le bilan prévisionnel demeure à l'équilibre et n'a pas d'impact sur le montant de la participation du concédant.

5. Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de la ZAC

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des clauses d'insertion

Eysines ZAC Cares Cantinolle
CRFA 2024 - BILAN CONSOLIDE

Annexe 1

BILAN AMENAGEUR



DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	1 988 724	393 071	2 381 795
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	885 000	177 000	1 062 000
Autres études	1 103 724	216 071	1 319 795
Frais d'acquisition et de libération des sols	13 446 929	1 161 738	14 608 667
Acquisitions foncières (dont aléas)	10 811 837	825 873	11 637 710
- détail acquisitions	0	0	0
* à Bordeaux Métropole	1 533 500	281 750	1 815 250
* à la commune	361 390	0	361 390
* à des propriétaires privés	8 916 947	544 123	9 461 070
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	698 834	104 265	803 099
Libération des terrains	1 157 729	231 546	1 389 275
Indemnités d'éviction	778 529	54	778 583
	0	0	0
Frais d'aménagement (*)	7 373 444	1 474 533	8 847 977
Maîtrise d'œuvre	738 845	147 769	886 614
Travaux et aléas	6 090 479	1 218 096	7 308 575
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	544 120	108 668	652 788
Participation aux équipements publics	1 905 205	0	1 905 205
Équipements de cheminements, voirie	150 000	0	150 000
Équipements sportifs	1 050 000	0	1 050 000
Enfouissement ligne à HT	637 967	0	637 967
Divers Enfouissement lignes aériennes	67 238	0	67 238
Honoraires concession	1 990 000	0	1 990 000
	1 990 000	0	1 990 000
Frais de communication	150 000	27 587	177 587
Frais divers	244 999	11 997	256 996
Frais financiers	75 000	0	75 000
Frais divers (Assurance, Taxes...)	169 999	11 997	181 996
Actualisation	110 000	22 000	132 000
TVA	0	253 808	253 808
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	253 808	253 808
TOTAL DES DEPENSES	27 209 302	3 344 733	30 554 035

RECETTES			€ HT	€ TVA	€ TTC
	Bilan origine	CRFA 2024			
Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	8 888 488	1 326 913	10 215 401
Libre	300	500	2 867 471	573 494	3 440 965
Accession abordable	200	200	623 235	124 647	747 882
Locatif social	180	220	2 012 198	251 524	2 263 722
Accession sociale	200	220	288 860	15 887	304 747
BRS		220	1 779 200	97 856	1 877 056
Commerces	150	200	0	0	0
Bureaux	0	200	0	0	0
Activités	0	200	1 317 525	263 505	1 581 030
	Bilan origine	CRFA 2024			
Participation constructeurs	Prix unit m² SP		926 994	0	926 994
Libre	45	65	605 215	0	605 215
Accession abordable	20	30	0	0	0
Locatif social	20	30	196 470	0	196 470
Accession sociale	20	30	0	0	0
BRS	20	30	96 150	0	96 150
Commerces	25	30	19 500	0	19 500
Bureaux		0	0	0	0
Activités		0	9 659	0	9 659
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstruct			0	0	0
Participation équipements d'intérêt général					
Subventions			228 703	0	228 703
Participation métropolitaine au titre de :			16 249 537	1 847 832	18 097 369
Participation équilibre			7 010 375	0	7 010 375
Participation remise d'ouvrages			9 239 162	1 847 832	11 086 994
Participation complément prix			0	0	0
Participation communale			849 939	169 988	1 019 927
			849 939	169 988	1 019 927
Autres recettes			65 640	0	65 640
Produits divers			33 231	0	33 231
Produits financiers			32 409	0	32 409
TOTAL DES RECETTES			27 209 302	3 344 733	30 554 035

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025


DEPENSES	(1)		(2)		(2-1)
	Bilan initial		CRFA 2024		variati*
	valeur	%	valeur	%	%
Études de définition et de suivi de l'opération	984 000	6%	2 381 795	8%	142%
Études architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	600 000	4%	1 062 000	3%	77%
Autres études	384 000	2%	1 319 795	4%	244%
Frais d'acquisition et de libération des sols	5 891 025	36%	14 608 667	48%	148%
Acquisitions foncières (dont aléas)	4 964 926	30%	11 637 710	38%	134%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* à Bordeaux Métropole	1 872 000	11%	1 815 250	6%	-3%
* à la commune	18 300	0%	361 390	1%	1875%
* à des propriétaires privés	3 074 626	19%	9 461 070	31%	208%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	566 099	3%	803 099	3%	42%
Libération des terrains	360 000	2%	1 389 275	5%	286%
Indemnités d'éviction	0	0%	778 583	3%	0%
			0	0%	0%
Frais d'aménagement (*)	4 585 752	28%	8 847 977	29%	93%
Maîtrise d'œuvre	518 952	3%	886 614	3%	71%
Travaux et aléas	3 706 800	23%	7 308 575	24%	97%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	360 000	2%	652 788	2%	81%
Participation aux équipements publics	1 700 000	10%	1 905 205	6%	12%
Équipements de cheminements, voirie	150 000	1%	150 000	0%	0%
Équipements sportifs	1 050 000	6%	1 050 000	3%	0%
Enfouissement ligne à HT	500 000	3%	637 967	2%	28%
Divers Enfouissement lignes aériennes	0	0%	67 238	0%	0%
Honoraires concession	1 460 000	9%	1 990 000	7%	36%
	1 460 000	9%	1 990 000	7%	36%
Frais de communication	300 000	2%	177 587	1%	-41%
Frais divers	778 125	5%	256 996	1%	-67%
Frais financiers	500 000	3%	75 000	0%	-85%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	278 125	2%	181 996	1%	-35%
Actualisation	580 709	4%	132 000	0%	-77%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors	580 709	4%	132 000	0%	-77%
TVA	113 309	1%	253 808	1%	124%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	113 309	1%	253 808	1%	124%
TOTAL DES DEPENSES	16 392 920	100%	30 554 035	100%	86%

RECETTES		Bilan origine		CRFA 2024		
		Prix unit. m² SP		Prix unit. m² SP		
Charges foncières						
Libre	300	500	1 965 600	12%	3 440 965	21%
Accession abordable	200	200	1 276 800	8%	747 882	5%
Locatif social	180	220	1 333 066	8%	2 263 722	14%
Accession sociale	200	200	238 715	1%	304 747	2%
BRS		220	0	0%	1 877 056	11%
Commerces		200	0	0%	0	0%
Bureaux		200	0	0%	0	0%
Activités			0	0%	1 581 030	10%
Participation constructeurs						
Libre	45	65	597 488	4%	605 215	4%
Accession abordable	20	30	199 900	1%	0	0%
Locatif social	20	30	192 050	1%	196 470	1%
Accession sociale	20	30	0	0%	0	0%
BRS		30	0	0%	96 150	1%
Commerces		25	75 000	0%	19 500	0%
Bureaux			0	0%	0	0%
Activités			0	0%	9 659	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)						
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%
Subventions						
Participation métropolitaine au titre de :						
Participation équilibre			10 202 569	62%	18 097 369	110%
Participation remise d'ouvrages			3 982 074	24%	7 010 375	43%
Participation complément prix			6 220 495	38%	11 086 994	68%
			0	0%	0	0%
Participation communale						
			311 733	2%	1 019 927	6%
			311 733	2%	1 019 927	6%
Autres recettes						
Produits divers			0	0%	65 640	0%
Produits financiers			0	0%	33 231	0%
			0	0%	32 409	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES			16 392 920	100%	30 554 035	86%

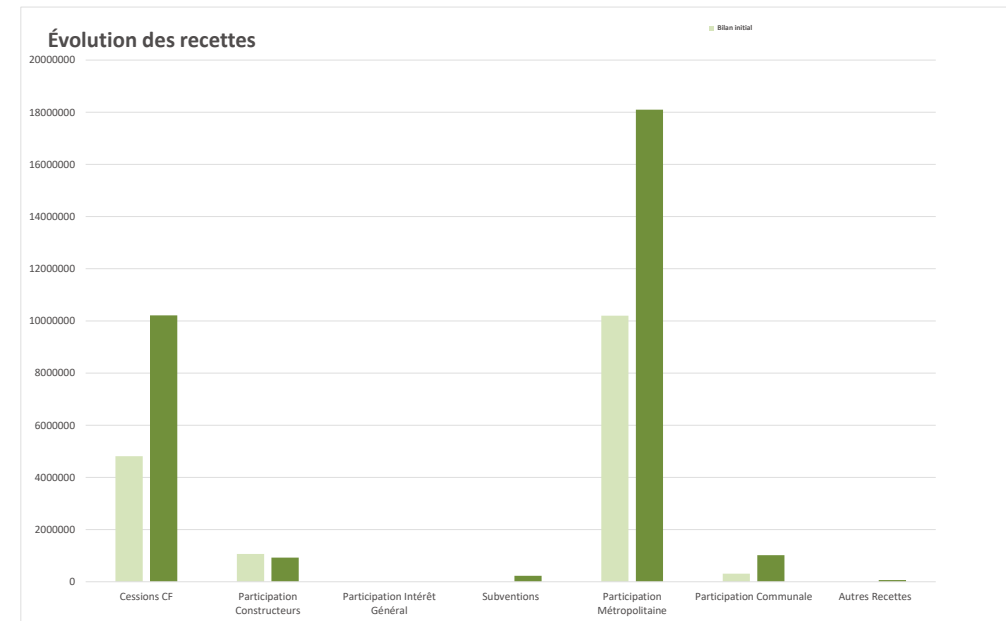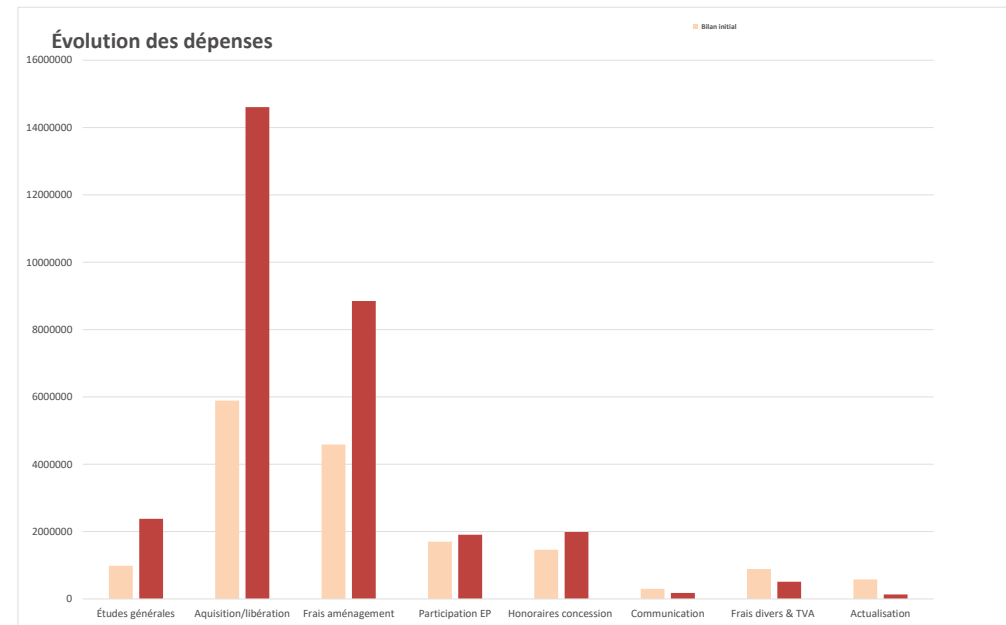

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926_mcf-110410-D-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

DEPENSES	CRFA 2024		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé à fin 2024		Reste à réaliser	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
Études de définition et de suivi de l'opération	2 381 795	8%	1 113 273	47%	1 268 522	53%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	1 062 000	3%	591 416	56%	470 584	44%
Autres études	1 319 795	4%	521 856	40%	797 939	60%
Frais d'acquisition et de libération des sols	14 608 667	48%	11 112 545	76%	3 496 122	24%
Acquisitions foncières (dont aléas)	11 637 710	38%	9 628 640	83%	2 009 070	17%
- détail acquisitions		0%		0%		0%
* à Bordeaux Métropole	1 815 250	6%	1 815 250	100%	0	0%
* à la commune	361 390	1%	0	0%	361 390	100%
* à des propriétaires privés	9 461 070	31%	7 813 390	83%	1 647 680	17%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	803 099	3%	443 193	55%	359 906	45%
Libération des terrains	1 389 275	5%	410 174	30%	979 101	70%
Indemnités d'éviction	778 583	3%	630 538	81%	148 045	19%
Frais d'aménagement (*)	8 847 977	29%	4 270 130	48%	4 577 847	52%
Maîtrise d'œuvre	886 614	3%	464 141	52%	422 473	48%
Travaux et aléas	7 308 575	24%	3 717 501	51%	3 591 074	49%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	652 788	2%	88 488	14%	564 300	86%
Participation aux équipements publics	1 905 205	6%	1 155 205	61%	150 000	8%
Equipements de cheminements, voirie	150 000	0%	0	0%	150 000	100%
Equipements sportifs	1 050 000		0			
Enfouissement ligne à HT	637 967		1 087 967			
Divers Enfouissement lignes aériennes	67 238	0%	67 238	100%	0	0%
Honoraires concession	1 990 000	7%	1 171 033	59%	818 967	41%
	1 990 000	7%	1 171 033	59%	818 967	41%
Frais de communication	177 587	1%	33 537	19%	144 050	81%
Frais divers	256 996	1%	21 885	9%	235 111	91%
Frais financiers	75 000	0%	0	0%	75 000	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	181 996	1%	21 885	12%	160 111	88%
Actualisation	132 000	0%	0	0%	132 000	100%
		0%		0%		0%
TVA	253 808	1%	1 079 620	425%	-825 812	-325%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	253 808	1%	1 079 620	425%	-825 812	-325%
TOTAL DES DEPENSES	30 554 035	100%	19 957 228	65%	9 996 807	33%

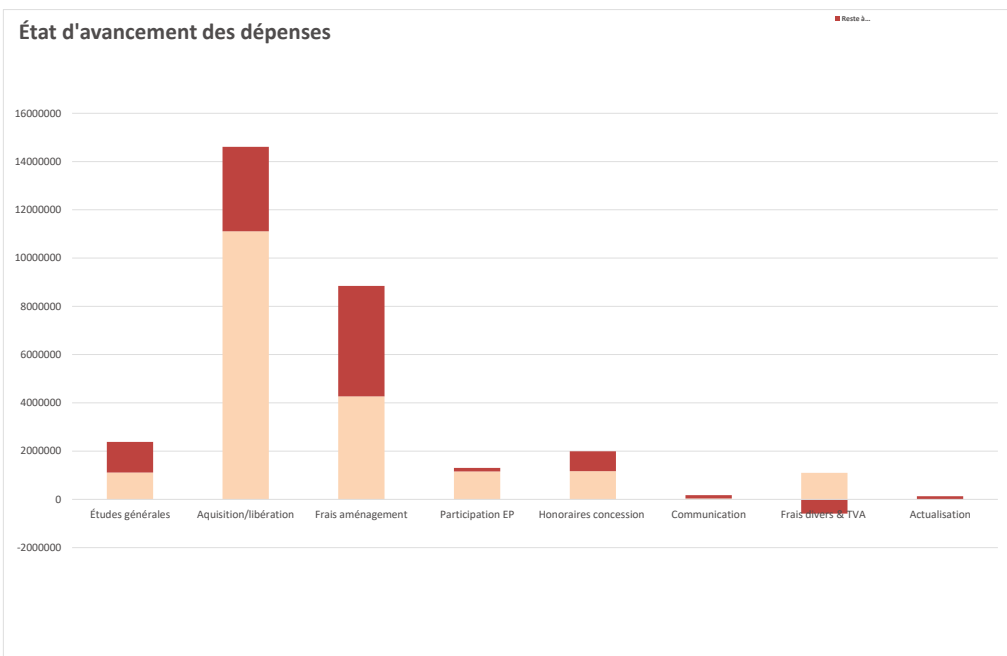


RÉCETTES		Bilan origine		CRFA 2024					
		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP						
Charges foncières				10 215 401	33%	4 481 230	44%	5 734 172	56%
Libre	300	500	3 440 965	11%	1 759 285	51%	1 681 680	49%	0%
Accession abordable	200	200	747 882	2%	747 882	100%	0	0%	0%
Locatif social	180	220	2 263 722	7%	1 624 286	72%	639 436	28%	0%
Accession sociale	200	220	304 747	1%	304 747	100%	0	0%	0%
BRS	0	220	1 877 056	6%	0	0%	1 877 056	100%	0%
Commerces	150	200	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Activités	150	200	1 581 030	5%	45 030	3%	1 536 000	97%	0%
Participation constructeurs				926 994	3%	2 516	0%	924 478	100%
Libre	45	65	605 215	2%	0	0%	605 215	100%	0%
Accession abordable	20	30	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Locatif social	20	30	196 470	1%	0	0%	196 470	100%	0%
Accession sociale	20	30	0	0%	0	0%	0	0%	0%
BRS	30	30	96 150	0%	0	0%	96 150	100%	0%
Commerces	25	30	19 500	0%	0	0%	19 500	100%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Activités	25	30	9 659	0%	2 516	26%	7 143	74%	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)				0%	0%	0%	0%	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général				0%	0%	0%	0%	0%	0%
Subventions				228 703	1%	167 488	73%	61 215	27%
Participation métropolitaine au titre de :				18 097 369	59%	10 420 724	58%	7 676 645	42%
Participation équilibre				7 010 375	23%	3 982 074	57%	3 028 301	43%
Participation remise d'ouvrages				11 086 994	36%	6 438 650	58%	4 648 344	42%
Participation complément prix				0	0%	0	0%	0	0%
Participation communale				1 019 927	3%	63 577	6%	956 350	94%
				1 019 927	3%	63 577	6%	956 350	94%
Autres recettes				65 640	0%	65 640	100%	0	0%
Produits divers				33 231	0%	33 231	100%	0	0%
Produits financiers				0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES				30 554 035	100%	19 957 228	65%	9 996 807	33%

Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-Imc1110110-DE-11

Date de télétransmission : 03/10/2025

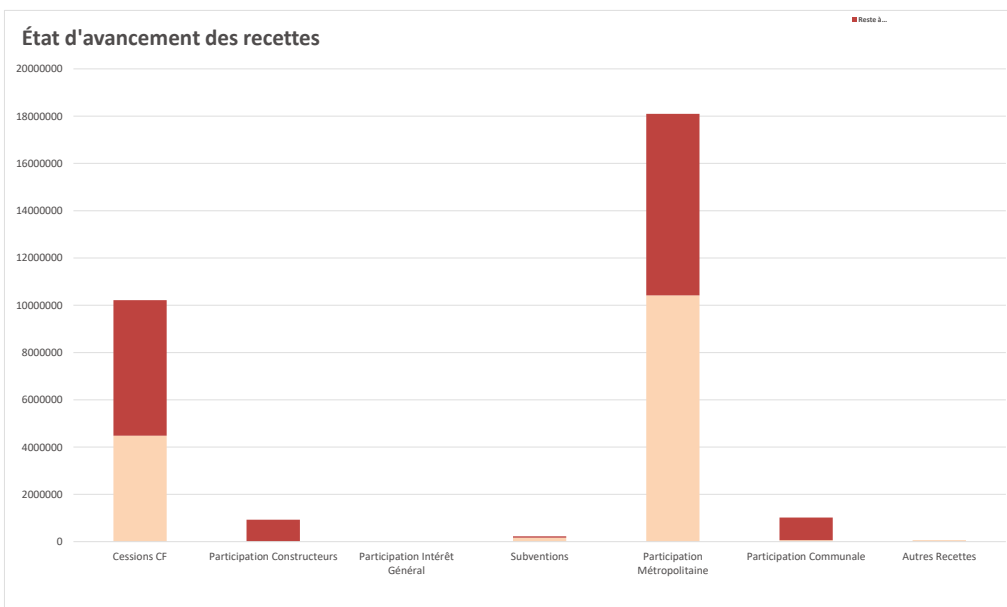

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-2025-0926-Imc1110-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

	2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		2 029		2 030		2 031		TOTAL			
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%				
DEPENSES																																				
Etudes de définition et de suivi de l'opération	27 327	1%	212 923	9%	128 934	5%	57 659	2%	34 411	1%	44 338	2%	122 232	5%	141 198	6%	344 250	14%	297 967	13%	301 200	13%	273 600	11%	208 740	9%	127 110	5%	59 905	3%	0	0%	2 381 795	100%		
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets	25 311	2%	142 631	13%	67 478	6%	20 094	2%	13 694	1%	23 700	2%	32 164	3%	64 799	6%	201 546	19%	169 200	16%	144 000	14%	96 000	9%	60 000	6%	1 384	0%	0	0%	0	0%	1 062 000	100%		
Autres études	2 016	0%	70 292	5%	61 456	5%	37 565	3%	20 717	2%	20 639	2%	90 068	7%	76 399	6%	142 704	11%	128 767	10%	157 200	12%	137 600	11%	148 740	11%	125 726	10%	59 905	5%	0	0%	1 319 795	100%		
Frais d'acquisition et de libération des sols	2 844	0%	1 294 852	9%	19 576	0%	3 645 595	25%	23 411	0%	2 665 084	18%	1 166 644	8%	1 026 575	7%	1 217 965	8%	1 948 763	13%	1 225 111	8%	167 400	1%	132 391	1%	22 456	0%	0	0%	0	0%	14 608 667	100%		
Acquisitions foncières (dont alias)	0	0%	1 223 050	11%	0	0%	3 545 882	30%	2 450	0%	2 366 638	20%	883 330	8%	846 090	7%	761 240	7%	1 360 640	12%	648 430	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	11 637 750	100%		
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
* à Bordeaux Métropole	0	0%	1 223 050	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 223 050	100%		
* à la commune	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
* à des propriétaires privés	0	0%	0	0%	0	0%	3 545 882	35%	2 450	0%	2 366 638	24%	883 330	9%	846 090	8%	761 240	8%	999 250	10%	648 430	6%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10 053 310	100%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	2 844	0%	71 802	9%	19 576	2%	81 995	10%	20 471	3%	44 367	6%	89 963	11%	76 744	10%	35 431	4%	106 050	13%	116 739	15%	65 400	8%	54 547	7%	17 170	2%	0	0%	0	0%	803 099	100%		
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	9 784	1%	400 390	29%	394 028	28%	399 942	29%	102 000	7%	77 844	6%	5 287	0%	0	0%	0	0%	1 389 275	100%		
Indemnités d'éviction	0	0%	0	0%	0	0%	17 718	2%	490	0%	0	0%	254 079	33%	193 351	25%	143 956	18%	20 904	3%	88 045	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	778 543	100%		
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Frais d'aménagement (*)	0	0%	35 022	0%	149 537	2%	567 904	6%	771 799	9%	89 866	1%	2 148 702	24%	469 683	5%	37 617	0%	1 086 814	12%	2 913 066	33%	548 746	6%	29 202	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8 847 977	100%		
Maîtrise d'œuvre	0	0%	35 022	4%	139 795	16%	62 110	7%	32 010	4%	42 611	5%	88 052	10%	56 216	6%	8 325	1%	150 978	17%	162 000	18%	91 961	10%	17 534	2%	0	0%	0	0%	0	0%	886 614	100%		
Travaux et aléas	0	0%	0	0%	0	0%	498 980	7%	734 407	10%	8 125	0%	2 051 507	28%	395 522	5%	28 959	0%	823 032	11%	2 312 317	32%	448 257	6%	7 468	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7 308 575	100%		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	0	0%	0	0%	9 742	1%	6 813	1%	5 381	1%	39 130	6%	9 143	1%	17 945	3%	333	0%	438 768	17%	438 768	67%	8 528	1%	4 200	1%	0	0%	0	0%	0	0%	652 788	100%		
Participation aux équipements publics	62 000	3%	13 652	1%	0	0%	25 583	1%	352 410	18%	889 528	47%	-37 968	-2%	-75 000	-4%	-75 000	-4%	450 000	24%	500 000	26%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	-50 000	-3%	0	0%	1 905 205	100%		
Equipements de cheminements, voirie																		25 000	1%	25 000	1%	25 000	1%	25 000	1%	25 000	1%	25 000	1%	0	0%	150 000	100%			
Equipements sportifs																		500 000	48%	550 000	52%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 050 000	100%			
Enfouissement ligne à HT	62 000	10%	13 652	2%	0	0%	25 583	4%	352 410	55%	822 290	129%	-37 968	-6%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	-75 000	-12%	0	0%	637 967	100%		
Divers Enfouissement lignes aériennes																		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	67 238	100%			
Monoraires concession	96 033	5%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	151 000	8%	120 000	6%	150 000	8%	200 000	10%	200 000	10%	120 000	6%	90 000	5%	58 967	3%	0	0%	1 990 000	100%		
	96 033	5%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	134 000	7%	151 000	8%	120 000	6%	150 000	8%	200 000	10%	200 000	10%	120 000	6%	90 000	5%	58 967	3%	0	0%	1 990 000	100%		
Frais de communication					1 261	1%	14 509	8%	6 860	4%	282	0%	4 886	3%	2 044	1%	3 696	2%	24 000	14%	24 000	14%	24 000	14%	24 000	14%	30 000	14%	24 050	14%	0	0%	177 587	100%		
Frais divers	115	0%	4 709	2%	3 039	1%	855	0%	708	0%	170	0%	1 365	1%	417	0%	10 507	4%	40 400	16%	49 400	19%	49 400	19%	33 400	13%	32 200	13%	30 311	12%	0	0%	256 579	100%		
Frais financiers									708	0%	-	0	0	0%	0	0%	0	0%	15 000	20%	15 000	20%	15 000	20%	15 000	20%	15 000	20%	15 000	20%	0	0%	75 000	100%		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	115	0%	4 709	3%	3 039	2%	855	0%	708	0%	170	0%	1 365	1%	417	0%	10 507	6%	40 400	22%	34 400	19%	34 400	19%	18 400	10%	17 200	9%	15 311	8%	0	0%	181 996	100%		
Actualisation					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	48 000	36%	54 000	41%	24 000	18%	6 000	5%	0	0%	0	0%	0	0%	132 000	100%		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors Janvier, Rem et F.I.)					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	48 000	36%	54 000	41%	24 000	18%	6 000	5%	0	0%	0	0%	0	0%	132 000	100%		
TVA					124 114	49%	955 506	376%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 497 938	-590%	246 163	97%	276 893	##	-32 622	##	22 190	9%	159 502	63%	0	0%	253 808	100%		
TVA encasée (-) / reversée (+)					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-1 497 938	-181%	246 163	-30%	276 893	-34%	-32 622	4%	22 190	-3%	159 502	-19%	0	0%	-825 812	100%		
TOTAL DES DEPENSES	188 319	1%	1 695 159	6%	560 461	2%	5 401 611	18%	1 323 599	4%	3 823 269	13%	3 539 860	12%	1 765 917	6%	1 659 034	5%	2 548 006	8%	5 512 960	18%	1 514 038	5%	471 111	2%	267 956	1%	282 736	1%	0	0%	30 554 035	100%		
RECETTES																																				
Charges foncières			763 356	7%	0	0%	3 717 874	36%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 677 389	26%	1 765 776	17%	0	0%	331 006	3%	0	0%	960 000	9%	10 215 401	100%		
Libre					0	0%	1 759 285	51%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 681 680	49%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3 440 965	100%		
Accession abordable					0	0%	747 882	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	747 882	100%		
Locatif social			458 609	20%	0	0%	1 165 678	51%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	331 903	15%	307 533	14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 263 722	100%		
Accession sociale					0	0%	304 747	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	304 747	100%		
BRS					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	663 806	35%	882 244	47%	0	0%	331 006	18%	0	0%	0	0%	1 877 056	100%		
Commerces					0	0%	45 030	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	45 030	100%		
Bureaux					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	960 000	100%		
Activités					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	576 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	576 000	100%		
Participation constructeurs					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	382 378	41%	496 500	54%	24 150	3%	21 450	2%	0	0%	0	0%	0	0%	924 478	100%		
Libre					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	254 215	42%	351 000	58%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	605 215	100%		
Accession abordable					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Locatif social					0	0%	0	0%	0																											



ZAC Eysines Carès Cantinolle - CRF 2024
Annexe 3 - Tableau des acquisitions et cessions

ACQUISITIONS EN 2024

Ilots/EP	Parcelles	Surfaces terrains m ²	Vendeur(s) / Propriétaire(s)	Date promesse	Date acte/jugement/ Déconsignation	Prix HT hors emploi	TVA	Prix TTC hors emploi	HT emploi	Indemnités diverses
C7	BB 659-252-253- 231-657-658- 3214-3215	4 935	BM		25/01/2024	493 500 €	98 700 €	592 200 €	0 €	0 €
EP All Eur	AA 502	1 632	Société propriétaire du bien		08/08/2024	114 240 €	0 €	114 240 €	12 424 €	0 €
C7	BB 256	548	Particulier propriétaire du bien	08/07/2024	17/09/2024	54 800 €	0 €	54 800 €	6 480 €	0 €

AUCUNE CESSION EN 2024

Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m ² SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT


Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation dossier modification		Programmation actualisée 2024		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	14 352	31%	14 352	31%	0%
PLAI	5 741	13%	5 741	13%	
PLUS	8 611	19%	8 611	19%	
PLS					
Accession sociale	2 022	4%	2 022	4%	0%
Accession abordable	1 983	4%	1 983	4%	
BRS	10 665	23%	10 665	23%	
Accession libre	16 738	37%	16 738	37%	0%
Sous total logements	45 760	100%	45 760	100%	0%

Logements	45 760	86%	45 760	86%	0%
Commerces, activités et équipements	7 166	14%	7 166	14%	0%
Total	52 926	100%	52 926	100%	0%


Programme de constructions actualisé en m² SP

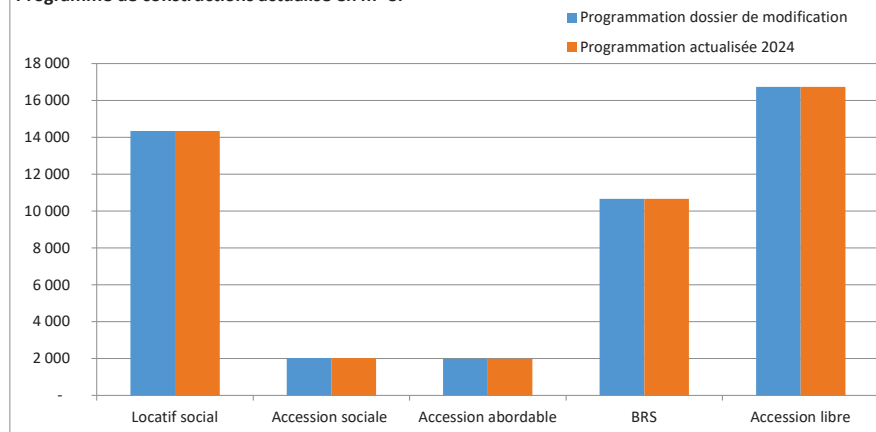

Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation dossier de modification		Programmation actualisée 2024		Variation%
		%		%	
Locatif social	198	30%	198	30%	0%
PLAI	79	12%	79	12%	
PLUS	119	18%	119	18%	
PLS	—	—	—	—	
Accession sociale	20	3%	20	3%	0%
Accession abordable	24	4%	24	4%	
BRS	165	25%	165	25%	
Accession libre	259	39%	259	39%	0%
Sous total logements	666	100%	666	100%	0%

Programme de constructions actualisé en nbre de logements

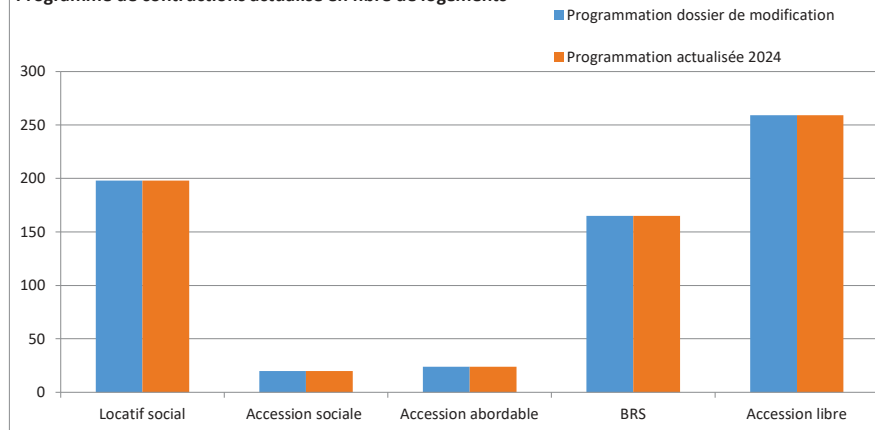


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2024		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	14 352	31%	5048	35%	9 304	65%
PLAI	5741	13%	1993		3748	
PLUS	8611	19%	3386		5225	
PLS	0	0%	—	—	—	—
Accession sociale	2 022	4%	2022	100%	-	0%
Accession abordable	1 983		1983	100%	-	0%
BRS	10 665				10 665	100%
Accession libre	16 738	37%	4567	27%	12 171	100%
Sous total logements	45 760		13 620	30%	32 140	70%
Commerces, activités et équipement	7 166		116	2%	7 050	100%
Total	52 926		13 736	26%	39 190	74%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

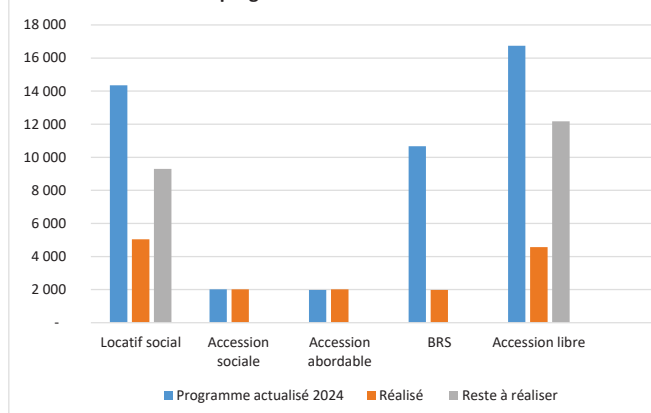


Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2024	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		Nbr	%	Nbr	%
Locatif social	198	61	31%	137	69%
PLAI	79	23	29%	56	71%
PLUS	119	38	32%	81	68%
PLS	—	—	—	—	—
Accession sociale	20	20	100%	0	0%
Accession abordable	24	24		0	0%
BRS	165			165	100%
Accession libre	259	69	27%	190	73%
Sous total logements	666	174	26%	492	74%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

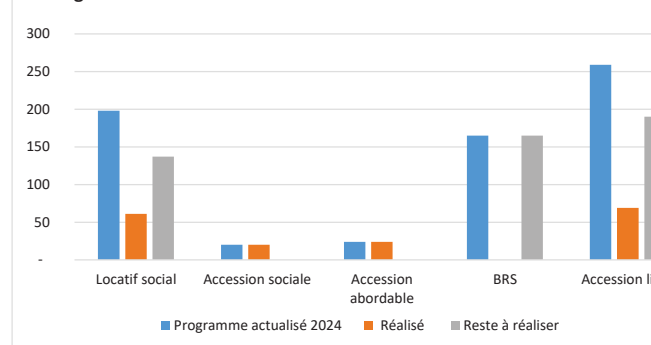



Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP																					
Nature du programme	Programmation Dossier de Modification	Programmation actualisée 2024	Echelonnement prévisionnel																		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026		2027	2028	2029		2030	2031
			Ilot Les Longères de Carès 2 070		Ilot L'Esprit des Jalles 2 978					Parcelle BB2728	Ilot Triat 4 034	Ilot Le Jardin des Sources 1 430	Ilot Les Sources A	Ilot Les Lisières 1 325	Ilot Médoc 1 800	Ilot Les Sources C		Ilot Les Sources B	Ilot Le Jardin Nourricier	Ilot Le bois ludique 715	
Locatif social	14 352	14 352																			
Accession sociale	2 022	2 022	2 022																		
Accession abordable	1 983	1 983			1 983																
BRS	10 665	10 665										2 860									
Accession libre	16 738	16 738			4 418					149	3 613	2 860	298	3 345	2 400	805		390	865	0	
Sous total logements	45 760	45 760	4 092		9 379					149	7 647	7 150	298	4 670	9 600	805		390	865	715	
Commerces, activités et équipements	7 166	7 166			116									6 400	650						
Total	52 926	52 926	4 092		9 495					149	7 647	7 150	298	11 070	10 250	805		390	865	715	

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements																					
Nature du programme	Programmation Dossier de Modification	Programmation actualisée 2024	Echelonnement prévisionnel																		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026		2027	2028	2029		2030	2031
			Ilot Les Longères de Carès 20		Ilot L'Esprit des Jalles 41					Parcelle BB2728	Ilot Triat 53	Ilot Le Jardin des Sources 22	Ilot Les Sources A	Ilot Les Lisières 21	Ilot Médoc 30	Ilot Les Sources C		Ilot Les Sources B	Ilot Le Jardin Nourricier	Ilot Le bois ludique 11	
Locatif social	198	198																			
Accession sociale	20	20	20																		
Accession abordable	24	24			24																
BRS	165	165																			
Accession libre	259	259			68					1	52	44	4	51	40	10		6	14		
Sous total logements	666	666	40		133					1	105	110	4	72	160	10		6	14	11	

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025



Eysines ZAC Cares Cantinolle
CRFA 2024 BILAN COMPARÉ

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	CRFA 2023			CRFA 2024			écarts	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	
Etudes de définition et de suivi de l'opération	1 216 349	240 141	1 456 490	1 988 724	393 071	2 381 795	772 375	
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	550 000	110 000	660 000	885 000	177 000	1 062 000	335 000	Augmentation de la ligne en lien avec les missions de coordination au regard des nouveaux ilots
Autres études	666 349	130 141	796 490	1 103 724	216 071	1 319 795	437 375	Augmentation liée aux nouveaux équipements publics et aux nouveaux ilots nécessitant des études complémentaires (techniques, environnementales...)
Frais d'acquisition et de libération des sols	11 227 790	947 007	12 174 797	13 446 929	1 161 738	14 608 667	2 219 139	
Acquisitions foncières (dont allées)	9 312 928	704 326	10 017 254	10 811 837	825 873	11 637 710	1 498 909	Ajustement liée à l'acquisition des parcelles de l'ilot Jardin Nourricier
- détail acquisitions	0	0	0	0	0	0	0	
* à Bordeaux Métropole et communes	1 533 500	183 050	1 716 550	1 533 500	281 750	1 815 250	0	
* à la commune	352 890	0	352 890	361 390	0	361 390	8 500	
* à des oronotaires orivés	7 426 538	521 276	7 947 814	8 916 947	544 123	9 461 070	1 490 409	
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	486 585	82 089	568 674	698 834	104 265	803 099	212 249	Recalage des frais en lien avec les nouvelles acquisitions
Libération des terrains	802 729	160 546	963 275	1 157 729	231 546	1 389 275	355 000	Coût lié aux démolitions des fonciers bâtis acquis pour l'ilot des Sources
Indemnités d'éviction	625 548	46	625 594	778 529	54	778 583	152 981	Coût lié aux fonciers bâtis acquis pour l'ilot des Sources
		0	0	0	0	0	0	
Frais d'aménagement (*)	4 412 270	882 298	5 294 568	7 373 444	1 474 533	8 847 977	2 961 174	
Maîtrise d'œuvre	484 854	96 971	581 825	738 845	147 769	886 614	253 991	Augmentation en lien avec les nouveaux équipements publics
Travaux et allées	3 822 929	764 586	4 587 515	6 090 479	1 218 096	7 308 575	2 267 550	Travaux liés aux nouveaux équipements publics
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	104 487	20 742	125 229	544 120	108 668	652 788	439 633	Ajustement de la ligne au regard des coûts en lien avec les concessionnaires
Participation aux équipements publics	1 905 205	0	1 905 205	1 905 205	0	1 905 205	0	
Equipements de cheminements, voirie	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	
Equipements sportifs	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	
Enfouissement ligne à HT	637 967	0	637 967	637 967	0	637 967	0	
Divers Enfouissement lignes aériennes	67 238	0	67 238	67 238	0	67 238	0	
Honoraires concession	1 460 000	0	1 460 000	1 990 000	0	1 990 000	530 000	Honoraires recalés au regard des nouvelles acquisitions, des nouveaux ouvrages et des nouveaux ilots
	1 460 000	0	1 460 000	1 990 000	0	1 990 000	530 000	
Frais de communication	150 000	27 648	177 648	150 000	27 587	177 587	0	
Frais divers	220 000	12 084	232 084	244 999	11 997	256 996	24 999	
Frais financiers	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	Recalé au regard des modifications
Frais divers (Assurance, Taxes...)	170 000	12 084	182 084	169 999	11 997	181 996	-1	
Actualisation	49 717	9 943	59 660	110 000	22 000	132 000	60 283	Augmentation liée aux nouveaux ouvrages à réaliser
Travaux et Hono - IND TP (TP01 : augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.R								
TVA		495 300	495 300		253 808	253 808	0	
TVA encaissée (-) / reversée (+)								
TOTAL DES DEPENSES	20 641 331	2 614 423	23 255 754	27 209 302	3 344 733	30 554 035	6 567 971	

RECETTES				€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT				
Bilan origine		CRFA 2024									
Prix unit. m² SP		Prix unit. m² SP		9 998 588	1 525 718	11 524 306	8 888 488	1 326 913	10 215 401	-1 110 100	
Charges foncières											
Libre	300	500	5 037 471	1 007 494	6 044 965	2 867 471	573 494	3 440 965	-2 170 000		
Accession abordable	200	200	623 235	124 647	747 882	623 235	124 647	747 882	0		
Locatif social	180	220	2 213 498	262 595	2 476 093	2 012 198	251 524	2 263 722	-201 300		
Accession sociale	200	220	288 860	15 887	304 747	288 860	15 887	304 747	0	Diminution en lien avec l'implantation dans l'ilot Les Lisières (C4) d'un gymnase et d'un groupe scolaire	
BRS		220	1 738 000	95 590	1 833 590	1 779 200	97 856	1 877 056	41 200		
Commerces	150	200	0	0	0	0	0	0	0		
Bureaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Activités	150	200	97 524	19 505	117 029	1 317 525	263 505	1 581 030	1 220 001		
Participation constructeurs	Bilan origine		CRFA 2024								
Prix unit. m² SP		Prix unit. m² SP		793 734	0	793 734	926 994	0	926 994	133 260	
Libre	45	65	430 014	0	430 014	605 215	0	605 215	175 201		
Accession abordable	20	30	0	0	0	0	0	0	0		
Locatif social	20	30	208 980	0	208 980	196 470	0	196 470	-12 510		
Accession sociale	20	30	139 740	0	139 740	0	0	0	-139 740		
BRS		30	0	0	0	96 150	0	96 150	96 150		
Commerces	25	30	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	4 500		
Bureaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Activités	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659	9 659		
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)									0		
Participation équipements d'intérêt général									0		
Subventions				153 703	0	153 703	228 703	0	228 703	75 000	Subvention obtenue dans le cadre de l'AMI Transformation des Zones Commerciales
Participation métropolitaine au titre de :				9 584 116	1 073 108	10 657 224	16 249 537	1 847 832	18 097 369	6 665 421	
Participation équilibre				4 218 574	0	4 218 574	7 010 375	0	7 010 375	2 791 801	Augmentation de la participation en lien avec les nouvelles dépenses et la baisse des recettes
Participation remise d'ouvrages				5 365 542	1 073 108	6 438 650	9 239 162	1 847 832	11 086 994	3 873 620	
Participation complément prix				0	0	0	0	0	0	0	
Participation communale				77 981	15 596	93 577	849 939	169 988	1 019 927	771 958	
				77 981	15 596	93 577	849 939	169 988	1 019 927	771 958	
Autres recettes				33 209	0	33 209	65 640	0	65 640	32 431	
Produits divers				300	0	800	33 231	0	33 231	32 431	Ajustement au regard des recettes
Produits financiers				0	0	32 409	32 409	0	32 409	0	
TOTAL DES RECETTES				20 641 331	2 614 423	23 255 754	27 209 302	3 344 733	30 554 035	6 567 971	

Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1

Date de réél transmission : 03/10/2025

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro	2023	2024	2024
1 DEPENSES			17 218 574,07	1 659 033,58	18 877 607,65
A ETUDES GENERALES			769 022,86	344 249,94	1 113 272,80
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			389 870,72	201 545,61	591 416,33
23-06442 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - TECTONE			6 237,00		6 237,00
018702 SOLDE	13/09/2023	FA	6 237,00		6 237,00
23-06443 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur Sporting Habitat - 2 PM			12 000,00		12 000,00
018484 SOLDE	09/08/2023	FA F23_098	12 000,00		12 000,00
23-06444 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - MOONWALKLOCAL			3 963,00		3 963,00
018973 SOLDE	09/10/2023	FA NH23_094	3 963,00		3 963,00
24-06826 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - CHAMP LIBRE				1 800,00	1 800,00
019727 INDEM ILOT C7 CDC HABITAT	01/01/2024	FA F-2023-12-		1 800,00	1 800,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - BIOTOPE			9 004,32		9 004,32
003756 AC 1	20/10/2016	FA 201602778	1 776,00		1 776,00
004526 AC 2	31/03/2017	FA 201700649	7 104,00		7 104,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	124,32		124,32
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - ICI LA (D')			42 059,76		42 059,76
003753 AC 1	20/10/2016	FA 910-OP144-	8 304,00		8 304,00
004027 AC 2	12/12/2016	FA 941-OP144-	20 760,00		20 760,00
004522 AC 3	28/02/2017	FA 988-OP144-	12 456,00		12 456,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	539,76		539,76
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - NADAU ARCHITECTURE			24 312,00		24 312,00
003754 AC 1	20/10/2016	FA 2016-10-32	4 800,00		4 800,00
004028 AC 2	12/12/2016	FA 2016-12-	12 000,00		12 000,00
004523 AC 3	16/03/2017	FA 2017-03-	7 200,00		7 200,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	312,00		312,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - PERIOLE GERAUD			4 376,16		4 376,16
003759 AC 1	18/10/2016	FA 16/2016	864,00		864,00
004029 AC 2	12/12/2016	FA 23/2016	2 160,00		2 160,00
004524 AC 3	24/02/2017	FA 05/2017	1 296,00		1 296,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	56,16		56,16
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			22 624,13		22 624,13
003755 AC 1	20/10/2016	FA F16MAT956	4 466,76		4 466,76
004030 AC 2	31/12/2016	FA	11 166,90		11 166,90
004525 AC 3	14/02/2017	FA F17MAT099	6 700,14		6 700,14
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	290,33		290,33
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - ICI LA			4 835,15		4 835,15
003824 AC 1	08/11/2016	FA 924-OP144-	2 160,00		2 160,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	23,76		23,76
008073 AC2	15/05/2019	FA 19094-	2 002,56		2 002,56
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	648,83		648,83
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - NADAU			2 972,34		2 972,34
003825 AC 1	04/11/2016	FA 2016-11-	2 940,00		2 940,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	32,34		32,34
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - SAFEGE-			2 635,20		2 635,20
014170 AC1	01/01/2022	FA	2 635,20		2 635,20
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC -			5 302,78		5 302,78
008073 AC2	15/05/2019	NH 324/UZE	4 005,12		4 005,12
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	1 297,66		1 297,66
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			9 711,98		9 711,98
005072 AC 1	31/07/2017	FA 201702057	4 722,00		4 722,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	70,82		70,82
006054 AC2	31/03/2018	FA 201800820	2 420,03		2 420,03
006206 AC3	07/05/2018	FA 201801240	1 215,92		1 215,92
006871 AC 4	19/10/2018	FA	775,83		775,83
009860 AC5	14/02/2020	FA 202000323	507,38		507,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - ICI			35 361,27		35 361,27
005069 AC 1	28/08/2017	FA 1059-	17 220,00		17 220,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	258,30		258,30
006053 AC2	05/04/2018	FA 18050-	8 859,69		8 859,69
006205 AC3	30/04/2018	FA 16_28	4 434,14		4 434,14
006870 AC4	18/10/2018	FA 18175	2 738,86		2 738,86
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	1 850,28		1 850,28
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			10 566,84		10 566,84
005070 AC 1	27/07/2017	FA 2017-07-	10 380,00		10 380,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	155,70		155,70
005725 REV DEF	25/01/2018	FA-201-007-	31,14		31,14
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			3 697,65		3 697,65
005073 AC 1	28/07/2017	FA 20/2017	1 800,00		1 800,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	27,00		27,00
006140 AC 2	04/04/2018	FA 13/2018	926,10		926,10
006208 AC3	02/05/2018	FA 20/2018	463,50		463,50
006873 AC 4	19/10/2018	FA 48/2018	287,64		287,64
009862 AC5	10/02/2020	FA 06/2020	193,41		193,41
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			9 910,49		9 910,49
005071 AC 1	31/08/2017	FA F17MAT707	4 815,00		4 815,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	72,23		72,23
006055 AC 2	04/04/2018	FA F18MAT284	2 496,58		2 496,58
006207 AC3	04/05/2018	FA F18MAT383	1 239,87		1 239,87
006872 AC 4	31/10/2018	FAF18MAT925	769,43		769,43
009861 AC5	07/02/2020	FA F20MAT119	517,38		517,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			10 771,85		10 771,85
006057 AC 1	05/04/2018	NH 254 / UZE	5 190,00		5 190,00
006209 AC2	24/04/2018	FA 259/UZE	2 823,35		2 823,35
006874 AC 3	11/10/2018	NH 279/UZE	2 191,75		2 191,75
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	566,75		566,75
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - ICI LA (D')			3 288,60		3 288,60
004824 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-	3 240,00		3 240,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	48,60		48,60
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - NADAU			548,10		548,10

Accusé d réception
033-243 80 03
Date de réception
Date de l'acte
Publié le 03

004822 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-	540,00		540,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	8,10		8,10
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - ICI LA (D')			4 872,00		4 872,00
004832 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-	4 800,00		4 800,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	72,00		72,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - NADAU			9 744,00		9 744,00
004823 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-	9 600,00		9 600,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	144,00		144,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - SAFEGE-			2 436,00		2 436,00
004821 SOLDE	30/06/2017	FA F17MAT597	2 400,00		2 400,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	36,00		36,00
M2016-005/MS07 Mission de suivi de cohérence urbaine - BIOTOPE			4 707,00		4 707,00
006173 AC 1	27/03/2018	FA 201800680	2 353,50		2 353,50
007206 AC2	10/12/2018	F 201804041	2 353,50		2 353,50
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MQ/MOE			977,28		977,28
005827 AC1	14/02/2018	FA 18020-	960,00		960,00
006790 REGUL REV MS08	06/12/2018	FA 06/12/2018	17,28		17,28
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MQ/MOE			2 280,00		2 280,00
005700 SOLDE MS8	12/01/2018	FA 2018-01-	2 280,00		2 280,00
M2016-005/MS09 Démarche de suivi de chantier - Ilot C5 - BIOTOPE			2 130,00		2 130,00
006172 AC1	27/03/2018	FA 201800679	2 130,00		2 130,00
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - ICI LA (D')			977,28	22,93	1 000,21
006066 AC 1	10/04/2018	FA 18051-	384,00		384,00
006391 AC2	10/07/2018	FA 18110-	576,00		576,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021389 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD		22,93	22,93
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - VAZISTAS			2 321,04	54,46	2 375,50
006067 AC 1	09/04/2018	NH 255 / UZE	912,00		912,00
006392 AC2	05/07/2018	NH 266 / UZE	1 368,00		1 368,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	41,04		41,04
021389 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD		54,46	54,46
M2016-005/MS12 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			977,28	17,59	994,87
006159 FACT	30/04/2018	FA 18064-	960,00		960,00
007095 REGUL REV MS12	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021390 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD		17,59	17,59
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des ilots C3-C4-C7 - ICI LA (D')			7 284,00	325,46	7 609,46
006358 AC1	26/06/2018	FA 16_28	5 827,20		5 827,20
006851 AC2	18/10/2018	FA 18174	1 092,60		1 092,60
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	364,20		364,20
021400 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		325,46	325,46
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des ilots C3-C4-C7 - VAZISTAS			6 000,00	268,09	6 268,09
006359 AC1	26/06/2018	NH 264/ UZE	4 800,00		4 800,00
006852 AC2	11/10/2018	FA 280 / UZE	900,00		900,00
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	300,00		300,00
021400 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		268,09	268,09
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - ICI LA (D')			1 465,92	51,52	1 517,44
006849 AC1	18/10/2018	FA 18173	1 152,00		1 152,00
008034 AC2	10/05/2019	FA 19088-	313,92		313,92
021402 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		51,52	51,52
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - VAZISTAS			4 275,60	150,25	4 425,85
006850 AC1	11/10/2018	FA 281 / UZE	3 360,00		3 360,00
008035 AC2	10/05/2019	FA 322 / UZE	915,60		915,60
021402 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		150,25	150,25
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			488,64	39,58	528,22
006494 AC1	02/08/2018	FA 18127	480,00		480,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	8,64		8,64
021404 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		39,58	39,58
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			977,28	26,39	1 003,67
006495 AC1	19/07/2018	NH 269/ UZE	960,00		960,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021404 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		26,39	26,39
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			1 989,12	75,19	2 064,31
008032 AC1	10/05/2019	FA 19087-	1 989,12		1 989,12
021405 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		75,19	75,19
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			1 591,30	33,42	1 624,72
008033 AC1	10/05/2019	FA 323 / UZE	1 591,30		1 591,30
021405 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD		33,42	33,42
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et			3 240,00	51,84	3 291,84
008354 BDC1	11/07/2019	FA 19150-	3 240,00		3 240,00
021446 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		51,84	51,84
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et			3 399,92	63,47	3 463,39
008353 BDC1	31/07/2019	FA F19MAT714	3 399,92		3 399,92
021446 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		63,47	63,47
M2016-005/MS17/BDC10 Mission 2.5 - Etude faisabilité parcelles 226, 229, 1032 - VAZISTAS			3 240,00	162,00	3 402,00
011868 AC1	19/01/2021	FA 439 / UZE	3 240,00		3 240,00
021457 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		162,00	162,00
M2016-005/MS17/BDC11 Mission 5a - Echanges projets du 23-03-2021 - ICI LA (D')			606,00	99,99	705,99
019275 SOLDE	24/11/2023	FA23384-	606,00		606,00
021458 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		99,99	99,99
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - PERIOLE GERAUD			242,40	16,00	258,40
012897 AC1	09/07/2021	FA 11/2021	242,40		242,40
021459 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		16,00	16,00
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - SAFEGE-SUEZ			286,03	18,88	304,91
013041 AC1	31/07/2021	FA F21MAT800	286,03		286,03
021459 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		18,88	18,88
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - ICI LA (D')			7 214,47	1 064,54	8 279,01
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-	7 214,47		7 214,47
021460 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		1 064,54	1 064,54
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - VAZISTAS			6 433,52	501,81	6 935,33
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-	6 433,52		6 433,52
021460 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		501,81	501,81
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / ilot C7 - ICI LA (D')			2 654,40	884,71	3 539,11
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	2 388,96		2 388,96
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-	265,44		265,44
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		884,71	884,71

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de récé
 Publi le : 03

M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / Ilot C7 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 654,40	294,90	2 949,30
014942 AC1	12/04/2022	FA F22MAT367	2 388,96		2 388,96
015178 AC2	16/05/2022	FA F22MAT489	265,44		265,44
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		294,90	294,90
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / Ilot C7 - VAZISTAS			5 308,80	589,81	5 898,61
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	4 777,92		4 777,92
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-	530,88		530,88
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		589,81	589,81
M2016-005/MS17/BDC16 Mission 5a - Réunion Suez Eau (compteurs Rue M. Porc) - SAFEGE-			296,51	28,46	324,97
014389 AC1	31/01/2022	FA F22MAT080	296,51		296,51
021472 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD		28,46	28,46
M2016-005/MS17/BDC17 Mission 5b - Ateliers PRO-DCE Allée de l'Europe - PERIOLE GERAUD			2 261,52	187,71	2 449,23
013811 AC1	26/11/2021	FA 19/2021	2 261,52		2 261,52
021473 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD		187,71	187,71
M2016-005/MS17/BDC18 Mission 2.4 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			14 040,00	1 656,72	15 696,72
015175 AC1	13/05/2022	FA 558/UZE	14 040,00		14 040,00
021491 REVISIONS DEFINITIVES	08/07/2024	DGD		1 656,72	1 656,72
M2016-005/MS17/BDC19 Missions 5b/2.4 - Analyse PC+Morpho C4/Groupe scolaire - VAZISTAS			4 574,88	645,05	5 219,93
016100 AC1	13/09/2022	NH 591 / UZE	4 574,88		4 574,88
021492 REVISIONS DEFINITIVES	08/07/2024	DGD		645,05	645,05
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation ilot C6 - ICI LA (D')			500,64	16,02	516,66
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	500,64		500,64
021447 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		16,02	16,02
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation ilot C6 - VAZISTAS			1 001,28	32,04	1 033,32
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	1 001,28		1 001,28
021447 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		32,04	32,04
M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE ilot C1 - ICI LA (D')			1 501,92	130,67	1 632,59
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	1 501,92		1 501,92
021448 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		130,67	130,67
M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE ilot C1 - VAZISTAS			3 003,84	87,11	3 090,95
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	3 003,84		3 003,84
021448 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		87,11	87,11
M2016-005/MS17/BDC4 Mission 5a - Réunion coactivité Colas-RTE - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			283,20	7,93	291,13
008685 AC1	30/09/2019	FA F19MAT887	283,20		283,20
021449 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		7,93	7,93
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - ICI LA (D')			900,00	39,02	939,02
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	900,00		900,00
021451 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		39,02	39,02
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - VAZISTAS			540,00	23,41	563,41
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	540,00		540,00
021451 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		23,41	23,41
M2016-005/MS17/BDC7 Mission 7 - Ilot C5 - ICI LA (D')			1 001,28	557,59	1 558,87
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	1 001,28		1 001,28
021453 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		557,59	557,59
M2016-005/MS17/BDC7 Mission 7 - Ilot C5 - VAZISTAS			2 378,04	392,38	2 770,42
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	2 378,04		2 378,04
021453 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		392,38	392,38
M2016-005/MS17/BDC8 Mission 5a - Réunion DUP - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			781,74	39,09	820,83
011902 AC1 / SOLDE	31/01/2021	FA F21MAT063	781,74		781,74
021454 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		39,09	39,09
M2016-005/MS17/BDC9 Mission 2.5 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			3 240,00	162,00	3 402,00
011867 AC1	19/01/2021	FA 422 / UZE	3 240,00		3 240,00
021455 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		162,00	162,00
M2022-050 Accompagnement dans le contrôle du réseau EU Rue Martin Porc - SAFEGE-SUEZ			1 612,80		1 612,80
017425 AC1	28/02/2023	FA F23MAT215	806,40		806,40
018139 SOLDE	31/05/2023	FA F23MAT607	806,40		806,40
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - BERIM			4 656,96	13 829,16	18 486,12
019272 AC1 11/23	22/11/2023	FA	4 656,96		4 656,96
020196 AC2 02/24	23/02/2024	FA		3 729,72	3 729,72
021952 SOLDE	27/08/2024	FA		10 099,44	10 099,44
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - ENVOLIS				1 521,00	1 521,00
020075 AC1 11/23	01/01/2024	FA 23-11-2181		1 521,00	1 521,00
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - JBA-BOUCHETON JACQUES				3 886,08	3 886,08
020563 AC1	31/03/2024	FA 24-03-353		3 886,08	3 886,08
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - MASTERPLAN			18 723,48	20 031,06	38 754,54
019068 AC1 10/23	26/10/2023	FA 23-10-0017	12 735,96		12 735,96
019323 AC2 11/23	17/11/2023	FA 23-11-0037	5 987,52		5 987,52
020189 AC3 02/24	29/02/2024	FA 24-02-0072		5 051,60	5 051,60
020738 AC4 04/24	24/04/2024	FA 24-04-0104		9 150,34	9 150,34
021029 AC5 05/25	29/05/2024	FA 24-05-0121		3 504,38	3 504,38
021624 AC6 07/24	18/07/2024	FA 24-07-0144		2 324,74	2 324,74
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - SOMMER (LE) ENVIRONNEMENT				10 361,28	10 361,28
021162 AC1 11/23	01/01/2024	FA 23/11/279b		6 041,64	6 041,64
020919 AC2 04/24	30/04/2024	FA		4 319,64	4 319,64
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - TROUILLOT HERMEL			13 620,33	15 427,30	29 047,63
019069 AC1 10/23	27/10/2023	FA 2310-243	9 005,71		9 005,71
019273 AC2 11/23	22/11/2023	FA 2311-263b	4 614,62		4 614,62
020768 AC3 04/24	24/04/2024	FA 2404-097		3 865,57	3 865,57
021065 AC4 05/24	29/05/2024	FA 2405-131		3 212,35	3 212,35
021424 AC5 06/24	27/06/2024	FA 2406-173a		6 485,54	6 485,54
021621 AC6 07/24	15/07/2024	FA 2407-199		1 863,84	1 863,84
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - BERIM				512,55	512,55
022057 AC1	30/08/2024	FA		512,55	512,55
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - JBA-BOUCHETON JACQUES				483,84	483,84
022934 AC1	26/11/2024	FA 24-11-135		483,84	483,84
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - MASTERPLAN				6 380,04	6 380,04
019625 AC1	01/01/2024	FA 23-12-0052		3 480,00	3 480,00
020558 AC2	29/03/2024	FA 24-03-0098		852,12	852,12
021030 AC3	29/05/2024	FA 24-05-0122		1 206,48	1 206,48
022922 AC4	25/11/2024	FA 24-11-0034		841,44	841,44
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - TROUILLOT HERMEL				2 592,90	2 592,90
019620 AC1	01/01/2024	FA 2312-313		1 290,00	1 290,00
021067 AC2	30/05/2024	FA 2405-132		787,00	787,00
022930 AC3	25/11/2024	FA 2411-318		515,90	515,90
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préliminaires avec				1 690,08	1 690,08

Accusé de réception
033-243306
Date de télécopie : 03
Date de réception : 03
Publié le : 03

022905 AC1	25/11/2024	FA 24-11-0039		1 690,08	1 690,08
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préalables avec les				941,62	941,62
022933 AC1	25/11/2024	FA 2411-321		941,62	941,62
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - MASTERPLAN				1 693,44	1 693,44
022591 AC1	31/10/2024	FA 24-10-0029		1 693,44	1 693,44
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - TROUILLOT HERMEL				2 605,84	2 605,84
022665 AC1	24/10/2024	FA 2410-297b		2 605,84	2 605,84
M2023-005/MS2/BDC13 IlotC4 mission 8 - MASTERPLAN				2 060,44	2 060,44
022598 AC1	30/10/2024	FA 24-10-0028		2 060,44	2 060,44
M2023-005/MS2/BDC14 Présentation ZAC aux élus - MASTERPLAN				1 028,17	1 028,17
022913 AC1	26/11/2024	FA 24-11-0040		1 028,17	1 028,17
M2023-005/MS2/BDC14 Présentation ZAC aux élus - TROUILLOT HERMEL				1 028,17	1 028,17
022929 AC1	21/11/2024	FA 2411-316		1 028,17	1 028,17
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - BERIM				512,56	512,56
021941 AC1	31/07/2024	FA		512,56	512,56
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - JBA-BOUCHETON JACQUES				1 440,00	1 440,00
019639 AC1	01/01/2024	FA JBA N2312		1 440,00	1 440,00
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - MASTERPLAN				10 882,04	10 882,04
019626 AC1	01/01/2024	FA 23-12-0053		6 000,00	6 000,00
019952 AC2	31/01/2024	FA 24-01-0062		1 441,44	1 441,44
020190 AC3 02/24	26/02/2024	FA 24-02-0073		1 101,24	1 101,24
020557 AC4	29/03/2024	FA 24-03-0097		843,12	843,12
021625 AC5 07/24	18/07/2024	FA 24-07-0145		1 496,24	1 496,24
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - TROUILLOT HERMEL				5 867,80	5 867,80
019621 AC1	01/01/2024	FA 2312-314		4 380,00	4 380,00
020197 AC2 02/24	26/02/2024	FA 2402-030		915,84	915,84
021622 AC3 07/24	16/07/2024	FA 2407-200		571,96	571,96
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - JBA-BOUCHETON JACQUES				2 887,20	2 887,20
020179 AC1	29/02/2024	FA 24-02-300		1 444,32	1 444,32
020554 AC2	31/03/2024	FA 24-03-351		1 442,88	1 442,88
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - MASTERPLAN				3 376,82	3 376,82
019954 AC1	31/01/2024	FA 24-01-0063		1 681,68	1 681,68
020175 AC2	29/02/2024	FA 24-02-0074		1 685,04	1 685,04
020784 SOLDE	29/04/2024	FA 24-04-0105		10,10	10,10
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - TROUILLOT HERMEL				2 595,48	2 595,48
020198 AC1 02/24	26/02/2024	FA 2402-031		1 805,40	1 805,40
020771 AC2	24/04/2024	FA 2404-098		784,92	784,92
020918 SOLDE	30/04/2024	FA 2404-115		5,16	5,16
M2023-005/MS2/BDC4 Ilot C3 - M4.a étude capacitaire - JBA-BOUCHETON JACQUES				2 897,30	2 897,30
020180 AC1	29/02/2024	FA 24-02-301		1 444,32	1 444,32
020555 AC2	31/03/2024	FA 24-03-352		1 442,88	1 442,88
020820 SOLDE	30/04/2024	FA 24-04-403		10,10	10,10
M2023-005/MS2/BDC4 Ilot C3 - M4.a étude capacitaire - MASTERPLAN				3 376,82	3 376,82
019955 AC1	31/01/2024	FA 24-01-0064		1 681,68	1 681,68
020176 AC2	29/02/2024	FA 24-02-0075		1 685,04	1 685,04
020785 SOLDE	25/04/2024	FA 24-04-0106		10,10	10,10
M2023-005/MS2/BDC4 Ilot C3 - M4.a étude capacitaire - TROUILLOT HERMEL				2 595,48	2 595,48
020199 AC1 02/24	26/02/2024	FA 2402-032		1 805,40	1 805,40
020770 AC2 04/24	24/04/2024	FA 2404-099		784,92	784,92
020917 SOLDE	30/04/2024	FA 2404-114		5,16	5,16
M2023-005/MS2/BDC5 Ilot C3 - M5 fiche de lot - BERIM				4 812,05	4 812,05
022060 AC1	30/08/2024	FA		1 917,56	1 917,56
022219 AC2	24/09/2024	FA		1 682,88	1 682,88
023069 AC3	27/11/2024	FA		1 211,61	1 211,61
M2023-005/MS2/BDC5 Ilot C3 - M5 fiche de lot - ENVOLIS				1 087,31	1 087,31
022089 SOLDE	20/05/2024	FA 24-05-2544		270,82	270,82
023038 AC2	03/12/2024	FA 24-12-3126		816,49	816,49
M2023-005/MS2/BDC5 Ilot C3 - M5 fiche de lot - JBA-BOUCHETON JACQUES				967,69	967,69
022935 AC1	26/11/2024	FA 24-11-136		967,69	967,69
M2023-005/MS2/BDC5 Ilot C3 - M5 fiche de lot - MASTERPLAN				8 812,63	8 812,63
021031 AC1	29/05/2024	FA 24-05-0123		3 863,08	3 863,08
022218 AC2	27/09/2024	FA 24-09-0004		3 375,37	3 375,37
022924 AC3	25/11/2024	FA 24-11-0036		1 574,18	1 574,18
M2023-005/MS2/BDC5 Ilot C3 - M5 fiche de lot - TROUILLOT HERMEL				6 760,37	6 760,37
021071 AC1	30/05/2024	FA 2405-133		2 704,15	2 704,15
022220 AC2	24/09/2024	FA 2409-247		2 362,76	2 362,76
022931 AC3	25/11/2024	FA 2411-319		1 693,46	1 693,46
M2023-005/MS2/BDC6 Ilot C4 - M5 fiche de lot - BERIM				3 595,40	3 595,40
021942 AC1	31/07/2024	FA		3 595,40	3 595,40
M2023-005/MS2/BDC6 Ilot C4 - M5 fiche de lot - JBA-BOUCHETON JACQUES				482,88	482,88
020818 SOLDE	30/04/2024	FA 24-04-401		482,88	482,88
M2023-005/MS2/BDC6 Ilot C4 - M5 fiche de lot - MASTERPLAN				7 236,04	7 236,04
020786 AC1	25/04/2024	FA 24-04-0107		4 828,84	4 828,84
021626 AC2 07/24	19/07/2024	FA 24-07-0146		2 407,20	2 407,20
M2023-005/MS2/BDC6 Ilot C4 - M5 fiche de lot - TROUILLOT HERMEL				5 065,23	5 065,23
020769 AC1	24/04/2024	FA 2404-096		3 380,18	3 380,18
021623 AC2	16/07/2024	FA 2407-201		1 685,05	1 685,05
M2023-005/MS2/BDC7 Interstices - M.5 Fiche de lot - MASTERPLAN				3 621,63	3 621,63
020788 AC1	25/04/2024	FA 24-04-0108		2 414,42	2 414,42
021377 AC2	27/06/2024	FA 24-06-0140		1 207,21	1 207,21
M2023-005/MS2/BDC7 Interstices - M.5 Fiche de lot - TROUILLOT HERMEL				1 690,09	1 690,09
021393 AC1	27/06/2024	FA 2406-174		1 690,09	1 690,09
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - MASTERPLAN				4 830,63	4 830,63
021361 AC1	28/06/2024	FA 24-06-0141		1 810,81	1 810,81
021627 AC2 07/24	19/07/2024	FA 24-07-0147		1 805,40	1 805,40
022925 AC3	25/11/2024	FA 24-11-0038		1 214,42	1 214,42
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - TROUILLOT HERMEL				2 105,26	2 105,26
021394 AC1	27/06/2024	FA 2406-175		1 321,90	1 321,90
022932 AC2	25/11/2024	FA 2411-320		783,36	783,36
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - BERIM				6 205,32	6 205,32
023068 AC1	27/11/2024	FA		6 205,32	6 205,32
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - MASTERPLAN				4 363,27	4 363,27
022597 AC1	30/10/2024	FA 24-10-0027		4 363,27	4 363,27
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - TROUILLOT HERMEL				6 787,31	6 787,31
022664 AC3	24/10/2024	FA 2410-296b		6 787,31	6 787,31

Accusé de réception
 033-243300
 Date de télé
 Date de récé
 Publié le : 0

A103 Etude programmation			8 160,00	6 510,00	14 670,00
M2020-035 Etude de programmation - URBAN ID			8 160,00		8 160,00
011176 AC1	16/10/2020	FA 2020/05	14 688,00		14 688,00
011543 AC2 / SOLDE	07/12/2020	FA 2020/08	1 632,00		1 632,00
011815 REFACTORATION SUR MOUSSA PICOT	01/01/2021	FA 2020-08	-8 160,00		-8 160,00
M2024-041 MAJ étude de programmation - URBAN ID				6 510,00	6 510,00
022709 AC1	08/11/2024	FA 2024/09		6 510,00	6 510,00
A104 Concertation			55 804,76	36 450,47	92 255,23
18-02090 Captation par drone (photos et vidéos) - APPLICADRON			300,00		300,00
006302 AC1	12/06/2018	FA 20180012	300,00		300,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - HAZGUI MEHDI			9 120,00		9 120,00
006366 AC1	05/07/2018	FA 2018014	7 296,00		7 296,00
007064 AC 2	27/11/2018	FA 2018026	1 824,00		1 824,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - PLACE			11 520,00		11 520,00
006367 AC1	05/07/2018	NH 17/321/1	9 216,00		9 216,00
007101 AC2	29/11/2018	FA 17/321/3	2 304,00		2 304,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - QUESADA ROMAIN			1 400,00		1 400,00
006436 AC1	17/07/2018	FA 2018-07-17-	1 120,00		1 120,00
007234 AC2	13/12/2018	FA 2018-12-13-	280,00		280,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELOT RUBEN			6 411,00	4 909,50	11 320,50
007066 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	500,00		500,00
007568 BDC4 - AC1	13/02/2019	FA 02_19	1 542,00		1 542,00
008136 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 06-19	1 542,00		1 542,00
008137 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	514,00		514,00
008138 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 08-19	1 156,50		1 156,50
008425 BDC7 - AC2	19/07/2019	NH 11_19	1 156,50		1 156,50
019929 BDC15 AC1	29/01/2024	FA 001-2024		1 472,85	1 472,85
020373 BDC15 AC2	13/03/2024	FA 004-2024		2 454,75	2 454,75
021020 BDC15 SOLDE	27/05/2024	FA 006-2024		981,90	981,90
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - CROUZEL OLIVIER				15 579,48	15 579,48
020320 BDC15 AC1	09/03/2024	FA 202403-3		7 789,74	7 789,74
021063 BDC15 SOLDE	23/04/2024	FA 202404-7		7 789,74	7 789,74
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			12 293,28	4 189,44	16 482,72
007065 BDC 2	27/11/2018	FA 2018028	1 920,00		1 920,00
007555 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 2019005	2 220,48		2 220,48
008128 AC2	29/05/2019	FA 2019014	2 220,48		2 220,48
008129 AC1	29/05/2019	FA 2019015	2 467,20		2 467,20
008130 AC1	29/05/2019	FA 2019016	1 480,32		1 480,32
008470 BDC7	19/07/2019	FA 2019023	1 480,32		1 480,32
010435 BDC12	23/06/2020	FA 2020017	504,48		504,48
020308 AC1 BDC15	08/03/2024	FA 2024007		2 094,72	2 094,72
022920 AC2 BDC15	26/11/2024	FA 2024031		2 094,72	2 094,72
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			57,79		57,79
007067 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	5,50		5,50
007569 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 02_19	16,96		16,96
008146 AC1 BDC7	29/05/2019	NH 08-19	12,72		12,72
008144 AC2 BDC4	29/05/2019	NH 06-19	16,96		16,96
008145 AC1 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	5,65		5,65
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			8 937,84	6 284,16	15 222,00
006368 BDC1	05/07/2018	NH 17/321/2	600,00		600,00
007612 BDC4 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/4/1	1 233,60		1 233,60
007613 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/6/1	1 233,60		1 233,60
008132 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 17/321/4/2	1 233,60		1 233,60
008133 BDC5	29/05/2019	NH 17/321/5	986,88		986,88
008134 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 17/321/7	956,04		956,04
008429 BDC7 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/7/2	956,04		956,04
008428 BDC6 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/6/2	1 233,60		1 233,60
010473 BDC12	29/06/2020	FA 17/321	504,48		504,48
020326 AC1 BDC 15	11/03/2024	FA		3 142,08	3 142,08
022938 AC2 BDC15	27/11/2024	FA		3 142,08	3 142,08
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - QUESADA ROMAIN			5 764,85	2 520,20	8 285,05
007614 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 2019-02-22-	2 518,60		2 518,60
008427 BDC6 - AC2	19/07/2019	FA 2019-07-19-	2 518,60		2 518,60
009925 AC1/SOLDE	04/03/2020	FA 2020-03-04-	359,80		359,80
010451 BDC12	23/06/2020	FA 2020-06-23-	367,85		367,85
022968 AC1 BDC15	26/10/2024	FA 2024-11-27-		2 520,20	2 520,20
M2023-010/BDC7 Eys Carès Séminaire avec les élus sur les objectifs - REPERAGE URBAIN				1 032,24	1 032,24
020896 AC1 SOLDE	04/05/2024	FA 202421B		1 032,24	1 032,24
M2023-010/BDC9 Eys Carès Assistance à consultation Carès - REPERAGE URBAIN				1 935,45	1 935,45
021920 AC1	21/08/2024	FA 202446		1 935,45	1 935,45
A105 Etudes environnementales			98 795,82	16 350,49	115 146,31
18-01919 Eysines ZAC Carès Cantinolle Ilot C5 - Nomination hydrogéologue agréé pour avis -			1 001,50		1 001,50
005751 ARMAND CLAUDE	29/01/2018	FA 180129	1 001,50		1 001,50
23-06415 Ilot C7 Avis hydrogéologue agréé (périmètre de protection de la source Cantinolle) -			1 008,08		1 008,08
018267 SOLDE	20/06/2023	FA230620	1 008,08		1 008,08
24-06961 Ilot C5 : suivi travaux fouilles archéo dans le PPR - ARMAND CLAUDE				1 430,82	1 430,82
020241 SOLDE	03/03/2024	FA 240201		1 430,82	1 430,82
24-07231 Ilot C4 : avis hydrogéologue pour projet implantation - ARMAND CLAUDE				1 387,93	1 387,93
021079 SOLDE	25/05/2024	FA 240525		1 387,93	1 387,93
M2015-016/MS 30 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE			2 952,00		2 952,00
006237 AC1	25/05/2018	FA 18-086	2 952,00		2 952,00
M2016-005/MS17/BDC14 Mission 5b - Visite avant démolition bât M.Porc - BIOTOPE			427,18	61,94	489,12
016641 AC1 - SOLDE	22/11/2022	FA 202205509	427,18		427,18
021470 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD		61,94	61,94
M2016-005/MS17/BDC6 Mission 2.3f - suivi chantier Ilot C1 - BIOTOPE			4 928,23	478,22	5 406,45
010041 AC1	31/03/2020	FA 202000796	840,00		840,00
011661 AC2	23/10/2020	FA 202003488	1 731,23		1 731,23
019240 SOLDE	23/10/2023	FA 202305276	2 357,00		2 357,00
021452 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD		478,22	478,22
M2016-029 Actualisation étude d'impact - RIVIERE ENVIRONNEMENT			19 080,00		19 080,00
003444 AC 1	27/07/2016	FA F16.07-659	2 016,00		2 016,00
004223 AC2	26/01/2017	FA F17.01-714	5 040,00		5 040,00
005056 AC 3	08/08/2017	FA F17.08-780	6 768,00		6 768,00
005717 AC4	23/01/2018	FA F18-01-835	3 456,00		3 456,00
006554 AC1	31/08/2018	FA F18-08-916	1 800,00		1 800,00

Accusé de ré
 033-243300:
 Date de télé:
 Date de réce:
 Publi le : 03

M2018-024/BDC 60 SSEP Poursuite du suivi piezo - TERE0			7 055,38		7 055,38
015292 AC1	31/05/2022	FA 22/151	1 937,49		1 937,49
015893 AC2	22/07/2022	FA 22/200	736,04		736,04
016328 AC3	26/09/2022	FA 22/259	734,58		734,58
016811 AC4	01/01/2023	FA 22/330	1 251,93		1 251,93
017790 AC5	06/02/2023	FA 23/041	743,89		743,89
019117 AC6	13/10/2023	FA 23/296	1 651,45		1 651,45
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - GAIA RJ			3 414,00		3 414,00
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	3 414,00		3 414,00
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - TERE0			18 159,35		18 159,35
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	11 667,54		11 667,54
012601 AC2	25/05/2021	FA 21/153	686,44		686,44
012911 AC3	05/07/2021	FA 21/194	686,44		686,44
013300 AC4	21/06/2021	FA 21/171	854,62		854,62
013394 AC5	24/09/2021	FA 21/279	1 180,87		1 180,87
013772 AC6	29/10/2021	FA 21/337	692,38		692,38
014202 AC7	01/01/2022	FA 21/413	697,25		697,25
014879 AC8	25/03/2022	FA 22/078	1 693,81		1 693,81
M2021-009/BDC1 Diagnostic écologique - BDC1 : Mission 1 - ENVOLIS			10 201,10		10 201,10
012814 AC1	13/05/2021	FA 21-05-664	1 863,60		1 863,60
012813 AC2	31/05/2021	FA 21-05-691	873,60		873,60
012815 AC3	19/06/2021	FA 21-06-734	873,60		873,60
013536 AC4	25/10/2021	FA 21-10-891	2 614,80		2 614,80
013626 AC5	29/10/2021	FA 21-10-932	873,60		873,60
014559 AC6	28/02/2022	FA 22-02-1120	1 455,60		1 455,60
015711 AC7	21/07/2022	FA 22-07-1405	1 455,60		1 455,60
016511 REGUL REVISIONS	07/11/2022	REV1	190,70		190,70
M2021-009/BDC2 Diagnostic écologique - BDC2 : Mission 2 expert. compl./6.2 Atelier - ENVOLIS			1 595,93		1 595,93
016031 AC1	20/06/2022	FA 22-06-1313	1 595,93		1 595,93
M2022-007 Lot 1/BDC13 M15.2 Participation réunion/atelier de travail - ENVOLIS				875,28	875,28
019980 SOLDE	01/01/2024	FA 23-11-2217		875,28	875,28
M2022-007 Lot 1/BDC4 AMO Missions écologiques : Actu Diag écologique - ENVOLIS			370,44		370,44
017507 AC1	03/03/2023	FA 23-03-1693	370,44		370,44
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC11 Suivi piézo 12 mois - SEREA			3 619,48	12 116,30	15 735,78
018417 AC1	28/07/2023	FA 230488	996,34		996,34
018514 AC2	11/08/2023	FA230536	994,38		994,38
018815 AC3	28/09/2023	FA 230622	628,54		628,54
019019 AC4	24/10/2023	FA 230679	1 000,22		1 000,22
019981 AC5	31/01/2024	FA 240052		2 283,95	2 283,95
020814 AC6	30/04/2024	FA 240256		4 859,21	4 859,21
022221 AC7	27/09/2024	FA 240559		4 973,14	4 973,14
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC2 SSEP3 - Démolition cabanon Rue M-Porc - SEREA			2 797,55		2 797,55
017975 AC1	17/05/2023	FA 230280	2 797,55		2 797,55
M2022-064/BDC1 Diag phyto Ilots C4, C5, C7 : Diag phyto+rapport - ENVOLIS			22 185,60		22 185,60
016382 AC1	20/10/2022	FA 22-10-1510	16 185,60		16 185,60
016668 AC2	18/11/2022	FA 22-11-1547	6 000,00		6 000,00
A106 Etude mobilité			88 742,69	49 676,72	138 419,41
M2016-045 Etudes mobilité - TRANSITEC			45 997,20		45 997,20
004514 MS1 AC1	24/03/2017	FA 17107	1 560,00		1 560,00
004625 AC 2	04/05/2017	FA 17159	15 868,80		15 868,80
004741 AC3	08/06/2017	FA 17213	14 078,40		14 078,40
004762 AC 3	12/06/2017	AV 17213	-14 078,40		-14 078,40
004763 AC 3	12/06/2017	FA 17220	13 374,48		13 374,48
004936 AC4	25/07/2017	FA 17308	5 731,92		5 731,92
005350 AC 5	26/10/2017	FA 17451	9 462,00		9 462,00
M2019-039 Lot 1/BDC11 ECC ECC - M6 ilot C1 enquête motorisation locataires - NOVA 7			8 059,32		8 059,32
019656 AC1	21/07/2023	FA 230708	8 059,32		8 059,32
M2019-039/Lot 2/BDC15A ECC Analyse offres C7 - AUXILIA			561,00		561,00
019673 AC1	29/09/2023	FA 329-2023	561,00		561,00
M2019-039/Lot 2/BDC15S ECC Analyse offres C7 - SCET			3 927,00		3 927,00
019674 AC1	30/08/2023	FA F23-09-	3 927,00		3 927,00
M2019-039/Lot 2/BDC6 SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - SCET			2 982,60		2 982,60
019688 AC2 SOLDE (PM AC1 S/STE)	30/06/2023	F23-09-P01160	2 982,60		2 982,60
M2019-039/Lot 2/BDC6A SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - AUXILIA			8 801,94	4 464,81	13 266,75
019690 AC2 (PM AC1 S/STE)	29/09/2023	FA 334-2023	8 801,94		8 801,94
020081 AC3 SOLDE	01/01/2024	FA 501-2023		4 464,81	4 464,81
M2019-039/Lot 2/BDC8A SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage			8 727,01	20 434,83	29 161,84
019694 AC2 (PM AC1 S/STE)	29/09/2023	FA 327-2023	8 727,01		8 727,01
020082 AC3	01/01/2024	FA 502-2023		4 332,06	4 332,06
021831 AC4	24/07/2024	FA 265-2024		16 102,77	16 102,77
M2019-039/Lot 2/BDC8S SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage loc			9 686,62	3 243,08	12 929,70
019692 AC2 (PM AC1 S/STE)	30/09/2023	FA F23-09-	9 686,62		9 686,62
021672 AC3	25/07/2024	FA		3 243,08	3 243,08
M2023-052/BDC2 Expérimentation prêt vélo Eysines - VELIPRO (VIRAJ)				21 534,00	21 534,00
020661 AC1 SOLDE	15/04/2024	FA F-382		21 534,00	21 534,00
A107 Sondages géotechniques			87 326,67	1 283,14	88 609,81
M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 634,70		9 634,70
005624 BDC 10	29/12/2017	FA	9 634,70		9 634,70
M2016-015/BDC13 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			14 763,05		14 763,05
006627 AC1	13/09/2018	FA SBX2.I.0342	14 763,05		14 763,05
M2016-015/BDC4 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 450,00		9 450,00
004728 AC1	02/06/2017	FA	9 450,00		9 450,00
M2016-015/BDC5 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			2 652,00		2 652,00
004997 AC1	02/08/2017	FA	2 652,00		2 652,00
M2016-015/BDC9 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			384,82		384,82
005271 AC1	11/10/2017	FA	384,82		384,82
M2020-052 LOT 2/BDC15 Ilot C7 : sondages complémentaires G0 - FONDASOL			5 338,20		5 338,20
017866 AC1	28/04/2023	FA SI2305140	5 338,20		5 338,20
M2020-052 LOT 2/BDC16 Mission G1PGC : Ilots C4 et C7 - FONDASOL			1 179,36		1 179,36
018083 AC1	05/06/2023	FA SI.23.06558	1 179,36		1 179,36
M2020-052 LOT 2/BDC17 Mission G1PGC : Ilots C4 investigation complémentaire - FONDASOL			2 882,88		2 882,88
018080 AC1	31/05/2023	FA SI.23.06443	2 882,88		2 882,88
M2020-052 LOT 2/BDC20 Ilot C7 - M12.1 vacation - FONDASOL				394,56	394,56
020033 SOLDE	07/02/2024	FA SI.24.01296		394,56	394,56
M2020-052 LOT 2/BDC21 Etudes Dde sol G1 pour acquisition BB256 - FONDASOL				888,58	888,58

Accusé de réception
033-243300
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

021105 SOLDE	31/05/2024	FA SI2406339		888,58	888,58
M2020-052 Lot 2/BDC7 Diags G2 AVP / Ilots C4 et C7 - FONDASOL			41 041,66		41 041,66
016493 AC1	31/10/2022	FA SI.22.13567	22 188,00		22 188,00
016702 AC2	29/11/2022	FA 14795	18 853,66		18 853,66
A108 Géomètre			21 149,70	24 410,10	45 559,80
M2016-003/BDC20 BDC 20 Plan général de synthèse - ABAC-GEO AQUITAINE			5 326,03		5 326,03
008392 BDC20	15/07/2019	FA F190758	5 326,03		5 326,03
M2016-003/BDC35 BDC 35 Piquetage limite bordure îlot C7 - ABAC-GEO AQUITAINE			362,17		362,17
008391 BDC35	15/07/2019	FA F190757	362,17		362,17
M2016-003/BDC37 BDC 37 Piquetage Rue Martin Porc - ABAC-GEO AQUITAINE			181,70		181,70
008390 BDC37	15/07/2019	FA F190756	181,70		181,70
M2016-003/BDC38 BDC 38 Piquetage propriété Soleillet - ABAC-GEO AQUITAINE			135,66		135,66
008389 BDC38	15/07/2019	FA F190755	135,66		135,66
M2019-034 Lot 1/BDC3 Demande DMPC parcelle BB 1164 - MAGEO			1 721,63		1 721,63
010201 AC1 / SOLDE	29/04/2020	FA FC12958	1 721,63		1 721,63
M2019-034 Lot 1/BDC39 Géomètre: plan récolement parcelle BB1020 - MAGEO			885,10		885,10
012635 AC1	31/05/2021	FA FC15237	885,10		885,10
M2019-034 Lot 1/BDC60 Bornage BB1020, îlot 7, plan, piquetage chemin rural - MAGEO			8 952,06		8 952,06
015728 AC1	22/07/2022	FA FC17793	8 952,06		8 952,06
M2019-034 Lot 1/BDC60bis Piquetage emprise servitude canalis" EP parcelle BB1020 - MAGEO			903,74		903,74
014885 AC1	31/03/2022	FA FC17146	903,74		903,74
M2019-034 Lot1/BDC98 Plans de récolement îlot C7 - MAGEO			2 681,61		2 681,61
017863 AC1	28/04/2023	FA FC19454	2 681,61		2 681,61
M2023-043/Lot1/BDC3 îlots C1 - C3 / parcelles BB3194 & BB3195 / relevés topo - GEOSAT				3 963,79	3 963,79
020698 SOLDE	19/04/2024	FA F24040433		3 963,79	3 963,79
M2023-043/Lot1/BDC6 Îlot C3 relevé topo complémentaire - GEOSAT				1 033,36	1 033,36
022296 AC1	30/09/2024	FA F24090967		1 033,36	1 033,36
M2023-043/Lot3/BDC15 îlot C4 M2.1.2 délimitation foncière - MAGEO				4 573,68	4 573,68
020847 SOLDE	30/04/2024	FA FC21955		4 573,68	4 573,68
M2023-043/Lot3/BDC16 Îlot C4 piquetage parcelle gymnase - MAGEO				1 786,66	1 786,66
023030 SOLDE	29/11/2024	FA FC23585		1 786,66	1 786,66
M2023-043/Lot3/BDC4 îlot C4 : M2.1.2 - 2.31.2.5 - MAGEO				3 905,69	3 905,69
020835 SOLDE	30/04/2024	FA FC21951		3 905,69	3 905,69
M2023-043/Lot3/BDC7 ZAC M2.7.1 & 2.7.2 contrôle plans et plan de récolement - MAGEO				1 718,92	1 718,92
020599 SOLDE	29/03/2024	FA FC21726		1 718,92	1 718,92
M2024-033 Détection et géoréférencement tous réseaux - GEOSAT				7 428,00	7 428,00
022281 AC1	30/09/2024	FA F24090910		7 428,00	7 428,00
A110 Etude et expertise juridique			6 060,53		6 060,53
M2021-001 Lot 1/BDC10 Conseil Juridique - Ligne Haute tension Pré-contentieux RTE -			3 969,65		3 969,65
014634 AC1	28/02/2022	FA 22-0278	3 969,65		3 969,65
M2021-001 Lot 1/BDC12 Conseil Juridique - Convention Participation des constructeurs -			2 090,88		2 090,88
015881 AC1	29/06/2022	FA 202203427	2 090,88		2 090,88
A112 Autres			13 111,97	8 023,41	21 135,38
18-02137 Dimensionnement dalle Aqueduc Eysines - ARTECH			5 340,00		5 340,00
006474 AC1	25/07/2018	FA 11 393	3 828,00		3 828,00
006541 AC2	20/08/2018	FA 11 430	1 245,00		1 245,00
007398 AC3	23/10/2018	FA 11 430 BIS	267,00		267,00
M2022-007 Lot 1/BDC6 AMO Missions écologiques : Etude site compensation - ENVOLIS			7 771,97	8 023,41	15 795,38
018650 AC1	08/09/2023	FA 23-09-2016	2 842,80		2 842,80
018754 AC2	21/09/2023	FA23-09-2043	4 929,17		4 929,17
022226 AC3	27/09/2024	FA 24-09-2899		4 819,60	4 819,60
022940 AC4	27/11/2024	FA 24-11-3083		3 203,81	3 203,81
B FONCIER			9 894 580,76	1 217 964,62	11 112 545,38
B101 Coût aquisition terrain			8 867 400,14	761 240,00	9 628 640,14
17-01383/1 Acquisition terrain non batis BM (ex IT Martin Porc) - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 223 050,00		1 223 050,00
17-01383/1 Provision	06/02/2017		1 248 000,00		1 248 000,00
004298 ACQ" TERRAIN NN BATIS	09/02/2017	FA 09/02/17	-24 950,00		-24 950,00
18-02141/1 Acquisition BB 2729- BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			2 100,00		2 100,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018		2 100,00		2 100,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			182 200,00		182 200,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	182 200,00		182 200,00
18-02143/1 Acquisition BB 1020 - PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			252 000,00		252 000,00
18-02143/1 Provision	03/07/2018		252 000,00		252 000,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			104 000,00		104 000,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19	104 000,00		104 000,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			167 181,82		167 181,82
18-02145/1 Provision	03/07/2018		167 181,82		167 181,82
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 190,00		1 190,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	1 190,00		1 190,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			221 100,00		221 100,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19	221 100,00		221 100,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			420,00		420,00
18-02149/1 Provision	03/07/2018		420,00		420,00
18-02150/1 Acquisition BB 236 - GAUDNER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			700,00		700,00
18-02150/1 Provision	03/07/2018		700,00		700,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			1 610,00		1 610,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA	1 610,00		1 610,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 050,00		1 050,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		1 050,00		1 050,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			173 700,00		173 700,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/AR	173 700,00		173 700,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 540,00		1 540,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/00	1 540,00		1 540,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			595,00		595,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	595,00		595,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			297,50		297,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	297,50		297,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			297,50		297,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG	297,50		297,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			62 500,00		62 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19	62 500,00		62 500,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES			146 880,00		146 880,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	146 880,00		146 880,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES			38 300,00		38 300,00
013500 ACQ" BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	38 300,00		38 300,00

Accusé de réception
033-243300
Date de télé
Date de récép
Publié le : 0

18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 283 700,00		1 283 700,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EY	1 283 700,00		1 283 700,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 400,00		1 400,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		1 400,00		1 400,00
19-03191 Acquisition Terrain nu AA309 IMMO LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 126 000,00		3 126 000,00
009031 TRANSFERT LUPINI CF001/C0002	08/11/2019	08/11/19	3 126 000,00		3 126 000,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 878,33		1 878,33
21-04458/1 Provision	03/06/2021		1 878,33		1 878,33
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 030,00		3 030,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		3 030,00		3 030,00
21-04917 Acquisition Expropration AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			66 220,00		66 220,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/97	33 110,00		33 110,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/2	33 110,00		33 110,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			114 240,00		114 240,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	114 240,00		114 240,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			878 500,00		878 500,00
22-05063 Provision	10/02/2022		878 582,45		878 582,45
22-05063 Provision	10/02/2022		-82,45		-82,45
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			2 030,00		2 030,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	2 030,00		2 030,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			536 500,00		536 500,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		536 500,00		536 500,00
22-05842/1 Acquisition BM - BB657 à 659 - BB227 - BB231 - BB252 et BB253 - BREYNE PATRICE				592 200,00	592 200,00
22-05842/1 Provision	02/12/2022			592 200,00	592 200,00
23-06127/1 Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			48 700,00		48 700,00
23-06127/1 Provision	09/03/2023		48 700,00		48 700,00
23-06128/1 Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			223 300,00		223 300,00
23-06128/1 Provision	09/03/2023		223 300,00		223 300,00
23-06165 Acquisition Expro Consignation BB 2731 GERDESSUS Gabriel - CONSIGNATION CAISSE			700,00		700,00
017640 ACQ EXPRO CONSIGNATION GERDESSUS GABRIEL	27/03/2023	BB 2731	700,00		700,00
23-06605/1 Acquisition SEMPEY BB3147 - BREYNE PATRICE (NOT)			490,00		490,00
23-06605/1 Provision	16/10/2023		490,00		490,00
23-06665 Acquisition Expro Consignation 2eme versement CA AA 502 - VAL D'ALBANT -				114 240,00	114 240,00
019202 EXPRO 2EME CC*	04/06/2024	0035/10357/2		114 240,00	114 240,00
24-06968 Acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)				54 800,00	54 800,00
24-06968 Provision	08/02/2024			54 800,00	54 800,00
B201 Frais d'actes			106 379,99	9 278,00	115 657,99
17-01383/2 It Martin Porc : Frais d'acqu* terrain non batis BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			21 806,84		21 806,84
17-01383/2 Provision	06/02/2017		22 500,00		22 500,00
17-01383/2 Provision	06/02/2017		-400,00		-400,00
004706 FRAIS ACQ* ILOT MARTIN PORT	24/05/2017	FA 24/05/17	-293,16		-293,16
18-02141/2 Frais acquisition BB 2729 BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			314,40		314,40
18-02141/2 Provision	11/10/2022		500,00		500,00
017679 FRAIS ACQ BB 2729 BOUC	10/03/2023	FA 30/03/23	-170,60		-170,60
017680 REMB / FRAIS ACQ BOUC	13/03/2023	FA 30/03/23	-15,00		-15,00
18-02143/2 Frais acquisition PARANTEAU BB1020 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			6 069,07		6 069,07
18-02143/2 Provision	18/12/2018		200,00		200,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		6 100,00		6 100,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		-13,29		-13,29
008209 FRAIS ACQ* PARANTEAU BB1020	31/05/2019	FA 31/05/19	-217,64		-217,64
18-02145/2 Frais d'acquisition MEU BB 68 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 225,44		3 225,44
18-02145/2 Provision	03/07/2019		4 892,00		4 892,00
009873 FRAIS ACQ* MEU BB 68	10/02/2020	FA 10/02/20	-1 666,56		-1 666,56
18-02149/2 Frais acquisition BB 2737 GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			207,61		207,61
18-02149/2 Provision	30/04/2021		240,00		240,00
013479 FRAIS ACQ BB 2737 GAUDNER M	16/09/2021	FA 16/09/21	-32,39		-32,39
18-02150/2 Frais acquisition GAUDNER BB236 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			196,14		196,14
18-02150/2 Provision	27/09/2019		300,00		300,00
009875 FRAIS ACQ* GAUDNER BB236	18/02/2020	FA 18/02/20	-103,86		-103,86
18-02152/2 Frais de notaire SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			198,71		198,71
18-02152/2 Provision	02/01/2020		260,00		260,00
010008 FRAIS ACQ* SOLEILLET	03/03/2020	FA 03/03/20	-61,29		-61,29
18-02163/2 Frais d'acquisition BB2751 HEZER/KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			311,46		311,46
18-02163/2 Provision	15/10/2020		340,00		340,00
011961 FRAIS ACQ BB2751 HEZER/KUCUK	29/01/2021	FA 29/01/21	-28,54		-28,54
19-03189 Eysines CC : Frais acquisition Immo LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			53 302,28		53 302,28
009032 TRANSFERT LUPINI CF001/C002	08/11/2019	08/11/19	53 302,28		53 302,28
19-03190 Eysines CC : Frais d'acquisition Immo LUPINI - ADENIS-LAMARRE (NOT)			283,42		283,42
009033 TRANSFERT LUPINI CF001/C0002	08/11/2019	08/11/19	283,42		283,42
21-04458/2 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			354,22		354,22
21-04458/2 Provision	03/06/2021		500,00		500,00
013668 FRAIS ACQ BB 2832- GIRONDE HABITAT	14/10/2021	FA 14/10/21	-145,78		-145,78
21-04460/2 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			484,32		484,32
21-04460/2 Provision	03/06/2021		600,00		600,00
013667 FRAIS ACQ BB AA 435 BMSO	14/10/2021	FA 14/10/21	-115,68		-115,68
22-05063//2 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			7 408,02		7 408,02
22-05063//2 Provision	07/02/2022		7 400,00		7 400,00
22-05063//2 Provision	07/02/2022		100,00		100,00
015095 FRAIS ACQ BB 2733 ARGILLOS	26/04/2022	FA 09/05/22	-91,98		-91,98
22-05842/2 Acquisition BM - BB657 à 659 - BB227 - BB231 - BB252 et BB253 - BREYNE PATRICE				6 735,12	6 735,12
22-05842/2 Provision	22/01/2024			7 500,00	7 500,00
020472 FRAIS ACQ BM ILOT C7	12/03/2024	FA 12/03/24		-764,88	-764,88
23-05694/2 Frais Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			6 775,37		6 775,37
23-05694/2 Provision	05/10/2022		6 786,07		6 786,07
018126 FRAIS ACQ NIETO BB258-257-678	31/05/2023	FA 31/05/23	-10,70		-10,70
23-06127/2 Frais Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			1 378,44		1 378,44
23-06127/2 Provision	07/09/2023		1 399,98		1 399,98
019137 FRAIS ACQ BEAUSOEIL BB234	27/10/2023	FA 27/10/23	-21,54		-21,54
23-06128/2 Frais Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			3 848,64		3 848,64
23-06128/2 Provision	05/05/2023		350,00		350,00
23-06128/2 Provision	05/05/2023		5 750,00		5 750,00
018427 FRAIS S/ACQ* GIANELLI BB254-255	17/07/2023	FA 17/07/23	-2 100,00		-2 100,00
018678 FRAIS DEF S/ACQ GIANELLI	07/08/2023	FA 07/08/23	-151,36		-151,36
23-06605/2 Frais acquisition Sempey BB3147 - BREYNE PATRICE (NOT)			215,61		215,61
23-06605/2 Provision	16/10/2023		250,00		250,00

Accusé de ré
033-243300 :
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

019710 FRAIS ACQ SEMPEY BB3147	28/12/2023	FA 28/12/23	-34,39		-34,39
24-06849 Signification jugement Claudio Roger - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)				71,44	71,44
019665 SOLDE	01/01/2024	FA B1265640		71,44	71,44
24-06850 Signification jugement Claudio née Metbach Katy - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)				71,44	71,44
019666 SOLDE	01/01/2024	FA B1265639		71,44	71,44
24-06968/2 Frais acquisition PSV EYMARD BB 256 - BUGEAUD CAMPAGNE (NOT)				400,00	400,00
24-06968/2 Provision	25/06/2024			400,00	400,00
24-06968/3 Frais acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)				2 000,00	2 000,00
24-06968/3 Provision	05/09/2024			2 000,00	2 000,00
B302 Géomètres foncier			38 342,85	110,35	38 453,20
M2016-003/BDC1 Géomètre expert lot 1 - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			5 688,00		5 688,00
003651 BDC1	30/09/2016	FA 1609-204	2 844,00		2 844,00
004022 SOLDE BDC1	14/12/2016	FA 1612-280	2 844,00		2 844,00
M2016-003/BDC13 Géomètre expert lot 1 - GEOSAT			7 935,70		7 935,70
005745 BDC13	28/11/2017	FA F174591	7 935,70		7 935,70
M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 1 Site géographique secteur nord - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			3 859,20		3 859,20
004024 BDC3 AC1	14/12/2016	FA 1612-281	3 859,20		3 859,20
M2016-003/BDC36 Bornage Paranteau et Piquetage Gaudner Folloni - ABAC-GEO AQUITAINE			785,23		785,23
009341 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191228	785,23		785,23
M2016-003/BDC5 Géomètre expert lot 1 - ABAC (NE PLUS UTILISER)			134,90		134,90
004752 BDC5 GEOMETRE EXPERT LOT1	09/06/2017	FA B-17-06-425	132,00		132,00
005055 REV BDC5	28/08/2017	FA 28/08/2017	2,90		2,90
M2019-032/BDC5 Bornage et plan de cession terrain à bâtir C1 - MAGEO			696,86		696,86
009052 AC1	31/10/2019	FA FC12064	696,86		696,86
M2019-034 Lot 1/BDC100 PD Maison Nieto 28 rue MP - MAGEO			480,47		480,47
017861 AC 1	30/04/2023	FA FC19461	480,47		480,47
M2019-034 Lot 1/BDC104 Piquetage clôtures BB2729 - BB2731 - MAGEO			985,68		985,68
018068 AC1	31/05/2023	FA FC19697	985,68		985,68
M2019-034 Lot 1/BDC125 Piquetage AA479 - MAGEO			1 035,22		1 035,22
019084 SOLDE	30/10/2023	FA FC20601	1 035,22		1 035,22
M2019-034 Lot 1/BDC23 Levé surfacique allée de l'Europe et du Taillan Médoc - MAGEO			3 298,93		3 298,93
011659 BDC 23	01/01/2021	FA FC14315	3 298,93		3 298,93
M2019-034 Lot 1/BDC67 DMPC EP rue MP - MAGEO			4 379,79		4 379,79
017699 AC1	31/03/2023	FA FC19316	4 379,79		4 379,79
M2019-034 Lot 1/BDC71 Bornage parcelles Fab + 1 partie du chemin rural ilot C7 - MAGEO			924,76		924,76
016563 AC 1	31/10/2022	FA FC18398	924,76		924,76
M2019-034 Lot 1/BDC78 Géomètre : Piquetage Rue M-porc/Clotures - MAGEO			1 559,11		1 559,11
015721 AC1	22/07/2022	FA FC17803	1 559,11		1 559,11
M2019-034 Lot 1/BDC81 Piquetage et DA emprise Seympé - MAGEO			1 543,64		1 543,64
016578 AC 1	31/10/2022	FA FC18399	720,71		720,71
017434 AC2	28/02/2023	FA FC19085	822,93		822,93
M2021-077/BDC10 Diags avant vente BB254-255 - AED EXPERTISES			159,41		159,41
017733 AC1	05/04/2023	FA FA-239436	159,41		159,41
M2021-077/BDC11 Diags avant vente BB234 - AED EXPERTISES			108,89		108,89
018529 AC1 SOLDE	22/08/2023	FA01095306	108,89		108,89
M2021-077/BDC13 Diags avant démol Nieto 28 rue MP - AED EXPERTISES			3 319,92		3 319,92
018744 SOLDE	19/09/2023	FAFA01096881	3 319,92		3 319,92
M2021-077/BDC13 Bis Compléments diag avant démol 28 rue MP - AED EXPERTISES			394,63		394,63
018960 SOLDE	19/09/2023	FA01096881	394,63		394,63
M2021-077/BDC2 Diagnostics ancien garage avant démol - AED EXPERTISES			590,38		590,38
015924 AC1	26/08/2022	FA FA-228282	500,09		500,09
017683 AC2	30/03/2023	FA FA-239024	90,29		90,29
M2021-077/BDC25 Diags avant vente terrain Sempey - AED EXPERTISES			109,52		109,52
019168 SOLDE	31/10/2023	FA01099781	109,52		109,52
M2021-077/BDC34 Diagnostics avant vente BB256 - AED EXPERTISES				110,35	110,35
020675 SOLDE	18/04/2024	FA		110,35	110,35
M2021-077/BDC8 Diag avant vente, assainissement 28 rue MP - AED EXPERTISES			352,61		352,61
017601 AC1	23/02/2023	FA-236504	352,61		352,61
B303 Expertises foncières			4 239,92		4 239,92
18-02275 Recherches Généalogiques - DELFAUT - PEROTIN			2 000,00		2 000,00
007529 ETUDE GENEALOGIQUE DELFAUT	01/02/2019	FA 795	2 000,00		2 000,00
M2019-032/BDC1 Document d'arpentage et plan de cession - MAGEO			2 239,92		2 239,92
010202 AC1/SOLDE	29/04/2020	FA FC12959	2 488,80		2 488,80
010298 AVOIR S/AC1	31/05/2020	AV 13100	-248,88		-248,88
B401 Indemnités de remploi			445 751,86	15 404,00	461 155,86
18-02141/1 Acquisition BB 2729- BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			420,00		420,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018		420,00		420,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			19 220,00		19 220,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	19 220,00		19 220,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			11 400,00		11 400,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19	11 400,00		11 400,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			17 718,18		17 718,18
18-02145/1 Provision	03/07/2018		17 718,18		17 718,18
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			238,00		238,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	238,00		238,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			23 110,00		23 110,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19	23 110,00		23 110,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			84,00		84,00
18-02149/1 Provision	03/07/2018		84,00		84,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			322,00		322,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA	322,00		322,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			210,00		210,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		210,00		210,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			18 370,00		18 370,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/AR	18 370,00		18 370,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			380,00		380,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/00	380,00		380,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			119,00		119,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	119,00		119,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			59,50		59,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	59,50		59,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			59,50		59,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG	59,50		59,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			7 250,00		7 250,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19	7 250,00		7 250,00

Accusé de réception
033-243300
Date de télé
Date de réception
Publié le : 0

18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES			10 688,00		10 688,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	10 688,00		10 688,00
18-02159/2 Acquisition Expro Complément Remploi BB 682 - EL LAHIANI Abdelkader - EL-			2 500,00		2 500,00
017092 COMP EMPLOI BB 682	18/01/2023	JUG 27/05/21	2 500,00		2 500,00
18-02159/3 Acquisition Expro Complément Remploi BB 682 - EL LAHIANI Djouher - EL-LAHIANI			2 500,00		2 500,00
017098 COMP EMPLOI BB 682	18/01/2023	JUG 27/05/21	2 500,00		2 500,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES			4 830,00		4 830,00
013500 ACQ° BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	4 830,00		4 830,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			129 370,00		129 370,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EY	129 370,00		129 370,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			280,00		280,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		280,00		280,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			375,67		375,67
21-04458/1 Provision	03/06/2021		375,67		375,67
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			606,00		606,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		606,00		606,00
21-04917 Acquisition Exporiation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			7 622,00		7 622,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/97	4 311,00		4 311,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/2	3 311,00		3 311,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			12 424,00		12 424,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	12 424,00		12 424,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			88 850,00		88 850,00
22-05063 Provision	10/02/2022		88 858,34		88 858,34
22-05063 Provision	10/02/2022		-8,34		-8,34
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			406,00		406,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	406,00		406,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			57 000,00		57 000,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		57 000,00		57 000,00
23-06127/1 Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			5 870,00		5 870,00
23-06127/1 Provision	09/03/2023		5 870,00		5 870,00
23-06128/1 Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			23 330,00		23 330,00
23-06128/1 Provision	09/03/2023		23 330,00		23 330,00
23-06165 Acquisition Expro Consignation BB 2731 GERDESSUS Gabriel - CONSIGNATION CAISSE			140,00		140,00
017640 ACQ EXPRO CONSIGNATION GERDESSUS GABRIEL	27/03/2023	BB 2731	140,00		140,00
23-06665 Acquisition Expro Consignation 2eme versement CA AA 502 - VAL D'ALBANT -				8 924,00	8 924,00
019202 EXPRO 2EME CC°	04/06/2024	0035/10357/2		8 924,00	8 924,00
24-06968 Acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)				6 480,00	6 480,00
24-06968 Provision	08/02/2024			6 480,00	6 480,00
B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers..)			163 882,20	5 500,00	169 382,20
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			1 500,00		1 500,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	1 500,00		1 500,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19	1 500,00		1 500,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19	1 500,00		1 500,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			4 900,00		4 900,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA	4 900,00		4 900,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 200,00		1 200,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/00	1 200,00		1 200,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			400,00		400,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	400,00		400,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			200,00		200,00
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	200,00		200,00
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			200,00		200,00
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG	200,00		200,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19	1 500,00		1 500,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EY	1 500,00		1 500,00
21-04917 Acquisition Exporiation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			7 347,20		7 347,20
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/97	1 500,00		1 500,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/2	5 847,20		5 847,20
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			1 500,00		1 500,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	1 500,00		1 500,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			98 135,00		98 135,00
22-05063 Provision	10/02/2022		98 144,21		98 144,21
22-05063 Provision	10/02/2022		-9,21		-9,21
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			500,00		500,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	500,00		500,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			36 500,00		36 500,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		36 500,00		36 500,00
23-06666 Indemnité art.700 CA CCASS Val d'Albant - CARPA BORDEAUX			5 500,00		5 500,00
019203 INDEM 700 CCASS VAL DALBANT	14/11/2023	0035/10357/2	5 500,00		5 500,00
24-07251 Indemnité art.700 CA CCASS 2ème versement Val d'Albant - CARPA BORDEAUX				5 500,00	5 500,00
021082 INDEM ART 700 CA CCASS 2EME VERSEMT VAL D'ALBANT	04/06/2024	04/06/2024		5 500,00	5 500,00
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			90 143,22	5 903,03	96 046,25
2023-009 Débroussaillage MP - BRETtes ENVIRONNEMENT			2 700,00		2 700,00
017490 AC1	03/03/2023	FA E2303003	2 700,00		2 700,00
2024-045 Défrichage ilot C4 avant mission piquetage gymnase - BRETtes ENVIRONNEMENT				3 696,00	3 696,00
022780 SOLDE	31/10/2024	FA E2410207		3 696,00	3 696,00
22-05383 Sécurisation par barrières Heras Al. des Peupliers - COLAS SO/SCREG			11 378,40		11 378,40
015565 AC1	22/06/2022	FA	11 378,40		11 378,40
22-05879 Renfort barrierage Allée des Peupliers - CAUPAMAT			3 923,18		3 923,18
017162 AC1	23/01/2023	FA	3 923,18		3 923,18
23-06139 Sécurisation du 28 rue martin porc et à l'entrée du chemin des gleyzes à Eysines -			1 764,00		1 764,00
017616 AC1	15/03/2023	FA FA4341	1 764,00		1 764,00
23-06258 Nettoyage du terrain 28 rue MP - RECYCLEXPRT			3 072,00		3 072,00
018043 AC1	30/05/2023	FA 1443	3 072,00		3 072,00
23-06286 Abattage arbre sur fil électrique Ilot C4 - BRETtes ENVIRONNEMENT			1 092,00		1 092,00
019070 SOLDE	31/05/2023	FA E2305166	1 092,00		1 092,00
24-07437 Abattage d'un sureau en pied d'un poteau électrique - 28 rue Martin Porc - BRETtes				211,20	211,20
022211 AC1	26/09/2024	FA E2409028		211,20	211,20
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			27 303,88		27 303,88
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		30 000,00		30 000,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		3 000,00		3 000,00

Accusé de ré
033-243300 :
Date de télé
Date de réce
Publié le : 03

005556 BDC 7 TPS 11/17	11/12/2017	FA 2017/39	129,04		129,04
006797 BDC 7- GENIER-DEFORGE	01/01/2018	FA			
006799 BDC 7 - AC ENVIRONNEMENT	01/01/2018	FA BFP002205			
006800 BDC 7 - GENIER DEFORGE	01/01/2018	FA	-5 825,16		-5 825,16
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			273,04		273,04
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Avance	20/10/2017		144,00		144,00
005557 BDC 11 TPS 11/2017	11/12/2017	FA 2017/40	129,04		129,04
007418 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118			
M2016-001 Lot 2/BDC 13 ZAC Eysines CC - Diag et démol dalle béton LUPINI - AQUITANIS			13 112,72		13 112,72
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		240,00		240,00
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		12 143,76		12 143,76
005558 GESTION TEMPS PASSE	11/12/2017	FA 2017/41	258,10		258,10
005638 BDC13 TPS 12/17	04/01/2018	FA 2017/44	258,09		258,09
005844 BDC 13 TPS 01/18	12/02/2018	FA 2018/03	193,57		193,57
007419 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118	19,20		19,20
007730 GESTION TERRAIN 2018	01/01/2019	FA 010119			
M2021-046 Lot 1/BDC26 Vidéosurveillance 28 rue MP 6 mois - VPSITEX				1 043,69	1 043,69
020111 AC1 SOLDE	19/02/2024	FA		1 043,69	1 043,69
M2021-046 Lot 1/BDC39 Videosurveillance 28 rue MP 08/23 à 02/24 - VPSITEX				952,14	952,14
020141 AC1	14/02/2024	FA		952,14	952,14
M2022-033 Débarras dépôt sauvage Allée des Peupliers - RECYCLEXPERT			21 684,00		21 684,00
015419 AC1	21/06/2022	FA 000871	21 684,00		21 684,00
M2023-051 Fauchage C7 avt diag archéo - BERDOT			3 840,00		3 840,00
019486 AC1 SOLDE	27/11/2023	FA 356	3 840,00		3 840,00
B502 Gardiennage			14 675,85	1 549,95	16 225,80
M2021-046 Lot 1/BDC39bis Location vidéosurveillance 2 mois au 28 rue MP - VPSITEX				290,52	290,52
020262 AC1	29/02/2024	FA		145,26	145,26
020875 AC2	23/04/2024	FA		145,26	145,26
M2021-046 Lot 1/BDC39ter Prolongation vidéosurveillance 28 rue MP mi avr-mi juin 2024 -				290,53	290,53
021191 AC1	31/05/2024	FA		290,53	290,53
M2021-046 Lot 2/BDC7 Rondes Allée des Peupliers - 01/06 au 27/06/22 - DRAKKAR			2 073,60		2 073,60
016957 AC1	01/01/2023	JUIN-22-6306	2 073,60		2 073,60
M2021-046 Lot 2/BDC7bis Gardiennage Allée des Peupliers - 01/06 au 02/06/2022 - DRAKKAR			520,66		520,66
016954 AC1	01/01/2023	FA JUIN-22-	520,66		520,66
M2021-084/BDC15 Rondes C4 01/07 au 08/09/23 - DRAKKAR			1 349,38		1 349,38
018657 SOLDE	08/09/2023	FA AOUT-23-	1 349,38		1 349,38
M2021-084/BDC2 Rondes Allée des Peupliers 07.22 à 01.23 - DRAKKAR			6 758,40		6 758,40
016967 AC1	01/01/2023	FA NOV-22-	6 758,40		6 758,40
M2021-084/BDC23 Gardiennage maison 28 rue MP - DRAKKAR			3 973,81		3 973,81
018756 AC1 SOLDE	30/08/2023	FAAOUT-23-	3 973,81		3 973,81
M2024-002/BDC11-1 Loc alarme 28 rue MP 09 au 30/06/24 - VPSITEX				124,08	124,08
021895 AC1	13/08/2024	FA		124,08	124,08
M2024-002/BDC11-2 Loc alarme 28 rue MP 07/24 à 12/24 - VPSITEX				844,82	844,82
021897 AC1	13/08/2024	FA		169,20	169,20
022041 AC2	31/08/2024	FA		169,20	169,20
022330 AC3	30/09/2024	FA		169,71	169,71
022690 AC4	31/10/2024	FA		168,69	168,69
023094 AC5	30/11/2024	FA		168,02	168,02
B503 Impots Foncier			909,45	1 721,00	2 630,45
18-02143/3 Taxe foncière PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			13,29		13,29
18-02143/3 Provision	15/04/2019		13,29		13,29
18-02324 TF 2018 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			20,00		20,00
006744 TF 2018 VOIRIES RUE M.PORC	10/08/2018	T 18 33	20,00		20,00
18-02324/1 TF 2019 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
008775 TF 2019 VOIRIES RUE M.PORC	31/08/2019	T	21,00		21,00
20-03916 Taxe foncière 2020 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
011101 TF 2020 TERRAINS BM	31/08/2020	T	21,00		21,00
21-04726 Taxe foncière 2021 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			38,00		38,00
013246 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33	21,00		21,00
013272 TF 2021	13/08/2021	TITRE 21 33	17,00		17,00
22-05629 Taxe foncière 2022 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			18,00		18,00
015985 TF 2022	31/08/2022	AV 22 33	18,00		18,00
22-05734 Taxe foncière 2022 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
016280 TF22	31/08/2022	TITRE 22 33	21,00		21,00
23-05694/2 Frais Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			713,93		713,93
23-05694/2 Provision	05/10/2022		713,93		713,93
23-06127/2 Frais Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			1,23		1,23
23-06127/2 Provision	07/09/2023		1,25		1,25
019137 FRAIS ACQ BEAUSOEIL BB234	27/10/2023	FA 27/10/23	-0,02		-0,02
23-06526 Taxe foncière 2023 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			23,00		23,00
018684 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33	23,00		23,00
23-06532 Taxe foncière 2023 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			19,00		19,00
018632 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	FA 23 33	19,00		19,00
24-07428 Taxe foncière 2024 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)				64,00	64,00
022036 SOLDE	12/08/2024	FA 24 33		64,00	64,00
24-07445 Taxe foncière 2024 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)				25,00	25,00
022105 SOLDE	12/08/2024	FA 24 33		25,00	25,00
24-07597 Taxe foncière 2024 N° PROP 28 rue Martin Porc - TRESOR PUBLIC (TF)				820,00	820,00
022603 TAXE FONCIERE 2024	17/10/2024	FA 24 33		820,00	820,00
24-07598 Taxe foncière 2023 N° PROP 28 rue Martin Porc - TRESOR PUBLIC (TF)				787,00	787,00
022604 TAXE FONCIERE 2023	17/10/2024	FA 24 33		787,00	787,00
24-07599 Taxe foncière 2023 N° PROP 162 + 01465 - TRESOR PUBLIC (TF)				25,00	25,00
022605 TAXE FONCIERE 2023	17/10/2024	FA 24 33		25,00	25,00
B601 Assistance Juridique			106 300,02	11 260,94	117 560,96
19-02783 PV constat parcelle BB1020 Paranteau - CASIMIRO (HUISSIER)			219,99		219,99
007944 PV CONSTAT BB1020	15/04/2019	FA 55626	219,99		219,99
21-04102 Signif notif EP Scherer So - CASIMIRO (HUISSIER)			119,40		119,40
011869 AC1	19/01/2021	FA 66 696	119,40		119,40
21-04819 Signif en Allemagne dossier Baron - NEDELLEC			300,00		300,00
013903 AC1	14/10/2021	FA	300,00		300,00
21-04896 PV constat PD 8 rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00		390,00
013785 09-11/21	24/11/2021	FA 72 258	390,00		390,00
21-04897 Signif Jgt indem. expro. LECHENNE/DOUMERET - CASIMIRO (HUISSIER)			165,96		165,96
013763 10/21	02/11/2021	FA 71 774	165,96		165,96
21-04899 Signif + Acte CE dossier BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			403,35		403,35

Accusé de ré
033-243300 :
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

013701 06/20	09/11/2021	FA 71 939	403,35		403,35
21-04951 Signif jgt indem. expro SCHERER + EL LAHIANI - CASIMIRO (HUISSIER)			1 036,54		1 036,54
014302 AC1	10/01/2022	FA 73081	963,71		963,71
016476 AC2	11/04/2022	FA 74648	72,83		72,83
22-05000 Signif jgt indem. expro Delfaut - CASIMIRO (HUISSIER)			131,92		131,92
014024 SIG JGT INDEMN EXPRO DELFAUT	01/01/2022	FA 72501	131,92		131,92
22-05001 Signif jgt indem. expro Chaigneau/Bouc - CASIMIRO (HUISSIER)			636,64		636,64
014036 SIG JGT INDEMN EXPRO CHAIG/BOUC	01/01/2022	FA 72219	493,48		493,48
014985 AC2	01/01/2022	FA 72 740	143,16		143,16
22-05002 Significations MARTIN-SCHERER - CASIMIRO (HUISSIER)			427,28		427,28
014049 SIGNIFICATION MARTIN/SCHERER	01/01/2022	FA 72026	427,28		427,28
22-05154 Signif + jugt + indem expro GERDESSUS - CASIMIRO (HUISSIER)			558,19		558,19
014525 AC1	21/02/2022	FA 73 926	145,66		145,66
016299 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO GERDESSUS	13/10/2022	FA 75 619	250,79		250,79
016308 SIGNIF 15/04/22 GERDESSUS	13/10/2022	FA 74 768	119,55		119,55
016309 SIGNIF JGT GERDESSUS AOGPE	10/10/2022	FA 74 766	42,19		42,19
22-05427 Notif enquête parcel GERDESSUS + CHAIGNEAU - CASIMIRO (HUISSIER)			145,66		145,66
015146 AC1	03/05/2022	FA 75 233	145,66		145,66
22-05428 Signif de jgt LASSEP J - CASIMIRO (HUISSIER)			288,97		288,97
015149 AC1	13/05/2022	FA 75 435	288,97		288,97
22-05430 Signif jgt indem expro MARTIN D - CASIMIRO (HUISSIER)			290,63		290,63
014980 AC1	04/04/2022	FA 74 562	290,63		290,63
22-05556 Signif jugt indem expro BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			123,92		123,92
015815 AC1	01/01/2022	FA 71 645	123,92		123,92
22-05557 Signif jugt indem expro EYQUEM - CASIMIRO (HUISSIER)			163,76		163,76
015814 AC1	01/01/2022	FA 71 621	163,76		163,76
22-05561 Signification 2024 - PROVOST-TEGUI			70,48	43,66	114,14
015813 AC1	01/01/2022	FA 21066	70,48		70,48
021649 AC2	22/04/2024	FA 72165		43,66	43,66
22-05704 PV constat + Signif GDV Allée des peupliers - CASIMIRO (HUISSIER)			1 600,42		1 600,42
016555 AC1	01/07/2022	FA 75 740	1 222,42		1 222,42
016557 AC2	19/05/2022	FA 75 518	378,00		378,00
22-05705 PV constat réseaux Enedis Rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			270,00		270,00
016559 AC1	30/05/2022	FA 75 658	270,00		270,00
23-06044 Sig ord expro cessib Gerdessus KV - CASIMIRO (HUISSIER)			218,49		218,49
017328 AC1	10/02/2023	FA 80 247	218,49		218,49
23-06053 Constat voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00		390,00
017361 SOLDE	14/02/2023	FA 80 312	390,00		390,00
23-06142 Constat n°2 voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUISSIER)			270,00		270,00
017858 AC1	02/05/2023	FA 81 967	270,00		270,00
23-06416 PV constat squat caravanes sur C4 - CASIMIRO (HUISSIER)			378,00		378,00
018260 83216	05/07/2023	FA83216	378,00		378,00
23-06700 Affichage PD 28 rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			342,00		342,00
019445 AC1 SOLDE	09/10/2023	FA 84895	342,00		342,00
24-07167 Signification décision CA 2024 - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)				709,51	709,51
020767 SOLDE	26/04/2024	FA B1282438		143,10	143,10
021249 AC1	14/05/2024	FA B1287620		216,54	216,54
021594 AC2	10/07/2024	FA B1292278		73,18	73,18
021639 AC3	04/07/2024	FA B1291487		276,69	276,69
M2013-022/BDC8 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action foncière - FIDAL			1 620,00		1 620,00
005764 BDC 8	31/01/2018	FA	1 620,00		1 620,00
M2016-009 AMO Constitution dossier DUP - SCET			10 200,00		10 200,00
004055 DOSSIER DUP 12/16	30/12/2016	FA F16-12-	10 200,00		10 200,00
M2016-039/BDC11 Procédure devant juge de l'expro - ADALTYS (ADAMAS)			23 500,92		23 500,92
011358 BDC11 AC1	30/10/2020	FA PB 20 46	2 039,70		2 039,70
011617 BDC 11 AC2	01/01/2021	FA PB 20 46	270,36		270,36
011992 BDC 11 AC3	29/01/2021	FA AB 21 46	5 714,65		5 714,65
012159 BDC11 AC4	26/02/2021	FA AB 21 46	7 310,74		7 310,74
012309 BDC11 AC5	29/03/2021	FA AB 21 46	1 833,96		1 833,96
012862 BDC11 AC6	30/04/2021	FA AB 21 46	3 839,71		3 839,71
012863 BDC11 AC7	31/05/2021	FA AB 21 46	479,26		479,26
013188 BDC11 AC08	30/08/2021	FA 21 46 454	116,64		116,64
013200 BDC11 AC09	28/07/2021	FA AB 21 46	882,84		882,84
013426 BDC11 AC10	30/09/2021	FA 21 46 517	479,26		479,26
013859 BDC11 AC11	17/11/2021	FA 21 46 631	294,17		294,17
014310 BDC 11 AC12	19/01/2022	FA 2246009	239,63		239,63
014311 BDC 11 AC13	01/01/2022	FA 2146517	479,26		479,26
014674 REGUL BDC 11 AC13 (DOUBLON)	02/03/2022	FA 2146517	-479,26		-479,26
M2016-039/BDC12 BDC12 Procédure devant le juge de l'expropriation - tenement LASSEP -			2 060,61		2 060,61
011865 AC1	01/01/2021	FA PB 20 46	1 198,14		1 198,14
012311 AC2	29/03/2021	FA AB 21 46	349,91		349,91
013857 AC3	18/11/2021	FA 21 46 633	272,93		272,93
014516 AC4	10/02/2022	FA 22 46 047	239,63		239,63
M2016-039/BDC14 BDC14 Procédure devant juge de l'expro MARTIN - ADALTYS (ADAMAS)			2 247,15		2 247,15
012310 AC1	29/03/2021	FA AB 21 46	1 721,27		1 721,27
013858 AC2	18/11/2021	FA 21 46 632	286,25		286,25
014309 AC3	19/01/2022	FA 2246010	239,63		239,63
M2016-039/BDC15 Procédure devant juge de l'expro (complément) - ADALTYS (ADAMAS)			1 967,47		1 967,47
012308 BDC15	29/03/2021	FA AB 21 46	1 967,47		1 967,47
M2016-039/BDC5 Expertise juridique mémoires d'expro 25 tènements fonciers - ADALTYS			10 033,92		10 033,92
009439 BDC 5- AC 1	01/01/2020	FA PB1946594	10 033,92		10 033,92
M2016-039/BDC7 BDC7 Consultation droit de préemption - ADALTYS (ADAMAS)			794,56		794,56
010119 BDC7 CONSULTATION DROIT DE PREEMPTION	14/04/2020	FA PB 20 46	786,24		786,24
010825 BDC7	31/08/2020	REGUL REV	8,32		8,32
M2016-039/BDC9 Expertise juridique raccordement réseau EP - ADALTYS (ADAMAS)			1 123,20		1 123,20
010548 BDC 9- AC 1	29/06/2020	FA PB2046264	786,24		786,24
011565 BDC 9	01/01/2021	FA PB 20 46	336,96		336,96
M2021-001 Lot 2/BDC7-1 Dossier Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio - THOME			2 599,78		2 599,78
013397 AC1	30/09/2021	FA 21-1239	2 599,78		2 599,78
M2021-001 Lot 2/BDC7-10 Appel Lassep - THOME HEITZMANN			2 368,15	1 175,26	3 543,41
016709 AC 1	30/11/2022	FA 22-2036	2 368,15		2 368,15
020187 SOLDE	29/02/2024	FA 24-2884		1 175,26	1 175,26
M2021-001 Lot 2/BDC7-10bis Frais postulation Lassep - THOME HEITZMANN			683,06		683,06
016443 AC 1	28/10/2022	FA 22-1988	683,06		683,06
M2021-001 Lot 2/BDC7-11 Suivi cassation val d'albant st marc - THOME HEITZMANN			763,92		763,92

Accusé de réception
033-243302
Date de tél
Date de récé
Publié le : 03

016708 AC 1	30/11/2022	FA 22-2035	763,92		763,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-12 Suivi audience CA - THOME HEITZMANN			2 350,30		2 350,30
016178 AC1	29/09/2022	FA 22-1920	2 350,30		2 350,30
M2021-001 Lot 2/BDC7-13 Suivi dossiers val dAlb-St Marc-Gerdessus - THOME HEITZMANN			1 002,65		1 002,65
016885 AC 1	01/01/2023	FA 22-2077	1 002,65		1 002,65
M2021-001 Lot 2/BDC7-14 Appel Lassep et suivi dossiers Arenas-Gerdessus - THOME			1 075,54		1 075,54
017390 AC1	22/02/2023	FA 23-2201	1 075,54		1 075,54
M2021-001 Lot 2/BDC7-1bis Honoraires postulation Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio -			1 680,00		1 680,00
013744 POSTULATION ST MARC-AC1	17/11/2021	FA F03104	420,00		420,00
013745 POSTULATION EL LAHIANI-AC2	10/11/2021	FA F02869	420,00		420,00
013746 POSTULATION VAL D'ALBANT-AC3	10/11/2021	FA F02791	420,00		420,00
013748 POSTULATION CLAUDIO-AC4	10/11/2021	FA F02868	420,00		420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-2 Rédaction mémoires + signifs Bouc/Val d'Alban/St			4 987,87		4 987,87
014130 AC1	01/01/2022	FA 21-1440	4 987,87		4 987,87
M2021-001 Lot 2/BDC7-3 Assistance et expertise foncière et représentation juridique Dossiers			7 228,80		7 228,80
014129 AC1	01/01/2022	FA 21-1439	7 228,80		7 228,80
M2021-001 Lot 2/BDC7-3bis Honoraires postulation Arenas/Eyquem/Baney - DELAVALLADE-			1 260,00		1 260,00
013747 POSTULATION EYQUEM-AC1	13/10/2021	FA F03017	420,00		420,00
013750 POSTULATION ARENAS-AC2	12/11/2021	FA F03094	420,00		420,00
013751 POSTULATION BANAY-AC3	13/10/2021	FA F03018	420,00		420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-5 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			436,32		436,32
014404 AC1	31/01/2022	FA 22-1483	436,32		436,32
M2021-001 Lot 2/BDC7-6 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			1 461,60		1 461,60
014855 AC1	30/03/2022	FA 22-1600	1 461,60		1 461,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-7 Suivi dossiers/mémoires/audience CA - THOME HEITZMANN			5 931,14		5 931,14
015048 AC1	29/04/2022	FA 22-1657	5 931,14		5 931,14
M2021-001 Lot 2/BDC7-8 Signif à parties Gerdessus/Goujon-Lechenné - THOME HEITZMANN			745,92		745,92
015253 AC1	31/05/2022	FA 22-1703	745,92		745,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-9 Suivi dossiers+audiences CA St Marc Valdalbant - THOME HEITZMANN			3 326,40		3 326,40
016011 AC1	07/09/2022	FA 22-1904	3 326,40		3 326,40
M2021-001 Lot 3/BDC3 Procédure expulsion BB2 - ADALTY (ADAMAS)			1 109,14		1 109,14
014960 AC1	15/04/2022	FA 2246190	1 109,14		1 109,14
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-1 Rédact*mémoire, assist. et représentat* devant CA - dossier				3 607,20	3 607,20
019961 AC1	30/01/2024	FA 24-2819		1 565,28	1 565,28
020519 AC2	27/03/2024	FA 24-2956		1 176,48	1 176,48
021093 AC3	31/05/2024	FA 24-3082		865,44	865,44
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-2 Rédact* mémoire, assist. et représentat* devant CA - dossier				3 133,44	3 133,44
019963 AC1	30/01/2024	FA 24-2820		2 269,66	2 269,66
020520 AC2	27/03/2024	FA 24-2957		863,78	863,78
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-3 Frais timbres fiscaux postulation - signif* CA Lassep - THOME				867,24	867,24
022578 SOLDE	30/10/2024	FA 24-3442		867,24	867,24
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-4 Frais timbres fiscaux Eyquem-Val d'Albant-Arenas-Claudio-Baney-				1 724,63	1 724,63
022557 SOLDE	29/10/2024	FA 24-3420		1 724,63	1 724,63
M2022-053 Pourvoi en cassation arrêté 30/06/22 val d'albant st marc/Fab - FOUSSARD-FROGER			4 800,00		4 800,00
016343 AC1	14/10/2022	FA 61773	600,00		600,00
016341 AC2	14/10/2022	FA 61772	1 800,00		1 800,00
017234 AC3	02/02/2023	FA 62758	2 400,00		2 400,00
B602 DUP, expro			33 471,24	5 607,56	39 078,80
17-01495 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2017 Eysines CC - BUREAU			847,00		847,00
004533 RSU COPIES DUP EYS CC	30/03/2017	FA 30/03/2017	276,00		276,00
004623 ATTESTAT* AP DECES	04/05/2017	FA 04/05/2017	151,00		151,00
005535 COPIES ACTES DUP	08/12/2017	FA 08/12/2017	420,00		420,00
18-01884 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - BUREAU HYPOTHEQUES			68,00		68,00
005723 COPIES D'ACTES	25/01/2018	FA 25/01/2018	30,00		30,00
007290 DEMANDE DE RSU	03/01/2019	FA 03/01/19	38,00		38,00
18-02419 Publication enquête publique - SUD OUEST			4 174,63		4 174,63
007287 AC1	24/12/2018	FA	1 869,73		1 869,73
007436 PUBLICATION AVIS EP - 01/19	18/01/2019	FA	1 869,73		1 869,73
008552 PUBLICATION AVIS EP 08/19	20/08/2019	FA	435,17		435,17
18-02463 Constat huissier avis EP - CASIMIRO (HUISSIER)			2 800,04		2 800,04
007586 PV CONSTAT HUISSIER AVIS EP	20/02/2019	FA 54 667	2 800,04		2 800,04
19-02505 Publicité Avis EP - 12/2018 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 192,46		1 192,46
007282 PUBLICITE AVIS EP	21/12/2018	FA 811686	1 192,46		1 192,46
19-02506 Signification DUP et offres - CASIMIRO (HUISSIER)			9 444,62		9 444,62
007396 SIGNIFICATION NOTIFICATION DUP	17/01/2019	FA 53 925	1 248,37		1 248,37
007484 SIGNIFICATION AVIS EP CALETTI	29/01/2019	FA 54 354	118,70		118,70
010537 SIGNIFICATIONS ARGILLOS/CANDOTO	30/06/2020	FA 63266	276,71		276,71
010539 SIGNIFICATION GERDESSUS/COMMISSA	30/06/2020	FA 63271	187,14		187,14
010538 SIGNIFICATION EL LAHIANI/TOUMIA	01/07/2020	FA 63285	280,71		280,71
010535 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/VAL D'ALBAN	01/07/2020	FA 63298	187,14		187,14
010536 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/DUROUSSE	01/07/2020	FA 63297	187,14		187,14
010570 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/GAUDNER	06/07/2020	FA 63384	652,99		652,99
010597 SIGNIFICATION GERDESSUS / GOUJON	08/07/2020	FA 63 434	276,71		276,71
010598 SIGNIFICATION COMMIS GOUV / DOUMERET	08/07/2020	FA 63 422	374,28		374,28
010599 SIGNIFICATION SAINT MARC/COMMIS GOUV	07/07/2020	FA 63 394	187,14		187,14
010600 SIGNIFICATION NADAL/EYQUEM	03/07/2020	FA 63 337	368,28		368,28
010606 SIGNIFICATION CLAUDIO/METBACH	03/07/2020	FA 63 329	204,03		204,03
010664 SIGNIFICATION BOUC	21/07/2020	FA 63 597	924,23		924,23
010814 SIGNIFICATION DUMORA BANAY	13/08/2020	FA 63 936	497,11		497,11
011866 SIGNIFICATION LASSEP E+J	15/01/2021	FA 66 435	215,84		215,84
011993 SIGNIFICATION BOUC	21/01/2021	FA 66 745	310,06		310,06
012485 GERDESSUS GABRIEL (LALANNE)	30/04/2021	FA 68 669	114,42		114,42
012751 SIGNIFICATION EL LAHIANI+TOUMIA	16/06/2021	FA 69 301	72,68		72,68
012797 SIGNIFICATION BOUC	25/06/2021	FA 69-450	643,40		643,40
012890 SIGNIFICATION SAINT-MARC	06/07/2021	FA 69 724	72,68		72,68
012891 ASSIGNATION VAL D'ALBANT	06/07/2021	FA 69 725	72,68		72,68
012893 ASSIGNATION CLAUDIO+METBACH	06/07/2021	FA 69 727	74,88		74,88
012895 SIGNIFICATION METR/LALANNE	02/07/2021	FA 69 534	285,71		285,71
012894 SIGNIFICATION METR/ARENAS/CANETE DEL RIO	02/07/2021	FA 69 533	365,33		365,33
012979 REGUL FA 69534	02/07/2021	FA 69534			
013143 SIGNIFICATION C.APPEL	13/08/2021	FA 70 338	328,04		328,04
016305 SIGNIF JUGT GOUJON AOGPE	13/10/2022	FA 75 620	166,41		166,41
016303 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO ARGILLOS	13/10/2022	FA 71 622	121,72		121,72
016306 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO BANAY	10/10/2022	FA 71 620	84,08		84,08
016301 SIGNIF ARRET EL LAHIANI TOUMIA	25/08/2022	FA 76 919	213,79		213,79

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de réce
 Publié le : 03

016393 ARENAS/CANETE DEL RIO	24/10/2022	FA 77 855	248,14		248,14
016552 DUROUSSEAU	01/01/2022	FA 71 619	84,08		84,08
19-02544 Publicité Avis EP - 01/2019 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 183,73		1 183,73
007409 PUBLICITE AVIS EP - 01/2019	18/01/2019	FA 900178	1 183,73		1 183,73
19-02617 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			1 034,00		1 034,00
007559 DEMANDE DE RSU	15/02/2019	FA 15/02/19	252,00		252,00
007655 RSU	04/03/2019	FA 04/03/19	24,00		24,00
007789 COPIE ACTE	01/04/2019	FA 01/04/19	30,00		30,00
007811 COPIE ACTE	03/04/2019	FA 03/04/19	45,00		45,00
008504 COPIE ACTE (X3)	05/08/2019	FA 05/08/19	45,00		45,00
008505 RSU	06/08/2019	FA 06/08/19	476,00		476,00
008653 RSU	16/09/2019	FA 16/09/19	12,00		12,00
008654 COPIE ACTE	16/09/2019	FA 16/09/19	150,00		150,00
008655 REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	-34,00		-34,00
008656 ANNUL REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00		34,00
19-02737 Indemnisation Commissaire Enquêteur - F.I.C.E			2 587,64		2 587,64
007909 INDEMN COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/04/2019	FA 01/04/19	2 587,64		2 587,64
20-03368 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - BUREAU HYPOTHEQUES			351,00		351,00
009516 DDE RSU AA 288	02/01/2020	FA 02/01/20	12,00		12,00
009811 DDE RSU BB 237	18/02/2020	FA 18/02/20	12,00		12,00
010425 DDE RSU	23/06/2020	FA 23/06/20	60,00		60,00
010740 ATTESTATION IMMO	10/08/2020	FA 10/08/20	30,00		30,00
010741 DDE RSU BB69	10/08/2020	FA 10/08/20	12,00		12,00
011058 DDE RSU BB2744	05/10/2020	FA 05/10/20	24,00		24,00
011182 DDE RSU AA 502	19/10/2020	FA 19/10/20	12,00		12,00
011256 RSU DOSSIER DE CESSIBILITE	29/10/2020	FA 29/10/20	132,00		132,00
011364 RSU & COPIE ACTE CESSIBILITE	10/11/2020	FA 10/11/20	57,00		57,00
20-03999 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - SPF BDX 1			312,00		312,00
011425 CESSIBILITE EYSINES	23/11/2020	FA 23/11/2020	24,00		24,00
011443 RSU DOSSIER CESSIBILITE	27/11/2020	FA 27/11/2020	24,00		24,00
012161 RSU	10/03/2021	BB 2743 229	48,00		48,00
014110 DMD RSU PARCELLAIRE	05/01/2022	FA 05/01/2022	216,00		216,00
21-04144 Enquête parcellaire complémentaire - SUD OUEST PUBLICITE			1 637,62		1 637,62
011874 AC 1	15/01/2021	FA	882,29		882,29
011957 ENQ PARCEL COMPL	30/01/2021	FA	755,33		755,33
21-04325 Indemnisation Commissaire Enquêteur - GUYOT CAROLA			1 078,05		1 078,05
012251 INDEMN COMM ENQU	22/03/2021	29/03/2021	1 078,05		1 078,05
21-04780 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1			420,00		420,00
013523 DDE RSU ACTES PARCELLES AA/BB	20/10/2021	FA 13/10/21	372,00		372,00
013765 DMD RSU EP COMPL	23/11/2021	FA 23/11/21	48,00		48,00
22-05114 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2022 - SPF BDX 1			195,00		195,00
014491 DMD COPIE ACTE PARCELLAIRE	16/02/2022	FA 16/02/22	15,00		15,00
015010 DMD RSU GERDESSUS GOUJON CONSIGN	26/04/2022	FA 26/04/2022	24,00		24,00
015013 DMD RSU LASSEP	27/04/2022	FA 27/04/2022	24,00		24,00
015337 DMD RSU BOUC GERDESSUS GAB	15/06/2022	FA 15/06/2022	72,00		72,00
015788 DMD RSU EYSINES BB234-257-258-678	03/08/2022	FA 03/08/2022	48,00		48,00
016974 DMD RSU CDC	02/01/2023	FA 30/12/22-	12,00		12,00
22-05407 Publications SO enq parcel complem Bouc Gerdessus - SUD OUEST PUBLICITE			1 376,13		1 376,13
015332 AC1	24/04/2022	FA	688,94		688,94
015333 AC2	08/05/2022	FA	687,19		687,19
22-05422 Publications SO Ilot C7 - SUD OUEST PUBLICITE			1 303,02		1 303,02
015334 AC1	30/05/2022	FA	654,59		654,59
015335 AC2	12/06/2022	FA	648,43		648,43
22-05531 Indemnisat* EP compl. Com. Enq. - GUYOT CAROLA			823,18		823,18
015755 INDEMN. EP COMPL. COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_03	823,18		823,18
22-05533 Indemnisat* EP ilot C7 Com. Enq. - GUYOT CAROLA			673,41		673,41
015756 INDEMN EP ILOT C7 COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_03	673,41		673,41
23-06069 cass signif mém fab à valdalbant stmarc - CASIMIRO (HUISSIER)			145,66		145,66
017029 AC1	02/01/2023	FA 79 462	145,66		145,66
23-06070 signif arrêté cessib ALPrado/Lalanne - CASIMIRO (HUISSIER)			42,19		42,19
017034 AC1	09/01/2023	FA 79 571	42,19		42,19
24-07300 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2024 - SPF BDX 1				60,00	60,00
021326 DMD RSU VAL DALBANT DECONSIGNATION	25/06/2024	FA 25/06/2024		36,00	36,00
021401 DMD RSU DECONSIGN BANEY	02/07/2024	FA 02/07/2024		24,00	24,00
24-07371 Publicité SO prorog DUP - SUD OUEST PUBLICITE				245,48	245,48
022055 SOLDE	31/08/2024	FA 240801768		245,48	245,48
M2021-001 Lot 2/BDC7-15 Procédure appel Claudio - THOME HEITZMANN			1 781,86		1 781,86
019410 AC 1	30/11/2023	FA 23-2694	1 781,86		1 781,86
M2021-083/BDC3 Publication ord expro phase 1 - SEGAT				2 651,04	2 651,04
021700 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-		2 651,04	2 651,04
M2021-083/BDC4 Publication ord expro phase 2 - SEGAT				1 325,52	1 325,52
021696 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-		1 325,52	1 325,52
M2021-083/BDC6 Publication ordo expro Eysines EP - SEGAT				1 325,52	1 325,52
021697 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-		1 325,52	1 325,52
B603 Libération des sols (diag+petits travaux)			13 299,95		13 299,95
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			1 016,38		1 016,38
004868 BDC7 TPS 06/17	04/07/2017	FA 06/2017/21	379,15		379,15
005044 BDC7 TPS 07/17	18/08/2017	FA 2017/24	189,57		189,57
005193 BDC7 TPS PASSE 08/17	22/09/2017	FA	189,57		189,57
005388 BDC7 TPS 09/17	31/10/2017	FA	258,09		258,09
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			193,57		193,57
005410 BDC11 TPS AA309	08/11/2017	FA 10/2017/34	193,57		193,57
M2023-036 Terrassement pour sécurisation ilot C4 suite évacuation caravanes - COLAS			12 090,00		12 090,00
018590 AC1 - SOLDE	30/08/2023	FA	12 090,00		12 090,00
B701 Dépollution			1 080,00	3 300,00	4 380,00
23-06649 Analyse terre polluées ilot C5 - FAYAT TP			1 080,00		1 080,00
019435 SOLDE	01/12/2023	FA	1 080,00		1 080,00
23-06784 Evacuation déblais vers DIB & ISDI - ilot C5 - FAYAT TP				3 300,00	3 300,00
019736 SOLDE	01/01/2024	FA		3 300,00	3 300,00
B702 Démolition - Désamiantage			8 356,07	2 855,59	11 211,66
M2021-077/BDC41 Diagnostics amiantes 28 rue Martin Porc - AED EXPERTISES				520,04	520,04
021225 AC1	18/06/2024	FA		520,04	520,04
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC4 SSEP3 - Repérage réseaux Ilot C7 - ADRE RESEAUX			2 076,00		2 076,00
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558	2 076,00		2 076,00
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC4 SSEP3 - Repérage réseaux Ilot C7 - SEREA			6 280,07		6 280,07

Accusé de réception
033-243300 :
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

017890 AC1	28/04/2023	FA 230276	6 224,02		6 224,02
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558 FA	56,05		56,05
M2023-022/BDC7 îlot C7 : MOE démol M5 - 6 & 7 - GINGER DELEO				2 335,55	2 335,55
022462 AC1	22/10/2024	FA		2 335,55	2 335,55
B704 Fouilles archéologiques			348,00	394 234,20	394 582,20
23-06617 M0d benne coulissante pour fouilles îlot C5 - FAYAT TP			348,00		348,00
019171 SOLDE	07/11/2023	FA	348,00		348,00
M2022-079 Fouille archéologie préventive Ilot C5 - INRAP				365 434,20	365 434,20
020380 AC1 12/23	15/03/2024	FA 0000145		341 494,20	341 494,20
022361 AC2 08/24	07/10/2024	FA 0001201		23 940,00	23 940,00
M2022-079 Fouille archéologie préventive Ilot C5 - TRESOR PUBLIC (BM)				28 800,00	28 800,00
020380 AC1 12/23	15/03/2024	FA 0000145		28 800,00	28 800,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			4 232 512,92	37 616,81	4 270 129,73
D103 VRD			2 710 540,94	1 571,70	2 712 112,64
23-06658 Pose barrières reprise terrain [rue Martin Porc] - COLAS SO/SCREG			3 402,00		3 402,00
019301 SOLDE	27/11/2023	FA 23047866	3 402,00		3 402,00
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - COLAS			1 513 036,66	1 410,82	1 514 447,48
M2018-040/Lot 1 Avance	16/11/2018		51 100,86		51 100,86
008463 AC2	27/06/2019	06/19	35 058,79		35 058,79
009080 AC3	31/10/2019	10/19	183 116,65		183 116,65
009286 AC4	01/01/2020	11/19	114 283,30		114 283,30
009791 AC5	13/02/2020	12/19	93 235,27		93 235,27
009734 AC6	13/01/2020	01/20	119 749,69		119 749,69
010037 AC7	27/03/2020	03/20	2 985,54		2 985,54
014209 AC8	01/01/2022	11/21	62 994,70		62 994,70
014532 AC9	14/02/2022	01/22	16 404,00		16 404,00
014714 AC10	08/03/2022	02/22	107 179,47		107 179,47
014916 AC11	06/04/2022	03/22 - FA	161 432,13		161 432,13
015109 AC12	30/04/2022	04/22 - FA	121 453,43		121 453,43
015319 AC13	09/06/2022	05/22 - FA	157 274,65		157 274,65
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA	201 011,37		201 011,37
015765 AC15	25/07/2022	07/22 -	35 054,55		35 054,55
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI220	3 299,93		3 299,93
017399 AC17 - 01/23	24/02/2023	FA	7 453,42		7 453,42
017511 AC18 - 02/23	06/03/2023	FA	1 360,70		1 360,70
018093 AC19 - 05/23	31/05/2023	FA	27 216,78		27 216,78
018624 AC20 - 07/23	04/09/2023	FA	11 371,43		11 371,43
019181 AC21 - 10/23 - DGD	01/01/2024	FA		1 410,82	1 410,82
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - FC BTP			93 155,75		93 155,75
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	6 325,75		6 325,75
009286 AC4	01/01/2020	11/19	11 215,54		11 215,54
009791 AC5	13/02/2020	12/19	9 701,19		9 701,19
009734 AC6	13/01/2020	01-20	5 681,50		5 681,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA	25 479,40		25 479,40
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA	4 043,60		4 043,60
015765 AC15	25/07/2022	FA14000RI220	30 695,27		30 695,27
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI220	13,50		13,50
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			84 673,97		84 673,97
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	31 460,35		31 460,35
009791 AC5	13/02/2020	12/19	1 016,50		1 016,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA	52 197,12		52 197,12
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			2 190,00		2 190,00
009734 AC6	13/01/2020	01-20	2 190,00		2 190,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - ALINEA SIGNALISATION			4 355,40		4 355,40
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA	4 355,40		4 355,40
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			949 486,66	160,88	949 647,54
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		44 003,11		44 003,11
015320 AC1 - 05/2022	09/06/2022	FA	139 806,72		139 806,72
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA	90 820,17		90 820,17
015995 AC3 - 08/2022	30/08/2022	FA	9 783,41		9 783,41
016289 AC4 - 09/2022	07/10/2022	FA	334 906,84		334 906,84
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA	114 963,03		114 963,03
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA	143 023,01		143 023,01
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA	18 889,80		18 889,80
017383 AC8 - 01/2023	20/02/2023	FA	18 106,78		18 106,78
017700 AC9 - 03/2023	03/04/2023	FA	18 903,50		18 903,50
018091 AC10 - 05/2023	02/06/2023	FA	5 834,67		5 834,67
019046 AC11 - 10/2023	23/10/2023	FA	10 445,62		10 445,62
020672 DGD	17/04/2024	DGD		160,88	160,88
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - DIAS SANTOS TIAGO			18 789,50		18 789,50
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA	7 589,50		7 589,50
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA	11 200,00		11 200,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - KIPOPLUIE			12 988,00		12 988,00
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA	12 988,00		12 988,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - PEPERIOT			17 375,00		17 375,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA	17 375,00		17 375,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - VIDEO INJECTION			11 088,00		11 088,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA	11 088,00		11 088,00
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			263 079,24	0,01	263 079,25
M2019-004 Travaux Eclairage Public et Telecom - CEPECA-CITEOS			225 847,69		225 847,69
008373 05/19	31/05/2019	AC 1	43 295,94		43 295,94
008365 06/19	30/06/2019	AC 2	51 136,01		51 136,01
009335 12/19	01/01/2020	AC 3	46 312,66		46 312,66
010460 06/20	29/06/2020	AC 4	64 717,08		64 717,08
012563 05/21	18/05/2021	AC 5	8 125,40		8 125,40
016596 07/22	14/10/2022	AC6 FA	12 260,60		12 260,60
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - CEPECA-CITEOS			28 730,53		28 730,53
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA	28 730,53		28 730,53
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			8 501,02	0,01	8 501,03
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		292,86		292,86
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA	8 656,36		8 656,36
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA	-448,20		-448,20
020672 DGD	17/04/2024	DGD		0,01	0,01
D105 Mobilier urbain			69 217,64	111,98	69 329,62
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			69 217,64	111,98	69 329,62

Accusé de réception
033-243300
Date de réception
Date de réception
Publié le : 3

009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA	10 647,50		10 647,50
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	22 535,09		22 535,09
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA	7 541,86		7 541,86
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA	5 146,21		5 146,21
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA	41,47		41,47
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA	16 250,96		16 250,96
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA	7 054,55		7 054,55
020670 AC10 - 02/2024	28/03/2024	FA		111,98	111,98
D106 Espaces verts			645 703,47	27 275,52	672 978,99
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			16 531,68		16 531,68
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA	16 531,68		16 531,68
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			30 740,80		30 740,80
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA	12 511,40		12 511,40
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	1 164,60		1 164,60
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA	17 064,80		17 064,80
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			461 240,22	27 275,52	488 515,74
008605 AC1 - 06-07/19	30/08/2019	FA	97 485,83		97 485,83
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA	116 672,12		116 672,12
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	54 061,23		54 061,23
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA	-365,87		-365,87
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA	-191,59		-191,59
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA	38 232,70		38 232,70
015038 AC7 - 04/2022	29/04/2022	FA	44 818,27		44 818,27
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA	101 363,96		101 363,96
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA	9 163,57		9 163,57
020670 AC10 - 02/2024	28/03/2024	FA		27 275,52	27 275,52
M2021-055/Lot 2 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE			137 190,77		137 190,77
M2021-055/Lot 2 Avance	21/07/2021		2 394,19		2 394,19
016869 AC1 - 11/2022	01/01/2023	FA	78 843,01		78 843,01
016884 AC2 - 12/2022	01/01/2023	FA	8 970,00		8 970,00
017755 AC3 - 03/2023	28/03/2023	FA	30 317,33		30 317,33
019397 AC4 - 11/2023	29/11/2023	FA	16 666,24		16 666,24
D203 Electricité			56 985,91	333,00	57 318,91
21-04409 Raccordement électrique C1 - DC26/058600/001001 - ENEDIS (EX : ERDF)			22 012,57		22 012,57
21-04409 Avance	18/05/2021		6 200,94		6 200,94
012628 AC1	27/05/2021	FA			
017031 AC2	03/01/2023	FA 0326-	15 811,63		15 811,63
21-04486 Raccordement électrique C6 - DC26/024162/001011 - ENEDIS (EX : ERDF)			32 503,74		32 503,74
012745 AC1	16/06/2021	FA 0326-	32 503,74		32 503,74
22-05850 Déplacement coffret de branchement 20 Rue Martin Porc - ENEDIS (EX : ERDF)			1 234,80		1 234,80
22-05850 Avance	06/12/2022		617,40		617,40
016905 AC1	01/01/2023	FA			
017262 AC2	31/01/2023	FA 0326-	617,40		617,40
22-05871 Déplacement coffret de branchement 1, Allée de l'Europe - ENEDIS (EX : ERDF)			1 234,80		1 234,80
22-05871 Avance	19/12/2022		617,40		617,40
016985 AC1	01/01/2023	FA			
017053 AC2	05/01/2023	FA 0326 -	617,40		617,40
24-07284 Suppression BRCHT 28 rue Martin Porc - PDL 16189869664471 - ENEDIS (EX : ERDF)				333,00	333,00
24-07284 Avance	21/06/2024			333,00	333,00
022725 AC1	29/10/2024	FA			
D204 Eau potable			25 590,62		25 590,62
18-02413 Raccordement Ilot C7 rue Martin Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			6 464,95		6 464,95
18-02413 Avance	04/12/2018		4 555,70		4 555,70
008839 AC1	02/10/2019	FA 4170797	1 909,25		1 909,25
18-02414 Raccordement Ilot C5 rue Bertrand Triat - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			9 278,18		9 278,18
18-02414 Avance	04/12/2018		5 186,06		5 186,06
008840 AC1	02/10/2019	FA 4170799	4 092,12		4 092,12
19-02972 Branchement AEP Av. du Taillan Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			2 706,87		2 706,87
19-02972 Avance	23/07/2019		812,06		812,06
009413 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA 4171669	1 894,81		1 894,81
20-03419 Branchement fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			162,84		162,84
009542 AC1 - SOLDE	02/01/2020	FA	162,84		162,84
20-03440 Conso fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			987,98		987,98
009597 AC1	10/01/2020	FA	209,80		209,80
010580 AC2	03/07/2020	FA	173,98		173,98
011899 AC3	21/01/2021	FA	229,72		229,72
012968 AC4	19/07/2021	FA	195,91		195,91
014430 AC5	31/01/2022	FA	178,57		178,57
22-04967 Déplacement compteur au 14 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04967 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014379 AC1	21/01/2022	FA 192200312			
015327 AC2	09/06/2022	FA 192201657	599,17		599,17
22-04968 Déplacement compteur au 16 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04968 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014382 AC1	21/01/2022	FA 192200313			
014909 AC2	05/04/2022	FA 192201031	599,17		599,17
22-04969 Déplacement compteur au 18 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04969 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014380 AC1	21/01/2022	FA 192200315			
014907 AC2	05/04/2022	FA 192201022	599,17		599,17
22-04970 Déplacement compteur au 20 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04970 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014381 AC1	21/01/2022	FA 192200316			
014908 AC2	05/04/2022	FA 192201025	599,17		599,17
22-04971 Déplacement compteur au 30 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04971 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014378 AC1	21/01/2022	FA 192200317			
015326 AC2	09/06/2022	FA 192201668	599,17		599,17
M2022-012 Branchement compteur d'eau Rue M-Porc - NOVELLO			1 710,00		1 710,00
014817 AC1	31/03/2022	FA	1 710,00		1 710,00
D207 Gaz			4 680,00		4 680,00
19-02993 Suppression branchement gaz au 16 Rue Martin Porc - REGAZ			1 740,00		1 740,00
014777 AC1	28/03/2022	FA FCO-	1 740,00		1 740,00
20-03472 Déplacement coffret gaz 7, Rue Triat - REGAZ			2 940,00		2 940,00
010189 AC1/SOLDE	23/04/2020	FA FCO-	2 940,00		2 940,00

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de réce
 Publié le : 03

D208 Autres travaux raccordements			898,80		898,80
23-06259 Déplacement poste de comptage / fosse jumbo petit modèle avec terrassement - EAU			898,80		898,80
23-06259 Avance	24/04/2023		449,40		449,40
017964 AC1	10/05/2023	FA BM2300408	0,02		0,02
018672 SOLDE	07/09/2023	FA BM2301044	449,38		449,38
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)			440 813,79	8 324,60	449 138,39
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - BIOTOPE			4 146,39		4 146,39
005920 AC 1	04/03/2018	FA 201800518	4 126,27		4 126,27
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	20,12		20,12
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - ICI LA (D')			67 952,29		67 952,29
004789 AC 4	20/06/2017	FA 18_28 EYS	23 721,91		23 721,91
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	355,82		355,82
005616 AC5	30/12/2017	FA 1032-	21 350,15		21 350,15
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	22 417,65		22 417,65
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	106,76		106,76
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - PERIOLE GERAUD			10 295,88		10 295,88
004790 AC 4	24/02/2017	FA 14/2017	3 594,30		3 594,30
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	53,92		53,92
005618 AC 5	06/12/2017	FA 35/2017	3 234,86		3 234,86
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	80,87		80,87
005919 AC 7	14/02/2018	FA 06/2018	3 315,75		3 315,75
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	16,18		16,18
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			20 591,76		20 591,76
004791 AC 4	14/06/2017	FA F17MAT505	7 188,60		7 188,60
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	107,83		107,83
005617 AC 5	31/12/2017	FA	6 469,74		6 469,74
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	161,75		161,75
005918 AC 7	15/02/2018	FA F18MAT112	6 631,49		6 631,49
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	32,35		32,35
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - ICI LA (D')			61 400,00		61 400,00
006437 AC1	19/07/2018	FA 18113-	47 810,00		47 810,00
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	1 290,87		1 290,87
007197 AC2	04/12/2018	FA 18205-	12 299,13		12 299,13
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - PERIOLE GERAUD			9 303,03		9 303,03
006439 AC1	18/07/2018	FA 35/2018	7 243,94		7 243,94
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	195,59		195,59
007198 AC2	07/12/2018	FA 78/2018	1 863,50		1 863,50
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			18 606,05		18 606,05
006438 AC1	20/07/2018	FA F18MAT673	14 487,88		14 487,88
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	391,16		391,16
007199 AC2	04/12/2018	FA	3 727,01		3 727,01
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - ICI LA (D')			40 604,26		40 604,26
007945 AC1	11/04/2019	FA 19070-	4 651,84		4 651,84
008104 AC2	24/05/2019	FA 19104-	1 523,82		1 523,82
008356 AC3	11/07/2019	FA 19149-	3 047,61		3 047,61
008689 AC4	20/09/2019	FA 19188	3 047,63		3 047,63
008820 AC5	08/10/2019	FA 19200	846,16		846,16
009201 AC6	01/01/2020	FA 19242	843,61		843,61
009472 AC7	01/01/2020	FA 19263-	1 826,11		1 826,11
009787 AC8	11/02/2020	FA 20026-	1 813,11		1 813,11
010966 AC9	18/09/2020	FA 20183-	4 521,83		4 521,83
014350 AC10	27/01/2022	FA 22008-	4 799,52		4 799,52
014355 AC11	27/01/2022	FA 22009-	2 304,00		2 304,00
016036 AC12	12/09/2022	FA 22206	2 086,79		2 086,79
016359 AC13	17/10/2022	FA 22249	1 184,65		1 184,65
016675 AC14	25/11/2022	FA 22302	1 209,70		1 209,70
017614 AC15	22/03/2023	FA 23081	3 260,98		3 260,98
019365 AC16	29/11/2023	FA 23391	3 636,90		3 636,90
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - PERIOLE GERAUD			11 994,52		11 994,52
007947 AC1	03/04/2019	FA 19/2019	1 550,62		1 550,62
008106 AC2	24/05/2019	FA 29/2019	482,39		482,39
008357 AC3	10/07/2019	FA 33/2019	964,78		964,78
008859 AC4	18/09/2019	FA 36/2019	964,78		964,78
008822 AC5	08/10/2019	FA 38/2019	267,85		267,85
009203 AC6	01/01/2020	FA 41/2019	565,76		565,76
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	285,79		285,79
009802 AC8	10/02/2020	FA 05/2020	574,02		574,02
011021 AC9	18/09/2020	FA 11/2020	1 432,21		1 432,21
014357 AC10	27/01/2022	FA 02/2022	1 281,99		1 281,99
016117 AC11	13/09/2022	FA 09/2022	2 548,90		2 548,90
019367 AC12	29/11/2023	FA 25/2023	1 075,43		1 075,43
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			92 066,97	-140,56	91 926,41
007946 AC1	04/04/2019	FA F19MAT327	9 303,71		9 303,71
008104 AC2	24/05/2019	FA F19MAT479	2 426,97		2 426,97
008355 AC3	31/07/2019	FA F19MAT716	6 405,34		6 405,34
008861 AC4	30/09/2019	FA F19MAT900	5 888,20		5 888,20
008821 AC5	08/10/2019	FA F19MAT977	1 631,70		1 631,70
009202 AC6	01/01/2020	FA	1 626,82		1 626,82
009472 AC7	01/01/2020	REGUL REV	1 807,36		1 807,36
009473 AC7	01/01/2020	FA	1 740,12		1 740,12
009475 AC8	01/01/2020	FA	725,22		725,22
009801 AC9	07/02/2020	FA F20MAT120	3 496,42		3 496,42
011020 AC10	30/09/2020	FA F20MAT790	8 721,49		8 721,49
014388 AC11	31/01/2022	FA F22MAT084	7 758,86		7 758,86
014390 AC12	31/01/2022	FA F22MAT081	1 730,74		1 730,74
014392 AC13	31/01/2022	FA F22MAT064	9 893,85		9 893,85
015739 AC14	30/06/2022	FA F22MAT642	2 233,25		2 233,25
015913 AC15	31/07/2022	FA F22MAT788	1 986,73		1 986,73
016132 AC16	31/05/2022	FA F22MAT526	1 966,24		1 966,24
016134 AC17	30/04/2022	FA F22MAT481	1 949,17		1 949,17
016360 AC18	30/09/2022	FA F22MAT941	5 685,98		5 685,98
016931 AC19	01/01/2023	FA	2 006,29		2 006,29
017603 AC20	01/01/2023	FA	3 513,93		3 513,93
017599 AC21	31/01/2023	FA F23MAT033	1 628,81		1 628,81
017867 AC22	31/03/2023	FA F23MAT312	2 850,43		2 850,43

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de récé
 Publi le : 03

018134 AC23	31/05/2023	FA F23MAT605	2 385,60		2 385,60
018698 AC24	31/07/2023	FA F23MAT906	1 214,47		1 214,47
018727 AC25	31/08/2023	FA F23MAT953	1 489,27		1 489,27
021939 AC26	30/06/2024	FA F24MAT694		-140,56	-140,56
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - ICI LA (D')			21 567,21	64,42	21 631,63
011900 AC1	25/01/2021	FA 21014-	4 891,63		4 891,63
012406 AC2	21/04/2021	FA 21070-	3 012,55		3 012,55
012486 AC3	30/04/2021	FA 21081-	1 981,86		1 981,86
013015 AC4	28/07/2021	FA 21157-	10 038,85		10 038,85
013521 AC5	15/10/2021	FA 21206	1 642,32		1 642,32
021521 REVISIONS DEFINITIVES	10/07/2024	GDG		64,42	64,42
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - SAFEGE-SUEZ			21 891,79	47,20	21 938,99
011901 AC1	31/01/2021	FA F21MAT060	4 669,15		4 669,15
012456 AC2	20/04/2021	FA F21MAT368	2 875,52		2 875,52
012487 AC3	21/04/2021	FA F21MAT369	1 891,73		1 891,73
013042 AC4	31/07/2021	FA F21MAT805	8 262,75		8 262,75
013919 AC5	30/09/2021	FA F21MAT972	1 299,60		1 299,60
014391 AC6	31/01/2022	FA F22MAT097	2 167,54		2 167,54
016133 AC7	30/04/2022	FA F22MAT480	725,50		725,50
021522 REVISIONS DEFINITIVES	10/07/2024	GDG		47,20	47,20
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - ICI LA (D')			20 185,59		20 185,59
014356 AC1	27/01/2022	FA 22010-	2 241,74		2 241,74
016035 AC2	12/09/2022	FA 22205	2 935,48		2 935,48
016362 AC3	17/10/2022	FA 22248	2 911,84		2 911,84
016674 AC4	25/11/2022	FA 22301	2 951,83		2 951,83
017613 AC5	22/03/2023	FA 23080	3 560,82		3 560,82
019362 AC6 11/23	29/11/2023	FA 23390	5 583,88		5 583,88
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - PERIOLE			5 539,43		5 539,43
014358 AC1	27/01/2022	FA 03/2022	747,25		747,25
016119 AC2	13/09/2022	FA 10/2022	748,36		748,36
016363 AC3	18/10/2022	FA 12/2022	735,84		735,84
016684 AC4	25/11/2022	FA 15/2022	743,23		743,23
017552 AC5	03/03/2023	FA 03/2023	1 114,87		1 114,87
019364 AC6	29/11/2023	FA 24/2023	1 449,88		1 449,88
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - SAFEGE-			32 249,42	3 202,41	35 451,83
014393 AC1	31/01/2022	FA F22MAT085	4 513,82		4 513,82
015910 AC2	30/04/2022	FA F22MAT482	2 156,50		2 156,50
015911 AC3	31/05/2022	FA F22MAT525	2 101,30		2 101,30
015751 AC4	30/06/2022	FA F22MAT641	2 116,93		2 116,93
015915 AC5	31/07/2022	FA F22MAT787	2 116,93		2 116,93
016098 AC6	31/08/2022	FA F22MAT836	2 132,56		2 132,56
016361 AC7	30/09/2022	FA F22MAT940	2 144,30		2 144,30
016673 AC8	31/10/2022	FA	2 146,24		2 146,24
016917 AC9	01/01/2023	FA	2 140,38		2 140,38
017604 AC10	01/01/2023	FA	3 626,46		3 626,46
017605 AC11	31/01/2023	FA F23MAT034	1 595,58		1 595,58
018135 AC12	31/05/2023	FA F23MAT604	2 789,74		2 789,74
019343 AC13	31/10/2023	F23MAT1166	1 198,12		1 198,12
019474 AC14 11/23	30/11/2023	FA	1 470,56		1 470,56
021940 AC15 05/24	31/05/2024	FA F24MAT589		1 989,49	1 989,49
021938 AC16 06/24	30/06/2024	FA F24MAT693		1 212,92	1 212,92
M2022-073 Coordination travaux Ilot C1/Allée de l'Europe - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 419,20		2 419,20
017424 AC1	28/02/2023	FA F23MAT216	1 935,36		1 935,36
017854 AC2	30/04/2023	FA F23MAT414	483,84		483,84
M2023-022/BDC4 iM.1_3_4 rue Martin Porc parcelle BB258 - ilot C7 - GINGER DELEO				5 151,13	5 151,13
020572 AC1	05/04/2024	FA		3 772,08	3 772,08
022140 AC2	13/09/2024	FA		912,25	912,25
023157 AC3	13/12/2024	FA		466,80	466,80
D302 Coordonnateur SPS			13 382,51		13 382,51
M2017-034 Mission de coordination SPS, catégorie 2 - ELYFEC SPS			13 382,51		13 382,51
006709 AC1	30/09/2018	FA F83181361	588,00		588,00
007665 AC2	28/02/2019	FA F83190244	210,00		210,00
008790 AC3	30/09/2019	FA F83191369	418,05		418,05
009014 AC4	31/10/2019	FA F83191530	412,97		412,97
009259 AC5	01/01/2020	FA F83191671	412,97		412,97
009521 AC6	01/01/2020	FA F83191829	413,77		413,77
009707 AC7	30/01/2020	FA F83200130	784,76		784,76
010316 AC8	26/05/2020	FA F83200575	418,48		418,48
013759 AC9	22/11/2021	FA F83211285	424,54		424,54
014060 AC10	01/01/2022	FA F83211478	427,33		427,33
014529 AC11	24/01/2022	FA F83220084	430,13		430,13
014773 AC12	28/03/2022	FA F83220311	443,28		443,28
015255 AC13	22/04/2022	FA F83220433	455,66		455,66
015187 AC14	23/05/2022	FA F83220563	441,30		441,30
015355 AC15	20/06/2022	FA F83220647	442,09		442,09
015921 AC16	24/08/2022	FA F83220893	454,45		454,45
017473 AC17	28/02/2023	FA F83230225	123,59		123,59
019295 SOLDE	27/11/2023	FA F83231360	6 081,14		6 081,14
D305 Autres honoraires techniques			1 620,00		1 620,00
M2021-048 Modification jeux carrefour Av. de l'Europe - GERTRUDE			1 620,00		1 620,00
013243 AC1	10/09/2021	FA BOD	1 620,00		1 620,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			1 230 204,92	-75 000,00	1 155 204,92
E113 Enfouissement ligne à HT			1 162 967,00	-75 000,00	1 087 967,00
16-01315 Enfouissement ligne haute tension - RTE			1 275 935,00		1 275 935,00
004037 AC1	07/12/2016	FA 90051609	62 000,00		62 000,00
004267 AC2	01/02/2017	FA 90052549	13 652,00		13 652,00
008003 AC3	30/04/2019	FA 90058811	25 583,00		25 583,00
011219 AC4	21/10/2020	FA 90062256	352 410,00		352 410,00
013987 AC5	20/12/2021	FA 90065282	822 290,00		822 290,00
016165 AC 6	30/09/2022	FA 1	-37 968,00		-37 968,00
016949 ERR TIERS REMBT C.EYSINES	30/09/2022	ANNUL AC6	37 968,00		37 968,00
22-05901 Remboursement C.Eysines Enfouissement ligne haute tension - TRESOR PUBLIC			-112 968,00	-75 000,00	-187 968,00
016950 REMBT RTE AC 2022	30/09/2022	AC1	-37 968,00		-37 968,00
018980 REMBT RTE AC 2023	17/10/2023	C0002-RTE-2	-75 000,00		-75 000,00
022677 REMBT RTE AC3	24/10/2024	FA C0002-RTE-		-75 000,00	-75 000,00

Accusé de ré
033-243300:
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

E115 Divers			67 237,92		67 237,92
21-04549 Participat* enfouissement lignes aériennes Rues MP/BT - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			67 237,92		67 237,92
012858 AC1	17/06/2021	TITRE 423	67 237,92		67 237,92
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			1 051 033,34	120 000,00	1 171 033,34
G101 Rémunération			1 051 033,34	120 000,00	1 171 033,34
16-01134 Rémunération aménageur 2016 - FAB			96 033,34		96 033,34
003328 REM 13/04-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-02	29 033,34		29 033,34
004063 REM 01/01-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-05	67 000,00		67 000,00
17-01472 Rémunération aménageur 2017 - FAB			134 000,00		134 000,00
004787 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-02	67 000,00		67 000,00
005225 REM 01/07-30/09/17	30/09/2017	ND 2017-05	33 500,00		33 500,00
005567 REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-08	33 500,00		33 500,00
18-02132 Rémunération aménageur 2018 - FAB			134 000,00		134 000,00
006344 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-02	67 000,00		67 000,00
006942 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-06	33 500,00		33 500,00
007250 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-12	33 500,00		33 500,00
19-02791 Rémunération aménageur 2019 - FAB			134 000,00		134 000,00
008462 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-02	67 000,00		67 000,00
008701 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-12	33 500,00		33 500,00
009211 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-22	33 500,00		33 500,00
20-03696 Rémunération aménageur 2020 - FAB			134 000,00		134 000,00
010419 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-02	67 000,00		67 000,00
011015 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-13	33 500,00		33 500,00
011683 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-24	33 500,00		33 500,00
21-04294 Rémunération aménageur 2021 - FAB			134 000,00		134 000,00
012211 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-02	33 500,00		33 500,00
012910 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-13	33 500,00		33 500,00
013466 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-24	33 500,00		33 500,00
014085 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-35	33 500,00		33 500,00
22-05219 Rémunération aménageur 2022 - FAB			134 000,00		134 000,00
014866 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-02	33 500,00		33 500,00
015350 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-13	33 500,00		33 500,00
016049 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-24	33 500,00		33 500,00
016843 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-35	33 500,00		33 500,00
23-06242 Rémunération aménageur 2023 - FAB			151 000,00		151 000,00
017800 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-02	25 250,00		25 250,00
018359 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-14	25 250,00		25 250,00
019493 REM REGUL 1523-1/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-26	62 750,00		62 750,00
019505 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-38	37 750,00		37 750,00
24-07293 Rémunération aménageur 2024 - FAB				120 000,00	120 000,00
021322 REM 01/01/24-30/06/24	25/06/2024	ND 2024-03		60 000,00	60 000,00
022569 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-15		30 000,00	30 000,00
023283 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-25		30 000,00	30 000,00
H FRAIS DIVERS			41 219,27	14 202,21	55 421,48
H101 Communication			29 840,97	3 695,58	33 536,55
19-02670 TOT BAG - INSOLEUSE			820,00		820,00
007757 AC1	21/03/2019	FA	820,00		820,00
19-02706 Prestation 23/03/2019 accueil habitants longères - LEMOINE			150,00		150,00
007805 AC1	23/03/2019	FA FBM	150,00		150,00
19-03131 Différence de règlement MDA- C0002 - MAISON DES ARTISTES			0,26		0,26
008860 ECART ARRONDI MDA 3°T2019	14/10/2019	FA 14/10/19	0,26		0,26
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - BRUNELOT RUBEN			1 250,00		1 250,00
006408 AC1	13/07/2018	FA N°10_18	1 000,00		1 000,00
007068 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	250,00		250,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - MAISON DES			13,75		13,75
006409 COTIS SOCIALES S/ FA N°10_18	13/07/2018	BRUNELOT	11,00		11,00
007069 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	2,75		2,75
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - APPLICADRONE			1 295,28		1 295,28
008279 AC1	01/07/2019	FA 20190013	431,76		431,76
009536 AC2	01/01/2020	FA 20190044	431,76		431,76
017219 BDC 8 AC3	01/01/2023	FA 20220047	431,76		431,76
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELOT RUBEN			7 465,25		7 465,25
008135 BDC 3	29/05/2019	NH 05-19	3 598,00		3 598,00
008426 BDC9	19/07/2019	NH 12_19	1 542,00		1 542,00
010475 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	257,00		257,00
016440 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	818,25		818,25
019044 BDC 16	13/10/2023	FA 004_2023	1 250,00		1 250,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			6 968,64		6 968,64
008127 AC1	29/05/2019	FA 2019013	2 960,64		2 960,64
010436 BDC10	23/06/2020	FA 2020016	2 960,64		2 960,64
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	1 047,36		1 047,36
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			94,87	54,00	148,87
008143 AC1 BDC3	29/05/2019	NH 05-19	39,58		39,58
008546 BDC9	19/07/2019	NH*12-19	16,96		16,96
008547 BDC7- AC2	19/07/2019	NH*11-19	12,78		12,78
010476 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	2,80		2,80
016460 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	9,00		9,00
019291 BDC 16	13/10/2023	FA 004_2023	13,75		13,75
019941 BDC15 AC1	29/01/2024	FA 001-2024		16,20	16,20
020682 BDC15 AC2	13/03/2024	FA 004_2024		27,00	27,00
021026 BDC15 AC3	27/05/2024	FA 006-2024		10,80	10,80
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			9 189,12		9 189,12
008131 BDC3	29/05/2019	NH 17/321/3	4 934,40		4 934,40
010474 BDC10	29/06/2020	FA 17/321	3 207,36		3 207,36
016433 BDC14 - AC2	28/10/2022	FA	1 047,36		1 047,36
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - RICOCHET SONORE			1 963,80		1 963,80
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	1 963,80		1 963,80
M2019-030 Lot 1/BDC14 Réimpression Vademecum Eysines - BLF IMPRESSION			138,00	-0,28	137,72
012691 AC1	10/06/2021	FA 37 244	138,00		138,00
021303 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC14		-0,28	-0,28
M2019-030 Lot 2/BDC21 Impression & pose d'un panneau de PD format 0,80x1,20m - MIPP			144,00		144,00
013396 AC1	30/09/2021	FA 213165	144,00		144,00
M2019-030 Lot 2/BDC31 Réimpression panneau permis de démolir - MIPP			144,00	29,23	173,23
017725 AC1	31/03/2023	FA F230975	144,00		144,00
021290 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC31		29,23	29,23

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de réce
 Publi le : 03

M2019-030 Lot 2/BDC36 Production et pose panneau permis de démolir - MIPP			204,00	38,68	242,68
018332 AC1	20/07/2023	FAF232158	60,00		60,00
018600 DEPLACEMENT PANNEAU PD EYSINES	31/08/2023	FA F232603	144,00		144,00
021293 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC36		38,68	38,68
M2023-038/BDC-OPDT-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 -				5,45	5,45
020941 CONTRIBUT* 1.1% BDC-OPDT-1	22/04/2024	FA 202410		5,45	5,45
M2023-038/BDC-OPDT-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - PANIER				544,50	544,50
020741 AC1	22/04/2024	FA 202410		544,50	544,50
M2024-009 Exposition scénographique Esprit des Jalles - BON SENS				3 024,00	3 024,00
020804 SOLDE	19/04/2024	FA 00329		3 024,00	3 024,00
H103 Taxes (hors foncier): archéo...				10 070,00	10 070,00
24-07738 Redevance archéologique préventive - DDFIP VIENNE RNF				10 070,00	10 070,00
022879 TAXE ARCHEO	30/10/2024	FA POIT 24		10 070,00	10 070,00
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			9 578,30	436,63	10 014,93
16-01036 Frais gestion bancaires 2016 - CAISSE D'EPARGNE			563,14		563,14
003087 COMM* GEST* 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	55,00		55,00
003143 REM COMM* GEST* 1TR16	07/04/2016	AV 07/04/16	-55,00		-55,00
003386 COMM* GEST* 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	55,12		55,12
003387 FRAIS VIRT 06/16	01/07/2016	FA 01/07/16	0,09		0,09
003714 COMM* GEST* 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	60,04		60,04
004127 COMM* GEST* 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	447,89		447,89
17-01508 Frais gestion bancaires 2017 - CAISSE D'EPARGNE			4 520,23		4 520,23
004553 COMM* GEST* 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	3 435,46		3 435,46
004875 COMM* GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	452,65		452,65
004956 FRAIS CONSENTMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00		10,00
005243 COMM* GEST 3TR17	30/09/2017	FA 30/09/17	363,13		363,13
005658 COMM* GEST* 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	258,99		258,99
18-02055 Frais gestion bancaires 2018 - CAISSE D'EPARGNE			1 625,13		1 625,13
006124 COMM* GEST* 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	236,00		236,00
006422 COMM* GEST* 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	246,99		246,99
006821 COMM* GEST* 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	496,65		496,65
007380 COMM* GEST* 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	645,49		645,49
19-02832 Frais gestion bancaires 2019 - CAISSE D'EPARGNE			209,27		209,27
008049 FRAIS ENVOI CHEQUIER	19/03/2019	FA 19/03/19	16,00		16,00
008058 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	3,71		3,71
008452 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	80,06		80,06
008914 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	109,50		109,50
20-03397 Frais gestion bancaires 2020 - CAISSE D'EPARGNE			708,04		708,04
009573 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	599,31		599,31
010207 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	34,01		34,01
010557 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	45,57		45,57
011196 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	29,15		29,15
21-04117 Frais gestion bancaires 2021 - CAISSE D'EPARGNE			1 023,94		1 023,94
011879 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	105,31		105,31
012378 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	16,61		16,61
012933 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	15,75		15,75
013489 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	32,78		32,78
014334 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	853,49		853,49
22-05281 Frais gestion bancaires 2022 - CAISSE D'EPARGNE			511,29		511,29
014969 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	151,26		151,26
015677 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	206,16		206,16
016262 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	153,87		153,87
23-05965 Frais gestion bancaires 2023 - CAISSE D'EPARGNE			417,26		417,26
017118 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	219,86		219,86
017898 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	44,84		44,84
017924 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-16,42		-16,42
018347 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	126,31		126,31
018885 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	42,67		42,67
24-06918 Frais gestion bancaires 2024 - CAISSE D'EPARGNE				436,63	436,63
019916 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24	72,23		72,23
020620 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24	138,40		138,40
021608 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24	171,46		171,46
022510 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24	54,54		54,54
H106 Contentieux			1 800,00		1 800,00
M2016-039 Lot 1/BDC1 Précautions convention CAIR/BRUTHER - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON			1 800,00		1 800,00
005597 BDC1	30/11/2017	NH H1711335	1 800,00		1 800,00
2 RECETTES			14 971 255,91	229 919,31	15 201 175,22
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			4 481 229,75		4 481 229,75
R101 Libre			1 759 284,64		1 759 284,64
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 759 284,64		1 759 284,64
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 759 284,64		1 759 284,64
R102 Abordable			747 881,96		747 881,96
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			747 881,96		747 881,96
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	747 881,96		747 881,96
R103 PLA1,PLUS,PLS			1 624 286,30		1 624 286,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC			458 608,50		458 608,50
17-10113 CESS* GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	458 608,50		458 608,50
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 165 677,80		1 165 677,80
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 165 677,80		1 165 677,80
R104 PSLA,Accession soc			304 747,30		304 747,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC			304 747,30		304 747,30
17-10113 CESS* GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	304 747,30		304 747,30
R107 Activités			45 029,55		45 029,55
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			45 029,55		45 029,55
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	45 029,55		45 029,55
S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS			2 516,26		2 516,26
S107 Activités			2 516,26		2 516,26
23-06161 Participation financière parcelle BB 2728 - HAMMADACHE			2 516,26		2 516,26
23-41203 PART* FINANCIERE AC1	23/03/2023	FA 2023-43	2 516,26		2 516,26
U SUBVENTIONS				167 488,01	167 488,01
U101 Subventions				167 488,01	167 488,01
24-07166 Subvention FNAP Fouilles Archéologiques Ilot C5 - FNAP				92 488,01	92 488,01
24-52535 SUBV FOUILLE ARCHEO ILOT C5	30/01/2024	FA 30/01/24		92 488,01	92 488,01
24-07766 Subvention Zones commerciales CC - ANCT				75 000,00	75 000,00
24-07766 Acompte	11/12/2024			-75 000,00	-75 000,00

Accusé de ré
 033-243300 :
 Date de télé
 Date de récé
 Publié le : 03

24-07766 Acompte	11/12/2024			75 000,00	75 000,00
24-53066 SUBV ZONES COMMERCIALES	11/12/2024	FA C0002-AC1		75 000,00	75 000,00
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			10 420 724,00		10 420 724,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			3 982 074,00		3 982 074,00
18-02225 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			3 982 074,00		3 982 074,00
19-19432 PART* EQUILIBRE 2019	13/05/2019	AC2	886 476,00		886 476,00
20-26782 PART* EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC3	3 095 598,00		3 095 598,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage			6 438 650,00		6 438 650,00
18-02222 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			6 438 650,00		6 438 650,00
18-15505 PART* REM OUVRAGE 2018	01/08/2018	AC1	2 200 000,00		2 200 000,00
19-19010 PART* REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2	3 302 742,00		3 302 742,00
19-19430 ANNUL PART* REM OUVRAGE 2019 ERREUR TVA	13/05/2019	AC2	-3 302 742,00		-3 302 742,00
19-19431 PART* REM OUVRAGE 2019	13/05/2019	AC2	2 416 266,00		2 416 266,00
20-26783 PART* REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC3	854 217,00		854 217,00
21-32171 PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40		968 167,40
21-32585 REJET PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	-968 167,40		-968 167,40
21-32588 PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,00		968 167,00
22-39485 PART RO 2022	31/12/2022	AC1	33 557,20		33 557,20
23-41127 AVOIR	31/01/2023	AC1	-33 557,20		-33 557,20
23-41128 PART RO	31/01/2023	AC1	33 577,20		33 577,20
24-48165 REGUL IMPUT GO7 PART RO 2022	31/12/2022	AC1	-33 557,20		-33 557,20
24-48167 REGUL IMPUT GO7 AVOIR	31/01/2023	AC1	33 557,20		33 557,20
24-48169 REGUL IMPUT GO7 REGUL PART RO 2022	31/01/2023	AC1	-33 577,20		-33 577,20
W PARTICIPATIONS COMMUNALES			33 577,20	30 000,00	63 577,20
W101 Commune(s)			33 577,20	30 000,00	63 577,20
22-05899 Participation s/ les ouvrages à réaliser Commune Eysines - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			33 577,20	30 000,00	63 577,20
24-48166 REGUL IMPUT GO7 PART RO	31/12/2022	AC1	33 557,20		33 557,20
24-48168 REGUL IMPUT GO7 AVOIR	31/01/2023	AC1	-33 557,20		-33 557,20
24-48170 REGUL IMPUT GO7 REGUL PART RO 2022	31/01/2023	AC1	33 577,20		33 577,20
24-51989 PART REMISE OUVRAGE VILLE AC2	24/10/2024	FA C0002 RO		30 000,00	30 000,00
X PRODUITS DIVERS			33 208,70	32 431,30	65 640,00
X102 Refacturations			800,00	32 431,30	33 231,30
23-06183 Remboursement frais de dépens ARENAS - CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE			800,00		800,00
23-41338 REMB DEPENS ARENAS	04/04/2023	FA 04/01/23	800,00		800,00
24-06981 Remboursement préjudices travaux RTE / SPAC - WTW (GRAS SAVOYE)				32 431,30	32 431,30
24-50002 REMBT PREJUDICES TRAVX RTE/SPAC	17/05/2024	QUIT 17/05/24		32 431,30	32 431,30
X201 Produits financiers			32 408,70		32 408,70
16-01037 Rémunération compte courant 2016 - CAISSE D'EPARGNE			3 633,64		3 633,64
16-06657 REM* CPTÉ COURANT 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	226,93		226,93
16-07383 REM* CPTÉ COURANT 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	1 816,26		1 816,26
17-08511 REM* CPTÉ COURANT 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	1 590,45		1 590,45
19-18061 REGUL AFFECTAT* C/C	31/12/2016	2016	-3 633,64		-3 633,64
19-18062 REGUL AFFECTAT* C/C	31/12/2016	2016	3 633,64		3 633,64
17-01509 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE			3 544,33		3 544,33
17-09661 REM* CPT COURANT 1TR17	31/03/2017		560,36		560,36
17-10383 REM* CPTÉ COURANT 2TR17	30/06/2017		536,52		536,52
17-11594 REM* CPTÉ COURANT 3TR17	30/09/2017		6 865,18		6 865,18
17-11596 ANNUL ERREUR OP REM* CPTÉ COURANT 3TR17	30/09/2017		-6 865,18		-6 865,18
17-11612 REM* CPTÉ COURANT 3TR17	30/09/2017		1 261,34		1 261,34
18-12924 REM* CPTÉ COURANT 4TR17	31/12/2017		1 186,11		1 186,11
19-18065 REGUL AFFECTAT* COMPTE	31/12/2017		-3 544,33		-3 544,33
19-18067 REGUL C/C 2017	31/12/2017		3 544,33		3 544,33
18-02056 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE			5 092,78		5 092,78
18-14476 REM* CPTÉ COURANT 1TR18	03/04/2018		1 091,66		1 091,66
18-15176 REM* CPTÉ COURANT 2TR18	02/07/2018		1 056,73		1 056,73
18-16228 REM* CPTÉ COURANT 3TR18	02/10/2018		855,11		855,11
19-17822 REM* CPTÉ COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	2 089,28		2 089,28
19-18066 REGUL 2018	31/12/2018	FA 311218	-5 092,78		-5 092,78
19-18068 REGUL C/C 2018	31/12/2018		5 092,78		5 092,78
19-02846 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			3 478,26		3 478,26
19-19504 REM* CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	1 950,51		1 950,51
19-20538 REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	113,18		113,18
19-21755 REM* CPTÉ COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	1 414,57		1 414,57
20-03407 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			6 180,90		6 180,90
20-23252 REM* CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	1 869,57		1 869,57
20-24901 REM* CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	1 557,75		1 557,75
20-25705 REM* CPTÉ COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	1 424,09		1 424,09
20-27165 REM* CPTÉ COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	1 329,49		1 329,49
21-04128 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE			8 375,80		8 375,80
21-28547 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	1 787,21		1 787,21
21-29734 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	2 349,32		2 349,32
21-30903 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	2 089,87		2 089,87
21-32214 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	1 453,78		1 453,78
22-34286 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	783,48		783,48
22-34395 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT	01/01/2022	FA 01/01/22	-783,48		-783,48
22-34396 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	695,62		695,62
22-05275 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE			1 050,28		1 050,28
22-35801 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	575,49		575,49
22-36927 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	324,96		324,96
22-38159 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	149,83		149,83
22-05310 Convention de servitude RTE - RTE			949,00		949,00
22-35884 INDEMNITE SERVITUDE	01/04/2022	FA 01/04/22	949,00		949,00
23-05977 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE			103,71		103,71
23-40031 INTERETS CREDITEUR 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	84,41		84,41
23-41719 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/2023	19,30		19,30
3 AMORTISSEMENT			1 085 672,00		1 085 672,00
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			6 052,00		6 052,00
O200 Rembousement avances internes			6 052,00		6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB			3 000,00		3 000,00
19-17792 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO	22/10/2018	22/10/18	3 000,00		3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB			3 052,00		3 052,00
19-17833 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		3 052,00		3 052,00
Z TVA A REVERSER			1 079 620,00		1 079 620,00
Z102 TVA à reverser			1 079 620,00		1 079 620,00
18-02408 CA3 - TRESOR PUBLIC (CA3)			1 079 620,00		1 079 620,00

Accusé de ré
033-243300:
Date de télé
Date de récé
Publié le : 03

18-17028 CA3 10/2018	26/11/2018		124 114,00		124 114,00
19-22516 CA3 10/2019	27/11/2019		955 506,00		955 506,00
4 MOBILISATION			2 640 052,00		2 640 052,00
M AVANCES			2 634 000,00		2 634 000,00
M100 Avances collectivités			2 634 000,00		2 634 000,00
16-01060 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE			2 634 000,00		2 634 000,00
16-05834 AVCE TRESORERIE	31/03/2016	DDE	1 734 000,00		1 734 000,00
17-09056 AVCE TRESORERIE	13/02/2017	DDE DE	900 000,00		900 000,00
O AVANCES INTERNE			6 052,00		6 052,00
O100 Avances interne			6 052,00		6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB			3 000,00		3 000,00
18-15986 REGUL PROV° AQUITANIS DU 17/05/17	01/01/2018		3 000,00		3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB			3 052,00		3 052,00
18-17025 C0002 ENC LOYERS C0007	04/12/2018		3 052,00		3 052,00
SOLDE			-692 938,16	-1 429 114,27	-2 122 052,43

CRFA 2024 ZAC Carès Cantinolle - Eysines

Annexe 7

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion		
					prévues	réalisées	%
Travaux rue Martin Porc, Bertrand Triat et Jardin de Cantinolle	1 - VRD	COLAS	4 ans	1 000 108,53 €	500	500	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	4 ans	507 545,20 €	200	200	100%
Travaux allée de l'Europe	1 - VRD et éclairage	COLAS	3 ans	849 305,64 €	455	455	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	3 ans	119 709,70 €	105	105	100%

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-lmc1110410-DE-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025
