

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2025

EYSINES
ZAC Carès Cantinolle

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	4
1.1	Préambule	4
	Secteur de Cantinolle	5
	Secteur Carès.....	7
1.2	Cadre juridique de l'intervention	9
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement.....	10
	10	
1.4	Programme prévisionnel de constructions	10
1.5	Programme prévisionnel des espaces publics.....	11
2.	Actions menées du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2025	16
2.1	Procédures administratives.....	16
2.2	Etudes.....	16
a)	Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination	16
b)	Mise en œuvre du plan d'actions mobilité.....	16
c)	Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain	16
d)	Etudes environnementales.....	16
e)	Etudes techniques	17
2.3	Démarches foncières.....	17
2.4	Gestion du patrimoine	17
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	18
2.6	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	18
2.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	19
2.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	19
3.	Actions à mener en 2026.....	20
3.1	Procédures administratives.....	20
3.2	Etudes.....	20
3.3	Démarches foncières.....	21
3.4	Gestion du patrimoine	22
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	22
3.6	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	22

3.7	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	22
3.8	Accompagnement des projets immobiliers.....	22
4.	Analyse financière	23
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2025.....	23
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2026.....	24
4.3	Imputation des charges du concessionnaire – Rémunération aménageur	25
4.4	Participation du concédant	25
4.5	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	25
4.6	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	26
5.	Annexes	27

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le site de Carès Cantinolle se situe au nord de la commune d'Eysines sur un secteur traversé par un réseau d'infrastructures urbaines fortement fréquenté (avenue du Médoc et route de Lacanau). Ce secteur se situe en limite des communes du Haillan et du Taillan-Médoc.

Aujourd'hui, ce secteur très routier est en cours de restructuration et requalification fortes avec :

- l'arrivée de la ligne D du tramway et l'implantation du P+R depuis 2020 qui viennent donner un signal fort dans le paysage et accompagner de nouveaux usages en termes de mobilité,
- la ZAC Carès Cantinolle avec l'apport de logements, la requalification et création d'espaces publics, la création d'un gymnase et d'un groupe scolaire,
- le réaménagement du rond-point de Cantinolle pour améliorer les déplacements,
- la requalification de la route du Médoc en avenue plus apaisée.

En terme urbain et paysager, ce site, même s'il est en pleine évolution, reste encore marqué par un paysage peu homogène, des situations urbaines disparates qui en font un lieu peu valorisé (zones commerciales mono fonctionnelles, friches, habitat diffus sans réelle logique d'aménagement) et à la proximité avec le Parc des Jalles peu lisible.

Le travail en cours depuis plus de dix ans, engagé avec la ZAC, mais aussi entre autres avec la desserte de ce secteur par la ligne D du tramway, de la station des Sources jusqu'au terminus au rond-point de Cantinolle, permettent d'envisager une mutation urbaine profonde.

Avec la ZAC, il s'agissait aussi de maîtriser l'urbanisation de manière à protéger la zone des sources de Cantinolle et l'aqueduc du Taillan-Médoc.

Le parti d'aménagement du projet urbain initial, en considération des enjeux métropolitains, développait les principes suivants :

- le respect du « génie du lieu » comme le disait Alexandre Chemetoff, paysagiste, avec la protection et la valorisation des éléments naturels existants : préservation d'un cœur de quartier vert, renforcement de la continuité écologique et de la trame paysagère avec les jalles qui deviennent une valeur pour les logements développés sur ses franges ;
- le respect de l'identité maraîchère de la commune : respect du parcellaire, habitat type « maraîcher » ;
- la recherche d'une intensification urbaine concentrée autour de l'axe de transport en commun, et des voiries existantes ;
- la recherche d'un équilibre entre l'économie globale du projet et la qualité des logements et du cadre de vie : limitation de la création de voies et de réseaux nouveaux, un habitat qualitatif parfaitement intégré et offrant des capacités évolutives, utilisation de l'aplomb de la ligne à haute tension (ligne 225 KV) pour les stationnements... ;
- une logique de projet opportuniste avec un développement en fonction des disponibilités du foncier ;
- l'apport de nouvelles fonctions dans la zone d'activités de Cantinolle ;
- des typologies de logements adaptées au contexte urbain et paysager pour une intervention en finesse.

Ce parti d'aménagement a été adapté en 2025 à de nouveaux enjeux et au regard du retour d'expériences sur les deux premiers îlots et les espaces publics livrés. Aujourd'hui, le projet validé dans le cadre de la modification du dossier de réalisation (délibération n°2025-160 du 4 avril 2025) est en lien avec les enjeux suivants :

- une histoire de sol et d'eaux en recherchant ***une exemplarité de la gestion de l'eau en lien avec la spécificité de ce quartier situé en majeure partie dans la zone de captage des Sources de Cantinolle*** ;
- l'organisation d'***un quartier composite autour de plusieurs lieux de rencontres et d'activités en créant des continuités inter-îlots et avec le tramway*** ;
- ***faire quartier dans l'entre-ville*** en maillant finement, en hiérarchisant, en qualifiant les différents itinéraires et en développant des lieux de rencontre autour de placettes et de causettes (petits lieux de rencontre) ;
- ***déjouer l'insularité en recomposant et en liaisonnant pour retrouver la petite échelle dans chaque secteur de projet et en lien avec l'espace naturel de Carès*** ;
- ***améliorer la lisibilité du paysage existant et localiser les espaces à préserver***. Il s'agira de lier et mailler ce patchwork d'espaces naturels et paysagers par une trame paysagère qui structurera le quartier tout en étant attentif à la préservation des corridors écologiques, des habitats en lisières des îlots ou des fossés accueillant des espèces remarquables et protégées.

Une ZAC avec deux secteurs aux identités spécifiques

La ZAC Carès Cantinolle, dont le nom lui-même témoigne d'une juxtaposition de deux secteurs, a composé avec un paysage fragmenté et hétéroclite une opération multisites. Elle offre encore un paysage en transition, avec des secteurs récemment livrés, qui pour certains affirment une urbanité forte, des secteurs qui vont entrer en chantier et d'autres encore non aménagés.

Secteur de Cantinolle


Le secteur de Cantinolle est caractérisé par une articulation entre la zone commerciale et l'espace naturel de Carès.

La zone commerciale se distingue par ses bâtiments en tôle, souvent désignés comme des « boîtes à chaussures », ses infrastructures routières imposantes et ses étendues de parkings. La mutation du paysage d'entrée de ville en cours propose d'introduire une mixité des formes urbaines, d'améliorer l'accessibilité aux transports en commun, avec le tramway et son parc-relais, et d'apporter une qualité architecturale et paysagère au quartier. En termes de mobilité, on observe un développement à deux vitesses : d'une part, l'arrivée du tramway facilite l'accès aux transports en commun et au cœur de Bordeaux, d'autre part, le réaménagement des infrastructures routières renforcent l'accessibilité et la sécurité depuis les portes du Médoc, avec notamment le réaménagement du carrefour Cantinolle et le passage à une 2x2 voies sur la route de Lacanau.

Un territoire paysager caractérisé par des entités paysagères distinctes. Au nord, les jalles et sa plaine maraîchère se déploient. A l'ouest, avec les sources de Cantinolle, se trouve un secteur de ressource en eau potable pour la Métropole, avec un périmètre de captage et un aqueduc traversant le secteur. Au sud, l'espace naturel de Carès, ancien territoire agricole, conserve encore des vestiges de son passé agricole (fossés, bâti, vignes...).

Les îlots nommés dans le dossier de réalisation de la ZAC C1 à C4 sont implantés dans ce secteur.

- L'îlot C1 nommé désormais « L'Esprit des Jalles » : 133 logements, livré en 2022
- L'îlot C2, 40 logements, situé sur l'emplacement du parking du Super U, aujourd'hui abandonné et qui dans le cadre de la modification a été supprimé.
- L'îlot C3 nommé désormais « Médoc » bénéficie du déplacement du magasin Point-P vers l'emplacement du Dispano pour mener une opération de construction de logements
- L'îlot C4 nommé désormais « Les Lisières » s'intègre dans l'espace naturel de Carès. Il accueille le gymnase et le groupe scolaire.

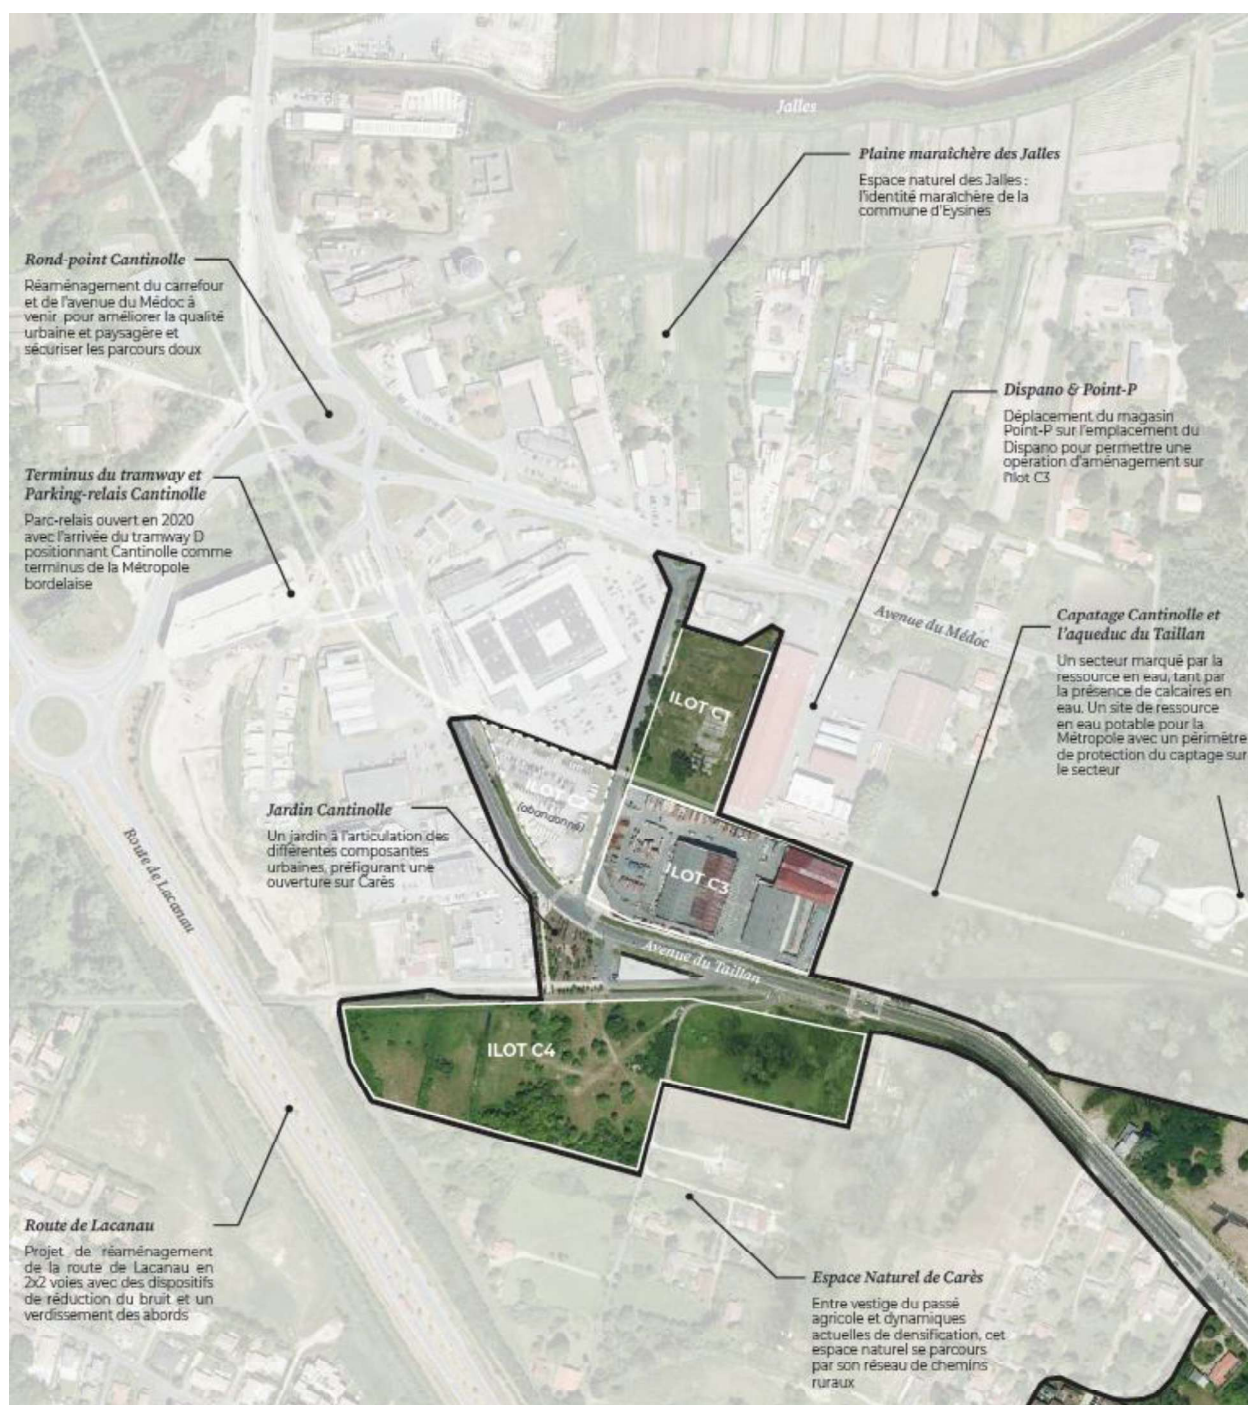

Secteur Carès

Le secteur de Carès se trouve entre le prolongement du centre-bourg d'Eysines et l'espace naturel de Carès, offrant un contraste entre urbanisation et nature.

Le secteur se caractérise par son lien avec un tissu constitué d'habitat pavillonnaire, en extension du centre-bourg d'une part, et de l'autre, par un ancien site rural témoignant d'un passé rural avec ses parcelles étroites, ses maisons isolées et des chemins ruraux, aujourd'hui en grande partie fermés.

L'Espace Naturel de Carès, composé principalement de propriétés privées, a été occupé illégalement pendant une dizaine d'années puis nettoyé en 2019, créant une réticence à l'idée de rouvrir ces chemins ruraux aux véhicules.

Trois îlots, dont un déjà construit « Les Longères de Carès » (îlot C6, 40 logements) et deux en cours de montage, se déploient à l'articulation entre ces deux milieux, adoptant une morphologie mixte de petits collectifs, bâtiments intermédiaires et d'habitats individuels. Cette densification urbaine a pour objectif de faire couture avec le tissu pavillonnaire existant et l'Espace Naturel de Carès. L'objectif est aussi de dialoguer en terme urbain et paysager avec le secteur de Cantinolle qui affirme une intensité plus forte.

Concernant les rues de ce secteur, il est à préciser qu'elles ne sont plus destinées uniquement aux véhicules, elles deviennent un espace apaisé et agréable à parcourir. Le stationnement est réfléchi comme un espace paysager et reste à une certaine distance des habitations. Les rues Martin Porc et Bertrand Triat ont fait l'objet de travaux de requalification avec un apport paysager très fort et la mise en place de cheminements doux agréables et sécurisés. Ces aménagements ont permis de préparer l'arrivée des futurs habitants et de rendre le quartier plus agréable aux habitants déjà présents.



Au cœur du site, un espace naturel dit « l'Espace Naturel Carès »

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle mais en dehors du périmètre de la ZAC, l'espace naturel dit « Espace Naturel Carès » ne connaît pas d'intervention par l'aménageur. C'est un espace fédérateur, élément fondamental du projet, jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement. Il fait l'objet d'un projet paysager spécifique sous la responsabilité de la Ville d'Eysines et de Bordeaux Métropole.

Les interstices, un nouvel élément intégré dans le projet


Les îlots de la ZAC formant des enclaves, quatre stratégies ont été mises en place visant à reconstituer la petite échelle et du lien dans le secteur de Carès.

Ces interstices non intégrés initialement constituent une adaptation du projet au regard de l'évolution du site. Ils sont intégrés dans le dossier de modification de la ZAC.

Ils entraînent le déploiement de nouvelles stratégies d'aménagement :

- Subdiviser les îlots, en diversifiant les modes d'habiter, les ambiances, les formes architecturales et les matériaux utilisés.
- S'ouvrir aux bords, en adressant les constructions et liaisons douces sur les abords de l'îlot, favorisant les connexions entre les îlots et l'Espace Naturel de Carès.
- Investir les interstices, les espaces entre les îlots, avec des projets à petite échelle réintroduisant une variété d'échelle dans le tissu urbain.
- Créer des chemins de traverses, des voies permettant de liaisonner les îlots entre eux, créant ainsi des porosités à anticiper dans les projets à venir. Ils favorisent aussi les échanges à l'échelle du quartier.

La mise en œuvre de ces stratégies a permis d'identifier plusieurs sites potentiels de projet au sein de la ZAC, suscitant une réflexion sur les interstices devenus de nouveaux îlots.

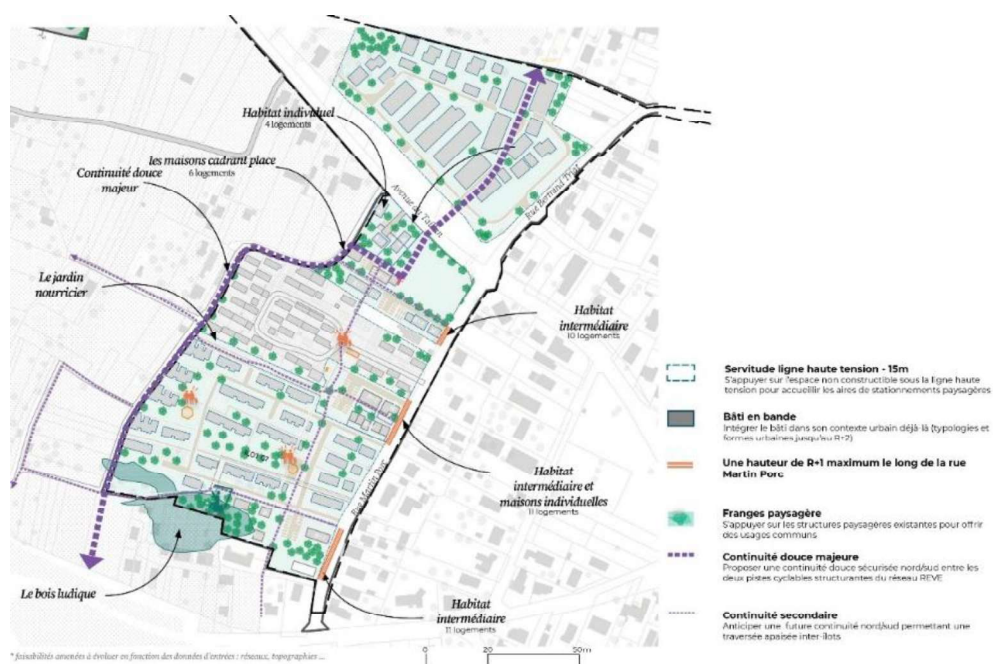

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n° 2015/0583 du 25 septembre 2015, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,
- le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact relative au projet de la ZAC Carès Cantinolle,
- le dossier de création de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines,
- le programme prévisionnel de construction de la zone.

Par délibération n° 2016/029 du 22 janvier 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le dossier de réalisation de la ZAC Carès Cantinolle,
- le programme des équipements publics,
- le traité de concession confiant la conduite de l'opération à La Fab,
- la délégation de l'exercice du droit de préemption à La Fab dans le périmètre de la ZAC,
- le montant de la participation métropolitaine à l'opération d'aménagement.

Le traité de concession « Eysines ZAC Carès Cantinolle » a été notifié à l'aménageur le 13 avril 2016 pour une durée de 15 ans.

Par délibération n° 2017-835 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le Compte-Rendu Financier et d'Activités (CRFA) 2016 et l'avenant n° 1 au traité de concession portant sur la répartition des participations financières, suite à une modification de la répartition des compétences entre Bordeaux Métropole et la Ville d'Eysines.

Par délibération n° 2018-746 du 30 novembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2017 et l'avenant n° 1 de la convention d'avance de trésorerie.

Par délibération n°2019-726 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2018 et l'avenant n°2 au traité de concession portant sur l'intégration d'une participation financière de la ZAC à l'enfouissement des lignes aériennes basse tension et télécom sur les rues Martin Porc et Bertrand Triat et autorisant La Fab à gérer les trésoreries fusionnées des opérations sur un compte bancaire unique.

Par délibération n°2020-328 du 23 octobre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2019.

Par délibération n°2021-435 du 23 septembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2020.

Par délibération n°2022-599 du 24 novembre 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2021.


Par délibération n°2023-517 du 1^{er} décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2022 et l'avenant n°3 au traité de concession pour faire évoluer la participation du concédant au regard de la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques.

Par délibération n°2024-483 du 26 septembre 2024, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2023.

Par délibération n°2025-160 du 4 avril 2025, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le dossier de modification de la ZAC et l'avenant n° 4 au traité de concession portant sur l'augmentation de la participation du concédant en lien avec la modification du dossier de réalisation de la ZAC.

Par délibération n°2025-489 du 26 septembre 2025, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le CRFA 2024 et l'avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie.

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement

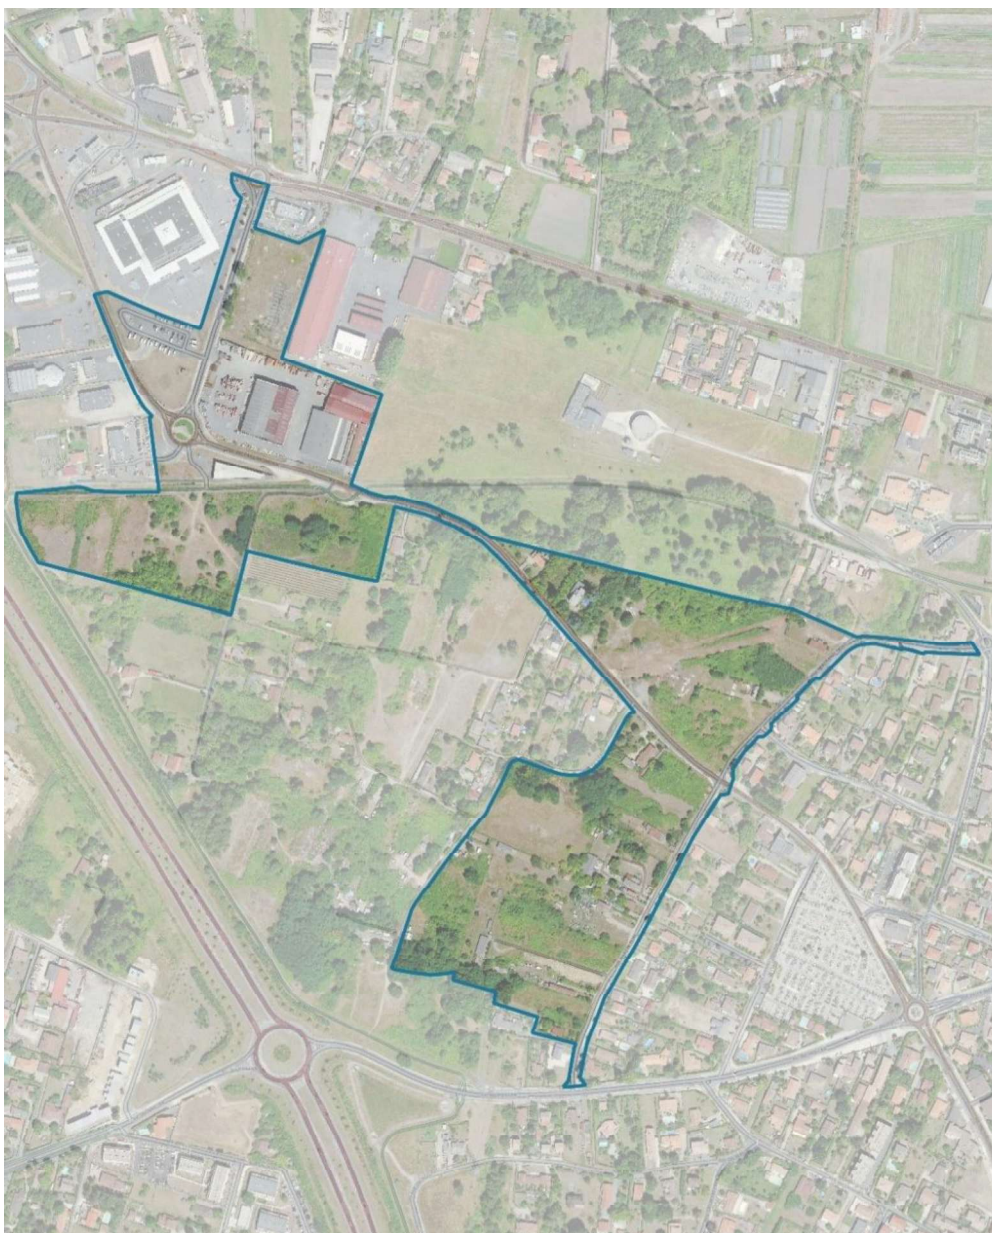

1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global initial des constructions fixait la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 52 000 m² environ pour les logements et 3 000 m² environ pour les commerces, services et activités. Dans le cadre de la modification du dossier de réalisation, il a connu une évolution avec une Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à environ 45 760 m² de SDP pour les logements soit environ 666 logements, 616 m² pour les commerces et 6 400 m² pour les équipements publics. Il convient de préciser que l'accès social n'est désormais proposée que sous la forme du BRS.

Concernant les prix de sortie pour le libre, il n'est pas demandé d'objectifs plafond. Les prix dépendent des prix du marché.

Concernant les typologies, la programmation prévoit une diversité de produits allant du T1 au T5.

La répartition initiale par typologie de logements était la suivante :

		m ² SDP	Nombre de logements
Logements en locatif social	30%	15 600	225
Logements en accession sociale ou abordable	35%	18 200	262
Logement libre	35%	18 200	263
Total	100%	52 000	750

Des locaux destinés à l'accueil des commerces ou de services étaient prévus en rez-de-chaussée dans le secteur de Cantinolle sur les îlots C1 (Esprit des Jalles), C2 (abandonné) et C3 (Médoc) pour une surface de 3 000 m².

Une nouvelle répartition a été définie dans le dossier de réalisation modifiée. Elle a connu un ajustement cette année. La programmation du CRFA 2025 est la suivante :

		m ² SDP	Nombre de logements
Logements en locatif social	31%	13 982	199
Logements en accession sociale (PSLA) (réalisés Les Longères de Carès)	4%	2 022	20
Logements en BRS	23 %	10575	164
Logements en abordable (réalisés L'Esprit des Jalles)	4%	1 910	24
Logement libre	38%	17 201	258
Total	100%	44 938	665

Des locaux destinés à l'accueil de commerces ou de services sont envisagés en rez-de-chaussée de l'îlot Médoc (ancien C3). Il est prévu une surface d'environ 500 m² visant en priorité l'installation d'un lieu de vie (brasserie, salon de thé ou toute autre activité permettant aux habitants de se retrouver). Une partie aussi de cette programmation pourra accueillir des activités en lien avec les besoins des habitants et des usagers du quartier.

1.5 Programme prévisionnel des espaces publics

L'aménagement de la ZAC nécessite la réalisation échelonnée dans le temps d'un programme des équipements publics composé principalement de voies et d'espaces publics. Il a aussi connu une évolution dans le cadre du dossier de modification de la ZAC.

Ce programme comprend deux types d'équipements publics :

- Ceux en infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur,
- Ceux en infrastructure ou en superstructure qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

a) Les équipements publics d'infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Les principes d'aménagement initiaux des espaces publics

Le site est marqué par une forte présence d'infrastructures. Les axes de transport, qu'ils soient hydrauliques ou associés à la mobilité, irriguent et ouvrent le territoire tout en le fragmentant.

Les axes routiers agissent comme une limite au nord et au sud de Carès Cantinolle. Assurant la connexion du site au grand territoire, ils imposent un statut d'entrée de ville fonctionnelle. Dédiées principalement à la voiture, ces routes laissent peu de place aux piétons et aux modes actifs.

Le site est également traversé par un aqueduc enterré, imposant des servitudes et limitant le franchissement souterrain.

Le tracé de l'ancienne voie ferrée a été réhabilité en piste cyclable, constituant un axe principal à l'échelle métropolitaine et est identifié dans le schéma Réseau Express Vélo (REVE).

Depuis 2020, le tramway traverse le site jusqu'à Cantinolle, faisant du site un terminus.

Le projet Carès Cantinolle ambitionne de transformer ces espaces purement fonctionnels en des espaces publics permettant de développer d'autres usages et fonctions (mobilités actives, jeux, espaces verts, lieux de promenade ...).

Un travail a donc été engagé prioritairement sur la requalification des voiries existantes : rue Martin Porc, rue Bertrand Triat et l'allée de l'Europe. Ce réaménagement est aujourd'hui terminé et a déjà permis d'apaiser les circulations, de végétaliser le site et de développer les modes actifs.




© P. Filiquet - rue Martin Porc



© Olivier Panier des Touches – allée de l'Europe

Dans la poursuite de cette volonté de rendre le site plus agréable à vivre, le Jardin de Cantinolle a été aménagé. Cet espace, ancien parking imperméabilisé, a été complètement paysagé et crée aujourd'hui un îlot vert dans le quartier. Dans le cadre de la poursuite du développement du site, il a vocation à devenir un lieu de centralité liant les différents secteurs sur Cantinolle.

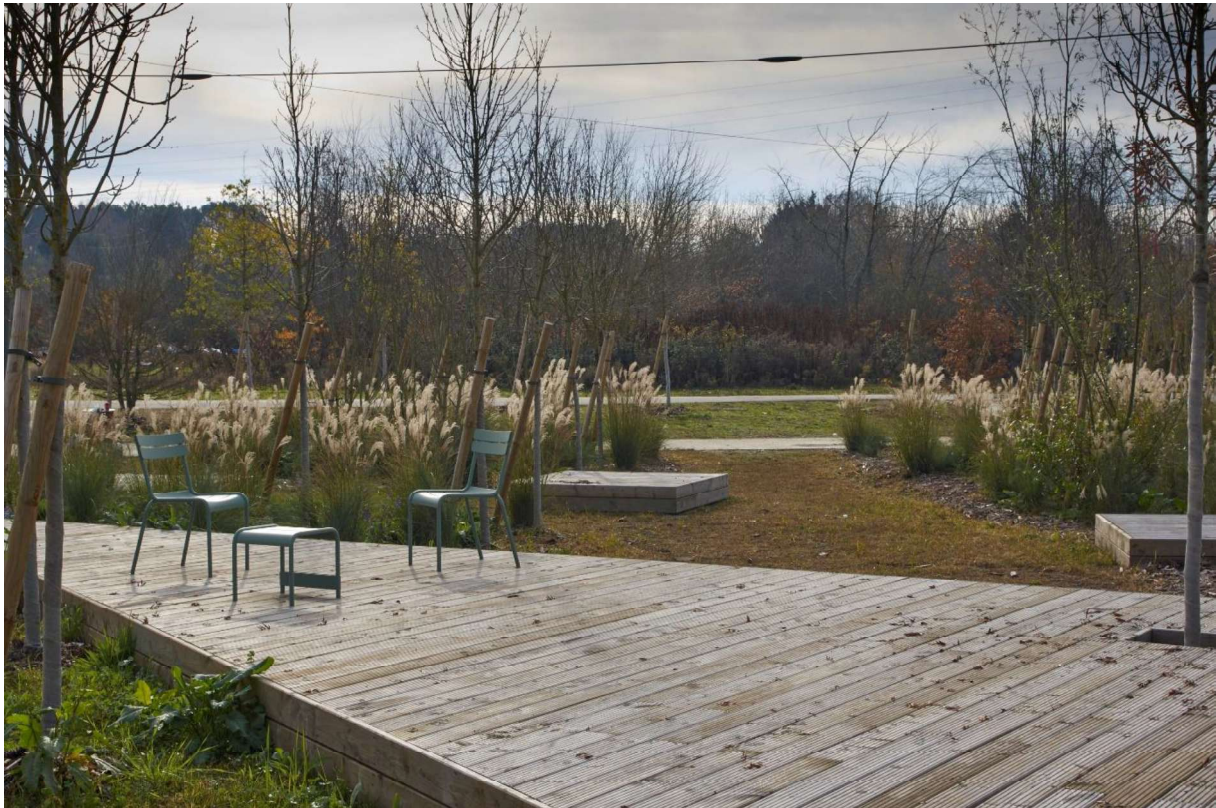

© P. Filiquet Jardin de Cantinolle

1.1.Des espaces publics nouveaux intégrés dans le cadre de la modification du dossier de réalisation


Dans le cadre de la modification, de nouveaux espaces publics ont été intégrés au Programme des Equipements Publics : une voie nouvelle, une frange urbaine et un corridor paysager en lien avec l’îlot les Lisières (ancien C4), deux traverses en lien avec l’Esprit des Jalles et l’îlot Médoc (ancien C3) et une venelle entre les Longères de Carès et le Jardin de Carès (ancien îlot C7).

Le tableau ci-après permet de récapituler les espaces publics prévus au Programme des Equipements Publics initial et ceux à venir intégrés dans le cadre de la modification.

Espaces Publics prévus au PEP		
	Statut	Phasage
Rue Martin Porc	Requalification	Réalisée
Rue Bertrand Triat	Requalification	Réalisée
Allée de l’Europe	Requalification	Réalisée
Jardin de Cantinolle	Création	Réalisée
Place de l’Europe	Création	2026
Nouveaux Espaces publics		
	Statut	Avancement
Voie Nouvelle	Création	2026
Frange Urbaine	Création	2026
Corridor Paysager	Création	2027

Traverse C1	Création	2026
Traverse C3	Création	2026
Venelle Jardin Nourricier	Création	2027

La carte ci-dessous illustre aussi les modifications.

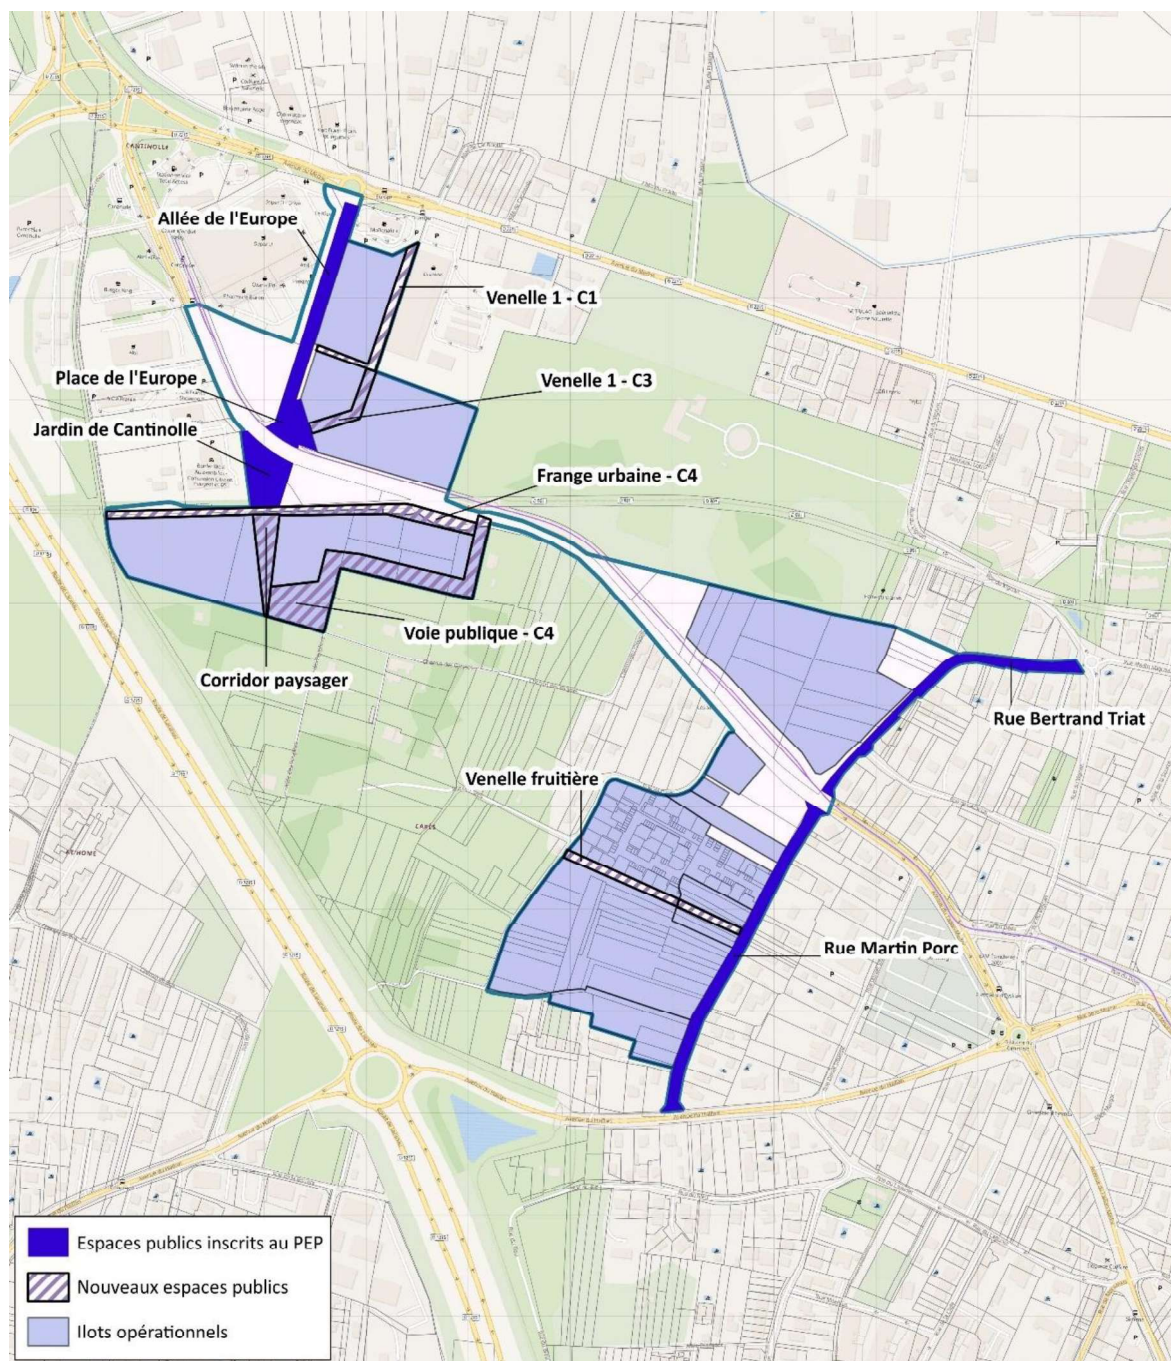

b) Les équipements publics d'infrastructures hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur :

Le Gymnase

La Ville assure la maîtrise d'ouvrage du futur gymnase. L'objectif est la réalisation d'une salle de sports polyvalente, homologuée pour les compétitions de hand-ball, soit un ensemble de 1 850 m² environ, hors Voirie Réseaux Divers (VRD) (dont parking), plantations et abords.

Ce gymnase se situera dans la ZAC Carès Cantinolle au sein de l'îlot Les Lisières (îlot C4).

En 2023, la Ville a lancé un concours pour désigner une équipe de concepteurs pour ce gymnase. Elle a choisi l'agence d'architecture Hessmafar et Véron. **La ville a déposé un PC au 1^{er} semestre 2025.**

Les équipements scolaires

Les besoins de création de classes estimés afin de répondre aux futurs besoins des habitants de la ZAC sont de **7 classes neuves**. La Ville d'Eysines a déjà construit 4 classes dans le cadre d'un groupe scolaire situé dans le centre-bourg. Les trois autres classes à venir seront construites dans un nouveau groupe scolaire qui sera implanté dans l'îlot Les Lisières (C4).

La ligne à haute tension

Le site est traversé par un réseau Très Haute Tension (THT). Les deux lignes concernées sont des lignes de 225 KV reliant Bruges à Eysines et 63 KV reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles.

La ligne 225 KV qui longe les rues Martin Porc et Bertrand Triat, de par sa puissance, ne sera pas enterrée. Si elle était enfouie, il serait nécessaire de mettre en place un système de refroidissement par huile qui serait techniquement compliqué au regard de la proximité avec la zone de captage et très impactant financièrement. Cette ligne a donc été intégrée comme un élément de contrainte avec lequel il faut faire le projet.

En revanche, la ligne reliant Bruges à Saint-Médard-en-Jalles, ligne 63 KV pouvait être enterrée avec moins de contraintes techniques et financières. Une convention tripartite entre Rte, la Ville d'Eysines et Bordeaux Métropole, a permis à Rte de mener une étude sur son enfouissement. Au regard des conclusions, il a été décidé de poursuivre les études opérationnelles.

En 2019, Rte, La Fab et la Ville d'Eysines ont signé une convention de travaux permettant de démarrer l'enfouissement jusqu'au pylône 12 et non 11 comme prévu initialement.

Depuis août 2021, la ligne aérienne a été déposée et la ligne souterraine a été mise en service.

Les cheminements doux au cœur de l'Espace Naturel de Carès

Au cœur du projet d'aménagement urbain du secteur Carès Cantinolle, l'espace naturel Carès est un lieu fédérateur, élément fondamental du projet jouant un rôle de lien entre les territoires de Carès et de Cantinolle, s'appuyant sur l'histoire du lieu et développant un véritable projet en mouvement.

Ce site fait donc l'objet d'un projet paysager spécifique qui est en dehors du bilan de la ZAC et porté par la Ville et Bordeaux Métropole.

La volonté est de redonner à cet espace sa vocation d'espace naturel. Il n'est pas prévu une maîtrise foncière totale du site. Le projet se développe autour de la réouverture des chemins ruraux sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole, de l'entretien et de l'animation des parcelles publiques et éventuellement privées par le biais de convention de gestion. Le projet ne fait pas l'objet d'un dessin figé d'où l'expression d'un « projet en mouvement ». Il se révélera progressivement au gré des opportunités.

Bordeaux Métropole (Pôle Territorial Ouest) a initié une phase d'études préliminaires sur ces chemins. En 2022, Bordeaux Métropole a réaménagé une partie du chemin des Gleyzes pour l'ouvrir aux modes actifs.

2. Actions menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

2.1 Procédures administratives

Bordeaux Métropole a approuvé en date du conseil du 4 avril 2025 le dossier de modification de la ZAC et l'avenant n°4 au Traité de Concession.

Les ordonnances d'expropriation ayant été publiées, La Fab a démarré, en lien avec le Pôle Territorial Ouest, la procédure de rétrocession des fonciers concernés par les espaces publics des rues Martin Porc et Triat et de l'allée de l'Europe.

La Fab a préparé un dossier de demande de dérogation espèces protégées dit CNPN et finalisé la recherche des fonciers de compensation.

2.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La maîtrise d'œuvre urbaine a rendu les études préliminaires et l'AVP pour les espaces publics de la ZAC.

Elle a poursuivi le travail d'accompagnement sur le gymnase avec un visa sur le PC, un accompagnement sur le PC de l'îlot Triat pendant la phase d'instruction, un accompagnement d'un PC dans l'îlot Des Sources (visa/suivi instruction) et la préparation du PC de l'îlot Le Jardin de Carès.

Elle a démarré aussi la préparation du PC sur l'îlot Médoc et accompagné en terme urbain le déplacement du Point P sur le foncier accueillant actuellement Dispano (qui est déplacé au Haillan).

Suite aux échanges avec le SDIS et les concessionnaires, elle a proposé une nouvelle faisabilité sur la partie logement de l'îlot Les Lisières.

La moeu a aussi démarré le dossier Loi sur l'Eau et mené un travail étroit avec Envolis pour la préparation du dossier CNPN.

La Fab a missionné un OPCIC chargé de planifier l'ensemble des actions en lien avec les travaux à venir.

b) Mise en œuvre du plan d'actions mobilité

Dans la poursuite de son accompagnement à l'échelle de tous ses projets sur les sujets mobilité/stationnement, La Fab avait engagé des actions en vue d'accompagner l'arrivée des habitants. Afin de mieux connaître le comportement des habitants depuis leur arrivée, La Fab a réalisé une enquête mobilité permettant d'évaluer les changements depuis l'arrivée des habitants et a aussi mené une enquête stationnement sur le site élargi.

c) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

Un nouveau marché médiation a été notifié auprès des prestataires suivants : Alga Médiation et Garluche.

d) Etudes environnementales

La Fab a missionné Envolis afin de mettre à jour les éléments du dossier dit « CNPN ».

e) Etudes techniques

Les études techniques se sont poursuivies dans le cadre de la mission des espaces publics :

- Missions du géomètre : piquetage, bornage et division parcellaire.
- La Fab a fait les démarches auprès d'Enedis et d'Orange pour déplacer les lignes aériennes présentes sur l'îlot des Lisières et pour déplacer le transformateur présent sur site.

2.3 Démarches foncières

Dans le cadre du dossier de réalisation initial, hormis la dernière emprise située sur l'îlot Médoc pour laquelle des négociations amiables sont engagées, La Fab a finalisé les dernières acquisitions, par voie amiable ou par voie d'expropriation, des fonciers privés nécessaires à la réalisation des espaces publics et des îlots sous maîtrise foncière de l'aménageur de la ZAC, y compris la maison d'habitation située sur l'îlot C7 renommé Le Jardin de Carès.

La Fab a également finalisé l'acquisition des fonciers métropolitains ainsi que les fonciers appartenant à la Ville d'Eysines situés dans l'îlot Le Jardin de Carès.

Suite au déclassement du chemin rural, la procédure s'est poursuivie avec le travail du géomètre de la ville pour procéder au bornage en vue de sa renumérotation cadastrale avant acquisition par La Fab.

Dans le cadre du dossier de modification de la ZAC, de nouveaux fonciers nécessaires à la réalisation de nouveaux îlots sur le secteur Carès ont été identifiés afin d'être acquis par La Fab.


Pour la réalisation du futur gymnase municipal sur l'îlot Les Lisières, La Fab a entamé le processus de cession des emprises correspondant à l'emprise du futur équipement (DMPC, bornage, rédaction de l'acte).

2.4 Gestion du patrimoine

Sur les terrains non bâtis, La Fab a procédé à des travaux d'entretien en particulier sur l'îlot Le Jardin de Carès (C7) en fonction des besoins et de l'état des sites.

Sauf interventions ponctuelles, le choix a été fait de laisser la végétation envahir l'îlot Les Lisières rendant ainsi le site difficilement accessible, afin d'éviter tout risque d'installation de caravanes.

La maison dans l'îlot Le Jardin de Carès est restée sous vidéosurveillance durant les différentes étapes préalables à sa démolition (permis de démolir, réalisation des diagnostics, consignation des réseaux) intervenue en août 2025.

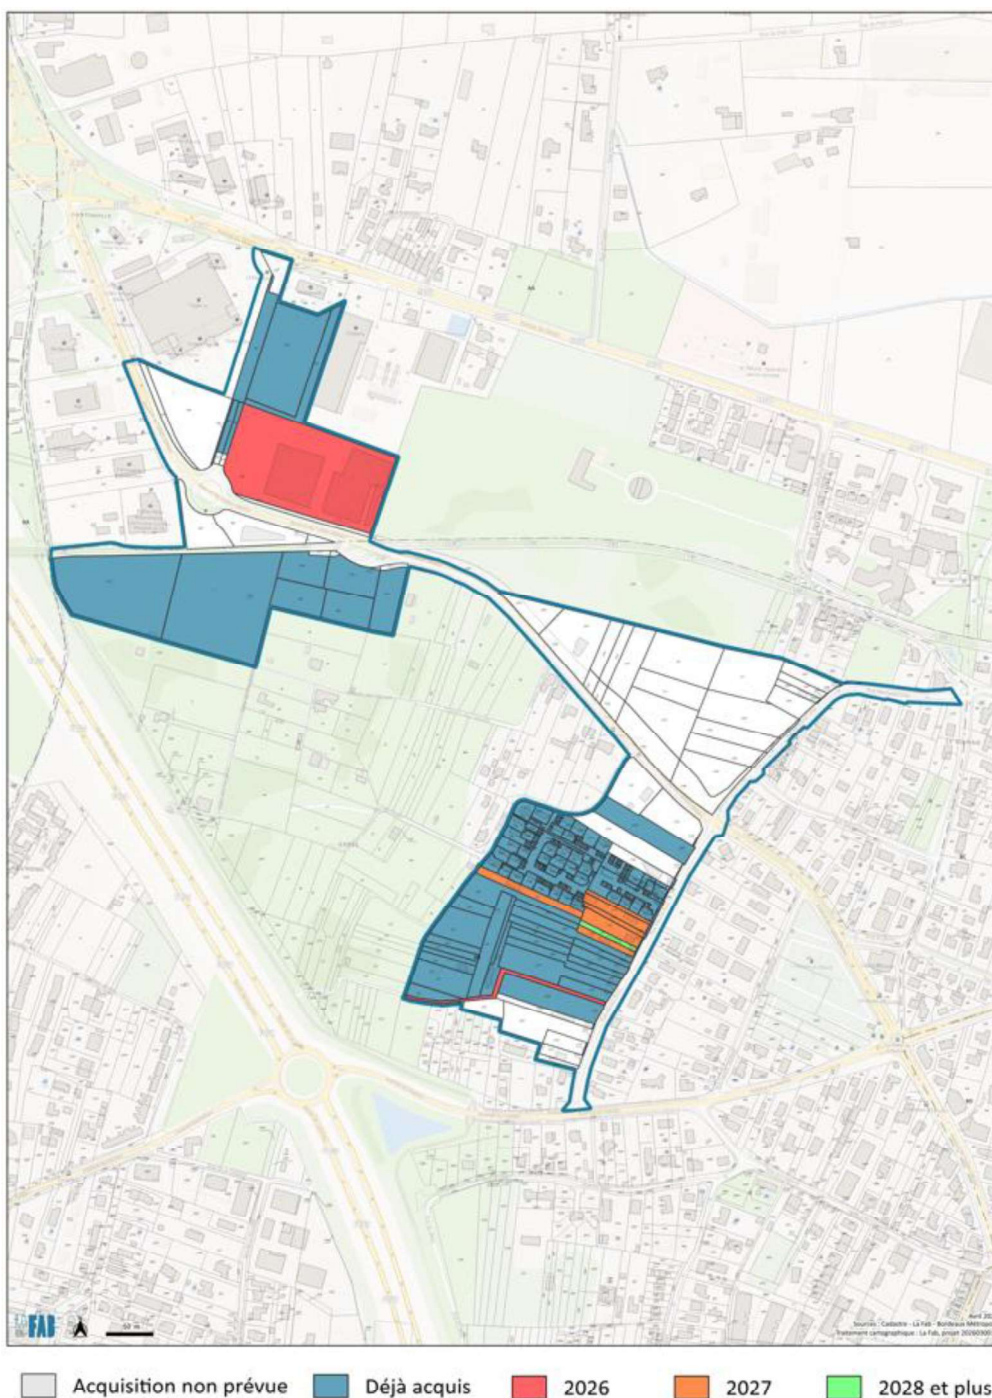

2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Il n'y a pas eu de travaux en 2025.

2.6 Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur


La Ville a déposé le PC pour le gymnase et a désigné des entreprises pour réaliser les travaux de construction.

Il n'y a pas eu d'actions sur l'Espace Naturel de Carès.

2.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Il n'y a pas eu de cessions de charges foncières en 2025.

2.8 Accompagnement des projets immobiliers

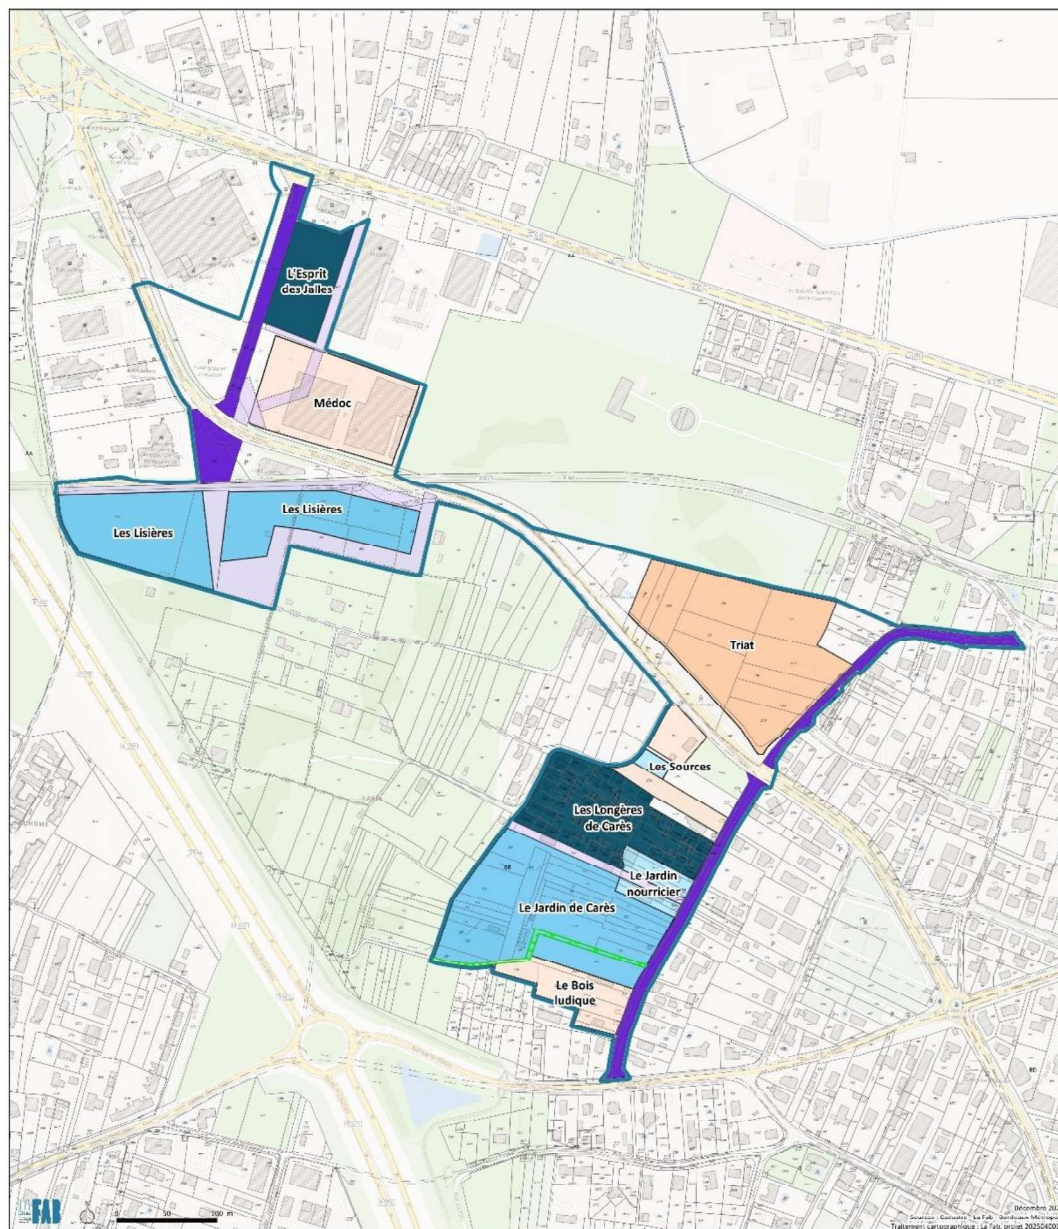

Ilots La Fab (cessions charges foncières)		Ilots opérateurs (acquisitions en direct)		ESPACE ET ÉQUIPEMENT PUBLICS		DÉCLASSEMENT	
	Ilots réalisés				Livré		Déclassement en cours
	Ilots en travaux				En cours de réalisation		
	Ilots en préparation				À réaliser		
	Ilots non engagés						

a) Îlot C1 dit îlot témoin Cantinolle « L'Esprit des Jalles »

Un travail a été engagé avec l'architecte du projet et le conseil syndical pour mettre en place des clôtures adaptées.

b) Îlot Médoc (C3)

Un travail a été engagé avec Saint-Gobain Immobilier et les opérateurs désignés (Vinci/Eiffage Immobilier) permettant de choisir des concepteurs pour cet îlot et de démarrer les ateliers de mise au point du PC. Cependant des questions techniques et de commercialisation vont se poser et mettre en pause le montage du PC.

Un travail a été aussi partagé avec Saint Gobain Immobilier pour la requalification du site du Dispano qui doit accueillir le Point P.

c) Îlot Les Lisières (C4)

Un travail d'atelier s'est poursuivi avec la Ville pour le projet du gymnase. La moe a émis un avis favorable au dépôt du PC.

Une nouvelle faisabilité a été proposée sur la partie logement afin de répondre aux enjeux du SDIS et aux retours des concessionnaires.

d) Îlot Triat (C5)

Des ateliers se sont poursuivis aboutissant à un avis favorable de la moe pour le dépôt du PC et à la délivrance du PC.

e) Îlot Le Jardin de Carès (C7)

Des échanges se sont déroulés entre La Fab et les maitres d'ouvrage de l'îlot afin de partager des pistes de sortie de cet îlot. Cet îlot est aujourd'hui bloqué pour des raisons économiques.

La DRAC a informé La Fab de la nécessité de mener sur une partie du site un diagnostic archéologique.

f) Îlot Les Sources

Un PC a été délivré pour un premier projet de maisons sur une partie de l'îlot (Les Sources A). Des ateliers ont été organisés avec un autre porteur de projet pour des logements en BRS (L'Abri Familial) et ont abouti à un avis favorable pour le dépôt d'un PC sur cet ilot (Les Sources C).

3. Actions à mener en 2026

3.1 Procédures administratives

L'arrêté ayant été pris par Bordeaux Métropole, La Fab poursuit la finalisation de la rétrocession des fonciers concernés par les espaces publics des rues Martin Porc et Triat et de l'allée de l'Europe avec le Pôle Territorial Ouest.

La Fab déposera auprès de la DREAL un dossier de demande de dérogation espèces protégées dit CNPN après avoir eu accord de Bordeaux Métropole pour compenser sur deux fonciers lui appartenant.

3.2 Etudes

a) Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de coordination

La Moeu rendra la phase PRO/DCE sur la partie Sud (voie nouvelle, corridor paysager, frange urbaine) pour les espaces publics de la ZAC et participera à la consultation des entreprises pour réaliser les travaux.

Elle finalisera le dossier loi sur l'eau.

Elle poursuivra le travail d'accompagnement sur le gymnase avec le suivi du DCE, un accompagnement sur le PC de l'îlot Triat pendant la phase d'échanges avec un promoteur désigné par Aquitanis et le DCE et la préparation du PC de l'îlot Le Jardin de Carès.

Elle continuera à accompagner aussi la préparation du PC sur l'îlot Médoc et le déplacement du Point P sur le foncier accueillant actuellement Dispano (qui est déplacé au Haillan).

Elle proposera une nouvelle faisabilité sur la partie du groupe scolaire de l'îlot Les Lisières et proposera une fiche de lot pour la partie logements.

L'OPCIC mènera les différentes missions de coordination en particulier les interfaces avec les concessionnaires et le gymnase.

b) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

Dans le cadre du nouveau marché, une stratégie de médiation sera proposée et des premières actions seront menées.

c) Etudes environnementales

La Fab engagera des échanges avec la DREAL concernant le dossier CNPN afin de permettre la délivrance d'un arrêté préfectoral en fin d'année.

d) Etudes techniques

Les études techniques se poursuivront dans le cadre de la mission des espaces publics :

- Le géomètre poursuivra ses missions de piquetage, bornage et division parcellaire.
- La Fab poursuivra les démarches auprès d'Enedis et d'Orange pour déplacer les lignes aériennes présentes sur le site des Lisières et pour déplacer le transformateur présent sur site.
- L'étude géotechnique sera réalisée par Ginger afin de caractériser les sols, notamment la profondeur de la nappe et le niveau du toit calcaire, en vue d'adapter les solutions techniques du projet.
- La Fab engagera une mission de rédaction d'un dossier sécurité tramway (OQA) pour accompagner la phase de préparation des travaux d'espaces publics

3.3 Démarches foncières

Dans l'îlot Le Jardin de Carès, reste à acquérir par La Fab l'emprise de l'ancien chemin rural auprès de la ville. L'acquisition aura lieu courant 2026 une fois le travail du géomètre et des services du cadastre accompli.

Suite aux difficultés des opérateurs à acquérir le foncier concerné par l'îlot Médoc, La Fab, après accord du COPRO aménagement de Bordeaux Métropole en date du 27 février 2026, conduira les négociations pour se porter acquéreur de l'intégralité de la parcelle, en lieu et place de l'emprise initiale correspondant uniquement à la réalisation des espaces publics de l'îlot.

La Fab mènera des négociations amiables auprès des propriétaires dont les fonciers ont été identifiés pour les nouveaux îlots et espaces publics sur le secteur Carès.

Concernant un de ces fonciers devant être acquis par l'aménageur, suite au dépôt d'une DIA en mars 2026, La Fab exercera le droit de préemption qui lui a été délégué dans le cadre du traité de concession.

3.4 Gestion du patrimoine

La Fab ne possédant que des fonciers non bâtis, elle poursuivra les travaux d'entretien en fonction des besoins et de l'état des sites.

En cas d'acquisition du foncier faisant l'objet de la procédure de préemption, celui-ci comportant une maison en état avancé de délabrement, elle sera mise sous vidéosurveillance en attendant d'être démolie.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Si l'arrêté CNPN est délivré au second semestre 2026, des travaux pourront démarrer en fin d'année 2026.

3.6 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Si l'arrêté CNPN est délivré au second semestre 2026, la Ville commencera les travaux du gymnase.

Il n'y aura pas d'actions sur l'Espace Naturel de Carès.

3.7 Commercialisation des terrains : cessions foncières

La Fab vendra à la mairie d'Eysines le foncier nécessaire pour la réalisation du gymnase.

3.8 Accompagnement des projets immobiliers

a) Îlot « Esprit des Jalles » (C1)

Un travail sera engagé avec les habitants sur les terrasses partagées.

b) Îlot Médoc (C3)

Sur cet îlot, deux options seront étudiées : recherche d'un preneur pour louer les locaux pendant 3 à 5 années et permettre à La Fab d'encaisser des loyers ou mise au point du PC si les opérateurs démontrent l'équilibre de leur bilan.

c) Îlot Les Lisières (C4)

Une nouvelle faisabilité sera validée sur le groupe scolaire et la fiche de lot pour les logements sera produite.

d) Îlot Triat (C5)

Des ateliers reprendront pour préparer le DCE et un éventuel PCM suite aux demandes de l'opérateur désigné par Aquitanis pour réaliser la partie privée des logements.

e) Îlot Jardin de Carès (C7)

Des échanges se poursuivront entre La Fab et les maîtres d'ouvrage de l'îlot afin de partager des pistes de sortie de cet îlot. Cet îlot est aujourd'hui bloqué pour des raisons économiques. Une piste sera proposée avec un phasage permettant de réaliser dans un premier temps les logements en LLS et BRS.

La Fab engagera la préparation d'un marché pour les fouilles demandées par la DRAC.

f) Îlot Des Sources

Le porteur de projet des Sources A commencera ses travaux et La Fab appellera les participations constructeurs.

L'Abri Familial mènera des investigations complémentaires afin de vérifier la faisabilité technique de son projet dans le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral des Sources de Cantinolle. Le PC sera délivré avant l'été 2026.

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2025

■ Les dépenses pour l'année 2025 correspondent à :

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Médiation
 - ✓ Etudes faune et flore
 - ✓ Etudes et accompagnement sur la mobilité
 - ✓ Etudes techniques

Le poste « études générales » représente 201 499 € TTC.

- Foncier :
 - ✓ Acquisition de fonciers
 - ✓ Frais liés aux acquisitions et aux indemnités
 - ✓ Frais liés à la gestion
 - ✓ Assistance juridique
 - ✓ Démolition

Le poste « foncier » représente 683 730 € TTC.

- Frais d'aménagement :
 - ✓ Entretien des espaces verts
 - ✓ Etudes
 - ✓ Maîtrise d'œuvre

Le poste « frais d'aménagement » représente 204 694 € TTC

- Participation équipements publics :
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension. Il s'élève à 75 000 € TTC.

Honoraires de concession :

- Rémunération forfaitaire annuelle d'un montant de 150 000 € TTC

Frais de communication :

- Pas de frais de communication

Frais divers :

- Ses frais représentent un montant de 372 € TTC

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 1 165 296 € TTC.

■ Les recettes pour l'année 2025 correspondent à :

- Charges foncières : pas de cession de Charges Foncières
- Participations constructeurs : 177 264 € TTC
- Participation métropolitaine à l'équilibre : 236 500 € TTC

- Participation communale : pas de participations communales
- Produits divers : pas de recettes

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 413 764 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2026

■ Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2026 correspondent à :

- Etudes générales :
 - ✓ Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
 - ✓ Etudes environnementales : suivi dossier CNPN
 - ✓ Etudes de programmation : mission OPCIC afin de préparer la coordination des travaux à venir
 - ✓ Etudes techniques : sondages et géomètre
 - ✓ Animation, concertation, médiation et communication : engagement d'un nouveau marché
- Foncier :
 - ✓ Frais en lien avec la procédure d'expropriation
 - ✓ Entretien des terrains
 - ✓ Acquisitions
- Participation aux équipements publics
 - ✓ Remboursement par la Ville des frais engagés par La Fab pour l'enfouissement de la ligne Haute Tension
- Travaux infrastructures et honoraires techniques
 - ✓ Maîtrise d'œuvre : PRO des ouvrages sur le secteur de Cantinolle
 - ✓ Travaux des concessionnaires : ENEDIS, Orange...
- Honoraires concession :
 - ✓ Rémunération forfaitaire
- Frais de communication : en lien avec la mission d'AMO animation, concertation, médiation et communication
- Frais divers

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 2 701 507 € TTC

■ Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2026 correspondent à :

- Charges foncières
- Participations constructeurs
- Participation métropolitaine au titre de la remise d'ouvrage
- Participation de la ville

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 3 340 514 € TTC

4.3 Imputation des charges du concessionnaire – Rémunération aménageur

L'article 19 du traité de concession stipule que « le concessionnaire est autorisé à imputer ses charges de fonctionnement en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations de charges sont destinées à couvrir le coût d'intervention du concessionnaire, et sont dites 'rémunérations' au sens de l'article L 1523-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). »

■ Point de vigilance

Le décalage opérationnel des ilots restant à accompagner et l'acquisition de l'ilot Médoc, nécessitent des frais d'ingénierie supplémentaires. Cela produit, dans le cadre du présent CRFA, un recalage des montants forfaitaires annuels tout en restant dans le montant global alloué. Au vu du contexte opérationnel actuel et à venir, il conviendra de prévoir une révision du montant global de la rémunération du concessionnaire.

4.4 Participation du concédant

Dans le cadre de l'avenant n°4 au traité de concession approuvé en avril 2025, la participation de Bordeaux Métropole a évolué.

L'échéancier est donc le suivant :

2018 :	2 200 000 € TTC	(versée en 2018)
2019 :	3 302 742 € TTC	(versée en 2019)
2020 :	3 095 598 € TTC	(versée en 2020)
2021 :	1 822 384 € TTC	(versée en 2021),
2025 :	236 500 € TTC	(versée en 2025),
2026 :	2 520 000 € TTC	
2027 :	2 128 344 € TTC	
2028 :	800 000 € TTC	
2029 :	800 000 € TTC	
2030 :	1 191 801 € TTC	

4.5 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2025, la trésorerie présente un solde négatif de 2 873 584 € et un solde positif prévisionnel de 1 765 424 € au 31 décembre 2026.

Conformément à la convention d'avance de trésorerie, le concédant a versé une avance de 1 734 000 € en 2016 dès la notification de la concession et 900 000 € en 2017. **L'avenant n°3 à la convention d'avance de trésorerie est proposé pour augmenter la mobilisation de l'avance d'un montant de 4 000 000 €.**

Conformément à l'article 15.6 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.6 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Les principales évolutions du bilan prévisionnel en dépenses sont les suivantes :

- Poste foncier : intégration de l'acquisition du foncier de l'ilot Médoc. **Il est précisé que les frais de raccordement de cet ilot n'ont pas été intégrés dans le bilan cette année et seront intégrés en 2026 quand les montants seront précisés.**
- Poste frais d'aménagement : intégration des coûts liés au devis des concessionnaires et au déplacement d'une armoire STL

Les principales évolutions du bilan prévisionnel en recettes sont les suivantes :

- Charges foncières : augmentation en lien avec l'intégration de l'ilot Médoc comme ilot aménageur
- Participations constructeurs : diminution en lien avec le passage de l'ilot Médoc d'un ilot constructeur à un ilot aménageur

Le bilan prévisionnel demeure à l'équilibre et n'a pas d'impact sur le montant de la participation du concédant.

- Point de vigilance

Il est à noter aussi que des fouilles sont prescrites par le Préfet sur l'ilot Jardin de Carès. A ce jour, le montant des fouilles n'étant pas connue, cette dépense n'a pas été inscrite dans le bilan.

Au vu du contexte opérationnel actuel et à venir, il conviendra de prévoir une révision du montant global de la rémunération du concessionnaire lors du prochain CRFA.

5. Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de la ZAC

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des clauses d'insertion




DEPENSES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération		1 988 724	393 071	2 381 795
Études architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers		885 000	177 000	1 062 000
Autres études		1 103 724	216 071	1 319 795
Frais d'acquisition et de libération des sols		16 647 519	1 254 478	17 901 997
Acquisitions foncières (dont aléas)		13 561 837	825 927	14 387 764
- détail acquisitions		0	0	0
* à Bordeaux Métropole		1 533 500	281 750	1 815 250
* à la commune		361 390	0	361 390
* à des propriétaires privés		11 666 947	544 177	12 211 124
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)		643 158	95 752	738 910
Libération des terrains		1 663 995	332 799	1 996 794
Indemnités d'éviction		778 529	0	778 529
Frais d'aménagement (*)		7 570 719	1 513 988	9 084 706
Maitrise d'œuvre		732 577	146 515	879 093
Travaux et aléas		6 059 100	1 211 820	7 270 920
Après travaux de raccordements (Enedis, Suez...)		779 041	155 652	934 694
Participation aux équipements publics		1 905 205	0	1 905 205
Équipements de cheminements, voirie		150 000	0	150 000
Équipements sportifs		1 050 000	0	1 050 000
Empiètement ligne à HT		637 967	0	637 967
Divers Enfouissement lignes aériennes		67 238	0	67 238
Frais honoraires concession		1 990 000	0	1 990 000
		1 990 000	0	1 990 000
Frais de communication		150 000	27 587	177 587
Frais divers		244 999	11 923	256 922
Frais financiers		75 000	0	75 000
Frais divers (Assurance, Taxes...)		169 999	11 923	181 922
Actualisation		110 000	22 000	132 000
TVA		0	758 649	758 649
TVA encaissée (-) / reversée (+)		0	758 649	758 649
TOTAL DES DEPENSES		30 607 166	3 981 695	34 588 861


Acquisition de l'opération par la commune
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de mise en œuvre : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Charges foncières		12 788 378	1 963 875	14 752 253
Libre	Bilan origine Prix unit m² SP	5 651 041	1 130 208	6 781 249
Accession abordable		623 235	124 647	747 882
Locatif social		2 398 518	272 771	2 671 289
Accession sociale		288 860	15 887	304 747
BRS		2 379 200	130 856	2 510 056
Commerces		130 000	26 000	156 000
Bureaux		0	0	0
Activités		1 317 525	263 505	1 581 030
Participation constructeurs		424 968	0	424 968
Libre	Bilan origine Prix unit m² SP	253 786	0	253 786
Accession abordable		0	0	0
Locatif social		142 236	0	142 236
Accession sociale		0	0	0
BRS		26 430	0	26 430
Commerces		0	0	0
Bureaux		0	0	0
Activités		2 516	0	2 516
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstruct)		0	0	0
Subventions		228 703	0	228 703
Participation métropolitaine au titre de :		16 249 537	1 847 832	18 097 369
Participation équilibre		7 010 375	0	7 010 375
Participation remise d'ouvrages		9 239 162	1 847 832	11 086 994
Participation complément prix		0	0	0
Participation communale		849 939	169 988	1 019 927
		849 939	169 988	1 019 927
Autres recettes		65 640	0	65 640
Produits divers		33 231	0	33 231
Produits financiers		32 409	0	32 409
TOTAL DES RECETTES		30 607 166	3 981 695	34 588 861

DEPENSES		(1) Bilan initial		(2) CRFA 2025		(2-1) variat*
		valeur	%	valeur	%	%
Etudes de définition et de suivi de l'opération						
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers		984 000	6%	2 381 795	7%	142%
Autres études		384 000	2%	1 319 795	4%	77%
						244%
Frais d'acquisition et de libération des sols						
Acquisitions foncières (dont allées)		5 891 025	36%	17 901 997	52%	204%
- détail acquisitions						190%
* à Bordeaux Métropole		0	0%	14 387 764	42%	0%
* à la commune		1 872 000	11%	1 815 250	5%	-3%
* à des propriétaires privés		18 300	0%	361 390	1%	1875%
Frais notariés 2% et frais de gestion des terrains)		3 074 626	19%	12 211 124	35%	297%
Libération des terrains		566 099	3%	738 910	2%	31%
Indemnités d'éviction		360 000	2%	1 998 794	6%	455%
			0%	778 529	2%	0%
			0%	0	0%	0%
Frais d'aménagement (*)						
Maîtrise d'œuvre		4 585 752	28%	9 084 706	26%	98%
Travaux et allées		518 952	3%	879 033	3%	69%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)		3 706 800	23%	7 270 920	21%	96%
		360 000	2%	934 694	3%	160%
Participation aux équipements publics						
Equipements de cheminements, voirie		1 700 000	10%	1 905 205	6%	12%
Equipements sportifs		150 000	1%	150 000	0%	0%
Aménagement ligne à HT		1 050 000	6%	1 050 000	3%	0%
Rejets Enfouissement lignes aériennes		500 000	3%	637 967	2%	28%
			0%	67 238	0%	0%
Opérations concession						
Opérations concession		1 460 000	9%	1 990 000	6%	36%
		1 460 000	9%	1 990 000	6%	-36%
Frais de communication						
Frais de communication		300 000	2%	177 587	1%	-41%
Frais divers						
Frais divers		778 125	5%	256 922	1%	-67%
Frais financiers		500 000	3%	75 000	0%	-85%
Frais divers (Assurance, Taxes...)		278 125	2%	181 922	1%	-35%
Actualisation						
Charges et honor. IND TP (POT : augmentation moyenne 2,75% par an) hors		580 709	4%	132 000	0%	-77%
		580 709	4%	132 000	0%	-77%
Reversés						
Reversés (à reverser (4))		113 309	1%	758 649	2%	570%
		113 309	1%	758 649	2%	570%
TOTAL DES DEPENSES						
		16 392 920	100%	34 588 861	100%	111%

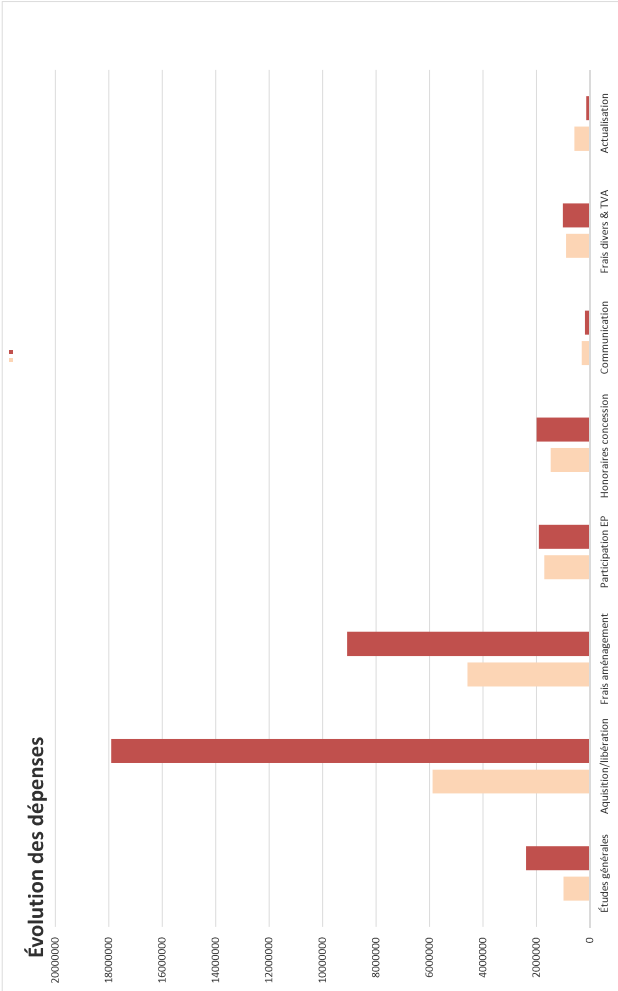

RECETTES		Bilan origine		CRFA 2025		
		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	
Charges foncières						
Libre		300	500	4 814 181	29%	206%
Accession abordable		200	200	1 965 600	12%	245%
Locatif social		180	200	1 276 800	8%	-41%
Accession sociale		200	200	1 335 000	8%	100%
BRS		200	200	238 715	1%	28%
Commerces		200	200	304 442	0%	15%
Bureaux		200	200	2 310 056	14%	0%
Activités		200	200	136 000	1%	0%
					0%	0%
					0%	0%
Participation constructeurs						
Libre		45	65	1 064 438	6%	-60%
Accession abordable		20	30	597 488	4%	-58%
Locatif social		20	30	199 900	1%	-100%
Accession sociale		20	30	192 050	1%	-26%
BRS		30	30	0	0%	0%
Commerces		30	30	0	0%	0%
Bureaux		25	30	75 000	0%	-100%
Activités				0	0%	0%
				2 516	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)						
Participation équipements d'intérêt général					0%	0%
					0%	0%
Subventions						
Subventions					0%	0%
					228 703	1%
Participation métropolitaine au titre de :						
Participation métropole				10 002 569	62%	77%
Participation remise d'ouvrages				3 982 074	24%	76%
Participation complément prix				6 220 495	38%	78%
					0%	0%
Participation communale						
Participation communale				311 733	2%	227%
				311 733	2%	227%
					1 019 927	6%
					227%	227%
Autres recettes						
Produits divers				0	0%	0%
Produits financiers					32 231	0%
					0%	0%
					32 409	0%
					0%	0%
					0%	0%
					0%	0%
TOTAL DES RECETTES						
				16 392 921	100%	111%


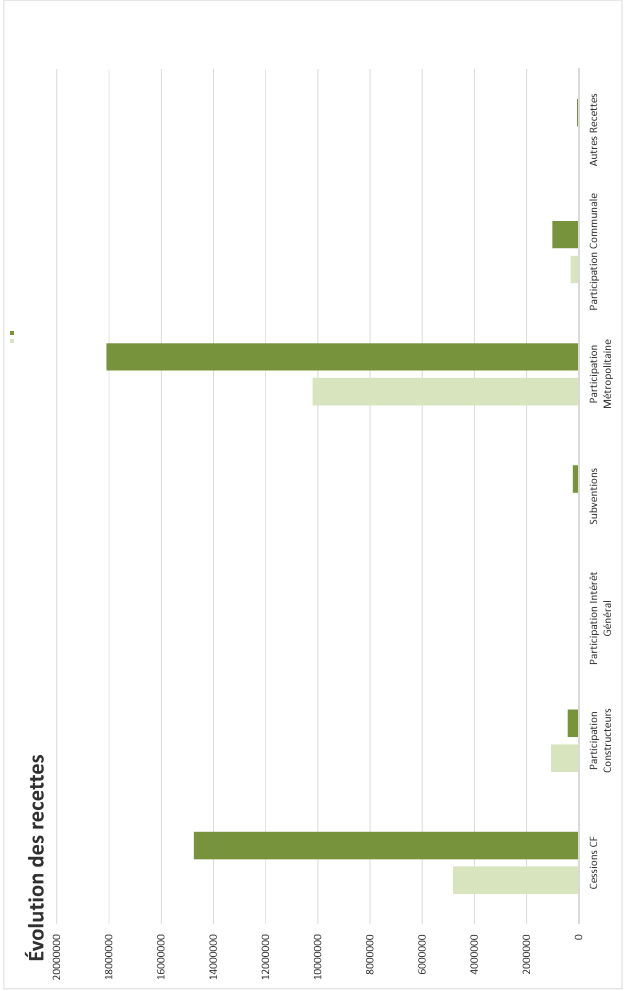


DEPENSES	CRFA 2025 valeur %	Etat d'avancement				
		Realisé à fin 2025		Reste à réaliser		
		valeur	%	valeur	%	
Etudes de définition et de suivi de l'opération	2 381 795	7%	1 314 772	55%	1 067 023	45%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	1 062 000	3%	689 826	65%	372 174	35%
Autres études	1 319 795	4%	624 947	47%	694 848	53%
Frais d'acquisition et de libération des sols	17 901 997	52%	11 796 275	66%	6 105 721	34%
Acquisitions foncières (dont allées)	14 387 764	42%	10 220 484	71%	4 167 280	29%
- détail acquisitions						
* à Bordeaux Métropole	1 815 250	5%	1 815 250	100%	0	0%
* à la commune	361 390	1%	0	0%	361 390	100%
* à des propriétaires privés	12 211 124	35%	8 405 234	69%	3 805 890	31%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	738 910	2%	466 266	63%	272 644	37%
Libération des terrains	1 996 794	6%	454 152	23%	1 542 642	77%
Indemnités d'éviction	778 529	2%	655 374	84%	123 155	16%
Frais d'aménagement (*)	9 084 706	26%	4 474 824	49%	4 609 882	51%
Maîtrise d'œuvre	879 093	3%	508 354	58%	370 739	42%
Travaux et allées	7 270 920	21%	3 740 977	51%	3 529 944	49%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)	934 694	3%	225 494	24%	709 200	76%

Participation aux équipements publics	1 905 205	6%	1 080 205	57%	150 000	8%
Equipements de cheminements, voirie	150 000	0%	0	0%	150 000	100%
Equipements sportifs	1 030 000		1 019 957			
Equipement ligne à HT	637 367		67 238	100%	0	0%
Autres Equipement lignes aériennes	67 238	0%				
Honoraires concession	1 990 000	6%	1 321 033	66%	668 967	34%
Honoraires concession	1 990 000	6%	1 321 033	66%	668 967	34%
Frais de communication	177 587	1%	33 537	19%	144 050	81%
Frais divers	256 922	1%	22 257	9%	234 665	91%
Frais financiers	75 000	0%	0	0%	75 000	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	181 922	1%	22 257	12%	159 665	88%
Actualisation	132 000	0%	0	0%	132 000	100%
Actualisation		0%		0%		0%
TVA	758 649	2%	1 079 620	142%	-320 971	-42%
TVA encaissée () / reversée (+)	758 649	2%	1 079 620	142%	-320 971	-42%
POTAT DES DEPENSES	34 588 861	100%	21 122 523	61%	12 791 338	37%

RECETTES	Bilan origine Prix unit m² SP	CRFA 2025 Prix unit m² SP				
			14 752 253	43%	4 481 230	30%
Charges foncières						
Libre	300	500	6 781 249	20%	1 759 285	26%
Accession abordable	200	200	747 882	100%	0	0%
Locatif social	180	220	2 671 289	8%	1 624 286	61%
Accession sociale	200	220	304 747	100%	0	0%
BRS	0	220	2 510 056	7%	0	0%
Commerces	150	200	156 000	0%	0	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%
Activités	150	200	1 581 030	5%	45 030	3%
Participation constructeurs						
Libre	45	65	424 968	1%	179 780	42%
Accession abordable	20	30	253 786	1%	116 985	46%
Locatif social	20	30	142 236	0%	0	0%
Accession sociale	20	30	0	0%	0	0%
BRS	30	30	26 430	0%	0	0%
Commerces	25	30	0	0%	0	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%
Activités	25	30	2 516	0%	2 516	100%
Participation équipements d'intérêt général						
Subventions						
Participation métropolitaine au titre de :						
Participation équilibre						
Participation remise d'ouvrages						
Participation complément prix						
Participation communale						
Autres recettes						
Produits divers						
Produits financiers						
TOTAL DES RECETTES			34 588 861	100%	15 614 939	45%

033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

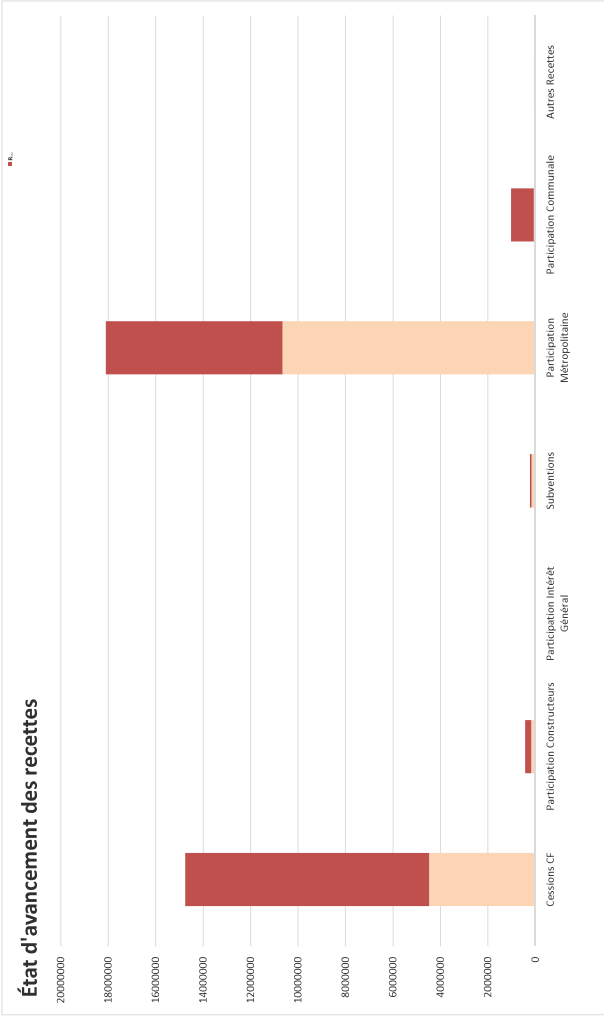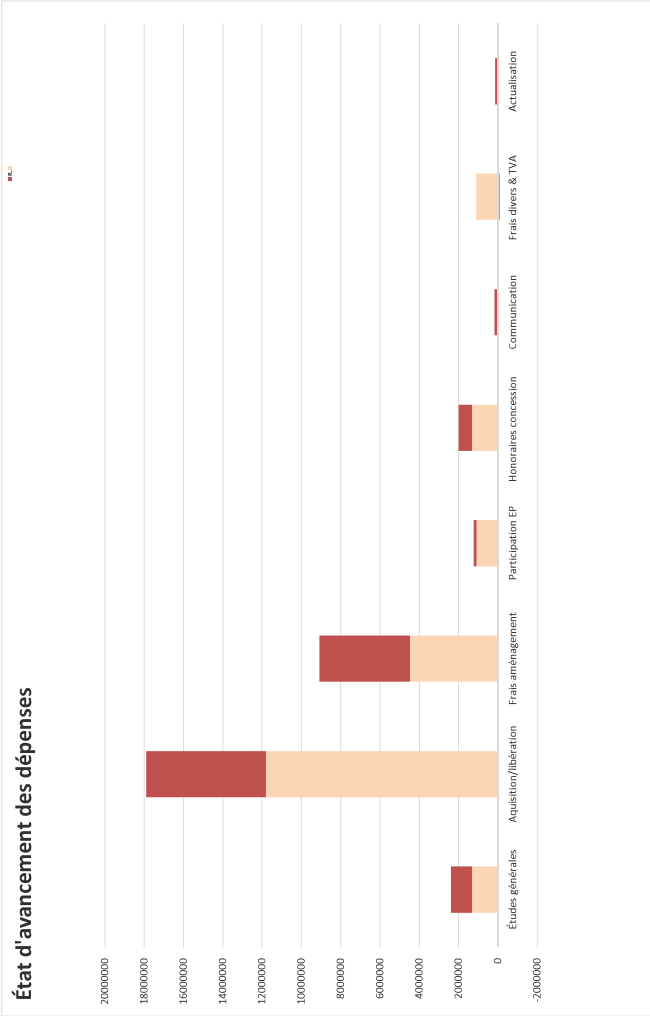



ZAC Eysines Carès Cantinolle - CRFA 2025
Annexe 3 - Tableau des acquisitions et cessions

AUCUNE ACQUISITION EN 2025

Ilots/EP	Parcelles	Surfaces terrains m²	Vendeur(s) (Propriétaire(s)/Occupant)	Date acte/jugement	Prix € HT (hors emploi)	TVA	Emploi	Indemnités diverses	Total

AUCUNE CESSION EN 2025

Ilots	Parcelles	Surfaces terrains	Acquéreur	Programme	m² SDP	Date acte	Prix HT

Description du programme de construction (en m² SP et %)


Nature du programme	Programme dossier modification		Prévisions actualisées		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	14 352	31%	13 982	30,6%	-3%
PLAI	5 741	13%	5 593	12,2%	-3%
PLUS	8 611	19%	8 389	18,4%	-3%
PLS	-				
Accession sociale	2 022	4%	2 022	4,4%	0%
Accession abordable	1 983	4%	1 910	4,2%	-4%
BRS	10 665	23%	10 575	23,1%	-1%
Accession libre	16 738	37%	17 201	37,6%	3%
Sous total logements	45 760		45 690	86%	0%

Logements	45 760	86%	45 690	86%	0%
Commerces, activités et équipements	7 166	14%	7 165	14%	0%
Total	52 926		52 855		0%


Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programme dossier modification		Programme actualisée		Variation %
		%		%	
Locatif social	198	35%	199	30%	1%
PLAI	79	10%	60	9%	-24%
PLUS	119	18%	139	21%	17%
PLS	-				
Accession sociale	20	10%	20	3%	0%
Accession abordable	24	9%	24	4%	0%
BRS	165	46%	164	25%	-1%
Accession libre	259		258	39%	0%
Sous total logements	666		665		0%

Programme de construction actualisé en m² SP

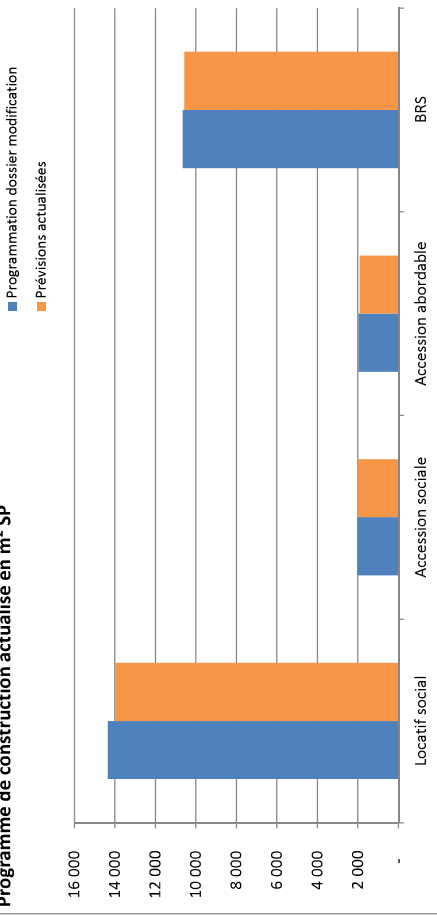

Programme de construction actualisé en nbre de logements

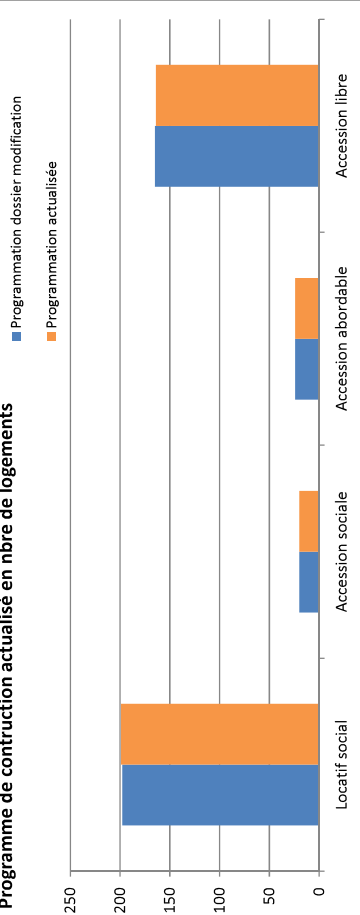


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % *

Nature du programme	Programme actualisé 2025		Etat d'avancement		Reste à réaliser	
	m² SP	%	Réalisé	%	m² SP	%
Locatif social	13 982	35%	8 756	63%	5 226	37%
PLAI	5 593	10%	3 502		2 090	
PLUS	8 389	25%	5 254		3 136	
PLS	0	-			0	
Accession sociale	2 022	9%	2 022	100%	0	0%
Accession abordable	1 910	7%	1 910	100%	0	0%
BRS	10 575	48%	0	0%	10 575	100%
Accession libre	17 201		8 470	49%	8 731	51%
Sous total logements	45 690		21 158	46%	24 532	54%
Commerces, activités et équipements	7 695		115	1%	7 580	99%
Total	53 385		21 273	40%	32 112	60%


* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

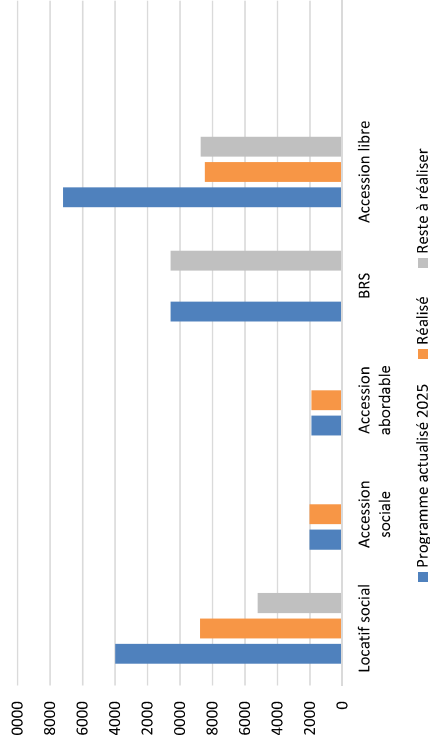

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

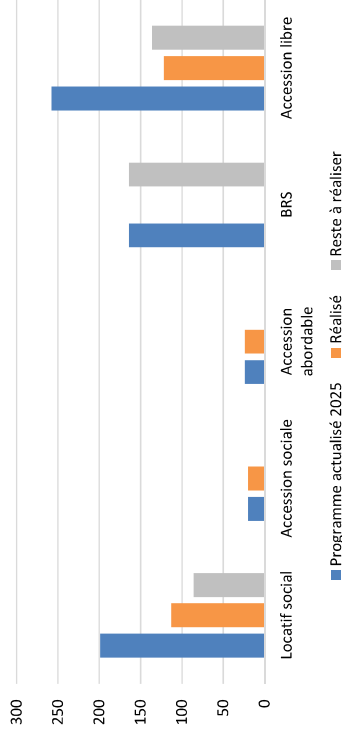

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs



Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2025	Echelonnement prévisionnel														
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Locatif social PLAI (30%) PLUS (70%) PLS Accession sociale Accession abordable BRS Accession libre Sous total logements	14 352	13 982	2070	0	2977	0	0	0	0	0	0	0	1266	1920	0	1325	715
	5 741	5 593	621	-	893	-	-	-	-	1 113	-	380	576	-	398	215	
	8 611	8 389	1 449	-	2 084	-	-	-	-	2 596	-	886	1 344	-	928	501	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 022	2 022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 983	1 910	0	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 665	10 575	0	0	0	0	0	0	0	0	715	2860	2400	0	3345	1255	
	16 738	17 201	0	0	4493	0	0	0	39	0	3938	298	3153	5280	0	0	
	29 022	45 690	4 092	0	9 380	0	0	0	39	0	7 647	1 013	7 279	9 600	0	4 670	1 970
	Commerces, activités et équipements	7 730	7 165	0	0	115	0	0	0	0	0	2 286	0	650	0	0	4 114
Total	36 752	52 855	4 092	0	9 495	0	0	0	39	0	7 647	3 299	7 279	10 250	0	4 670	6 084

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Programmation Initiale	Programmation actualisée 2025	Echelonnement prévisionnel															
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Locatif social	198	199	20	0	41	0	0	0	0	0	0	52	0	22	32	0	21	11
	79	60	6	-	12	-	-	-	-	-	16	-	7	10	-	6	3	
	119	139	14	-	29	-	-	-	-	-	36	-	15	22	-	15	8	
	-	0																
	PLS																	
Accession sociale	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accession abordable	24	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS	165	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	42	40	0	51	20
Accession libre	259	258	0	0	68	0	0	0	0	0	1	0	3	45	88	0	0	0
Sous total logements	666	665	40	0	133	0	0	0	0	0	1	0	14	109	160	0	72	31

* Cession des charges foncières et perception des participations constructeurs



DEPENSES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération		1 988 724	393 071	2 381 795
Études architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers		885 000	177 000	1 062 000
Autres études		1 103 724	216 071	1 319 795
Frais d'acquisition et de libération des sols		16 647 519	1 254 478	17 901 997
Acquisitions foncières (dont aléas)		13 561 837	825 927	14 387 764
- détail acquisitions		0	0	0
* à Bordeaux Métropole		1 533 500	281 750	1 815 250
* à la commune		361 390	0	361 390
* à des propriétaires privés		11 666 947	544 177	12 211 124
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)		643 158	95 752	738 910
Libération des terrains		1 663 995	332 799	1 996 794
Indemnités d'éviction		778 529	0	778 529
Frais d'aménagement (*)		7 570 719	1 513 988	9 084 706
Maitrise d'œuvre		732 577	146 515	879 093
Travaux et aléas		6 059 100	1 211 820	7 270 920
Après travaux de raccordements (Enedis, Suez...)		779 041	155 652	934 694
Participation aux équipements publics		1 905 205	0	1 905 205
Équipements de cheminements, voirie		150 000	0	150 000
Équipements sportifs		1 050 000	0	1 050 000
Empiètement ligne à HT		637 967	0	637 967
Divers Enfouissement lignes aériennes		67 238	0	67 238
Frais honoraires concession		1 990 000	0	1 990 000
		1 990 000	0	1 990 000
Frais de communication		150 000	27 587	177 587
Frais divers		244 999	11 923	256 922
Frais financiers		75 000	0	75 000
Frais divers (Assurance, Taxes...)		169 999	11 923	181 922
Actualisation		110 000	22 000	132 000
TVA		0	758 649	758 649
TVA encaissée (-) / reversée (+)		0	758 649	758 649
TOTAL DES DEPENSES		30 607 166	3 981 695	34 588 861

Acquisition de la parcelle n° 035-243300310-20260925-Imc1119369-DF-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de mise en œuvre : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Charges foncières		12 788 378	1 963 875	14 752 253
Libre	Bilan origine Prix unit m² SP	5 651 041	1 130 208	6 781 249
Accession abordable		623 235	124 647	747 882
Locatif social		2 398 518	272 771	2 671 289
Accession sociale		288 860	15 887	304 747
BRS		2 379 200	130 856	2 510 056
Commerces		130 000	26 000	156 000
Bureaux		0	0	0
Activités		1 317 525	263 505	1 581 030
Participation constructeurs		424 968	0	424 968
Libre	Bilan origine Prix unit m² SP	253 786	0	253 786
Accession abordable		0	0	0
Locatif social		142 236	0	142 236
Accession sociale		0	0	0
BRS		26 430	0	26 430
Commerces		0	0	0
Bureaux		0	0	0
Activités		2 516	0	2 516
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstruct)		0	0	0
Subventions		228 703	0	228 703
Participation métropolitaine au titre de :		16 249 537	1 847 832	18 097 369
Participation équilibre		7 010 375	0	7 010 375
Participation remise d'ouvrages		9 239 162	1 847 832	11 086 994
Participation complément prix		0	0	0
Participation communale		849 939	169 988	1 019 927
		849 939	169 988	1 019 927
Autres recettes		65 640	0	65 640
Produits divers		33 231	0	33 231
Produits financiers		32 409	0	32 409
TOTAL DES RECETTES		30 607 166	3 981 695	34 588 861

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
1 DEPENSES			18 877 607,65	1 165 295,60	20 042 903,25
A ETUDES GENERALES			1 113 272,80	201 499,41	1 314 772,21
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			591 416,33	98 409,36	689 825,69
23-06442 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - TECTONE			6 237,00		6 237,00
018702 SOLDE	13/09/2023	FA 1581.2309.215.D3	6 237,00		6 237,00
23-06443 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur Sporting Habitat - 2 PM ARCHITECTURES			12 000,00		12 000,00
018484 SOLDE	09/08/2023	FA F23_098	12 000,00		12 000,00
23-06444 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - MOONWALKLOCAL			3 963,00		3 963,00
018973 SOLDE	09/10/2023	FA NH23_094	3 963,00		3 963,00
24-06826 Ilot C7 Indemnisation Concepteur / opérateur CDC Habitat - CHAMP LIBRE			1 800,00		1 800,00
019727 INDEM ILOT C7 CDC HABITAT	01/01/2024	FA F-2023-12-206	1 800,00		1 800,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - BIOTOPE			9 004,32		9 004,32
003756 AC 1	20/10/2016	FA 201602778	1 776,00		1 776,00
004526 AC 2	31/03/2017	FA 201700649	7 104,00		7 104,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	124,32		124,32
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - ICI LA (D')			42 059,76		42 059,76
003753 AC 1	20/10/2016	FA 910-OP144-1-2016	8 304,00		8 304,00
004027 AC 2	12/12/2016	FA 941-OP144-3-2016	20 760,00		20 760,00
004522 AC 3	28/02/2017	FA 988-OP144-1-2017	12 456,00		12 456,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	539,76		539,76
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - NADAU ARCHITECTURE			24 312,00		24 312,00
003754 AC 1	20/10/2016	FA 2016-10-32	4 800,00		4 800,00
004028 AC 2	12/12/2016	FA 2016-12-054	12 000,00		12 000,00
004523 AC 3	16/03/2017	FA 2017-03-087	7 200,00		7 200,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	312,00		312,00
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - PERIOLE GERAUD			4 376,16		4 376,16
003759 AC 1	18/10/2016	FA 16/2016	864,00		864,00
004029 AC 2	12/12/2016	FA 23/2016	2 160,00		2 160,00
004524 AC 3	24/02/2017	FA 05/2017	1 296,00		1 296,00
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	56,16		56,16
M2016-005/MS01 Consolidation du plan guide - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			22 624,13		22 624,13
003755 AC 1	20/10/2016	FA F16MAT956	4 466,76		4 466,76
004030 AC 2	31/12/2016	FA F16MAT1247	11 166,90		11 166,90
004525 AC 3	14/02/2017	FA F17MAT099	6 700,14		6 700,14
005281 REGUL REV MS1	16/10/2017	FA 10/2017	290,33		290,33
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - ICI LA (D')			4 835,15		4 835,15
003824 AC 1	08/11/2016	FA 924-OP144-2-2016	2 160,00		2 160,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	23,76		23,76
008073 AC2	15/05/2019	FA 19094-EYSINES-MOE	2 002,56		2 002,56
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	648,83		648,83
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - NADAU			2 972,34		2 972,34
003825 AC 1	04/11/2016	FA 2016-11-037	2 940,00		2 940,00
005299 REGUL REV MS3/AC1	16/10/2017	FA 10/2017	32,34		32,34
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - SAFEGE-			2 635,20		2 635,20
014170 AC1	01/01/2022	FA F21MAT1312	2 635,20		2 635,20
M2016-005/MS03 Coordination des opérations engagées dans le périmètre de la ZAC - VAZISTAS			5 302,78		5 302,78
008073 AC2	15/05/2019	NH 324/UZE 2019	4 005,12		4 005,12
009848 AC3	21/02/2020	FA 20036	1 297,66		1 297,66
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			9 711,98		9 711,98
005072 AC 1	31/07/2017	FA 201702057	4 722,00		4 722,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	70,82		70,82
006054 AC2	31/03/2018	FA 201800820	2 420,03		2 420,03
006206 AC3	07/05/2018	FA 201801240	1 215,92		1 215,92
006871 AC 4	19/10/2018	FA 2018803067	775,83		775,83
009860 AC5	14/02/2020	FA 202000323	507,38		507,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn - ICI			35 361,27		35 361,27
005069 AC 1	28/08/2017	FA 1059-EYSINES-URBA-5-2017	17 220,00		17 220,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	258,30		258,30
006053 AC2	05/04/2018	FA 18050-EYSINES-MOE	8 859,69		8 859,69
006205 AC3	30/04/2018	FA 16_28 EYSINES	4 434,14		4 434,14
006870 AC4	18/10/2018	FA 18175	2 738,86		2 738,86
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	1 850,28		1 850,28
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			10 566,84		10 566,84
005070 AC 1	27/07/2017	FA 2017-07-003	10 380,00		10 380,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	155,70		155,70
005725 REV DEF	25/01/2018	FA-201-007-003	31,14		31,14
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			3 697,65		3 697,65
005073 AC 1	28/07/2017	FA 20/2017	1 800,00		1 800,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	27,00		27,00
006140 AC 2	04/04/2018	FA 13/2018	926,10		926,10
006208 AC3	02/05/2018	FA 20/2018	463,50		463,50
006873 AC 4	19/10/2018	FA 48/2018	287,64		287,64
009862 AC5	10/02/2020	FA 06/2020	193,41		193,41
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			9 910,49		9 910,49

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
005071 AC 1	31/08/2017	FA F17MAT707	4 815,00		4 815,00
005300 REGUL REV MS4	16/10/2017	FA 10/2017	72,23		72,23
006055 AC 2	04/04/2018	FA F18MAT284	2 496,58		2 496,58
006207 AC3	04/05/2018	FA F18MAT383	1 239,87		1 239,87
006872 AC 4	31/10/2018	FAF18MAT925	769,43		769,43
009861 AC5	07/02/2020	FA F20MAT119	517,38		517,38
M2016-005/MS04 Elaboration cahiers prescriptions archi urbaines paysagères et environn -			10 771,85		10 771,85
006057 AC 1	05/04/2018	NH 254 / UZE 2018	5 190,00		5 190,00
006209 AC2	24/04/2018	FA 259/UZE 2018	2 823,35		2 823,35
006874 AC 3	11/10/2018	NH 279/UZE 2018	2 191,75		2 191,75
009847 AC5	21/02/2020	FA 20035	566,75		566,75
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - ICI LA (D')			3 288,60		3 288,60
004824 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-EYSINES-4-2017	3 240,00		3 240,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	48,60		48,60
M2016-005/MS05 Participation aux réunions de communication et de concertation - NADAU			548,10		548,10
004822 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-113	540,00		540,00
005301 REGUL REV MS5	16/10/2017	FA 10/2017	8,10		8,10
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - ICI LA (D')			4 872,00		4 872,00
004832 SOLDE	28/06/2017	FA 1035-EYSINES-4-2017	4 800,00		4 800,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	72,00		72,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - NADAU			9 744,00		9 744,00
004823 SOLDE	26/06/2017	FA 2017-06-114	9 600,00		9 600,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	144,00		144,00
M2016-005/MS06 Elaboration fiches de lot / mission suivi cohérence urbaine Ilot C1 - SAFEGE-			2 436,00		2 436,00
004821 SOLDE	30/06/2017	FA F17MAT597	2 400,00		2 400,00
005303 REGUL REV MS6	16/10/2017	FA 10/2017	36,00		36,00
M2016-005/MS07 Mission de suivi de cohérence urbaine - BIOTOPE			4 707,00		4 707,00
006173 AC 1	27/03/2018	FA 201800680	2 353,50		2 353,50
007206 AC2	10/12/2018	F 201804041	2 353,50		2 353,50
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MO/MOE			977,28		977,28
005827 AC1	14/02/2018	FA 18020-EYSINES-MOE	960,00		960,00
006790 REGUL REV MS08	06/12/2018	FA 06/12/2018	17,28		17,28
M2016-005/MS08 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges accompagnement MO/MOE			2 280,00		2 280,00
005700 SOLDE MS8	12/01/2018	FA 2018-01-048	2 280,00		2 280,00
M2016-005/MS09 Démarche de suivi de chantier - Ilot C5 - BIOTOPE			2 130,00		2 130,00
006172 AC1	27/03/2018	FA 201800679	2 130,00		2 130,00
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - ICI LA (D')			1 000,21		1 000,21
006066 AC 1	10/04/2018	FA 18051-EYSINES-MOE	384,00		384,00
006391 AC2	10/07/2018	FA 18110-EYSINES-MOE	576,00		576,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021389 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD	22,93		22,93
M2016-005/MS11 Assistance à La Fab, BM et Ville dans échanges - VAZISTAS			2 375,50		2 375,50
006067 AC 1	09/04/2018	NH 255 / UZE 2018	912,00		912,00
006392 AC2	05/07/2018	NH 266 / UZE 2018	1 368,00		1 368,00
007096 REGUL REV MS11	03/12/2018	FA 03/12/18	41,04		41,04
021389 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD	54,46		54,46
M2016-005/MS12 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			994,87		994,87
006159 FACT	30/04/2018	FA 18064-EYSINES-MOE	960,00		960,00
007095 REGUL REV MS12	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021390 REVISIONS DEFINITIVES	01/07/2024	DGD	17,59		17,59
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des ilots C3-C4-C7 - ICI LA (D')			7 609,46		7 609,46
006358 AC1	26/06/2018	FA 16_28 EYSINES	5 827,20		5 827,20
006851 AC2	18/10/2018	FA 18174	1 092,60		1 092,60
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	364,20		364,20
021400 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	325,46		325,46
M2016-005/MS13 Mission de morphologie des ilots C3-C4-C7 - VAZISTAS			6 268,09		6 268,09
006359 AC1	26/06/2018	NH 264/ UZE 2018	4 800,00		4 800,00
006852 AC2	11/10/2018	FA 280 / UZE 2018	900,00		900,00
009849 AC3	21/02/2020	FA 20037	300,00		300,00
021400 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	268,09		268,09
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - ICI LA (D')			1 517,44		1 517,44
006849 AC1	18/10/2018	FA 18173	1 152,00		1 152,00
008034 AC2	10/05/2019	FA 19088- EYSINES-MOE	313,92		313,92
021402 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	51,52		51,52
M2016-005/MS14 Avis écrit sur les PC et ses modificatifs - VAZISTAS			4 425,85		4 425,85
006850 AC1	11/10/2018	FA 281 / UZE 2018	3 360,00		3 360,00
008035 AC2	10/05/2019	FA 322 / UZE 2019	915,60		915,60
021402 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	150,25		150,25
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			528,22		528,22
006494 AC1	02/08/2018	FA 18127	480,00		480,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	8,64		8,64
021404 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	39,58		39,58
M2016-005/MS15 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			1 003,67		1 003,67
006495 AC1	19/07/2018	NH 269/ UZE 2018	960,00		960,00
007094 REGUL REV MS15	03/12/2018	FA 03/12/18	17,28		17,28
021404 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	26,39		26,39

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - ICI LA (D')			2 064,31		2 064,31
008032 AC1	10/05/2019	FA 19087-EYSINES-MOE	1 989,12		1 989,12
021405 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	75,19		75,19
M2016-005/MS16 Participation réunions comm/concertation - VAZISTAS			1 624,72		1 624,72
008033 AC1	10/05/2019	FA 323 / UZE 2019	1 591,30		1 591,30
021405 REVISIONS DEFINITIVES	02/07/2024	DGD	33,42		33,42
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et			3 291,84		3 291,84
008354 BDC1	11/07/2019	FA 19150-EYSINES-MOE	3 240,00		3 240,00
021446 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	51,84		51,84
M2016-005/MS17/BDC 1 Réunion concertation 13/12/18 et 3 ateliers travail 9 et 12/11/18, et			3 463,39		3 463,39
008353 BDC1	31/07/2019	FA F19MAT714	3 399,92		3 399,92
021446 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	63,47		63,47
M2016-005/MS17/BDC10 Mission 2.5 - Etude faisabilité parcelles 226, 229, 1032 - VAZISTAS			3 402,00		3 402,00
011868 AC1	19/01/2021	FA 439 / UZE 2021	3 240,00		3 240,00
021457 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	162,00		162,00
M2016-005/MS17/BDC11 Mission 5a - Echanges projets du 23-03-2021 - ICI LA (D')			705,99		705,99
019275 SOLDE	24/11/2023	FA23384-EYSINES-MOE	606,00		606,00
021458 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	99,99		99,99
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - PERIOLE GERAUD			258,40		258,40
012897 AC1	09/07/2021	FA 11/2021	242,40		242,40
021459 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	16,00		16,00
M2016-005/MS17/BDC12 Mission 5a - Remise d'ouvrages 9-06-2021 - SAFEGE-SUEZ			304,91		304,91
013041 AC1	31/07/2021	FA F21MAT800	286,03		286,03
021459 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	18,88		18,88
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - ICI LA (D')			8 279,01		8 279,01
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	7 214,47		7 214,47
021460 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	1 064,54		1 064,54
M2016-005/MS17/BDC13 Mission 2.4 - Morphologie îlots C3/C4/C7 - VAZISTAS			6 935,33		6 935,33
013714 AC1	16/11/2021	FA 21235-EYSINES-MOE	6 433,52		6 433,52
021460 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	501,81		501,81
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - ICI LA (D')			3 539,11		3 539,11
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	2 388,96		2 388,96
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	265,44		265,44
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	884,71		884,71
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 949,30		2 949,30
014942 AC1	12/04/2022	FA F22MAT367	2 388,96		2 388,96
015178 AC2	16/05/2022	FA F22MAT489	265,44		265,44
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	294,90		294,90
M2016-005/MS17/BDC15 Mission 2.2 - Fiche de lot / îlot C7 - VAZISTAS			5 898,61		5 898,61
014917 AC1	12/04/2022	FA 22075	4 777,92		4 777,92
015134 AC2	13/05/2022	FA 22103-EYSINES-MOE	530,88		530,88
021471 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	589,81		589,81
M2016-005/MS17/BDC16 Mission 5a - Réunion Suez Eau (compteurs Rue M. Porc) - SAFEGE-			324,97		324,97
014389 AC1	31/01/2022	FA F22MAT080	296,51		296,51
021472 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD	28,46		28,46
M2016-005/MS17/BDC17 Mission 5b - Ateliers PRO-DCE Allée de l'Europe - PERIOLE GERAUD			2 449,23		2 449,23
013811 AC1	26/11/2021	FA 19/2021	2 261,52		2 261,52
021473 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD	187,71		187,71
M2016-005/MS17/BDC18 Mission 2.4 - Etude faisabilité îlot C7 - VAZISTAS			15 696,72		15 696,72
015175 AC1	13/05/2022	FA 558/UZE 2022	14 040,00		14 040,00
021491 REVISIONS DEFINITIVES	08/07/2024	DGD	1 656,72		1 656,72
M2016-005/MS17/BDC19 Missions 5b/2.4 - Analyse PC+Morpho C4/Groupe scolaire - VAZISTAS			5 219,93		5 219,93
016100 AC1	13/09/2022	NH 591 / UZE	4 574,88		4 574,88
021492 REVISIONS DEFINITIVES	08/07/2024	DGD	645,05		645,05
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation îlot C6 - ICI LA (D')			516,66		516,66
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	500,64		500,64
021447 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	16,02		16,02
M2016-005/MS17/BDC2 Mission 2.3e - Démarche évaluation îlot C6 - VAZISTAS			1 033,32		1 033,32
009850 AC1	21/02/2020	FA 20038	1 001,28		1 001,28
021447 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	32,04		32,04
M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE îlot C1 - ICI LA (D')			1 632,59		1 632,59
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	1 501,92		1 501,92
021448 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	130,67		130,67
M2016-005/MS17/BDC3 Mission 2.3d - Analyse éléments essentiels DCE îlot C1 - VAZISTAS			3 090,95		3 090,95
008412 BDC3	16/07/2019	FA 19160	3 003,84		3 003,84
021448 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	87,11		87,11
M2016-005/MS17/BDC4 Mission 5a - Réunion coactivité Colas-RTE - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			291,13		291,13
008685 AC1	30/09/2019	FA F19MAT887	283,20		283,20
021449 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	7,93		7,93
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - ICI LA (D')			939,02		939,02
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	900,00		900,00
021451 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	39,02		39,02
M2016-005/MS17/BDC5 Mission 5b - Atelier 10/10/2019 Ilot C6 - VAZISTAS			563,41		563,41
009867 AC1 - SOLDE	21/02/2020	FA 20039	540,00		540,00
021451 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	23,41		23,41
M2016-005/MS17/BDC7 Mission 7 - Ilot C5 - ICI LA (D')			1 558,87		1 558,87

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	1 001,28		1 001,28
021453 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	557,59		557,59
M2016-005/MS17/BDC7 Mission 7 - Ilot C5 - VAZISTAS			2 770,42		2 770,42
019274 SOLDE	24/11/2023	FA 23383	2 378,04		2 378,04
021453 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	392,38		392,38
M2016-005/MS17/BDC8 Mission 5a - Réunion DUP - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			820,83		820,83
011902 AC1 / SOLDE	31/01/2021	FA F21MAT063	781,74		781,74
021454 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	39,09		39,09
M2016-005/MS17/BDC9 Mission 2.5 - Etude faisabilité Ilot C7 - VAZISTAS			3 402,00		3 402,00
011867 AC1	19/01/2021	FA 422 / UZE 2021	3 240,00		3 240,00
021455 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	162,00		162,00
M2022-050 Accompagnement dans le contrôle du réseau EU Rue Martin Porc - SAFEGE-SUEZ			1 612,80		1 612,80
017425 AC1	28/02/2023	FA F23MAT215	806,40		806,40
018139 SOLDE	31/05/2023	FA F23MAT607	806,40		806,40
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - BERIM			18 486,12		18 486,12
019272 AC1 11/23	22/11/2023	FA BM23110146	4 656,96		4 656,96
020196 AC2 02/24	23/02/2024	FA BM24020039	3 729,72		3 729,72
021952 SOLDE	27/08/2024	FA BM24080141	10 099,44		10 099,44
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - ENVOLIS			1 521,00		1 521,00
020075 AC1 11/23	01/01/2024	FA 23-11-2181	1 521,00		1 521,00
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - JBA-BOUCHETON JACQUES			3 886,08	3 951,36	7 837,44
020563 AC1	31/03/2024	FA 24-03-353	3 886,08		3 886,08
023857 AC2	27/02/2025	FA 25-02-289		3 951,36	3 951,36
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - MASTERPLAN			38 754,54		38 754,54
019068 AC1 10/23	26/10/2023	FA 23-10-0017	12 735,96		12 735,96
019323 AC2 11/23	17/11/2023	FA 23-11-0037	5 987,52		5 987,52
020189 AC3 02/24	29/02/2024	FA 24-02-0072	5 051,60		5 051,60
020738 AC4 04/24	24/04/2024	FA 24-04-0104	9 150,34		9 150,34
021029 AC5 05/25	29/05/2024	FA 24-05-0121	3 504,38		3 504,38
021624 AC6 07/24	18/07/2024	FA 24-07-0144	2 324,74		2 324,74
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - SOMMER (LE) ENVIRONNEMENT			10 361,28		10 361,28
021162 AC1 11/23	01/01/2024	FA 23/11/279b	6 041,64		6 041,64
020919 AC2 04/24	30/04/2024	FA LSE24/04/12	4 319,64		4 319,64
M2023-005/MS1 Actualisation du Plan Guide et du CPAUPE - TROUILLOT HERMEL			29 047,63	1 907,14	30 954,77
019069 AC1 10/23	27/10/2023	FA 2310-243	9 005,71		9 005,71
019273 AC2 11/23	22/11/2023	FA 2311-263b	4 614,62		4 614,62
020768 AC3 04/24	24/04/2024	FA 2404-097	3 865,57		3 865,57
021065 AC4 05/24	29/05/2024	FA 2405-131	3 212,35		3 212,35
021424 AC5 06/24	27/06/2024	FA 2406-173a	6 485,54		6 485,54
021621 AC6 07/24	15/07/2024	FA 2407-199	1 863,84		1 863,84
023889 AC7	24/02/2025	FA 2502-045		1 907,14	1 907,14
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - BERIM			512,55		512,55
022057 AC1	30/08/2024	FA BM24080289	512,55		512,55
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - JBA-BOUCHETON JACQUES			483,84		483,84
022934 AC1	26/11/2024	FA 24-11-135	483,84		483,84
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - MASTERPLAN			6 380,04	619,44	6 999,48
019625 AC1	01/01/2024	FA 23-12-0052	3 480,00		3 480,00
020558 AC2	29/03/2024	FA 24-03-0098	852,12		852,12
021030 AC3	29/05/2024	FA 24-05-0122	1 206,48		1 206,48
022922 AC4	25/11/2024	FA 24-11-0034	841,44		841,44
023195 AC5	01/01/2025	FA 24-12-0064		619,44	619,44
M2023-005/MS2/BDC1 Ilot C5 - M6.b suivi de projet - TROUILLOT HERMEL			2 592,90		2 592,90
019620 AC1	01/01/2024	FA 2312-313	1 290,00		1 290,00
021067 AC2	30/05/2024	FA 2405-132	787,00		787,00
022930 AC3	25/11/2024	FA 2411-318	515,90		515,90
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préalables avec les				516,64	516,64
023585 AC1	29/01/2025	FA BM25010113		516,64	516,64
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préalables avec les				1 465,97	1 465,97
023858 AC1	28/02/2025	FA 25-02-290		1 465,97	1 465,97
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préalables avec les			1 690,08	4 409,71	6 099,79
022905 AC1	25/11/2024	FA 24-11-0039	1 690,08		1 690,08
023844 AC2	26/02/2025	FA 25-02-0102		4 409,71	4 409,71
M2023-005/MS2/BDC10 Ilot C3 sélection des architectes et échanges préalables avec les			941,62	3 512,69	4 454,31
022933 AC1	25/11/2024	FA 2411-321	941,62		941,62
023890 AC2	24/02/2025	FA 2502-047		3 512,69	3 512,69
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - BERIM				516,64	516,64
023583 AC1	01/01/2025	FA BM24120570		516,64	516,64
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - JBA-BOUCHETON JACQUES				488,65	488,65
023860 AC1	28/02/2025	FA 25-02-291		488,65	488,65
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - MASTERPLAN			1 693,44	5 383,19	7 076,63
022591 AC1	31/10/2024	FA 24-10-0029	1 693,44		1 693,44
023197 AC2	01/01/2025	FA 24-12-0066		1 212,48	1 212,48
023553 AC3	29/01/2025	FA 25-01-0082		1 698,48	1 698,48
023845 AC4	26/02/2025	FA 25-02-0103		1 234,67	1 234,67
024151 AC5	26/03/2025	FA 25-03-0119		1 237,56	1 237,56
M2023-005/MS2/BDC11 Ilot C4 suivi architectural - TROUILLOT HERMEL			2 605,84		2 605,84

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
022665 AC1	24/10/2024	FA 2410-297b	2 605,84		2 605,84
M2023-005/MS2/BDC12 Ilot C5 visa PC - BERIM				911,72	911,72
023588 AC1	29/01/2025	FA BM25010114		911,72	911,72
M2023-005/MS2/BDC12 Ilot C5 visa PC - MASTERPLAN				2 680,99	2 680,99
023554 AC1	29/01/2025	FA 25-01-0083		1 337,18	1 337,18
023846 AC2	26/02/2025	FA 25-02-0104		1 343,81	1 343,81
M2023-005/MS2/BDC12 Ilot C5 visa PC - TROUILLOT HERMEL				1 834,26	1 834,26
024207 AC1	27/03/2025	FA 2503-080		1 834,26	1 834,26
M2023-005/MS2/BDC13 IlotC4 mission 8 - MASTERPLAN			2 060,44		2 060,44
022598 AC1	30/10/2024	FA 24-10-0028	2 060,44		2 060,44
M2023-005/MS2/BDC14 Présentation ZAC aux élus - MASTERPLAN			1 028,17		1 028,17
022913 AC1	26/11/2024	FA 24-11-0040	1 028,17		1 028,17
M2023-005/MS2/BDC14 Présentation ZAC aux élus - TROUILLOT HERMEL			1 028,17		1 028,17
022929 AC1	21/11/2024	FA 2411-316	1 028,17		1 028,17
M2023-005/MS2/BDC17 M6 - Suivi de projets immobiliers - BERIM				1 892,71	1 892,71
024848 AC1	28/05/2025	FA BM25050249		917,13	917,13
025645 AC2	31/07/2025	FA BM25070430		975,58	975,58
M2023-005/MS2/BDC17 M6 - Suivi de projets immobiliers - MASTERPLAN				9 839,19	9 839,19
024779 AC1	27/05/2025	FA 25-05-0161		2 690,24	2 690,24
025169 AC2	30/06/2025	FA 25-06-0181		1 415,71	1 415,71
025364 AC3	28/07/2025	FA 25-07-0202		2 137,92	2 137,92
026347 AC4	31/10/2025	FA 25-10-0039		2 174,03	2 174,03
026790 AC5	26/11/2025	FA 25-11-0055		1 421,29	1 421,29
M2023-005/MS2/BDC17 M6 - Suivi de projets immobiliers - TROUILLOT HERMEL				3 280,64	3 280,64
024774 AC1	23/05/2025	FA 2505-167		1 834,26	1 834,26
025080 AC2	26/06/2025	FA 2506-200		524,79	524,79
025392 AC3	28/07/2025	FA 2507-247		390,84	390,84
026351 AC4	30/10/2025	FA 2510-357		530,75	530,75
M2023-005/MS2/BDC18 M6 - Suivi de projets immobiliers - BERIM				9 873,28	9 873,28
025643 AC1	31/07/2025	FA BM25070431		9 416,25	9 416,25
026349 AC2	29/10/2025	FA BM25100280		457,03	457,03
M2023-005/MS2/BDC18 M6 - Suivi de projets immobiliers - MASTERPLAN				1 280,20	1 280,20
025358 AC1	28/07/2025	FA 25-07-0203		1 280,20	1 280,20
M2023-005/MS2/BDC19 ilot TRIAT C5_M6e analyse DCE - BERIM				459,92	459,92
026320 AC1	30/09/2025	FA BM25090464		459,92	459,92
M2023-005/MS2/BDC19 ilot TRIAT C5_M6e analyse DCE - MASTERPLAN				979,20	979,20
025946 AC1	30/09/2025	FA 25-09-0018		979,20	979,20
M2023-005/MS2/BDC19 ilot TRIAT C5_M6e analyse DCE - TROUILLOT HERMEL				795,60	795,60
025940 AC1	30/09/2025	FA 2509-313		795,60	795,60
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - BERIM			512,56	518,17	1 030,73
021941 AC1	31/07/2024	FA BM24070477	512,56		512,56
023594 AC2	01/01/2025	FA BM24120569		518,17	518,17
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - JBA-BOUCHETON JACQUES			1 440,00		1 440,00
019639 AC1	01/01/2024	FA JBA N2312 200	1 440,00		1 440,00
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - MASTERPLAN			10 882,04	976,10	11 858,14
019626 AC1	01/01/2024	FA 23-12-0053	6 000,00		6 000,00
019952 AC2	31/01/2024	FA 24-01-0062	1 441,44		1 441,44
020190 AC3 02/24	26/02/2024	FA 24-02-0073	1 101,24		1 101,24
020557 AC4	29/03/2024	FA 24-03-0097	843,12		843,12
021625 AC5 07/24	18/07/2024	FA 24-07-0145	1 496,24		1 496,24
023196 AC6	01/01/2025	FA 24-12-0065		976,10	976,10
M2023-005/MS2/BDC2 Ilot C7 - M6.a & 6.b suivi de projet - TROUILLOT HERMEL			5 867,80	517,43	6 385,23
019621 AC1	01/01/2024	FA 2312-314	4 380,00		4 380,00
020197 AC2 02/24	26/02/2024	FA 2402-030	915,84		915,84
021622 AC3 07/24	16/07/2024	FA 2407-200	571,96		571,96
023230 AC4	01/01/2025	FA 2412-368		517,43	517,43
M2023-005/MS2/BDC20 ilot Interstices M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - BERIM				459,92	459,92
026311 AC1	30/09/2025	FA BM25090465		459,92	459,92
M2023-005/MS2/BDC20 ilot Interstices M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - MASTERPLAN				2 698,19	2 698,19
025962 AC1	30/09/2025	FA 25-09-0019		2 698,19	2 698,19
M2023-005/MS2/BDC20 ilot Interstices M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - TROUILLOT HERMEL				797,20	797,20
025956 AC1	30/09/2025	FA 2509-314		797,20	797,20
M2023-005/MS2/BDC21 ilot Abri familial M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - BERIM				459,92	459,92
026350 AC1	29/10/2025	FA BM25100281		459,92	459,92
M2023-005/MS2/BDC21 ilot Abri familial M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - MASTERPLAN				2 698,19	2 698,19
026343 AC1	31/10/2025	FA 25-10-0040		2 698,19	2 698,19
M2023-005/MS2/BDC21 ilot Abri familial M6.d_M8.2 Avis PC modificatif - TROUILLOT HERMEL				797,20	797,20
026346 AC1	30/10/2025	FA 2510-358		797,20	797,20
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - JBA-BOUCHETON JACQUES			2 887,20		2 887,20
020179 AC1	29/02/2024	FA 24-02-300	1 444,32		1 444,32
020554 AC2	31/03/2024	FA 24-03-351	1 442,88		1 442,88
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - MASTERPLAN			3 376,82		3 376,82
019954 AC1	31/01/2024	FA 24-01-0063	1 681,68		1 681,68
020175 AC2	29/02/2024	FA 24-02-0074	1 685,04		1 685,04
020784 SOLDE	29/04/2024	FA 24-04-0105	10,10		10,10
M2023-005/MS2/BDC3 Ilot C4 - M4.a étude capacitaire - TROUILLOT HERMEL			2 595,48		2 595,48

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
020198 AC1 02/24	26/02/2024	FA 2402-031	1 805,40		1 805,40
020771 AC2	24/04/2024	FA 2404-098	784,92		784,92
020918 SOLDE	30/04/2024	FA 2404-115	5,16		5,16
M2023-005/MS2/BDC4 Îlot C3 - M4.a étude capacitaire - JBA-BOUCHETON JACQUES			2 897,30		2 897,30
020180 AC1	29/02/2024	FA 24-02-301	1 444,32		1 444,32
020555 AC2	31/03/2024	FA 24-03-352	1 442,88		1 442,88
020820 SOLDE	30/04/2024	FA 24-04-403	10,10		10,10
M2023-005/MS2/BDC4 Îlot C3 - M4.a étude capacitaire - MASTERPLAN			3 376,82		3 376,82
019955 AC1	31/01/2024	FA 24-01-0064	1 681,68		1 681,68
020176 AC2	29/02/2024	FA 24-02-0075	1 685,04		1 685,04
020785 SOLDE	25/04/2024	FA 24-04-0106	10,10		10,10
M2023-005/MS2/BDC4 Îlot C3 - M4.a étude capacitaire - TROUILLOT HERMEL			2 595,48		2 595,48
020199 AC1 02/24	26/02/2024	FA 2402-032	1 805,40		1 805,40
020770 AC2 04/24	24/04/2024	FA 2404-099	784,92		784,92
020917 SOLDE	30/04/2024	FA 2404-114	5,16		5,16
M2023-005/MS2/BDC5 Îlot C3 - M5 fiche de lot - BERIM			4 812,05		4 812,05
022060 AC1	30/08/2024	FA BM24080290	1 917,56		1 917,56
022219 AC2	24/09/2024	FA BM24090235	1 682,88		1 682,88
023069 AC3	27/11/2024	FA BM24110310	1 211,61		1 211,61
M2023-005/MS2/BDC5 Îlot C3 - M5 fiche de lot - ENVOLIS			1 087,31		1 087,31
022089 SOLDE	20/05/2024	FA 24-05-2544	270,82		270,82
023038 AC2	03/12/2024	FA 24-12-3126	816,49		816,49
M2023-005/MS2/BDC5 Îlot C3 - M5 fiche de lot - JBA-BOUCHETON JACQUES			967,69		967,69
022935 AC1	26/11/2024	FA 24-11-136	967,69		967,69
M2023-005/MS2/BDC5 Îlot C3 - M5 fiche de lot - MASTERPLAN			8 812,63	861,26	9 673,89
021031 AC1	29/05/2024	FA 24-05-0123	3 863,08		3 863,08
022218 AC2	27/09/2024	FA 24-09-0004	3 375,37		3 375,37
022924 AC3	25/11/2024	FA 24-11-0036	1 574,18		1 574,18
023843 AC4	26/02/2025	FA 25-02-0101		861,26	861,26
M2023-005/MS2/BDC5 Îlot C3 - M5 fiche de lot - TROUILLOT HERMEL			6 760,37		6 760,37
021071 AC1	30/05/2024	FA 2405-133	2 704,15		2 704,15
022220 AC2	24/09/2024	FA 2409-247	2 362,76		2 362,76
022931 AC3	25/11/2024	FA 2411-319	1 693,46		1 693,46
M2023-005/MS2/BDC6 Îlot C4 - M5 fiche de lot - BERIM			3 595,40		3 595,40
021942 AC1	31/07/2024	FA BM24070478	3 595,40		3 595,40
M2023-005/MS2/BDC6 Îlot C4 - M5 fiche de lot - JBA-BOUCHETON JACQUES			482,88		482,88
020818 SOLDE	30/04/2024	FA 24-04-401	482,88		482,88
M2023-005/MS2/BDC6 Îlot C4 - M5 fiche de lot - MASTERPLAN			7 236,04		7 236,04
020786 AC1	25/04/2024	FA 24-04-0107	4 828,84		4 828,84
021626 AC2 07/24	19/07/2024	FA 24-07-0146	2 407,20		2 407,20
M2023-005/MS2/BDC6 Îlot C4 - M5 fiche de lot - TROUILLOT HERMEL			5 065,23		5 065,23
020769 AC1	24/04/2024	FA 2404-096	3 380,18		3 380,18
021623 AC2	16/07/2024	FA 2407-201	1 685,05		1 685,05
M2023-005/MS2/BDC7 Interstices - M.5 Fiche de lot - MASTERPLAN			3 621,63	1 221,65	4 843,28
020788 AC1	25/04/2024	FA 24-04-0108	2 414,42		2 414,42
021377 AC2	27/06/2024	FA 24-06-0140	1 207,21		1 207,21
024781 AC3	27/05/2025	FA 25-05-0162		1 221,65	1 221,65
M2023-005/MS2/BDC7 Interstices - M.5 Fiche de lot - TROUILLOT HERMEL			1 690,09		1 690,09
021393 AC1	27/06/2024	FA 2406-174	1 690,09		1 690,09
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - BERIM				518,17	518,17
025234 AC1	30/06/2025	FA BM25060185		518,17	518,17
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - JBA-BOUCHETON JACQUES				1 467,41	1 467,41
024210 AC1	31/03/2025	FA 25-03-362		1 467,41	1 467,41
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - MASTERPLAN			4 830,63	1 228,88	6 059,51
021361 AC1	28/06/2024	FA 24-06-0141	1 810,81		1 810,81
021627 AC2 07/24	19/07/2024	FA 24-07-0147	1 805,40		1 805,40
022925 AC3	25/11/2024	FA 24-11-0038	1 214,42		1 214,42
024545 AC4	30/04/2025	FA 25-04-0145		619,24	619,24
025082 AC5	30/06/2025	FA 25-06-0180		609,64	609,64
M2023-005/MS2/BDC8 Interstices - M.6 accompagnement projets - TROUILLOT HERMEL			2 105,26	1 167,17	3 272,43
021394 AC1	27/06/2024	FA 2406-175	1 321,90		1 321,90
022932 AC2	25/11/2024	FA 2411-320	783,36		783,36
025084 AC3	26/06/2025	FA 2506-199		1 167,17	1 167,17
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - BERIM			6 205,32		6 205,32
023068 AC1	27/11/2024	FA BM24110311	6 205,32		6 205,32
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - MASTERPLAN			4 363,27		4 363,27
022597 AC1	30/10/2024	FA 24-10-0027	4 363,27		4 363,27
M2023-005/MS2/BDC9 Actualisation doc ZAC (plan guide espaces publics) - TROUILLOT HERMEL			6 787,31		6 787,31
022664 AC3	24/10/2024	FA 2410-296b	6 787,31		6 787,31
M2023-005/MS3 Etudes préliminaires - BERIM				7 647,75	7 647,75
023549 AC1	01/01/2025	FA BM24120568		3 797,29	3 797,29
024025 AC2	25/02/2025	FA BM25020280		3 085,68	3 085,68
024401 AC3	28/03/2025	FA BM25030211		764,78	764,78
M2023-005/MS3 Etudes préliminaires - MASTERPLAN				5 078,74	5 078,74
023194 AC1	01/01/2025	FA 24-12-0063		2 531,53	2 531,53
023847 AC2	26/02/2025	FA 25-02-0105		2 037,37	2 037,37

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024152 AC3	26/03/2025	FA 25-03-0120		509,84	509,84
M2023-005/MS3 Etudes préliminaires - TROUILLOT HERMEL				12 696,87	12 696,87
023231 AC1	01/01/2025	FA 2412-367		6 328,82	6 328,82
023893 AC2	24/02/2025	FA 2502-076		5 093,43	5 093,43
024205 AC1	27/03/2025	FA 2503-079		1 274,62	1 274,62
A103 Etude programmation			14 670,00		14 670,00
M2020-035 Etude de programmation - URBAN ID			8 160,00		8 160,00
011176 AC1	16/10/2020	FA 2020/05	14 688,00		14 688,00
011543 AC2 / SOLDE	07/12/2020	FA 2020/08	1 632,00		1 632,00
011815 REFACTORATION SUR MOUSSA PICOT	01/01/2021	FA 2020-08	-8 160,00		-8 160,00
M2024-041 MAJ étude de programmation - URBAN ID			6 510,00		6 510,00
022709 AC1	08/11/2024	FA 2024/09	6 510,00		6 510,00
A104 Concertation			92 255,23	1 184,22	93 439,45
18-02090 Captation par drone (photos et vidéos) - APPLICADRONE			300,00		300,00
006302 AC1	12/06/2018	FA 20180012	300,00		300,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - HAZGUI MEHDI			9 120,00		9 120,00
006366 AC1	05/07/2018	FA 2018014	7 296,00		7 296,00
007064 AC 2	27/11/2018	FA 2018026	1 824,00		1 824,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - PLACE			11 520,00		11 520,00
006367 AC1	05/07/2018	NH 17/321/1	9 216,00		9 216,00
007101 AC2	29/11/2018	FA 17/321/3	2 304,00		2 304,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - QUESADA ROMAIN			1 400,00		1 400,00
006436 AC1	17/07/2018	FA 2018-07-17-82	1 120,00		1 120,00
007234 AC2	13/12/2018	FA 2018-12-13-84	280,00		280,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELOT RUBEN			11 320,50		11 320,50
007066 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	500,00		500,00
007568 BDC4 - AC1	13/02/2019	FA 02_19	1 542,00		1 542,00
008136 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 06-19	1 542,00		1 542,00
008137 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	514,00		514,00
008138 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 08-19	1 156,50		1 156,50
008425 BDC7 - AC2	19/07/2019	NH 11_19	1 156,50		1 156,50
019929 BDC15 AC1	29/01/2024	FA 001-2024	1 472,85		1 472,85
020373 BDC15 AC2	13/03/2024	FA 004-2024	2 454,75		2 454,75
021020 BDC15 SOLDE	27/05/2024	FA 006-2024	981,90		981,90
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - CROUZEL OLIVIER			15 579,48		15 579,48
020320 BDC15 AC1	09/03/2024	FA 202403-3	7 789,74		7 789,74
021063 BDC15 SOLDE	23/04/2024	FA 202404-7	7 789,74		7 789,74
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			16 482,72		16 482,72
007065 BDC 2	27/11/2018	FA 2018028	1 920,00		1 920,00
007555 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 2019005	2 220,48		2 220,48
008128 AC2	29/05/2019	FA 2019014	2 220,48		2 220,48
008129 AC1	29/05/2019	FA 2019015	2 467,20		2 467,20
008130 AC1	29/05/2019	FA 2019016	1 480,32		1 480,32
008470 BDC7	19/07/2019	FA 2019023	1 480,32		1 480,32
010435 BDC12	23/06/2020	FA 2020017	504,48		504,48
020308 AC1 BDC15	08/03/2024	FA 2024007	2 094,72		2 094,72
022920 AC2 BDC15	26/11/2024	FA 2024031	2 094,72		2 094,72
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			57,79		57,79
007067 BDC 2	22/11/2018	FA 16_18	5,50		5,50
007569 BDC 4 AC1	13/02/2019	FA 02_19	16,96		16,96
008146 AC1 BDC7	29/05/2019	NH 08-19	12,72		12,72
008144 AC2 BDC4	29/05/2019	NH 06-19	16,96		16,96
008145 AC1 BDC5	29/05/2019	NH 07-19	5,65		5,65
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			15 222,00		15 222,00
006368 BDC1	05/07/2018	NH 17/321/2	600,00		600,00
007612 BDC4 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/4/1	1 233,60		1 233,60
007613 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 17/321/6/1	1 233,60		1 233,60
008132 BDC4 - AC2	29/05/2019	NH 17/321/4/2	1 233,60		1 233,60
008133 BDC5	29/05/2019	NH 17/321/5	986,88		986,88
008134 BDC7 - AC1	29/05/2019	NH 17/321/7	956,04		956,04
008429 BDC7 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/7/2	956,04		956,04
008428 BDC6 - AC2	22/07/2019	FA 17/321/6/2	1 233,60		1 233,60
010473 BDC12	29/06/2020	FA 17/321	504,48		504,48
020326 AC1 BDC 15	11/03/2024	FA 17/321/BC15a	3 142,08		3 142,08
022938 AC2 BDC15	27/11/2024	FA 17/321/BC15b	3 142,08		3 142,08
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - QUESADA ROMAIN			8 285,05		8 285,05
007614 BDC6 - AC1	22/02/2019	FA 2019-02-22-87	2 518,60		2 518,60
008427 BDC6 - AC2	19/07/2019	FA 2019-07-19-90	2 518,60		2 518,60
009925 AC1/SOLDE	04/03/2020	FA 2020-03-04-97	359,80		359,80
010451 BDC12	23/06/2020	FA 2020-06-23-117	367,85		367,85
022968 AC1 BDC15	26/10/2024	FA 2024-11-27-178	2 520,20		2 520,20
M2023-010/BDC12 Carès Assistance à Audition - REPERAGE URBAIN				523,77	523,77
026655 AC1	16/11/2025	FA 202561C0812		523,77	523,77
M2023-010/BDC7 Eys Carès Séminaire avec les élus sur les objectifs - REPERAGE URBAIN			1 032,24		1 032,24
020896 AC1 SOLDE	04/05/2024	FA 2024218	1 032,24		1 032,24
M2023-010/BDC9 Eys Carès Assistance à consultation Carès - REPERAGE URBAIN			1 935,45	660,45	2 595,90

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
021920 AC1	21/08/2024	FA 202446	1 935,45		1 935,45
026653 AC2	16/11/2025	FA 202561C089		660,45	660,45
A105 Etudes environnementales			115 146,31	38 254,91	153 401,22
18-01919 Eysines ZAC Carès Cantinolle Ilot C5 - Nomination hydrogéologue agréé pour avis -			1 001,50		1 001,50
005751 ARMAND CLAUDE	29/01/2018	FA 180129	1 001,50		1 001,50
23-06415 Ilot C7 Avis hydrogéologue agréé (périmètre de protection de la source Cantinolle) -			1 008,08		1 008,08
018267 SOLDE	20/06/2023	FA230620	1 008,08		1 008,08
24-06961 Ilot C5 : suivi travaux fouilles archéo dans le PPR - ARMAND CLAUDE			1 430,82		1 430,82
020241 SOLDE	03/03/2024	FA 240201	1 430,82		1 430,82
24-07231 Ilot C4 : avis hydrogéologue pour projet implantation - ARMAND CLAUDE			1 387,93		1 387,93
021079 SOLDE	25/05/2024	FA 240525	1 387,93		1 387,93
M2015-016/MS 30 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE			2 952,00		2 952,00
006237 AC1	25/05/2018	FA 18-086	2 952,00		2 952,00
M2016-005/MS17/BDC14 Mission 5b - Visite avant démolition bât M.Porc - BIOTOPE			489,12		489,12
016641 AC1 - SOLDE	22/11/2022	FA 202205509	427,18		427,18
021470 REVISIONS DEFINITIVES	05/07/2024	DGD	61,94		61,94
M2016-005/MS17/BDC6 Mission 2.3f - suivi chantier Ilot C1 - BIOTOPE			5 406,45		5 406,45
010041 AC1	31/03/2020	FA 202000796	840,00		840,00
011661 AC2	23/10/2020	FA 202003488	1 731,23		1 731,23
019240 SOLDE	23/10/2023	FA 202305276	2 357,00		2 357,00
021452 REVISIONS DEFINITIVES	04/07/2024	DGD	478,22		478,22
M2016-029 Actualisation étude d'impact - RIVIERE ENVIRONNEMENT			19 080,00		19 080,00
003444 AC 1	27/07/2016	FA F16.07-659	2 016,00		2 016,00
004223 AC2	26/01/2017	FA F17.01-714	5 040,00		5 040,00
005056 AC 3	08/08/2017	FA F17.08-780	6 768,00		6 768,00
005717 AC4	23/01/2018	FA F18-01-835	3 456,00		3 456,00
006554 AC1	31/08/2018	FA F18-08-916	1 800,00		1 800,00
M2018-024/BDC 60 SSEP Poursuite du suivi piezo - TERE0			7 055,38		7 055,38
015292 AC1	31/05/2022	FA 22/151	1 937,49		1 937,49
015893 AC2	22/07/2022	FA 22/200	736,04		736,04
016328 AC3	26/09/2022	FA 22/259	734,58		734,58
016811 AC4	01/01/2023	FA 22/330	1 251,93		1 251,93
017790 AC5	06/02/2023	FA 23/041	743,89		743,89
019117 AC6	13/10/2023	FA 23/296	1 651,45		1 651,45
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - GAIA RJ			3 414,00		3 414,00
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	3 414,00		3 414,00
M2018-024/BDC43 SSEP : sondages et piézomètres - TERE0			18 159,35		18 159,35
012488 AC1	28/04/2021	FA 21/114	11 667,54		11 667,54
012601 AC2	25/05/2021	FA 21/153	686,44		686,44
012911 AC3	05/07/2021	FA 21/194	686,44		686,44
013300 AC4	21/06/2021	FA 21/171	854,62		854,62
013394 AC5	24/09/2021	FA 21/279	1 180,87		1 180,87
013772 AC6	29/10/2021	FA 21/337	692,38		692,38
014202 AC7	01/01/2022	FA 21/413	697,25		697,25
014879 AC8	25/03/2022	FA 22/078	1 693,81		1 693,81
M2021-009/BDC1 Diagnostic écologique - BDC1 : Mission 1 - ENVOLIS			10 201,10		10 201,10
012814 AC1	13/05/2021	FA 21-05-664	1 863,60		1 863,60
012813 AC2	31/05/2021	FA 21-05-691	873,60		873,60
012815 AC3	19/06/2021	FA 21-06-734	873,60		873,60
013536 AC4	25/10/2021	FA 21-10-891	2 614,80		2 614,80
013626 AC5	29/10/2021	FA 21-10-932	873,60		873,60
014559 AC6	28/02/2022	FA 22-02-1120	1 455,60		1 455,60
015711 AC7	21/07/2022	FA 22-07-1405	1 455,60		1 455,60
016511 REGUL REVISIONS	07/11/2022	REV1	190,70		190,70
M2021-009/BDC2 Diagnostic écologique - BDC2 : Mission 2 expert. compl./6.2 Atelier - ENVOLIS			1 595,93		1 595,93
016031 AC1	20/06/2022	FA 22-06-1313	1 595,93		1 595,93
M2022-007 Lot 1/BDC13 M15.2 Participation réunion/atelier de travail - ENVOLIS			875,28		875,28
019980 SOLDE	01/01/2024	FA 23-11-2217	875,28		875,28
M2022-007 Lot 1/BDC24 AMO Missions écologiques: Eligibilité site compensation - ENVOLIS				5 640,18	5 640,18
023232 AC1	01/01/2025	FA 24-12-3166		4 756,50	4 756,50
023512 AC2	24/01/2025	FA 25-01-3235		883,68	883,68
M2022-007 Lot 1/BDC4 AMO Missions écologiques : Actu Diag écologique - ENVOLIS			370,44		370,44
017507 AC1	03/03/2023	FA 23-03-1693	370,44		370,44
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC11 Suivi piézo 12 mois - SEREA			15 735,78		15 735,78
018417 AC1	28/07/2023	FA 230488	996,34		996,34
018514 AC2	11/08/2023	FA230536	994,38		994,38
018815 AC3	28/09/2023	FA 230622	628,54		628,54
019019 AC4	24/10/2023	FA 230679	1 000,22		1 000,22
019981 AC5	31/01/2024	FA 240052	2 283,95		2 283,95
020814 AC6	30/04/2024	FA 240256	4 859,21		4 859,21
022221 AC7	27/09/2024	FA 240559	4 973,14		4 973,14
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC2 SSEP3 - Démolition cabanon Rue M-Porc - SEREA			2 797,55		2 797,55
017975 AC1	17/05/2023	FA 230280	2 797,55		2 797,55
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC22 Suivi piézométrique 12 mois - SEREA				5 289,32	5 289,32
023909 AC1	28/02/2025	FA 250135		5 289,32	5 289,32
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC29 Pose piézomètre Venelle 1 C1 - SEREA				2 047,70	2 047,70

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023880 AC1	28/02/2025	FA 250107		2 047,70	2 047,70
M2022-034 Lot 1 S_ Ouest/BDC34 Diagnostics enrobés - SEREA				6 572,35	6 572,35
025705 AC1	20/08/2025	FA 250621		6 572,35	6 572,35
M2022-064/BDC1 Diag phyto Ilots C4, C5, C7 : Diag phyto+rapport - ENVOLIS			22 185,60		22 185,60
016382 AC1	20/10/2022	FA 22-10-1510	16 185,60		16 185,60
016668 AC2	18/11/2022	FA 22-11-1547	6 000,00		6 000,00
M2023-005/MS2/BDC15 Etudes complémentaires hydraulique - ENVOLIS				5 125,68	5 125,68
024203 AC1	26/03/2025	FA 25-03-3438		5 125,68	5 125,68
M2023-005/MS2/BDC16 MAJ dessin du parvis du gymnase - BERIM				2 454,21	2 454,21
024400 AC1	31/03/2025	FA BM25030233		2 454,21	2 454,21
M2023-005/MS2/BDC16 MAJ dessin du parvis du gymnase - MASTERPLAN				2 323,39	2 323,39
024155 AC1	26/03/2025	FA 25-03-0121		2 323,39	2 323,39
M2023-005/MS2/BDC16 MAJ dessin du parvis du gymnase - TROUILLOT HERMEL				5 105,36	5 105,36
024209 AC1	27/03/2025	FA 2503-081		5 105,36	5 105,36
M2023-005/MS2/BDC22 Dossier loi sur l'eau (autorisation) - ENVOLIS				1 500,00	1 500,00
026820 AC1	27/11/2025	FA 25-11-4306		1 500,00	1 500,00
M2024-013/Lot1/BDC20 AMO économie circulaire démarche REFAIR Lot 1 - CANCAN				425,46	425,46
025937 AC1 SOLDE	01/10/2025	FA 25-225-102		425,46	425,46
M2024-063/BDC1 M9 expertises écologiques et études compl 28 rue Martin Porc - ENVOLIS				1 261,26	1 261,26
024549 SOLDE	30/04/2025	FA 25-04-3574		1 261,26	1 261,26
M2024-063/BDC4 M16 Terrains compensation dossier CNPN - ENVOLIS				510,00	510,00
024901 AC1	05/06/2025	FA 25-06-3688		510,00	510,00
A106 Etude mobilité			138 419,41	19 442,71	157 862,12
2024-022/BDC2 Mission 2.7 Modelisation de carrefour - IRIS CONSEIL REGIONS				2 361,06	2 361,06
024193 AC1 SOLDE	31/03/2025	FA REGBX4273		2 361,06	2 361,06
M2016-045 Etudes mobilité - TRANSITEC			45 997,20		45 997,20
004514 MS1 AC1	24/03/2017	FA 17107	1 560,00		1 560,00
004625 AC 2	04/05/2017	FA 17159	15 868,80		15 868,80
004741 AC3	08/06/2017	FA 17213	14 078,40		14 078,40
004762 AC 3	12/06/2017	AV 17213	-14 078,40		-14 078,40
004763 AC 3	12/06/2017	FA 17220	13 374,48		13 374,48
004936 AC4	25/07/2017	FA 17308	5 731,92		5 731,92
005350 AC 5	26/10/2017	FA 17451	9 462,00		9 462,00
M2019-039 Lot 1/BDC11 ECC ECC - M6 ilot C1 enquête motorisation locataires - NOVA 7			8 059,32		8 059,32
019656 AC1	21/07/2023	FA 230708	8 059,32		8 059,32
M2019-039/Lot 2/BDC15A ECC Analyse offres C7 - AUXILIA			561,00		561,00
019673 AC1	29/09/2023	FA 329-2023	561,00		561,00
M2019-039/Lot 2/BDC15S ECC Analyse offres C7 - SCET			3 927,00		3 927,00
019674 AC1	30/08/2023	FA F23-09-P00158	3 927,00		3 927,00
M2019-039/Lot 2/BDC21 Evenement pour cloture démarche nouveaux habitants ECC - SCET				577,32	577,32
026178 AC1	17/10/2025	FA CLIEN/2025/04338		577,32	577,32
M2019-039/Lot 2/BDC6 SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - SCET			2 982,60		2 982,60
019688 AC2 SOLDE (PM AC1 S/STE)	30/06/2023	F23-09-P01160	2 982,60		2 982,60
M2019-039/Lot 2/BDC6A SOLDE Parcours arrivée nouveaux occupants C1 - AUXILIA			13 266,75		13 266,75
019690 AC2 (PM AC1 S/STE)	29/09/2023	FA 334-2023	8 801,94		8 801,94
020081 AC3 SOLDE	01/01/2024	FA 501-2023	4 464,81		4 464,81
M2019-039/Lot 2/BDC8A SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage loc			29 161,84	9 763,97	38 925,81
019694 AC2 (PM AC1 S/STE)	29/09/2023	FA 327-2023	8 727,01		8 727,01
020082 AC3	01/01/2024	FA 502-2023	4 332,06		4 332,06
021831 AC4	24/07/2024	FA 265-2024	16 102,77		16 102,77
023539 AC5	01/01/2025	FA 518-2024		9 763,97	9 763,97
M2019-039/Lot 2/BDC8S SOLDE Accomp habitants C1 - Enquête Longères - Exp* Autopartage loc			12 929,70	6 740,36	19 670,06
019692 AC2 (PM AC1 S/STE)	30/09/2023	FA F23-09-P01159	9 686,62		9 686,62
021672 AC3	25/07/2024	FA CLIEN/2024/03130	3 243,08		3 243,08
026177 AC4	17/10/2025	FA CLIEN/2025/04336		6 740,36	6 740,36
M2023-052/BDC2 Expérimentation prêt vélo Eysines - VELIPRO (VIRAJ)			21 534,00		21 534,00
020661 AC1 SOLDE	15/04/2024	FA F-382	21 534,00		21 534,00
A107 Sondages géotechniques			88 609,81	17 124,54	105 734,35
M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 634,70		9 634,70
005624 BDC 10	29/12/2017	FA SBX2.H.0449	9 634,70		9 634,70
M2016-015/BDC13 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			14 763,05		14 763,05
006627 AC1	13/09/2018	FA SBX2.I.0342	14 763,05		14 763,05
M2016-015/BDC4 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			9 450,00		9 450,00
004728 AC1	02/06/2017	FA SBX2.H.0180	9 450,00		9 450,00
M2016-015/BDC5 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			2 652,00		2 652,00
004997 AC1	02/08/2017	FA SBX2.H.0257	2 652,00		2 652,00
M2016-015/BDC9 Etudes géotechniques lot 2 - GINGER CEBTP			384,82		384,82
005271 AC1	11/10/2017	FA SBX2.H.0336	384,82		384,82
M2020-052 LOT 2/BDC15 Ilot C7 : sondages complémentaires G0 - FONDASOL			5 338,20		5 338,20
017866 AC1	28/04/2023	FA SI2305140	5 338,20		5 338,20
M2020-052 LOT 2/BDC16 Mission G1PGC : Ilots C4 et C7 - FONDASOL			1 179,36		1 179,36
018083 AC1	05/06/2023	FA SI.23.06558	1 179,36		1 179,36
M2020-052 LOT 2/BDC17 Mission G1PGC : Ilots C4 investigation complémentaire - FONDASOL			2 882,88		2 882,88
018080 AC1	31/05/2023	FA SI.23.06443	2 882,88		2 882,88
M2020-052 LOT 2/BDC20 Ilot C7 - M12.1 vacation - FONDASOL			394,56		394,56
020033 SOLDE	07/02/2024	FA SI.24.01296	394,56		394,56

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2020-052 LOT 2/BDC21 Etudes Dde sol G1 pour acquisition BB256 - FONDASOL			888,58		888,58
021105 SOLDE	31/05/2024	FA SI2406339	888,58		888,58
M2020-052 LOT 2/BDC23 Sondages complémentaires C4, C1 et C3 - FONDASOL				9 450,54	9 450,54
023928 AC1	28/02/2025	FA SI.25.02249		9 450,54	9 450,54
M2020-052 LOT 2/BDC7 Diags G2 AVP / Ilots C4 et C7 - FONDASOL			41 041,66		41 041,66
016493 AC1	31/10/2022	FA SI.22.13567	22 188,00		22 188,00
016702 AC2	29/11/2022	FA 14795	18 853,66		18 853,66
M2024-065/BDC1 Etude géotechnique niveau G2 AVP - GINGER CEBTP				7 674,00	7 674,00
025598 AC1	19/08/2025	FA 0035BX2P0357		7 674,00	7 674,00
A108 Géomètre			45 559,80		45 559,80
M2016-003/BDC20 BDC 20 Plan général de synthèse - ABAC-GEO AQUITAINE			5 326,03		5 326,03
008392 BDC20	15/07/2019	FA F190758	5 326,03		5 326,03
M2016-003/BDC35 BDC 35 Piquetage limite bordure ilot C7 - ABAC-GEO AQUITAINE			362,17		362,17
008391 BDC35	15/07/2019	FA F190757	362,17		362,17
M2016-003/BDC37 BDC 37 Piquetage Rue Martin Parc - ABAC-GEO AQUITAINE			181,70		181,70
008390 BDC37	15/07/2019	FA F190756	181,70		181,70
M2016-003/BDC38 BDC 38 Piquetage propriété Soleillet - ABAC-GEO AQUITAINE			135,66		135,66
008389 BDC38	15/07/2019	FA F190755	135,66		135,66
M2019-034 Lot 1/BDC3 Demande DMPC parcelle BB 1164 - MAGEO			1 721,63		1 721,63
010201 AC1 / SOLDE	29/04/2020	FA FC12958	1 721,63		1 721,63
M2019-034 Lot 1/BDC39 Géomètre: plan récolement parcelle BB1020 - MAGEO			885,10		885,10
012635 AC1	31/05/2021	FA FC15237	885,10		885,10
M2019-034 Lot 1/BDC60 Bornage BB1020, ilot 7, plan, piquetage chemin rural - MAGEO			8 952,06		8 952,06
015728 AC1	22/07/2022	FA FC17793	8 952,06		8 952,06
M2019-034 Lot 1/BDC60bis Piquetage emprise servitude canalis* EP parcelle BB1020 - MAGEO			903,74		903,74
014885 AC1	31/03/2022	FA FC17146	903,74		903,74
M2019-034 Lot1/BDC98 Plans de récolement Ilot C7 - MAGEO			2 681,61		2 681,61
017863 AC1	28/04/2023	FA FC19454	2 681,61		2 681,61
M2023-043/Lot1/BDC3 ilots C1 - C3 / parcelles BB3194 & BB3195 / relevés topo - GEOSAT			3 963,79		3 963,79
020698 SOLDE	19/04/2024	FA F24040433	3 963,79		3 963,79
M2023-043/Lot1/BDC6 ilot C3 relevé topo complémentaire - GEOSAT			1 033,36		1 033,36
022296 AC1	30/09/2024	FA F24090967	1 033,36		1 033,36
M2023-043/Lot3/BDC15 ilot C4 M2.1.2 délimitation foncière - MAGEO			4 573,68		4 573,68
020847 SOLDE	30/04/2024	FA FC21955	4 573,68		4 573,68
M2023-043/Lot3/BDC16 ilot C4 piquetage parcelle gymnase - MAGEO			1 786,66		1 786,66
023030 SOLDE	29/11/2024	FA FC23585	1 786,66		1 786,66
M2023-043/Lot3/BDC4 ilot C4 : M2.1.2 - 2.31.2.5 - MAGEO			3 905,69		3 905,69
020835 SOLDE	30/04/2024	FA FC21951	3 905,69		3 905,69
M2023-043/Lot3/BDC7 ZAC M2.7.1 & 2.7.2 contrôle plans et plan de récolement - MAGEO			1 718,92		1 718,92
020599 SOLDE	29/03/2024	FA FC21726	1 718,92		1 718,92
M2024-033 Détection et géoréférencement tous réseaux - GEOSAT			7 428,00		7 428,00
022281 AC1	30/09/2024	FA F24090910	7 428,00		7 428,00
A110 Etude et expertise juridique			6 060,53		6 060,53
M2021-001 Lot 1/BDC10 Conseil Juridique - Ligne Haute tension Pré-contentieux RTE - COUDRAY			3 969,65		3 969,65
014634 AC1	28/02/2022	FA 22-0278	3 969,65		3 969,65
M2021-001 Lot 1/BDC12 Conseil juridique - Convention Participation des constructeurs -			2 090,88		2 090,88
015881 AC1	29/06/2022	FA 202203427	2 090,88		2 090,88
A112 Autres			21 135,38	27 083,67	48 219,05
18-02137 Dimensionnement dalle Aqueduc Eysines - ARTECH			5 340,00		5 340,00
006474 AC1	25/07/2018	FA 11 393	3 828,00		3 828,00
006541 AC2	20/08/2018	FA 11 430	1 245,00		1 245,00
007398 AC3	23/10/2018	FA 11 430 BIS	267,00		267,00
M2022-007 Lot 1/BDC27 M.2 - Eligibilité d'un site de compensation potentiel > 10 ha - ENVOLIS				8 615,64	8 615,64
023853 AC1	27/02/2025	FA 25-02-3354		2 536,80	2 536,80
024106 AC2	19/03/2025	FA 25-03-3411		6 078,84	6 078,84
M2022-007 Lot 1/BDC6 AMO Missions écologiques : Etude site compensation - ENVOLIS			15 795,38	6 560,34	22 355,72
018650 AC1	08/09/2023	FA 23-09-2016	2 842,80		2 842,80
018754 AC2	21/09/2023	FA23-09-2043	4 929,17		4 929,17
022226 AC3	27/09/2024	FA 24-09-2899	4 819,60		4 819,60
022940 AC4	27/11/2024	FA 24-11-3083	3 203,81		3 203,81
023557 AC5	30/01/2025	FA 25-01-3253		2 792,58	2 792,58
023854 AC6	27/02/2025	FA 25-02-3361		507,36	507,36
025930 AC7	30/09/2025	FA 25-09-4097		1 546,08	1 546,08
026811 AC8	27/11/2025	FA 25-11-4328		1 714,32	1 714,32
M2024-063/BDC6 AMO missions écologiques - ENVOLIS				5 802,54	5 802,54
025381 AC1	29/07/2025	FA 25-07-3902		5 802,54	5 802,54
M2024-063/BDC9 MAJ DDEP et expertises complémentaires - ENVOLIS				6 105,15	6 105,15
026089 AC1	10/10/2025	FA 25-10-4122		2 978,91	2 978,91
026837 AC2	27/11/2025	FA 25-11-4329		3 126,24	3 126,24
B FONCIER			11 112 545,38	683 730,04	11 796 275,42
B101 Coût aquisition terrain			9 628 693,82	591 790,00	10 220 483,82
17-01383/1 Acquisition terrain non batis BM (ex IT Martin Parc) - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 223 050,00		1 223 050,00
17-01383/1 Provision	06/02/2017		1 248 000,00		1 248 000,00
004298 ACQ* TERRAIN NN BATIS	09/02/2017	FA 09/02/17	-24 950,00		-24 950,00
18-02141/1 Acquisition BB 2729- BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			2 100,00		2 100,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018		2 100,00		2 100,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			182 200,00		182 200,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	182 200,00		182 200,00
18-02143/1 Acquisition BB 1020 - PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			252 000,00		252 000,00
18-02143/1 Provision	03/07/2018		252 000,00		252 000,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			104 000,00		104 000,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	104 000,00		104 000,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			167 181,82		167 181,82
18-02145/1 Provision	03/07/2018		167 181,82		167 181,82
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 190,00		1 190,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	1 190,00		1 190,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			221 100,00		221 100,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	221 100,00		221 100,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			420,00		420,00
18-02149/1 Provision	03/07/2018		420,00		420,00
014234 ACQ BB 2737 GAUDNER M	25/05/2021	ACTE 25/05/21	0,00		0,00
18-02150/1 Acquisition BB 236 - GAUDNER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			700,00		700,00
18-02150/1 Provision	03/07/2018		700,00		700,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			1 610,00		1 610,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/2021372 CAB	1 610,00		1 610,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 050,00		1 050,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		1 050,00		1 050,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			173 700,00		173 700,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS	173 700,00		173 700,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 540,00		1 540,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	1 540,00		1 540,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			595,00		595,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	595,00		595,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			297,50		297,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	297,50		297,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			297,50		297,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022	297,50		297,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			62 500,00		62 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	62 500,00		62 500,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES			146 880,00		146 880,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	146 880,00		146 880,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES			38 300,00		38 300,00
013500 ACQ* BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	38 300,00		38 300,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 283 700,00		1 283 700,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	1 283 700,00		1 283 700,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 400,00		1 400,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		1 400,00		1 400,00
19-03191 Acquisition Terrain nu AA309 IMMO LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 126 000,00		3 126 000,00
009031 TRANSFERT LUPINI CF001/C0002	08/11/2019	08/11/19	3 126 000,00		3 126 000,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 932,00		1 932,00
21-04458/1 Provision	03/06/2021		1 878,33		1 878,33
014235 ACQ BB 2832 GIRONDE HABITAT	09/06/2021	ACTE 09/06/21	53,67		53,67
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 030,00		3 030,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		3 030,00		3 030,00
21-04917 Acquisition Expropriation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			66 220,00		66 220,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	33 110,00		33 110,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/212799675/9719452	33 110,00		33 110,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			114 240,00		114 240,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	114 240,00		114 240,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			878 500,00		878 500,00
22-05063 Provision	10/02/2022		878 582,45		878 582,45
22-05063 Provision	10/02/2022		-82,45		-82,45
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			2 030,00		2 030,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	2 030,00		2 030,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			536 500,00		536 500,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		536 500,00		536 500,00
22-05842/1 Acquisition BM - BB657 à 659 - BB227 - BB231 - BB252 et BB253 - BREYNE PATRICE			592 200,00		592 200,00
22-05842/1 Provision	02/12/2022		592 200,00		592 200,00
23-06127/1 Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			48 700,00		48 700,00
23-06127/1 Provision	09/03/2023		48 700,00		48 700,00
23-06128/1 Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			223 300,00		223 300,00
23-06128/1 Provision	09/03/2023		223 300,00		223 300,00
23-06165 Acquisition Expro Consignation BB 2731 GERDESSUS Gabriel - CONSIGNATION CAISSE			700,00		700,00
017640 ACQ EXPRO CONSIGNATION GERDESSUS GABRIEL	27/03/2023	BB 2731	700,00		700,00
23-06605/1 Acquisition SEMPEY BB3147 - BREYNE PATRICE (NOT)			490,00		490,00
23-06605/1 Provision	16/10/2023		490,00		490,00
23-06665 Acquisition Expro Consignation 2eme versement CA AA 502 - VAL D'ALBANT -			114 240,00		114 240,00
019202 EXPRO 2EME CC*	04/06/2024	0035/10357/212799666/971951 VAL	114 240,00		114 240,00
24-06968 Acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)			54 800,00		54 800,00
24-06968 Provision	08/02/2024		54 800,00		54 800,00
24-07146/1 Acquisition parcelles ville BB249-250-251 - BREYNE PATRICE (NOT)				352 890,00	352 890,00
24-07146/1 Provision	17/04/2024			352 890,00	352 890,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
25-08308 Acquisition BB 243 - BOS Pierre - transféré de CF001 au 1/01/25 - MELLAC DELAFRAYE				238 900,00	238 900,00
024997 ACQ BB 243 BOS TRANSFERT CF001	01/01/2025	ACTE 10/07/20		238 900,00	238 900,00
B201 Frais d'actes			115 657,99	9 002,41	124 660,40
17-01383/2 It Martin Porc : Frais d'acqu* terrain non batis BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			21 806,84		21 806,84
17-01383/2 Provision	06/02/2017		22 500,00		22 500,00
17-01383/2 Provision	06/02/2017		-400,00		-400,00
004706 FRAIS ACQ* ILOT MARTIN PORT	24/05/2017	FA 24/05/17	-293,16		-293,16
18-02141/2 Frais acquisition BB 2729 BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			314,40		314,40
18-02141/2 Provision	11/10/2022		500,00		500,00
017679 FRAIS ACQ BB 2729 BOUC	10/03/2023	FA 30/03/23	-170,60		-170,60
017680 REMB / FRAIS ACQ BOUC	13/03/2023	FA 30/03/23	-15,00		-15,00
18-02143/2 Frais acquisition PARANTEAU BB1020 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			6 069,07		6 069,07
18-02143/2 Provision	18/12/2018		200,00		200,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		6 100,00		6 100,00
18-02143/2 Provision	18/12/2018		-13,29		-13,29
008209 FRAIS ACQ* PARANTEAU BB1020	31/05/2019	FA 31/05/19	-217,64		-217,64
18-02145/2 Frais d'acquisition MEU BB 68 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 225,44		3 225,44
18-02145/2 Provision	03/07/2019		4 892,00		4 892,00
009873 FRAIS ACQ* MEU BB 68	10/02/2020	FA 10/02/20	-1 666,56		-1 666,56
18-02149/2 Frais acquisition BB 2737 GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			207,61		207,61
18-02149/2 Provision	30/04/2021		240,00		240,00
013479 FRAIS ACQ BB 2737 GAUDNER M	16/09/2021	FA 16/09/21	-32,39		-32,39
18-02150/2 Frais acquisition GAUDNER BB236 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			196,14		196,14
18-02150/2 Provision	27/09/2019		300,00		300,00
009875 FRAIS ACQ* GAUDNER BB236	18/02/2020	FA 18/02/20	-103,86		-103,86
18-02152/2 Frais de notaire SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			198,71		198,71
18-02152/2 Provision	02/01/2020		260,00		260,00
010008 FRAIS ACQ* SOLEILLET	03/03/2020	FA 03/03/20	-61,29		-61,29
18-02163/2 Frais d'acquisition BB2751 HEZER/KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			311,46		311,46
18-02163/2 Provision	15/10/2020		340,00		340,00
011961 FRAIS ACQ BB2751 HEZER/KUCUK	29/01/2021	FA 29/01/21	-28,54		-28,54
19-03189 Eysines CC : Frais acquisition Immo LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			53 302,28		53 302,28
009032 TRANSFERT LUPINI CF001/CO02	08/11/2019	08/11/19	53 302,28		53 302,28
19-03190 Eysines CC : Frais d'acquisition Immo LUPINI - ADENIS-LAMARRE (NOT)			283,42		283,42
009033 TRANSFERT LUPINI CF001/CO002	08/11/2019	08/11/19	283,42		283,42
21-04458/2 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			354,22		354,22
21-04458/2 Provision	03/06/2021		500,00		500,00
013668 FRAIS ACQ BB 2832- GIRONDE HABITAT	14/10/2021	FA 14/10/21	-145,78		-145,78
21-04460/2 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			484,32		484,32
21-04460/2 Provision	03/06/2021		600,00		600,00
013667 FRAIS ACQ BB AA 435 BMSO	14/10/2021	FA 14/10/21	-115,68		-115,68
22-05063//2 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			7 408,02		7 408,02
22-05063//2 Provision	07/02/2022		7 400,00		7 400,00
22-05063//2 Provision	07/02/2022		100,00		100,00
015095 FRAIS ACQ BB 2733 ARGILLOS	26/04/2022	FA 09/05/22	-91,98		-91,98
22-05842/2 Acquisition BM - BB657 à 659 - BB227 - BB231 - BB252 et BB253 - BREYNE PATRICE			6 735,12		6 735,12
22-05842/2 Provision	22/01/2024		7 500,00		7 500,00
020472 FRAIS ACQ BM ILOT C7	12/03/2024	FA 12/03/24	-764,88		-764,88
23-05694/2 Frais Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			6 775,37		6 775,37
23-05694/2 Provision	05/10/2022		6 786,07		6 786,07
018126 FRAIS ACQ NIETO BB258-257-678	31/05/2023	FA 31/05/23	-10,70		-10,70
23-06127/2 Frais Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			1 378,44		1 378,44
23-06127/2 Provision	07/09/2023		1 399,98		1 399,98
019137 FRAIS ACQ BEAUSOEIL BB234	27/10/2023	FA 27/10/23	-21,54		-21,54
23-06128/2 Frais Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			3 848,64		3 848,64
23-06128/2 Provision	05/05/2023		350,00		350,00
23-06128/2 Provision	05/05/2023		5 750,00		5 750,00
018427 FRAIS S/ACQ* GIANELLI BB254-255	17/07/2023	FA 17/07/23	-2 100,00		-2 100,00
018678 FRAIS DEF S/ACQ GIANELLI	07/08/2023	FA 07/08/23	-151,36		-151,36
23-06605/2 Frais acquisition Sempey BB3147 - BREYNE PATRICE (NOT)			215,61		215,61
23-06605/2 Provision	16/10/2023		250,00		250,00
019710 FRAIS ACQ SEMPEY BB3147	28/12/2023	FA 28/12/23	-34,39		-34,39
24-06849 Signification jugement Claudio Roger - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			71,44		71,44
019665 SOLDE	01/01/2024	FA B1265640	71,44		71,44
24-06850 Signification jugement Claudio née Metbach Katy - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			71,44		71,44
019666 SOLDE	01/01/2024	FA B1265639	71,44		71,44
24-06968/2 Frais acquisition PSV EYMARD BB 256 - BUGEAUD CAMPAGNE (NOT)			400,00		400,00
24-06968/2 Provision	25/06/2024		400,00		400,00
24-06968/3 Frais acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)			2 000,00	-235,31	1 764,69
24-06968/3 Provision	05/09/2024		2 000,00		2 000,00
025479 FRAIS ACQ EYMARD BB 256	07/07/2025	FA 07/07/25		-235,31	-235,31
24-07146/2 Fais Acquisition parcelles ville BB249-250-251 - BREYNE PATRICE (NOT)				5 100,00	5 100,00
24-07146/2 Provision	05/11/2025			5 100,00	5 100,00
25-08309 Frais d'acquisition BB 243 - BOS Pierre trabsféré de CF001 le 1/01/25 - MELLAC				4 137,72	4 137,72
024998 F AQC BB 243 BOS TRANSFERT DE CF001	01/01/2025	FA 03/06/21		4 137,72	4 137,72
B302 Géomètres foncier			38 453,20	8 379,29	46 832,49

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-003/BDC1 Géomètre expert lot 1 - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			5 688,00		5 688,00
003651 BDC1	30/09/2016	FA 1609-204	2 844,00		2 844,00
004022 SOLDE BDC1	14/12/2016	FA 1612-280	2 844,00		2 844,00
M2016-003/BDC13 Géomètre expert lot 1 - GEOSAT			7 935,70		7 935,70
005745 BDC13	28/11/2017	FA F174591	7 935,70		7 935,70
M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 1 Site géographique secteur nord - GEO-AQUITAINE (NE PLUS UTILISER)			3 859,20		3 859,20
004024 BDC3 AC1	14/12/2016	FA 1612-281	3 859,20		3 859,20
M2016-003/BDC36 Bornage Paranteau et Piquetage Gaudner Folloni - ABAC-GEO AQUITAINE			785,23		785,23
009341 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191228	785,23		785,23
M2016-003/BDC5 Géomètre expert lot 1 - ABAC (NE PLUS UTILISER)			134,90		134,90
004752 BDC5 GEOMETRE EXPERT LOT1	09/06/2017	FA B-17-06-425	132,00		132,00
005055 REV BDC5	28/08/2017	FA 28/08/2017	2,90		2,90
M2019-032/BDC5 Bornage et plan de cession terrain à bâtir C1 - MAGEO			696,86		696,86
009052 AC1	31/10/2019	FA FC12064	696,86		696,86
M2019-034 Lot 1/BDC100 PD Maison Nieto 28 rue MP - MAGEO			480,47		480,47
017861 AC 1	30/04/2023	FA FC19461	480,47		480,47
M2019-034 Lot 1/BDC104 Piquetage clôtures BB2729 - BB2731 - MAGEO			985,68		985,68
018068 AC1	31/05/2023	FA FC19697	985,68		985,68
M2019-034 Lot 1/BDC125 Piquetage AA479 - MAGEO			1 035,22		1 035,22
019084 SOLDE	30/10/2023	FA FC20601	1 035,22		1 035,22
M2019-034 Lot 1/BDC23 Levé surfacique allée de l'Europe et du Taillan Médoc - MAGEO			3 298,93		3 298,93
011659 BDC 23	01/01/2021	FA FC14315	3 298,93		3 298,93
M2019-034 Lot 1/BDC67 DMPC EP rue MP - MAGEO			4 379,79		4 379,79
017699 AC1	31/03/2023	FA FC19316	4 379,79		4 379,79
M2019-034 Lot 1/BDC71 Bornage parcelles Fab + 1 partie du chemin rural ilot C7 - MAGEO			924,76		924,76
016563 AC 1	31/10/2022	FA FC18398	924,76		924,76
M2019-034 Lot 1/BDC78 Géomètre : Piquetage Rue M-porc/Clotures - MAGEO			1 559,11		1 559,11
015721 AC1	22/07/2022	FA FC17803	1 559,11		1 559,11
M2019-034 Lot 1/BDC81 Piquetage et DA emprise Seympé - MAGEO			1 543,64		1 543,64
016578 AC 1	31/10/2022	FA FC18399	720,71		720,71
017434 AC2	28/02/2023	FA FC19085	822,93		822,93
M2021-077/BDC10 Diags avant vente BB254-255 - AED EXPERTISES			159,41		159,41
017733 AC1	05/04/2023	FA FA-239436	159,41		159,41
M2021-077/BDC11 Diags avant vente BB234 - AED EXPERTISES			108,89		108,89
018529 AC1 SOLDE	22/08/2023	FA01095306	108,89		108,89
M2021-077/BDC13 Diags avant démol Nieto 28 rue MP - AED EXPERTISES			3 319,92		3 319,92
018744 SOLDE	19/09/2023	FAFA01096881	3 319,92		3 319,92
M2021-077/BDC13 Bis Compléments diag avant démol 28 rue MP - AED EXPERTISES			394,63		394,63
018960 SOLDE	19/09/2023	FA01096881	394,63		394,63
M2021-077/BDC13 ter Diagnostics amiante complémentaire 28 rue Martin Porc - AED				212,06	212,06
024931 SOLDE	10/06/2025	FA FA01147605		212,06	212,06
M2021-077/BDC2 Diagnostics ancien garage avant démol - AED EXPERTISES			590,38		590,38
015924 AC1	26/08/2022	FA FA-228282	500,09		500,09
017683 AC2	30/03/2023	FA FA-239024	90,29		90,29
023606 SOLDE	01/01/2025	FA FA-239024		89,46	89,46
024224 REGUL DOUBLON SAISIE	18/03/2025	FA 239024		-89,46	-89,46
M2021-077/BDC25 Diags avant vente terrain Sempey - AED EXPERTISES			109,52		109,52
019168 SOLDE	31/10/2023	FA01099781	109,52		109,52
M2021-077/BDC34 Diagnostics avant vente BB256 - AED EXPERTISES			110,35		110,35
020675 SOLDE	18/04/2024	FA FA01111721	110,35		110,35
M2021-077/BDC8 Diag avant vente, assainissement 28 rue MP - AED EXPERTISES			352,61		352,61
017601 AC1	23/02/2023	FA-236504	352,61		352,61
M2023-043 Lot 3/BDC30 DMPC gymnase - bornage ilot C4 - MAGEO				1 833,09	1 833,09
025113 SOLDE	30/06/2025	FA FC25014		1 833,09	1 833,09
M2023-043 Lot 3/BDC30-1 DA complémentaire parcelle BB 2533 Ilot C4 Gymnase - MAGEO				146,16	146,16
025106 SOLDE	30/06/2025	FA FC25000		146,16	146,16
M2023-043 Lot 3/BDC32 Plan récolement général - MAGEO				685,86	685,86
023990 AC1	28/02/2025	FA FC24194		685,86	685,86
M2023-043 Lot 3/BDC35 Bornage gymnase Ilot C4 - MAGEO				850,92	850,92
025265 SOLDE	17/07/2025	FA FC23153		850,92	850,92
M2023-043 Lot 3/BDC41 Complément levés topo EP ilot C4 - MAGEO				4 651,20	4 651,20
025991 SOLDE	30/09/2025	FA FC25652		4 651,20	4 651,20
B303 Expertises foncières			4 239,92		4 239,92
18-02275 Recherches Généalogiques - DELFAUT - ETUDE GENEALOGIQUE PEROTIN			2 000,00		2 000,00
007529 ETUDE GENEALOGIQUE DELFAUT	01/02/2019	FA 795	2 000,00		2 000,00
M2019-032/BDC1 Document d'arpentage et plan de cession - MAGEO			2 239,92		2 239,92
010202 AC1/SOLDE	29/04/2020	FA FC12959	2 488,80		2 488,80
010298 AVOIR S/AC1	31/05/2020	AV 13100	-248,88		-248,88
B401 Indemnités de remploi			461 102,18	24 890,00	485 992,18
18-02141/1 Acquisition BB 2729- BOUC - BREYNE PATRICE (NOT)			420,00		420,00
18-02141/1 Provision	03/07/2018		420,00		420,00
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			19 220,00		19 220,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	19 220,00		19 220,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			11 400,00		11 400,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	11 400,00		11 400,00
18-02145/1 Acquisition BB 68 - MEU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			17 718,18		17 718,18

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
18-02145/1 Provision	03/07/2018		17 718,18		17 718,18
18-02146/1 Acquisition BB 237 - MARTIN - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			238,00		238,00
015007 ACQ BB 237 - MARTIN	10/03/2022	FA 10/03/2022	238,00		238,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			23 110,00		23 110,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	23 110,00		23 110,00
18-02149/1 Acquisition BB 2737 - GAUDNER M - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			84,00		84,00
18-02149/1 Provision	03/07/2018		84,00		84,00
014234 ACQ BB 2737 GAUDNER M	25/05/2021	ACTE 25/05/21	-0,00		-0,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			322,00		322,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/2021372 CAB	322,00		322,00
18-02152/1 Acquisition BB 119 / BB 120 / BB 121 - SOLEILLET - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			210,00		210,00
18-02152/1 Provision	03/07/2018		210,00		210,00
18-02153/1 Acquisition Expropriation BB 681 - ARENAS - CARPA BORDEAUX			18 370,00		18 370,00
013885 EXPRO BB 681 ARENAS	07/12/2021	212819476/ARENAS	18 370,00		18 370,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			380,00		380,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	380,00		380,00
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			119,00		119,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	119,00		119,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			59,50		59,50
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	59,50		59,50
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			59,50		59,50
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022	59,50		59,50
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			7 250,00		7 250,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	7 250,00		7 250,00
18-02159/1 Acquisition Expro Consignation BB 682 - EL LAHIANI - CONSIGNATION CAISSE DES			10 688,00		10 688,00
013982 EXPRO CONSIGNATION BB 682 EL LAHIANI	07/12/2021	FA 7/12/21	10 688,00		10 688,00
18-02159/2 Acquisition Expro Complément Remploi BB 682 - EL LAHIANI Abdolkader - EL-			2 500,00		2 500,00
017092 COMP EMPLOI BB 682	18/01/2023	JUG 27/05/21	2 500,00		2 500,00
18-02159/3 Acquisition Expro Complément Remploi BB 682 - EL LAHIANI Djouher - EL-LAHIANI			2 500,00		2 500,00
017098 COMP EMPLOI BB 682	18/01/2023	JUG 27/05/21	2 500,00		2 500,00
18-02161/1 Consignation/Expropriation BB 229 - Décès DELFAUT - CONSIGNATION CAISSE DES			4 830,00		4 830,00
013500 ACQ [°] BB229 DECES DELFAUT	27/09/2021	FA 27/09/21	4 830,00		4 830,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			129 370,00		129 370,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	129 370,00		129 370,00
18-02163/1 Acquisition BB 2751 - HEZER/ KUCUK - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			280,00		280,00
18-02163/1 Provision	03/07/2018		280,00		280,00
21-04458/1 Acquisition BB 2832- GIRONDE HABITAT - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			322,00		322,00
21-04458/1 Provision	03/06/2021		375,67		375,67
014235 ACQ BB 2832 GIRONDE HABITAT	09/06/2021	ACTE 09/06/21	-53,67		-53,67
21-04460/1 Acquisition BB AA 435- BMSO - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			606,00		606,00
21-04460/1 Provision	03/06/2021		606,00		606,00
21-04917 Acquisition Exporiation AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			7 622,00		7 622,00
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	4 311,00		4 311,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/212799675/9719452	3 311,00		3 311,00
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			12 424,00		12 424,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	12 424,00		12 424,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			88 850,00		88 850,00
22-05063 Provision	10/02/2022		88 858,34		88 858,34
22-05063 Provision	10/02/2022		-8,34		-8,34
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			406,00		406,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	406,00		406,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			57 000,00		57 000,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		57 000,00		57 000,00
23-06127/1 Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			5 870,00		5 870,00
23-06127/1 Provision	09/03/2023		5 870,00		5 870,00
23-06128/1 Acquisition BB254-255 rue Martin Porc- Gianelli - BREYNE PATRICE (NOT)			23 330,00		23 330,00
23-06128/1 Provision	09/03/2023		23 330,00		23 330,00
23-06165 Acquisition Expro Consignation BB 2731 GERDESSUS Gabriel - CONSIGNATION CAISSE			140,00		140,00
017640 ACQ EXPRO CONSIGNATION GERDESSUS GABRIEL	27/03/2023	BB 2731	140,00		140,00
23-06665 Acquisition Expro Consignation 2eme versement CA AA 502 - VAL D'ALBANT -			8 924,00		8 924,00
019202 EXPRO 2EME CC [°]	04/06/2024	0035/10357/212799666/971951 VAL	8 924,00		8 924,00
24-06968 Acquisition EYMARD BB 256 - BREYNE PATRICE (NOT)			6 480,00		6 480,00
24-06968 Provision	08/02/2024		6 480,00		6 480,00
25-08308 Acquisition BB 243 - BOS Pierre - transféré de CF001 au 1/01/25 - MELLAC DELAFRAYE				24 890,00	24 890,00
024997 ACQ BB 243 BOS TRANSFERT CF001	01/01/2025	ACTE 10/07/20		24 890,00	24 890,00
B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers..)			169 382,20		169 382,20
18-02142/1 Acquisition Expro Consignation BB 2533 - BANEY - CONSIGNATION CAISSE DES			1 500,00		1 500,00
013892 EXPRO CONSIGNATION BB 2533 - BANEY	07/12/2021	FA 07/12/2021	1 500,00		1 500,00
18-02144/1 Acquisition Expropriation BB 226 / BB 232 - BARON - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013886 EXPRO BB 226 / BB 232 BARON	07/12/2021	212807174/19077642	1 500,00		1 500,00
18-02148/1 Acquisition Expropriation BB 1032 / BB 233 - LECHENNE - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013889 EXPRO BB 1032 / BB 233 LECHENNE	07/12/2021	212807165/19011642	1 500,00		1 500,00
18-02151/1 Acquisition Expropriation BB 2739 / BB 2741 - GERDESSUS Gilbert - CARPA			4 900,00		4 900,00
014945 EXPRO GERDESSUS GILBERT BB2739/BB2741	15/04/2022	FA 0035/11901/222869841/2021372 CAB	4 900,00		4 900,00
18-02155/1 Acquisition Expropriation BB 2735- CLAUDIO - CARPA BORDEAUX			1 200,00		1 200,00
013883 EXPRO BB2735 CLAUDIO	07/12/2021	212803534/0007803	1 200,00		1 200,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
18-02157/1 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Dominique - LASSEP DOMINIQUE			400,00		400,00
017089 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	400,00		400,00
18-02157/2 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Jonathan - LASSEP JONATHAN			200,00		200,00
017090 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/22	200,00		200,00
18-02157/3 Acquisition Expropriation BB 2744 - LASSEP Etienne - LASSEP ETIENNE			200,00		200,00
017091 ACQ EXPRO BB 2744	18/01/2023	JUG 14/04/2022	200,00		200,00
18-02158/1 Acquisition Expropriation BB 230 - DUROUSSEAU/ DUGRAVA - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013887 EXPRO BB 230 - DUROUSSEAU	07/12/2021	212807156/19011642	1 500,00		1 500,00
18-02162/1 Acquisition Expropriation BB 2318/ BB 2 - EYQUEM/ NADAL - CARPA BORDEAUX			1 500,00		1 500,00
013888 EXPRO BB 2318/ BB 2 EYQUEM/ NADAL	07/12/2021	212809143/EYQUEM	1 500,00		1 500,00
21-04917 Acquisition Expropration AA 425-500- SAINT MARC - CARPA BORDEAUX			7 347,20		7 347,20
013884 EXPRO AA 425-500 SAINT MARC	07/12/2021	212799675/9719452	1 500,00		1 500,00
019205 EXPRO AA425-500 ST MARC	22/09/2023	0035/10357/212799675/9719452	5 847,20		5 847,20
21-04919 Acquisition Expro Consignation AA 502 - VAL D'ALBANT - CONSIGNATION CAISSE DES			1 500,00		1 500,00
013891 EXPRO CONSIGNATION AA 502 VAL D'ALBANT	07/12/2021	FA 07/12/21	1 500,00		1 500,00
22-05063 Acquisition Expropriation BB 2733 ARGILLOS - BREYNE PATRICE (NOT)			98 135,00		98 135,00
22-05063 Provision	10/02/2022		98 144,21		98 144,21
22-05063 Provision	10/02/2022		-9,21		-9,21
22-05262 Acquisition Expro Consignation BB 2727 GERDESSUS Gilbert - CONSIGNATION CAISSE			500,00		500,00
014946 EXPRO CONSIGNATION BB 2727 GERDESSUS Gilbert	15/04/2022	FA 15/04/22	500,00		500,00
22-05694/1 Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			36 500,00		36 500,00
22-05694/1 Provision	05/10/2022		36 500,00		36 500,00
23-06666 Indemnité art.700 CA CCASS Val d'Albant - CARPA BORDEAUX			5 500,00		5 500,00
019203 INDEM 700 CCASS VAL DALBANT	14/11/2023	0035/10357/212799666/9719451	5 500,00		5 500,00
24-07251 Indemnité art.700 CA CCASS 2ème versement Val d'Albant - CARPA BORDEAUX			5 500,00		5 500,00
021082 INDEM ART 700 CA CCASS 2EME VERSEMENT VAL D'ALBANT	04/06/2024	04/06/2024	5 500,00		5 500,00
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			97 256,20	3 429,60	100 685,80
2023-009 Débroussaillage MP - BRETTE ENVIRONNEMENT			2 700,00		2 700,00
017490 AC1	03/03/2023	FA E2303003	2 700,00		2 700,00
2024-045 Défrichage ilot C4 avant mission piquetage gymnase - BRETTE ENVIRONNEMENT			3 696,00		3 696,00
022780 SOLDE	31/10/2024	FA E2410207	3 696,00		3 696,00
22-05383 Sécurisation par barrières Heras Al. des Peupliers - COLAS SO/SCREG			11 378,40		11 378,40
015565 AC1	22/06/2022	FA 14000RI22022365	11 378,40		11 378,40
22-05879 Renfort barrierae Allée des Peupliers - CAUPAMAT			3 923,18		3 923,18
017162 AC1	23/01/2023	FA B0010002/D22	3 923,18		3 923,18
23-06139 Sécurisation du 28 rue martin porc et à l'entrée du chemin des gleyzes à Eysines -			1 764,00		1 764,00
017616 AC1	15/03/2023	FA FA4341	1 764,00		1 764,00
23-06258 Nettoyage du terrain 28 rue MP - RECYCLEXPRT			3 072,00		3 072,00
018043 AC1	30/05/2023	FA 1443	3 072,00		3 072,00
23-06286 Abattage arbre sur fil électrique Ilot C4 - BRETTE ENVIRONNEMENT			1 092,00		1 092,00
019070 SOLDE	31/05/2023	FA E2305166	1 092,00		1 092,00
24-07437 Abattage d'un sureau en pied d'un poteau électrique - 28 rue Martin Porc - BRETTE			211,20		211,20
022211 AC1	26/09/2024	FA E2409028	211,20		211,20
25-051 Entretien EV le long muret 266 av Taillan - ARCINS ENTREPRISE				1 077,60	1 077,60
025857 SOLDE	23/09/2025	FA VTP25028		1 077,60	1 077,60
25-074 Entretien espaces verts parcelle AA479 - ARCINS ENTREPRISE				2 352,00	2 352,00
026774 SOLDE	24/11/2025	FA VTP25037		2 352,00	2 352,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Nettoyage et évacuation déchets terrains BM - AQUITANIS			28 320,26		28 320,26
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		30 000,00		30 000,00
M2016-001 Lot 2/BDC 07 Avance	19/05/2017		3 000,00		3 000,00
005515 CHANGT AFFECT*	31/10/2017	31/10/17	1 016,38		1 016,38
005556 BDC 7 TPS 11/17	11/12/2017	FA 2017/39	129,04		129,04
006797 BDC 7 - GENIER-DEFORGE	01/01/2018	FA 2016080021			
006799 BDC 7 - AC ENVIRONNEMENT	01/01/2018	FA BFP002205			
006800 BDC 7 - GENIER DEFORGE	01/01/2018	FA 2016080021	-5 825,16		-5 825,16
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Diag termites IMMO LUPINI - AQUITANIS			466,61		466,61
M2016-001 Lot 2/BDC 11 Avance	20/10/2017		144,00		144,00
005516 CHANGT AFFECT*	08/11/2017	08/11/17	193,57		193,57
005557 BDC 11 TPS 11/2017	11/12/2017	FA 2017/40	129,04		129,04
007418 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118			
M2016-001 Lot 2/BDC 13 ZAC Eysines CC - Diag et démol dalle béton LUPINI - AQUITANIS			13 112,72		13 112,72
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		240,00		240,00
M2016-001 Lot 2/BDC 13 Avance	05/12/2017		12 143,76		12 143,76
005558 GESTION TEMPS PASSE	11/12/2017	FA 2017/41	258,10		258,10
005638 BDC13 TPS 12/17	04/01/2018	FA 2017/44	258,09		258,09
005844 BDC 13 TPS 01/18	12/02/2018	FA 2018/03	193,57		193,57
007419 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118	19,20		19,20
007730 GESTION TERRAIN 2018	01/01/2019	FA 010119			
M2021-046 Lot 1/BDC26 Vidéosurveillance 28 rue MP 6 mois - VPSITEX			1 043,69		1 043,69
020111 AC1 SOLDE	19/02/2024	FA SEF102423357	1 043,69		1 043,69
M2021-046 Lot 1/BDC39 Videosurveillance 28 rue MP 08/23 à 02/24 - VPSITEX			952,14		952,14
020141 AC1	14/02/2024	FA SEF102423180	952,14		952,14
M2022-033 Débarras dépôt sauvage Allée des Peupliers - RECYCLEXPRT			21 684,00		21 684,00
015419 AC1	21/06/2022	FA 000871	21 684,00		21 684,00
M2023-051 Fauchage C7 avt diag archéo - BERDOT			3 840,00		3 840,00
019486 AC1 SOLDE	27/11/2023	FA 356	3 840,00		3 840,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
B502 Gardiennage			16 225,80	919,47	17 145,27
M2021-046 Lot 1/BDC39bis Location vidéosurveillance 2 mois au 28 rue MP - VPSITEX			290,52		290,52
020262 AC1	29/02/2024	FA SEF102426057	145,26		145,26
020875 AC2	23/04/2024	FA SEF102440332	145,26		145,26
M2021-046 Lot 1/BDC39ter Prolongation vidéosurveillance 28 rue MP mi avr-mi juin 2024 -			290,53		290,53
021191 AC1	31/05/2024	FA SEF102454277	290,53		290,53
M2021-046 Lot 2/BDC7 Rondes Allée des Peupliers - 01/06 au 27/06/22 - PROTEXIO/DRAKKAR			2 073,60		2 073,60
016957 AC1	01/01/2023	JUIN-22-6306	2 073,60		2 073,60
M2021-046 Lot 2/BDC7bis Gardiennage Allée des Peupliers - 01/06 au 02/06/2022 -			520,66		520,66
016954 AC1	01/01/2023	FA JUIN-22-6302	520,66		520,66
M2021-084/BDC15 Rondes C4 01/07 au 08/09/23 - PROTEXIO/DRAKKAR			1 349,38		1 349,38
018657 SOLDE	08/09/2023	FA AOUT-23-7072	1 349,38		1 349,38
M2021-084/BDC2 Rondes Allée des Peupliers 07.22 à 01.23 - PROTEXIO/DRAKKAR			6 758,40		6 758,40
016967 AC1	01/01/2023	FA NOV-22-6591	6 758,40		6 758,40
M2021-084/BDC23 Gardiennage maison 28 rue MP - PROTEXIO/DRAKKAR			3 973,81		3 973,81
018756 AC1 SOLDE	30/08/2023	FAAOUT-23-7041	3 973,81		3 973,81
M2024-002/BDC11-1 Loc alarme 28 rue MP 09 au 30/06/24 - VPSITEX			124,08		124,08
021895 AC1	13/08/2024	FA SEF102472668	124,08		124,08
M2024-002/BDC11-2 Loc alarme 28 rue MP 07/24 à 12/24 - VPSITEX			844,82	169,20	1 014,02
021897 AC1	13/08/2024	FA SEF102472669	169,20		169,20
022041 AC2	31/08/2024	FA SEF102475995	169,20		169,20
022330 AC3	30/09/2024	FA SEF102483463	169,71		169,71
022690 AC4	31/10/2024	FA SEF102494507	168,69		168,69
023094 AC5	30/11/2024	FA SEF102502500	168,02		168,02
023364 SOLDE	01/01/2025	FA SEF102512779		169,20	169,20
M2024-002/BDC11-3 Loc alarme 28 rue MP 01-04/25 - VPSITEX				676,80	676,80
023669 AC1	29/01/2025	FA SEF102516492	169,20		169,20
023980 AC2	28/02/2025	FA SEF102524395		169,20	169,20
024282 AC3	31/03/2025	FA SEF102537192		169,20	169,20
024593 SOLDE	30/04/2025	FA SEF102540044		169,20	169,20
M2024-002/BDC11-4 PROLONGATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE (3 DETECTEUR) - VPSITEX				73,47	73,47
024884 SOLDE	31/05/2025	FA SEF102549073		73,47	73,47
B503 Impots Foncier			2 630,45	1 341,60	3 972,05
18-02143/3 Taxe fonciere PARANTEAU - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			13,29		13,29
18-02143/3 Provision	15/04/2019		13,29		13,29
18-02324 TF 2018 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			20,00		20,00
006744 TF 2018 VOIRIES RUE M.PORC	10/08/2018	T 18 33 4315231	20,00		20,00
18-02324/1 TF 2019 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
008775 TF 2019 VOIRIES RUE M.PORC	31/08/2019	T 1933431742295	21,00		21,00
20-03916 Taxe foncière 2020 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
011101 TF 2020 TERRAINS BM	31/08/2020	T 2033432271902	21,00		21,00
21-04726 Taxe foncière 2021 terrains non bâtis BM - TRESOR PUBLIC (TF)			38,00		38,00
013246 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33 4327853 72	21,00		21,00
013272 TF 2021	13/08/2021	TITRE 21 33 4327843 82	17,00		17,00
22-05629 Taxe foncière 2022 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			18,00		18,00
015985 TF 2022	31/08/2022	AV 22 33 4333449 68	18,00		18,00
22-05734 Taxe foncière 2022 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			21,00		21,00
016280 TF22	31/08/2022	TITRE 22 33 4333459 58	21,00		21,00
23-05694/2 Frais Acquisition BB258-257-678 INDIVI NIETO - BREYNE PATRICE (NOT)			713,93		713,93
23-05694/2 Provision	05/10/2022		713,93		713,93
23-06127/2 Frais Acquisition BB234 rue Martin Porc-Beausoleil - BREYNE PATRICE (NOT)			1,23		1,23
23-06127/2 Provision	07/09/2023		1,25		1,25
019137 FRAIS ACQ.BEAUSOEIL BB234	27/10/2023	FA 27/10/23	-0,02		-0,02
23-06526 Taxe foncière 2023 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			23,00		23,00
018684 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33 4331614 26	23,00		23,00
23-06532 Taxe foncière 2023 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			19,00		19,00
018632 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	FA 23 33 4331604 36	19,00		19,00
24-07428 Taxe foncière 2024 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)			64,00	-16,00	48,00
022036 SOLDE	12/08/2024	FA 24 33 4343346 94	64,00		64,00
023656 DEGREV TF 2024	15/01/2025	FA 2433434334694		-16,00	-16,00
24-07445 Taxe foncière 2024 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)			25,00		25,00
022105 SOLDE	12/08/2024	FA 24 33 4343356 84	25,00		25,00
24-07597 Taxe foncière 2024 N° PROP 28 rue Martin Porc - TRESOR PUBLIC (TF)			820,00		820,00
022603 TAXE FONCIERE 2024	17/10/2024	FA 24 33 6511139 57	820,00		820,00
24-07598 Taxe foncière 2023 N° PROP 28 rue Martin Porc - TRESOR PUBLIC (TF)			787,00		787,00
022604 TAXE FONCIERE 2023	17/10/2024	FA 24 33 6507762 39	787,00		787,00
24-07599 Taxe foncière 2023 N° PROP 162 + 01465 - TRESOR PUBLIC (TF)			25,00		25,00
022605 TAXE FONCIERE 2023	17/10/2024	FA 24 33 6507745 56	25,00		25,00
25-08527 Taxe foncière 2025 (162 + 01408 J) - TRESOR PUBLIC (TF)				854,60	854,60
025760 SOLDE-RUE MARTIN PORC	11/08/2025	FA 25 33 4347178 11		854,60	854,60
25-08532 Taxe foncière 2025 N° PROP 162 + 01425 J - TRESOR PUBLIC (TF)				25,00	25,00
025792 SOLDE	11/08/2025	FA 25 33 4347188 01		25,00	25,00
25-08633 Taxe sur logts vacants 2025 28 rue martin porc - TRESOR PUBLIC (TF)				478,00	478,00
026660 SOLDE	03/11/2025	FA 25 33 8806248 31		478,00	478,00
B601 Assistance Juridique			117 560,96		117 560,96
19-02783 PV constat parcelle BB1020 Paranteau - CASIMIRO (HUISSIER)			219,99		219,99

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
007944 PV CONSTAT BB1020	15/04/2019	FA 55626	219,99		219,99
21-04102 Signif notif EP Scherer So - CASIMIRO (HUISSIER)			119,40		119,40
011869 AC1	19/01/2021	FA 66 696	119,40		119,40
21-04819 Signif en Allemagne dossier Baron - NEDELLEC			300,00		300,00
013903 AC1	14/10/2021	FA 0695.C079152	300,00		300,00
21-04896 PV constat PD 8 rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00		390,00
013785 09-11/21	24/11/2021	FA 72 258	390,00		390,00
21-04897 Signif jgt indem. expro. LECHENNE/DOUMERET - CASIMIRO (HUISSIER)			165,96		165,96
013763 10/21	02/11/2021	FA 71 774	165,96		165,96
21-04899 Signif + Acte CE dossier BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			403,35		403,35
013701 06/20	09/11/2021	FA 71 939	403,35		403,35
21-04951 Signif jgt indem. expro SCHERER + EL LAHIANI - CASIMIRO (HUISSIER)			1 036,54		1 036,54
014302 AC1	10/01/2022	FA 73081	963,71		963,71
016476 AC2	11/04/2022	FA 74648	72,83		72,83
22-05000 Signif jgt indem. expro Delfaut - CASIMIRO (HUISSIER)			131,92		131,92
014024 SIG JGT INDEMN EXPRO DELFAUT	01/01/2022	FA 72501	131,92		131,92
22-05001 Signif jgt indem. expro Chaigneau/Bouc - CASIMIRO (HUISSIER)			636,64		636,64
014036 SIG JGT INDEMN EXPRO CHAIG/BOUC	01/01/2022	FA 72219	493,48		493,48
014985 AC2	01/01/2022	FA 72 740	143,16		143,16
22-05002 Significations MARTIN-SCHERER - CASIMIRO (HUISSIER)			427,28		427,28
014049 SIGNIFICATION MARTIN/SCHERER	01/01/2022	FA 72026	427,28		427,28
22-05154 Signif + jugt + indemn expro GERDESSUS - CASIMIRO (HUISSIER)			558,19		558,19
014525 AC1	21/02/2022	FA 73 926	145,66		145,66
016299 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO GERDESSUS	13/10/2022	FA 75 619	250,79		250,79
016308 SIGNIF 15/04/22 GERDESSUS	13/10/2022	FA 74 768	119,55		119,55
016309 SIGNIF JGT GERDESSUS AOGPE	10/10/2022	FA 74 766	42,19		42,19
22-05427 Notif enquête parcel GERDESSUS + CHAIGNEAU - CASIMIRO (HUISSIER)			145,66		145,66
015146 AC1	03/05/2022	FA 75 233	145,66		145,66
22-05428 Signif de jgt LASSEP J - CASIMIRO (HUISSIER)			288,97		288,97
015149 AC1	13/05/2022	FA 75 435	288,97		288,97
22-05430 Signif jgt indemn expro MARTIN D - CASIMIRO (HUISSIER)			290,63		290,63
014980 AC1	04/04/2022	FA 74 562	290,63		290,63
22-05556 Signif jugt indem expro BARON - CASIMIRO (HUISSIER)			123,92		123,92
015815 AC1	01/01/2022	FA 71 645	123,92		123,92
22-05557 Signif jugt indem expro EYQUEM - CASIMIRO (HUISSIER)			163,76		163,76
015814 AC1	01/01/2022	FA 71 621	163,76		163,76
22-05561 Signification 2024 - PROVOST-TEGUI			114,14		114,14
015813 AC1	01/01/2022	FA 21066	70,48		70,48
021649 AC2	22/04/2024	FA 72165	43,66		43,66
22-05704 PV constat + Signif GDV Allée des peupliers - CASIMIRO (HUISSIER)			1 600,42		1 600,42
016555 AC1	01/07/2022	FA 75 740	1 222,42		1 222,42
016557 AC2	19/05/2022	FA 75 518	378,00		378,00
22-05705 PV constat réseaux Enedis Rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			270,00		270,00
016559 AC1	30/05/2022	FA 75 658	270,00		270,00
23-06044 Sig ord expro cessib Gerdessus KV - CASIMIRO (HUISSIER)			218,49		218,49
017328 AC1	10/02/2023	FA 80 247	218,49		218,49
23-06053 Constat voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUISSIER)			390,00		390,00
017361 SOLDE	14/02/2023	FA 80 312	390,00		390,00
23-06142 Constat n°2 voirie Allée de l'Europe - CASIMIRO (HUISSIER)			270,00		270,00
017858 AC1	02/05/2023	FA 81 967	270,00		270,00
23-06416 PV constat squat caravanes sur C4 - CASIMIRO (HUISSIER)			378,00		378,00
018260 83216	05/07/2023	FA83216	378,00		378,00
23-06700 Affichage PD 28 rue Martin Porc - CASIMIRO (HUISSIER)			342,00		342,00
019445 AC1 SOLDE	09/10/2023	FA 84895	342,00		342,00
24-07167 Signification décision CA 2024 - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			709,51		709,51
020767 SOLDE	26/04/2024	FA B1282438	143,10		143,10
021249 AC1	14/05/2024	FA B1287620	216,54		216,54
021594 AC2	10/07/2024	FA B1292278	73,18		73,18
021639 AC3	04/07/2024	FA B1291487	276,69		276,69
M2013-022/BDC8 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action foncière - FIDAL			1 620,00		1 620,00
005764 BDC 8	31/01/2018	FA 140FID18006928	1 620,00		1 620,00
M2016-009 AMO Constitution dossier DUP - SCET			10 200,00		10 200,00
004055 DOSSIER DUP 12/16	30/12/2016	FA F16-12-P01361	10 200,00		10 200,00
M2016-039/BDC11 Procédure devant juge de l'expro - ADALTYS (ADAMAS)			23 500,92		23 500,92
011358 BDC11 AC1	30/10/2020	FA PB 20 46 473	2 039,70		2 039,70
011617 BDC 11 AC2	01/01/2021	FA PB 20 46 574	270,36		270,36
011992 BDC 11 AC3	29/01/2021	FA AB 21 46 062	5 714,65		5 714,65
012159 BDC11 AC4	26/02/2021	FA AB 21 46 118	7 310,74		7 310,74
012309 BDC11 AC5	29/03/2021	FA AB 21 46 173	1 833,96		1 833,96
012862 BDC11 AC6	30/04/2021	FA AB 21 46 240	3 839,71		3 839,71
012863 BDC11 AC7	31/05/2021	FA AB 21 46 296	479,26		479,26
013188 BDC11 AC08	30/08/2021	FA 21 46 454	116,64		116,64
013200 BDC11 AC09	28/07/2021	FA AB 21 46 410	882,84		882,84
013426 BDC11 AC10	30/09/2021	FA 21 46 517	479,26		479,26
013859 BDC11 AC11	17/11/2021	FA 21 46 631	294,17		294,17
014310 BDC 11 AC12	19/01/2022	FA 2246009	239,63		239,63

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
014311 BDC 11 AC13	01/01/2022	FA 2146517	479,26		479,26
014674 REGUL BDC 11 AC13 (DOUBLON)	02/03/2022	FA 2146517	-479,26		-479,26
M2016-039/BDC12 BDC12 Procédure devant le juge de l'expropriation - tenement LASSEP -			2 060,61		2 060,61
011865 AC1	01/01/2021	FA PB 20 46 608	1 198,14		1 198,14
012311 AC2	29/03/2021	FA AB 21 46 171	349,91		349,91
013857 AC3	18/11/2021	FA 21 46 633	272,93		272,93
014516 AC4	10/02/2022	FA 22 46 047	239,63		239,63
M2016-039/BDC14 BDC14 Procédure devant juge de l'expro MARTIN - ADALTYS (ADAMAS)			2 247,15		2 247,15
012310 AC1	29/03/2021	FA AB 21 46 172	1 721,27		1 721,27
013858 AC2	18/11/2021	FA 21 46 632	286,25		286,25
014309 AC3	19/01/2022	FA 2246010	239,63		239,63
M2016-039/BDC15 Procédure devant juge de l'expro (complément) - ADALTYS (ADAMAS)			1 967,47		1 967,47
012308 BDC15	29/03/2021	FA AB 21 46 174	1 967,47		1 967,47
M2016-039/BDC5 Expertise juridique mémoires d'expro 25 tènements fonciers - ADALTYS			10 033,92		10 033,92
009439 BDC 5- AC 1	01/01/2020	FA PB1946594	10 033,92		10 033,92
M2016-039/BDC7 BDC7 Consultation droit de préemption - ADALTYS (ADAMAS)			794,56		794,56
010119 BDC7 CONSULTATION DROIT DE PREEMPTION	14/04/2020	FA PB 20 46 167	786,24		786,24
010825 BDC7	31/08/2020	REGUL REV 2020	8,32		8,32
M2016-039/BDC9 Expertise juridique raccordement réseau EP - ADALTYS (ADAMAS)			1 123,20		1 123,20
010548 BDC 9- AC 1	29/06/2020	FA PB2046264	786,24		786,24
011565 BDC 9	01/01/2021	FA PB 20 46 567	336,96		336,96
M2021-001 Lot 2/BDC7-1 Dossier Bouc/Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio - THOME			2 599,78		2 599,78
013397 AC1	30/09/2021	FA 21-1239	2 599,78		2 599,78
M2021-001 Lot 2/BDC7-10 Appel Lassep - THOME HEITZMANN			3 543,41		3 543,41
016709 AC 1	30/11/2022	FA 22-2036	2 368,15		2 368,15
020187 SOLDE	29/02/2024	FA 24-2884	1 175,26		1 175,26
M2021-001 Lot 2/BDC7-10bis Frais postulation Lassep - THOME HEITZMANN			683,06		683,06
016443 AC 1	28/10/2022	FA 22-1988	683,06		683,06
M2021-001 Lot 2/BDC7-11 Suivi cassation val d'albant st marc - THOME HEITZMANN			763,92		763,92
016708 AC 1	30/11/2022	FA 22-2035	763,92		763,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-12 Suivi audience CA - THOME HEITZMANN			2 350,30		2 350,30
016178 AC1	29/09/2022	FA 22-1920	2 350,30		2 350,30
M2021-001 Lot 2/BDC7-13 Suivi dossiers Val d'Alb-St Marc-Gerdessus - THOME HEITZMANN			1 002,65		1 002,65
016885 AC 1	01/01/2023	FA 22-2077	1 002,65		1 002,65
M2021-001 Lot 2/BDC7-14 Appel Lassep et suivi dossiers Arenas-Gerdessus - THOME			1 075,54		1 075,54
017390 AC1	22/02/2023	FA 23-2201	1 075,54		1 075,54
M2021-001 Lot 2/BDC7-1bis Honoraires postulation Val d'Alban/St Marc/Lahinani/Claudio -			1 680,00		1 680,00
013744 POSTULATION ST MARC-AC1	17/11/2021	FA F03104	420,00		420,00
013745 POSTULATION EL LAHIANI-AC2	10/11/2021	FA F02869	420,00		420,00
013746 POSTULATION VAL D'ALBANT-AC3	10/11/2021	FA F02791	420,00		420,00
013748 POSTULATION CLAUDIO-AC4	10/11/2021	FA F02868	420,00		420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-2 Rédaction mémoires + signifiés Bouc/Val d'Alban/St			4 987,87		4 987,87
014130 AC1	01/01/2022	FA 21-1440	4 987,87		4 987,87
M2021-001 Lot 2/BDC7-3 Assistance et expertise foncière et représentation juridique Dossiers			7 228,80		7 228,80
014129 AC1	01/01/2022	FA 21-1439	7 228,80		7 228,80
M2021-001 Lot 2/BDC7-3bis Honoraires postulation Arenas/Eyquem/Baney - DELAVALLADE-			1 260,00		1 260,00
013747 POSTULATION EYQUEM-AC1	13/10/2021	FA F03017	420,00		420,00
013750 POSTULATION ARENAS-AC2	12/11/2021	FA F03094	420,00		420,00
013751 POSTULATION BANEY-AC3	13/10/2021	FA F03018	420,00		420,00
M2021-001 Lot 2/BDC7-5 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			436,32		436,32
014404 AC1	31/01/2022	FA 22-1483	436,32		436,32
M2021-001 Lot 2/BDC7-6 Mission d'assistance et d'expertise foncière - THOME HEITZMANN			1 461,60		1 461,60
014855 AC1	30/03/2022	FA 22-1600	1 461,60		1 461,60
M2021-001 Lot 2/BDC7-7 Suivi dossiers/mémoires/audience CA - THOME HEITZMANN			5 931,14		5 931,14
015048 AC1	29/04/2022	FA 22-1657	5 931,14		5 931,14
M2021-001 Lot 2/BDC7-8 Signif à parties Gerdessus/Goujon-Lechenné - THOME HEITZMANN			745,92		745,92
015253 AC1	31/05/2022	FA 22-1703	745,92		745,92
M2021-001 Lot 2/BDC7-9 Suivi dossiers+audiences CA St Marc Valdalbant - THOME HEITZMANN			3 326,40		3 326,40
016011 AC1	07/09/2022	FA 22-1904	3 326,40		3 326,40
M2021-001 Lot 3/BDC3 Procédure expulsion BB2 - ADALTYS (ADAMAS)			1 109,14		1 109,14
014960 AC1	15/04/2022	FA 2246190	1 109,14		1 109,14
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-1 Rédact* mémoire, assist. et représentat* devant CA - dossier			3 607,20		3 607,20
019961 AC1	30/01/2024	FA 24-2819	1 565,28		1 565,28
020519 AC2	27/03/2024	FA 24-2956	1 176,48		1 176,48
021093 AC3	31/05/2024	FA 24-3082	865,44		865,44
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-2 Rédact* mémoire, assist. et représentat* devant CA - dossier			3 133,44		3 133,44
019963 AC1	30/01/2024	FA 24-2820	2 269,66		2 269,66
020520 AC2	27/03/2024	FA 24-2957	863,78		863,78
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-3 Frais timbres fiscaux postulation - signif* CA Lassep - THOME			867,24		867,24
022578 SOLDE	30/10/2024	FA 24-3442	867,24		867,24
M2021-001/Lot2/BDC 7bis/-4 Frais timbres fiscaux Eyquem-Val d'Albant-Arenas-Claudio-Baney-			1 724,63		1 724,63
022557 SOLDE	29/10/2024	FA 24-3420	1 724,63		1 724,63
M2022-053 Pourvoi en cassation arrêt 30/06/22 val d'albant st marc/Fab - FOUSSARD-FROGER			4 800,00		4 800,00
016343 AC1	14/10/2022	FA 61773	600,00		600,00
016341 AC2	14/10/2022	FA 61772	1 800,00		1 800,00
017234 AC3	02/02/2023	FA 62758	2 400,00		2 400,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
B602 DUP, expro			39 078,80		39 078,80
17-01495 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2017 Eysines CC - BUREAU			847,00		847,00
004533 RSU COPIES DUP EYS CC	30/03/2017	FA 30/03/2017	276,00		276,00
004623 ATTESTAT* AP DECES	04/05/2017	FA 04/05/2017	151,00		151,00
005535 COPIES ACTES DUP	08/12/2017	FA 08/12/2017	420,00		420,00
18-01884 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - BUREAU HYPOTHEQUES			68,00		68,00
005723 COPIES D'ACTES	25/01/2018	FA 25/01/2018	30,00		30,00
007290 DEMANDE DE RSU	03/01/2019	FA 03/01/19	38,00		38,00
18-02419 Publication enquête publique - SUD OUEST			4 174,63		4 174,63
007287 AC1	24/12/2018	FA 181201912/00227	1 869,73		1 869,73
007436 PUBLICATION AVIS EP - 01/19	18/01/2019	FA 190100909/00161	1 869,73		1 869,73
008552 PUBLICATION AVIS EP 08/19	20/08/2019	FA 190801182/00083	435,17		435,17
18-02463 Constat huissier avis EP - CASIMIRO (HUISSIER)			2 800,04		2 800,04
007586 PV CONSTAT HUISSIER AVIS EP	20/02/2019	FA 54 667	2 800,04		2 800,04
19-02505 Publicité Avis EP - 12/2018 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 192,46		1 192,46
007282 PUBLICITE AVIS EP	21/12/2018	FA 811686	1 192,46		1 192,46
19-02506 Signification DUP et offres - CASIMIRO (HUISSIER)			9 444,62		9 444,62
007396 SIGNIFICATION NOTIFICATION DUP	17/01/2019	FA 53 925	1 248,37		1 248,37
007484 SIGNIFICATION AVIS EP CALETTI	29/01/2019	FA 54 354	118,70		118,70
010537 SIGNIFICATIONS ARGILLOS/CANDOTO	30/06/2020	FA 63266	276,71		276,71
010539 SIGNIFICATION GERDESSUS/COMMISSA	30/06/2020	FA 63271	187,14		187,14
010538 SIGNIFICATION EL LAHIANI/TOUMIA	01/07/2020	FA 63285	280,71		280,71
010535 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/VAL D'ALBAN	01/07/2020	FA 63298	187,14		187,14
010536 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/DUROUSSE	01/07/2020	FA 63297	187,14		187,14
010570 SIGNIFICATION COMMIS GOUV/GAUDNER	06/07/2020	FA 63384	652,99		652,99
010597 SIGNIFICATION GERDESSUS / GOUJON	08/07/2020	FA 63 434	276,71		276,71
010598 SIGNIFICATION COMMIS GOUV / DOUMERET	08/07/2020	FA 63 422	374,28		374,28
010599 SIGNIFICATION SAINT MARC/COMMIS GOUV	07/07/2020	FA 63 394	187,14		187,14
010600 SIGNIFICATION NADAL/EYQUEM	03/07/2020	FA 63 337	368,28		368,28
010606 SIGNIFICATION CLAUDIO/METBACH	03/07/2020	FA 63 329	204,03		204,03
010664 SIGNIFICATION BOUC	21/07/2020	FA 63 597	924,23		924,23
010814 SIGNIFICATION DUMORA BANEY	13/08/2020	FA 63 936	497,11		497,11
011866 SIGNIFICATION LASSEP E+J	15/01/2021	FA 66 435	215,84		215,84
011993 SIGNIFICATION BOUC	21/01/2021	FA 66 745	310,06		310,06
012485 GERDESSUS GABRIEL (LALANNE)	30/04/2021	FA 68 669	114,42		114,42
012751 SIGNIFICATION EL LAHIANI+TOUMIA	16/06/2021	FA 69 301	72,68		72,68
012797 SIGNIFICATION BOUC	25/06/2021	FA 69-450	643,40		643,40
012890 SIGNIFICATION SAINT-MARC	06/07/2021	FA 69 724	72,68		72,68
012891 ASSIGNATION VAL D'ALBANT	06/07/2021	FA 69 725	72,68		72,68
012893 ASSIGNATION CLAUDIO+METBACH	06/07/2021	FA 69 727	74,88		74,88
012895 SIGNIFICATION METR/LALANNE	02/07/2021	FA 69 534	285,71		285,71
012894 SIGNIFICATION METR/ARENAS/CANETE DEL RIO	02/07/2021	FA 69 533	365,33		365,33
012979 REGUL FA 69534	02/07/2021	FA 69534			
013143 SIGNIFICATION C.APPEL	13/08/2021	FA 70 338	328,04		328,04
016305 SIGNIF JUGT GOUJON AOGPE	13/10/2022	FA 75 620	166,41		166,41
016303 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO ARGILLOS	13/10/2022	FA 71 622	121,72		121,72
016306 SIGNIF JUGT INDEMN EXPRO BANEY	10/10/2022	FA 71 620	84,08		84,08
016301 SIGNIF ARRET EL LAHIANI TOUMIA	25/08/2022	FA 76 919	213,79		213,79
016393 ARENAS/CANETE DEL RIO	24/10/2022	FA 77 855	248,14		248,14
016552 DUROUSSEAU	01/01/2022	FA 71 619	84,08		84,08
19-02544 Publicité Avis EP - 01/2019 - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 183,73		1 183,73
007409 PUBLICITE AVIS EP - 01/2019	18/01/2019	FA 900178	1 183,73		1 183,73
19-02617 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			1 034,00		1 034,00
007559 DEMANDE DE RSU	15/02/2019	FA 15/02/19	252,00		252,00
007655 RSU	04/03/2019	FA 04/03/19	24,00		24,00
007789 COPIE ACTE	01/04/2019	FA 01/04/19	30,00		30,00
007811 COPIE ACTE	03/04/2019	FA 03/04/19	45,00		45,00
008504 COPIE ACTE (X3)	05/08/2019	FA 05/08/19	45,00		45,00
008505 RSU	06/08/2019	FA 06/08/19	476,00		476,00
008653 RSU	16/09/2019	FA 16/09/19	12,00		12,00
008654 COPIE ACTE	16/09/2019	FA 16/09/19	150,00		150,00
008655 REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	-34,00		-34,00
008656 ANNUL REMB RSU	28/06/2019	FA 28/06/19	34,00		34,00
19-02737 Indemnisation Commissaire Enquêteur - F.I.C.E			2 587,64		2 587,64
007909 INDEMN COMMISSAIRE ENQUETEUR	01/04/2019	FA 01/04/19	2 587,64		2 587,64
20-03368 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - BUREAU HYPOTHEQUES			351,00		351,00
009516 DDE RSU AA 288	02/01/2020	FA 02/01/20	12,00		12,00
009811 DDE RSU BB 237	18/02/2020	FA 18/02/20	12,00		12,00
010425 DDE RSU	23/06/2020	FA 23/06/20	60,00		60,00
010740 ATTESTATION IMMO	10/08/2020	FA 10/08/20	30,00		30,00
010741 DDE RSU BB69	10/08/2020	FA 10/08/20	12,00		12,00
011058 DDE RSU BB2744	05/10/2020	FA 05/10/20	24,00		24,00
011182 DDE RSU AA 502	19/10/2020	FA 19/10/20	12,00		12,00
011256 RSU DOSSIER DE CESSIBILITE	29/10/2020	FA 29/10/20	132,00		132,00
011364 RSU & COPIE ACTE CESSIBILITE	10/11/2020	FA 10/11/20	57,00		57,00
20-03999 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 - SPF BDX 1			312,00		312,00

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
011425 CESSIBILITE EYSINES	23/11/2020	FA 23/11/2020	24,00		24,00
011443 RSU DOSSIER CESSIBILITE	27/11/2020	FA 27/11/2020	24,00		24,00
012161 RSU	10/03/2021	BB 2743 229 69 81	48,00		48,00
014110 DMD RSU PARCELLAIRE	05/01/2022	FA 05/01/2022	216,00		216,00
21-04144 Enquête parcellaire complémentaire - SUD OUEST PUBLICITE			1 637,62		1 637,62
011874 AC 1	15/01/2021	FA 210100455/00105	882,29		882,29
011957 ENQ PARCEL COMPL	30/01/2021	FA 210101351/00244	755,33		755,33
21-04325 Indemnisation Commissaire Enquêteur - GUYOT CAROLA			1 078,05		1 078,05
012251 INDEMN COMM ENQU	22/03/2021	29/03/2021	1 078,05		1 078,05
21-04780 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1			420,00		420,00
013523 DDE RSU ACTES PARCELLES AA/BB	20/10/2021	FA 13/10/21	372,00		372,00
013765 DMD RSU EP COMPL	23/11/2021	FA 23/11/21	48,00		48,00
22-05114 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2022 - SPF BDX 1			195,00		195,00
014491 DMD COPIE ACTE PARCELLAIRE	16/02/2022	FA 16/02/22	15,00		15,00
015010 DMD RSU GERDESSUS GOUJON CONSIGN	26/04/2022	FA 26/04/2022	24,00		24,00
015013 DMD RSU LASSEP	27/04/2022	FA 27/04/2022	24,00		24,00
015337 DMD RSU BOUC GERDESSUS GAB	15/06/2022	FA 15/06/2022	72,00		72,00
015788 DMD RSU EYSINES BB234-257-258-678	03/08/2022	FA 03/08/2022	48,00		48,00
016974 DMD RSU CDC	02/01/2023	FA 30/12/22- EYSINES BB 682	12,00		12,00
22-05407 Publications SO enq parcel complem Bouc Gerdessus - SUD OUEST PUBLICITE			1 376,13		1 376,13
015332 AC1	24/04/2022	FA 220401388/00229	688,94		688,94
015333 AC2	08/05/2022	FA 220500257/00255	687,19		687,19
22-05422 Publications SO ilot C7 - SUD OUEST PUBLICITE			1 303,02		1 303,02
015334 AC1	30/05/2022	FA 220501684/00260	654,59		654,59
015335 AC2	12/06/2022	FA 220600387/00384	648,43		648,43
22-05531 Indemnizat* EP compl. Com. Enq. - GUYOT CAROLA			823,18		823,18
015755 INDEMN. EP COMPL. COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0311	823,18		823,18
22-05533 Indemnizat* EP ilot C7 Com. Enq. - GUYOT CAROLA			673,41		673,41
015756 INDEMN EP ILOT C7 COM. ENQ.	28/07/2022	JG/VJ/2022_0312	673,41		673,41
23-06069 cass signif mém fab à valdalbant stmarc - CASIMIRO (HUISSIER)			145,66		145,66
017029 AC1	02/01/2023	FA 79 462	145,66		145,66
23-06070 signif arrêté cessib ALPrado/Lalanne - CASIMIRO (HUISSIER)			42,19		42,19
017034 AC1	09/01/2023	FA 79 571	42,19		42,19
24-07300 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2024 - SPF BDX 1			60,00		60,00
021326 DMD RSU VAL DALBANT DECONSIGNATION	25/06/2024	FA 25/06/2024	36,00		36,00
021401 DMD RSU DECONSIGN BANEY	02/07/2024	FA 02/07/2024	24,00		24,00
24-07371 Publicité SO prorog DUP - SUD OUEST PUBLICITE			245,48		245,48
022055 SOLDE	31/08/2024	FA 240801768	245,48		245,48
M2021-001 Lot 2/BDC7-15 Procédure appel Claudio - THOME HEITZMANN			1 781,86		1 781,86
019410 AC 1	30/11/2023	FA 23-2694	1 781,86		1 781,86
M2021-083/BDC3 Publication ord expro phase 1 - SEGAT			2 651,04		2 651,04
021700 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-197	2 651,04		2 651,04
M2021-083/BDC4 Publication ord expro phase 2 - SEGAT			1 325,52		1 325,52
021696 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-194	1 325,52		1 325,52
M2021-083/BDC6 Publication ordo expro Eysines EP - SEGAT			1 325,52		1 325,52
021697 SOLDE	30/07/2024	FA FC-24-07-195	1 325,52		1 325,52
B603 Libération des sols (diag+petits travaux)			12 090,00		12 090,00
004868 BDC7 TPS 06/17	04/07/2017	FA 06/2017/21	379,15		379,15
005044 BDC7 TPS 07/17	18/08/2017	FA 2017/24	189,57		189,57
005193 BDC7 TPS PASSE 08/17	22/09/2017	FA DHC/GLS/GEJ/08/2017/26	189,57		189,57
005388 BDC7 TPS 09/17	31/10/2017	FA DHC/GLS/GEJ/09/2017/33	258,09		258,09
005515 CHANGT AFFECT*	31/10/2017	31/10/17	-1 016,38		-1 016,38
005410 BDC11 TPS AA309	08/11/2017	FA 10/2017/34	193,57		193,57
005516 CHANGT AFFECT*	08/11/2017	08/11/17	-193,57		-193,57
M2023-036 Terrassement pour sécurisation ilot C4 suite évacuation caravanes - COLAS			12 090,00		12 090,00
018590 AC1 - SOLDE	30/08/2023	FA 14000Ri23032933	12 090,00		12 090,00
B701 Dépollution			4 380,00		4 380,00
23-06649 Analyse terre polluées ilot C5 - FAYAT TP			1 080,00		1 080,00
019435 SOLDE	01/12/2023	FA 20241000000499	1 080,00		1 080,00
23-06784 Evacuation déblais vers DIB & ISDI - ilot C5 - FAYAT TP			3 300,00		3 300,00
019736 SOLDE	01/01/2024	FA 20241000000689	3 300,00		3 300,00
B702 Démolition - Désamiantage			11 211,66	43 977,67	55 189,33
M2021-077/BDC41 Diagnostics amiantes 28 rue Martin Porc - AED EXPERTISES			520,04		520,04
021225 AC1	18/06/2024	FA FA01116537	520,04		520,04
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC4 SSEP3 - Repérage réseaux ilot C7 - ADRE RESEAUX			2 076,00		2 076,00
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558	2 076,00		2 076,00
M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC4 SSEP3 - Repérage réseaux ilot C7 - SEREA			6 280,07		6 280,07
017890 AC1	28/04/2023	FA 230276	6 224,02		6 224,02
018141 SOLDE	08/06/2023	F2023-558 FA sous traitant ADRE	56,05		56,05
M2023-022/BDC7 Ilot C7 : MOE démol M5 - 6 & 7 - GINGER DELEO			2 335,55	6 683,47	9 019,02
022462 AC1	22/10/2024	FA 156S01024002065	2 335,55		2 335,55
023904 AC2	26/02/2025	FA 156DESOP0025		3 549,31	3 549,31
024540 AC3	29/04/2025	FA 156DESOP0106		1 261,46	1 261,46
024762 AC4	26/05/2025	FA DESOP0134		1 252,12	1 252,12
025619 SOLDE	22/08/2025	FA 56DESOP0232		620,58	620,58
M2024-066 Désamiantage - déplombage et curage au 28 rue Martin Porc - VALODEM				37 294,20	37 294,20

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
024947 AC1 05/25	30/05/2025	FA FC-202500-0115		37 294,20	37 294,20
B704 Fouilles archéologiques			394 582,20		394 582,20
23-06617 MâD benne coulissante pour fouilles îlot C5 - FAYAT TP			348,00		348,00
019171 SOLDE	07/11/2023	FA 20241000000214	348,00		348,00
M2022-079 Fouille archéologie préventive Ilot C5 - INRAP			365 434,20		365 434,20
020380 AC1 12/23	15/03/2024	FA 0000145	341 494,20		341 494,20
022361 AC2 08/24	07/10/2024	FA 0001201	23 940,00		23 940,00
M2022-079 Fouille archéologie préventive Ilot C5 - TRESOR PUBLIC (BM)			28 800,00		28 800,00
020380 AC1 12/23	15/03/2024	FA 0000145	28 800,00		28 800,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			4 270 129,73	204 694,43	4 474 824,16
D103 VRD			2 712 112,64	2 341,20	2 714 453,84
23-06658 Pose barrières reprise terrain [rue Martin Porc] - COLAS SO/SCREG			3 402,00		3 402,00
019301 SOLDE	27/11/2023	FA 23047866	3 402,00		3 402,00
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - COLAS			1 514 447,48		1 514 447,48
M2018-040/Lot 1 Avance	16/11/2018		51 100,86		51 100,86
008463 AC2	27/06/2019	06/19	35 058,79		35 058,79
009080 AC3	31/10/2019	10/19	183 116,65		183 116,65
009286 AC4	01/01/2020	11/19	114 283,30		114 283,30
009791 AC5	13/02/2020	12/19	93 235,27		93 235,27
009734 AC6	13/01/2020	01/20	119 749,69		119 749,69
010037 AC7	27/03/2020	03/20	2 985,54		2 985,54
014209 AC8	01/01/2022	11/21	62 994,70		62 994,70
014532 AC9	14/02/2022	01/22	16 404,00		16 404,00
014714 AC10	08/03/2022	02/22	107 179,47		107 179,47
014916 AC11	06/04/2022	03/22 - FA 14000RI22011610	161 432,13		161 432,13
015109 AC12	30/04/2022	04/22 - FA 14000RI22015370	121 453,43		121 453,43
015319 AC13	09/06/2022	05/22 - FA 14000RI22019755	157 274,65		157 274,65
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA 14000RI22022353	201 011,37		201 011,37
015765 AC15	25/07/2022	07/22 - FA14000RI22028376	35 054,55		35 054,55
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI22032756	3 299,93		3 299,93
017399 AC17 - 01/23	24/02/2023	FA 14000RI23001564	7 453,42		7 453,42
017511 AC18 - 02/23	06/03/2023	FA 14000RI23004299	1 360,70		1 360,70
018093 AC19 - 05/23	31/05/2023	FA 14000RI23019144	27 216,78		27 216,78
018624 AC20 - 07/23	04/09/2023	FA 14000RI23031114	11 371,43		11 371,43
019181 AC21 - 10/23 - DGD	01/01/2024	FA 14000RI23043569	1 410,82		1 410,82
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle - FC BTP			93 155,75		93 155,75
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	6 325,75		6 325,75
009286 AC4	01/01/2020	11/19	11 215,54		11 215,54
009791 AC5	13/02/2020	12/19	9 701,19		9 701,19
009734 AC6	13/01/2020	01-20	5 681,50		5 681,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000RI22019755	25 479,40		25 479,40
015656 AC14	11/07/2022	06/22 - FA 14000RI22022353	4 043,60		4 043,60
015765 AC15	25/07/2022	FA14000RI22028376	30 695,27		30 695,27
015994 AC16 - 08/22	30/08/2022	FA14000RI22032756	13,50		13,50
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			84 673,97		84 673,97
009080 AC3	31/10/2019	AC 3	31 460,35		31 460,35
009791 AC5	13/02/2020	12/19	1 016,50		1 016,50
015319 AC13	09/06/2022	05/22 FA 14000RI22019755	52 197,12		52 197,12
M2018-040/Lot 1 Lot 1 : VRD - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			2 190,00		2 190,00
009734 AC6	13/01/2020	01-20	2 190,00		2 190,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - ALINEA SIGNALISATION			4 355,40		4 355,40
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000RI22054580	4 355,40		4 355,40
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			949 647,54		949 647,54
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		44 003,11		44 003,11
015320 AC1 - 05/2022	09/06/2022	FA 14000RI22018795	139 806,72		139 806,72
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000RI22025859	90 820,17		90 820,17
015995 AC3 - 08/2022	30/08/2022	FA 14000RI22032768	9 783,41		9 783,41
016289 AC4 - 09/2022	07/10/2022	FA 14000RI22038104	334 906,84		334 906,84
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	114 963,03		114 963,03
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	143 023,01		143 023,01
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000RI22054580	18 889,80		18 889,80
017383 AC8 - 01/2023	20/02/2023	FA 14000RI23002956	18 106,78		18 106,78
017700 AC9 - 03/2023	03/04/2023	FA 14000RI23010155	18 903,50		18 903,50
018091 AC10 - 05/2023	02/06/2023	FA 14000RI23019453	5 834,67		5 834,67
019046 AC11 - 10/2023	23/10/2023	FA 14000RI23040870	10 445,62		10 445,62
020672 DGD	17/04/2024	DGD	160,88		160,88
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - DIAS SANTOS TIAGO			18 789,50		18 789,50
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	7 589,50		7 589,50
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	11 200,00		11 200,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - KIPOPLUIE			12 988,00		12 988,00
015659 AC2 - 06/2022	11/07/2022	FA 14000RI22025859	12 988,00		12 988,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - PEPERIOT			17 375,00		17 375,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	17 375,00		17 375,00
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - VIDEO INJECTION			11 088,00		11 088,00
016778 AC6 - 11/2022	28/11/2022	FA 14000RI22049360	11 088,00		11 088,00
M2022-071 Contrôles préalables à la réception de réseaux d'assainissement - COVICA				2 341,20	2 341,20

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
023957 AC1	05/03/2025	FA CP1 COVICA		2 341,20	2 341,20
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			263 079,25	51,66	263 130,91
M2019-004 Travaux Eclairage Public et Telecom - CEPECA-CITEOS			225 847,69	51,66	225 899,35
008373 05/19	31/05/2019	AC 1	43 295,94		43 295,94
008365 06/19	30/06/2019	AC 2	51 136,01		51 136,01
009335 12/19	01/01/2020	AC 3	46 312,66		46 312,66
010460 06/20	29/06/2020	AC 4	64 717,08		64 717,08
012563 05/21	18/05/2021	AC 5	8 125,40		8 125,40
016596 07/22	14/10/2022	AC6 FA 7440013094	12 260,60		12 260,60
022214 AC7	01/01/2025	DGD		51,66	51,66
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - CEPECA-CITEOS			28 730,53		28 730,53
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	28 730,53		28 730,53
M2021-055/Lot 1 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 1 : VRD - COLAS SO/SCREG			8 501,03		8 501,03
M2021-055/Lot 1 Avance	21/07/2021		292,86		292,86
016595 AC5 - 10/2022	15/11/2022	FA 14000RI22045230	8 656,36		8 656,36
016867 AC7 - 12/2022	01/01/2023	FA 14000RI22054580	-448,20		-448,20
020672 DGD	17/04/2024	DGD	0,01		0,01
D105 Mobilier urbain			69 329,62		69 329,62
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			69 329,62		69 329,62
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	10 647,50		10 647,50
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	22 535,09		22 535,09
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	7 541,86		7 541,86
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	5 146,21		5 146,21
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	41,47		41,47
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903018023	16 250,96		16 250,96
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA 2908011423	7 054,55		7 054,55
020670 AC10 - 02/2024	28/03/2024	FA 2903020824	111,98		111,98
D106 Espaces verts			672 978,99	21 083,39	694 062,38
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			16 531,68		16 531,68
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	16 531,68		16 531,68
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			30 740,80		30 740,80
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	12 511,40		12 511,40
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	1 164,60		1 164,60
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	17 064,80		17 064,80
M2018-040/Lot 2 Lot 2 : Espaces verts - Espaces publics rues M. Porc, B. Triat & Parc Cantinolle -			488 515,74	14 633,96	503 149,70
008605 AC1 - 06-07/19	30/08/2019	FA 2908001019	97 485,83		97 485,83
009655 AC2 - 12/2019	23/01/2020	FA 2912020919	116 672,12		116 672,12
009987 AC3 - 02/2020	12/03/2020	FA2902012120	54 061,23		54 061,23
010358 AC4 - 05/2020	31/05/2020	FA 2905012220	-365,87		-365,87
010824 AC5 - 07/2020	30/08/2020	FA 2907016420	-191,59		-191,59
015037 AC6 - 03/2022	29/04/2022	FA 2905000622	38 232,70		38 232,70
015038 AC7 - 04/2022	29/04/2022	FA 2905000722	44 818,27		44 818,27
017756 AC8 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903018023	101 363,96		101 363,96
018588 AC9 - 08/2023	29/08/2023	FA 2908011423	9 163,57		9 163,57
020670 AC10 - 02/2024	28/03/2024	FA 2903020824	27 275,52		27 275,52
024293 AC11 - 03/2025	27/03/2025	FA 2903023825		14 633,96	14 633,96
M2021-055/Lot 2 TRAVAUX ALLEE DE L'EUROPE - Lot 2 : Espaces verts - IDVERDE			137 190,77	6 449,43	143 640,20
M2021-055/Lot 2 Avance	21/07/2021		2 394,19		2 394,19
016869 AC1 - 11/2022	01/01/2023	FA 2911013522	78 843,01		78 843,01
016884 AC2 - 12/2022	01/01/2023	FA 2912017922	8 970,00		8 970,00
017755 AC3 - 03/2023	28/03/2023	FA 2903017923	30 317,33		30 317,33
019397 AC4 - 11/2023	29/11/2023	FA 2911024123	16 666,24		16 666,24
024291 AC5 - 03/2025	27/03/2025	FA 2903023325		6 449,43	6 449,43
D203 Electricité			57 318,91	137 005,25	194 324,16
21-04409 Raccordement électrique C1 - DC26/058600/001001 - ENEDIS (EX : ERDF)			22 012,57		22 012,57
21-04409 Avance	18/05/2021		6 200,94		6 200,94
012628 AC1	27/05/2021	FA 3400033376			
017031 AC2	03/01/2023	FA 0326-690805800	15 811,63		15 811,63
21-04486 Raccordement électrique C6 - DC26/024162/001011 - ENEDIS (EX : ERDF)			32 503,74		32 503,74
012745 AC1	16/06/2021	FA 0326-690716854	32 503,74		32 503,74
22-05850 Déplacement coffret de branchement 20 Rue Martin Porc - ENEDIS (EX : ERDF)			1 234,80		1 234,80
22-05850 Avance	06/12/2022		617,40		617,40
016905 AC1	01/01/2023	FA 3400081008			
017262 AC2	31/01/2023	FA 0326-690809311	617,40		617,40
22-05871 Déplacement coffret de branchement 1, Allée de l'Europe - ENEDIS (EX : ERDF)			1 234,80		1 234,80
22-05871 Avance	19/12/2022		617,40		617,40
016985 AC1	01/01/2023	FA 3400083143			
017053 AC2	05/01/2023	FA 0326 - 690806096	617,40		617,40
24-07284 Suppression BRCHT 28 rue Martin Porc - PDL 16189869664471 - ENEDIS (EX : ERDF)			333,00	333,00	666,00
24-07284 Avance	21/06/2024		333,00		333,00
022725 AC1	29/10/2024	FA 3400072563			
023770 SOLDE	01/01/2025	FA 0326 - 690904448		333,00	333,00
25-07843 MAJ convention raccordement RAC-24-28645KB01S - ENEDIS (EX : ERDF)				1 497,60	1 497,60
25-07843 Avance	15/01/2025			1 497,60	1 497,60
023731 AC1 - SOLDE	03/02/2025	FA 3400006801			
25-08108 Déplacement transfo + ligne aérienne av du Taillan Médoc - ENEDIS (EX : ERDF)				135 174,65	135 174,65

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
25-08108 Avance	14/04/2025	Devis RC26250015250001		135 174,65	135 174,65
024641 SOLDE	05/05/2025	FA 3400028890			
D204 Eau potable			25 590,62		25 590,62
18-02413 Raccordement Ilot C7 rue Martin Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			6 464,95		6 464,95
18-02413 Avance	04/12/2018		4 555,70		4 555,70
008839 AC1	02/10/2019	FA 4170797	1 909,25		1 909,25
18-02414 Raccordement Ilot C5 rue Bertrand Triat - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			9 278,18		9 278,18
18-02414 Avance	04/12/2018		5 186,06		5 186,06
008840 AC1	02/10/2019	FA 4170799	4 092,12		4 092,12
19-02972 Branchement AEP Av. du Taillan Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			2 706,87		2 706,87
19-02972 Avance	23/07/2019		812,06		812,06
009413 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA 4171669	1 894,81		1 894,81
20-03419 Branchement fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			162,84		162,84
009542 AC1 - SOLDE	02/01/2020	FA 1045795452	162,84		162,84
20-03440 Conso fontaine Parc Cantinolle - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			987,98		987,98
009597 AC1	10/01/2020	FA 1045941707	209,80		209,80
010580 AC2	03/07/2020	FA 1050779730	173,98		173,98
011899 AC3	21/01/2021	FA 1056446738	229,72		229,72
012968 AC4	19/07/2021	FA 1061944596	195,91		195,91
014430 AC5	31/01/2022	FA 1067518056	178,57		178,57
22-04967 Déplacement compteur au 14 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04967 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014379 AC1	21/01/2022	FA 192200312			
015327 AC2	09/06/2022	FA 192201657	599,17		599,17
22-04968 Déplacement compteur au 16 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04968 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014382 AC1	21/01/2022	FA 192200313			
014909 AC2	05/04/2022	FA 192201031	599,17		599,17
22-04969 Déplacement compteur au 18 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04969 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014380 AC1	21/01/2022	FA 192200315			
014907 AC2	05/04/2022	FA 192201022	599,17		599,17
22-04970 Déplacement compteur au 20 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04970 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014381 AC1	21/01/2022	FA 192200316			
014908 AC2	05/04/2022	FA 192201025	599,17		599,17
22-04971 Déplacement compteur au 30 Rue M. Porc - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			855,96		855,96
22-04971 Avance	04/01/2022		256,79		256,79
014378 AC1	21/01/2022	FA 192200317			
015326 AC2	09/06/2022	FA 192201668	599,17		599,17
M2022-012 Branchement compteur d'eau Rue M-Porc - NOVELLO			1 710,00		1 710,00
014817 AC1	31/03/2022	FA 14000RI22010285	1 710,00		1 710,00
D207 Gaz			4 680,00		4 680,00
19-02993 Suppression branchement gaz au 16 Rue Martin Porc - REGAZ			1 740,00		1 740,00
014777 AC1	28/03/2022	FA FCO-000102887	1 740,00		1 740,00
20-03472 Déplacement coffret gaz 7, Rue Triat - REGAZ			2 940,00		2 940,00
010189 AC1/SOLDE	23/04/2020	FA FCO-000080139	2 940,00		2 940,00
D208 Autres travaux raccordements			898,80		898,80
23-06259 Déplacement poste de comptage / fosse jumbo petit modèle avec terrassement - EAU			898,80		898,80
23-06259 Avance	24/04/2023		449,40		449,40
017964 AC1	10/05/2023	FA BM2300408	0,02		0,02
018672 SOLDE	07/09/2023	FA BM2301044	449,38		449,38
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)			449 138,39	44 212,93	493 351,32
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - BIOTOPE			4 146,39		4 146,39
005920 AC 1	04/03/2018	FA 201800518	4 126,27		4 126,27
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	20,12		20,12
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - ICI LA (D')			67 952,29		67 952,29
004789 AC 4	20/06/2017	FA 18_28 EYS	23 721,91		23 721,91
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	355,82		355,82
005616 AC5	30/12/2017	FA 1032-EYSINES-MOE-1-2017	21 350,15		21 350,15
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	22 417,65		22 417,65
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	106,76		106,76
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - PERIOLE GERAUD			10 295,88		10 295,88
004790 AC 4	24/02/2017	FA 14/2017	3 594,30		3 594,30
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	53,92		53,92
005618 AC 5	06/12/2017	FA 35/2017	3 234,86		3 234,86
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	80,87		80,87
005919 AC 7	14/02/2018	FA 06/2018	3 315,75		3 315,75
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	16,18		16,18
M2016-005/MS02 Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			20 591,76		20 591,76
004791 AC 4	14/06/2017	FA F17MAT505	7 188,60		7 188,60
005298 REGUL REV MS2	16/10/2017	FA 10/2017	107,83		107,83
005617 AC 5	31/12/2017	FA F17MAT1125	6 469,74		6 469,74
005917 AC 6	21/02/2018	FA 18021	161,75		161,75
005918 AC 7	15/02/2018	FA F18MAT112	6 631,49		6 631,49
007108 REG REV DEF MS02	05/12/2018	FA 05/12/18	32,35		32,35

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - ICI LA (D')			61 400,00		61 400,00
006437 AC1	19/07/2018	FA 18113-EYSINES-MOE	47 810,00		47 810,00
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	1 290,87		1 290,87
007197 AC2	04/12/2018	FA 18205-EYSINES-MOE	12 299,13		12 299,13
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - PERIOLE GERAUD			9 303,03		9 303,03
006439 AC1	18/07/2018	FA 35/2018	7 243,94		7 243,94
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	195,59		195,59
007198 AC2	07/12/2018	FA 78/2018	1 863,50		1 863,50
M2016-005/MS10 MOE espaces publics/formalisation DLE du PRO - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			18 606,05		18 606,05
006438 AC1	20/07/2018	FA F18MAT673	14 487,88		14 487,88
007179 REGUL MS10 AC 1	12/12/2018	FA 12/12/2018	391,16		391,16
007199 AC2	04/12/2018	FA F18MAT1079	3 727,01		3 727,01
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - ICI LA (D')			40 604,26		40 604,26
007945 AC1	11/04/2019	FA 19070-EYSINES-MOE	4 651,84		4 651,84
008104 AC2	24/05/2019	FA 19104- EYSINES	1 523,82		1 523,82
008356 AC3	11/07/2019	FA 19149-EYSINES-MOE	3 047,61		3 047,61
008689 AC4	20/09/2019	FA 19188	3 047,63		3 047,63
008820 AC5	08/10/2019	FA 19200	846,16		846,16
009201 AC6	01/01/2020	FA 19242	843,61		843,61
009472 AC7	01/01/2020	FA 19263-EYSINES-MOE	1 826,11		1 826,11
009787 AC8	11/02/2020	FA 20026-EYSINE-MOE	1 813,11		1 813,11
010966 AC9	18/09/2020	FA 20183-EYSINES-MOE	4 521,83		4 521,83
014350 AC10	27/01/2022	FA 22008-EYSINES-MOE	4 799,52		4 799,52
014355 AC11	27/01/2022	FA 22009-EYSINES-MOE	2 304,00		2 304,00
016036 AC12	12/09/2022	FA 22206	2 086,79		2 086,79
016359 AC13	17/10/2022	FA 22249	1 184,65		1 184,65
016675 AC14	25/11/2022	FA 22302	1 209,70		1 209,70
017614 AC15	22/03/2023	FA 23081	3 260,98		3 260,98
019365 AC16	29/11/2023	FA 23391	3 636,90		3 636,90
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - PERIOLE GERAUD			11 994,52		11 994,52
007947 AC1	03/04/2019	FA 19/2019	1 550,62		1 550,62
008106 AC2	24/05/2019	FA 29/2019	482,39		482,39
008357 AC3	10/07/2019	FA 33/2019	964,78		964,78
008859 AC4	18/09/2019	FA 36/2019	964,78		964,78
008822 AC5	08/10/2019	FA 38/2019	267,85		267,85
009203 AC6	01/01/2020	FA 41/2019	565,76		565,76
009474 AC7	01/01/2020	FA 43/2019	285,79		285,79
009802 AC8	10/02/2020	FA 05/2020	574,02		574,02
011021 AC9	18/09/2020	FA 11/2020	1 432,21		1 432,21
014357 AC10	27/01/2022	FA 02/2022	1 281,99		1 281,99
016117 AC11	13/09/2022	FA 09/2022	2 548,90		2 548,90
019367 AC12	29/11/2023	FA 25/2023	1 075,43		1 075,43
M2016-005/MS18 Moe urbaine et espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			91 926,41	1 864,43	93 790,84
007946 AC1	04/04/2019	FA F19MAT327	9 303,71		9 303,71
008104 AC2	24/05/2019	FA F19MAT479	2 426,97		2 426,97
008355 AC3	31/07/2019	FA F19MAT716	6 405,34		6 405,34
008861 AC4	30/09/2019	FA F19MAT900	5 888,20		5 888,20
008821 AC5	08/10/2019	FA F19MAT977	1 631,70		1 631,70
009202 AC6	01/01/2020	FA F19MAT1115	1 626,82		1 626,82
009472 AC7	01/01/2020	REGUL REV	1 807,36		1 807,36
009473 AC7	01/01/2020	FA F19MAT1250	1 740,12		1 740,12
009475 AC8	01/01/2020	FA F19MAT1253	725,22		725,22
009801 AC9	07/02/2020	FA F20MAT120	3 496,42		3 496,42
011020 AC10	30/09/2020	FA F20MAT790	8 721,49		8 721,49
014388 AC11	31/01/2022	FA F22MAT084	7 758,86		7 758,86
014390 AC12	31/01/2022	FA F22MAT081	1 730,74		1 730,74
014392 AC13	31/01/2022	FA F22MAT064	9 893,85		9 893,85
015739 AC14	30/06/2022	FA F22MAT642	2 233,25		2 233,25
015913 AC15	31/07/2022	FA F22MAT788	1 986,73		1 986,73
016132 AC16	31/05/2022	FA F22MAT526	1 966,24		1 966,24
016134 AC17	30/04/2022	FA F22MAT481	1 949,17		1 949,17
016360 AC18	30/09/2022	FA F22MAT941	5 685,98		5 685,98
016931 AC19	01/01/2023	FA F22MAT1136	2 006,29		2 006,29
017603 AC20	01/01/2023	FA F22MAT1270	3 513,93		3 513,93
017599 AC21	31/01/2023	FA F23MAT033	1 628,81		1 628,81
017867 AC22	31/03/2023	FA F23MAT312	2 850,43		2 850,43
018134 AC23	31/05/2023	FA F23MAT605	2 385,60		2 385,60
018698 AC24	31/07/2023	FA F23MAT906	1 214,47		1 214,47
018727 AC25	31/08/2023	FA F23MAT953	1 489,27		1 489,27
021939 AC26	30/06/2024	FA F24MAT694	-140,56		-140,56
024456 SOLDE	28/02/2025	FA F25MAT180		1 864,43	1 864,43
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - ICI LA (D')			21 631,63		21 631,63
011900 AC1	25/01/2021	FA 21014-EYSINES-MOE	4 891,63		4 891,63
012406 AC2	21/04/2021	FA 21070-EYSINES-MOE	3 012,55		3 012,55
012486 AC3	30/04/2021	FA 21081-EYSINES-MOE	1 981,86		1 981,86
013015 AC4	28/07/2021	FA 21157-EYSINES-MOE	10 038,85		10 038,85

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
013521 AC5	15/10/2021	FA 21206	1 642,32		1 642,32
021521 REVISIONS DEFINITIVES	10/07/2024	DGD	64,42		64,42
M2016-005/MS19 MOE urbaine - Reprise AVP/PRO sur Mail de l'Europe - SAFEGE-SUEZ			21 938,99		21 938,99
011901 AC1	31/01/2021	FA F21MAT060	4 669,15		4 669,15
012456 AC2	20/04/2021	FA F21MAT368	2 875,52		2 875,52
012487 AC3	21/04/2021	FA F21MAT369	1 891,73		1 891,73
013042 AC4	31/07/2021	FA F21MAT805	8 262,75		8 262,75
013919 AC5	30/09/2021	FA F21MAT972	1 299,60		1 299,60
014391 AC6	31/01/2022	FA F22MAT097	2 167,54		2 167,54
016133 AC7	30/04/2022	FA F22MAT480	725,50		725,50
021522 REVISIONS DEFINITIVES	10/07/2024	DGD	47,20		47,20
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - ICI LA (D')			20 185,59		20 185,59
014356 AC1	27/01/2022	FA 22010-EYSINES-MOE	2 241,74		2 241,74
016035 AC2	12/09/2022	FA 22205	2 935,48		2 935,48
016362 AC3	17/10/2022	FA 22248	2 911,84		2 911,84
016674 AC4	25/11/2022	FA 22301	2 951,83		2 951,83
017613 AC5	22/03/2023	FA 23080	3 560,82		3 560,82
019362 AC6 11/23	29/11/2023	FA 23390	5 583,88		5 583,88
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - PERIOLE			5 539,43		5 539,43
014358 AC1	27/01/2022	FA 03/2022	747,25		747,25
016119 AC2	13/09/2022	FA 10/2022	748,36		748,36
016363 AC3	18/10/2022	FA 12/2022	735,84		735,84
016684 AC4	25/11/2022	FA 15/2022	743,23		743,23
017552 AC5	03/03/2023	FA 03/2023	1 114,87		1 114,87
019364 AC6	29/11/2023	FA 24/2023	1 449,88		1 449,88
M2016-005/MS20 MOE Espaces publics - Mail de l'Europe = Phase 1 / Allée Europe - SAFEGE-			35 451,83	1 915,42	37 367,25
014393 AC1	31/01/2022	FA F22MAT085	4 513,82		4 513,82
015910 AC2	30/04/2022	FA F22MAT482	2 156,50		2 156,50
015911 AC3	31/05/2022	FA F22MAT525	2 101,30		2 101,30
015751 AC4	30/06/2022	FA F22MAT641	2 116,93		2 116,93
015915 AC5	31/07/2022	FA F22MAT787	2 116,93		2 116,93
016098 AC6	31/08/2022	FA F22MAT836	2 132,56		2 132,56
016361 AC7	30/09/2022	FA F22MAT940	2 144,30		2 144,30
016673 AC8	31/10/2022	FA F22MAT1008	2 146,24		2 146,24
016917 AC9	01/01/2023	FA F22MAT1135	2 140,38		2 140,38
017604 AC10	01/01/2023	FA F22MAT1272	3 626,46		3 626,46
017605 AC11	31/01/2023	FA F23MAT034	1 595,58		1 595,58
018135 AC12	31/05/2023	FA F23MAT604	2 789,74		2 789,74
019343 AC13	31/10/2023	F23MAT1166	1 198,12		1 198,12
019474 AC14 11/23	30/11/2023	FA 0F23MAT1341	1 470,56		1 470,56
021940 AC15 05/24	31/05/2024	FA F24MAT589	1 989,49		1 989,49
021938 AC16 06/24	30/06/2024	FA F24MAT693	1 212,92		1 212,92
024457 SOLDE	28/02/2025	FA F25MAT181		1 915,42	1 915,42
M2022-073 Coordination travaux Ilot C1/Allée de l'Europe - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			2 419,20		2 419,20
017424 AC1	28/02/2023	FA F23MAT216	1 935,36		1 935,36
017854 AC2	30/04/2023	FA F23MAT414	483,84		483,84
M2023-005/MS4 Mission de maîtrise d'oeuvre des espaces publics - BERIM				12 128,24	12 128,24
025646 AC1	31/07/2025	FA BM25070432		2 412,59	2 412,59
026321 AC2 09/25	30/09/2025	FA BM25090463		7 290,97	7 290,97
026344 AC3 10/25	29/10/2025	FA BM25100278		2 424,68	2 424,68
M2023-005/MS4 Mission de maîtrise d'oeuvre des espaces publics - MASTERPLAN				6 065,31	6 065,31
025390 AC1	28/07/2025	FA 25-07-0204		1 209,92	1 209,92
025886 AC2 09/25	25/09/2025	FA 25-09-0012		3 649,09	3 649,09
026348 AC3 10/25	31/10/2025	FA 25-10-0041		1 206,30	1 206,30
M2023-005/MS4 Mission de maîtrise d'oeuvre des espaces publics - TROUILLOT HERMEL				22 239,53	22 239,53
025397 AC1	28/07/2025	FA 2507-248		4 436,38	4 436,38
025885 AC2 09/25	23/09/2025	FA 2509-295		13 380,08	13 380,08
026345 AC3 10/25	30/10/2025	FA 2510-356		4 423,07	4 423,07
M2023-022/BDC4 IM.1_3_4 rue Martin Porc parcelle BB258 - Ilot C7 - GINGER DELEO			5 151,13		5 151,13
020572 AC1	05/04/2024	FA 156501024000647	3 772,08		3 772,08
022140 AC2	13/09/2024	FA 156501024001744	912,25		912,25
023157 AC3	13/12/2024	FA 156501024002756	466,80		466,80
D302 Coordonnateur SPS			13 382,51		13 382,51
M2017-034 Mission de coordination SPS, catégorie 2 - ELYFEC SPS			13 382,51		13 382,51
006709 AC1	30/09/2018	FA F83181361	588,00		588,00
007665 AC2	28/02/2019	FA F83190244	210,00		210,00
008790 AC3	30/09/2019	FA F83191369	418,05		418,05
009014 AC4	31/10/2019	FA F83191530	412,97		412,97
009259 AC5	01/01/2020	FA F83191671	412,97		412,97
009521 AC6	01/01/2020	FA F83191829	413,77		413,77
009707 AC7	30/01/2020	FA F83200130	784,76		784,76
010316 AC8	26/05/2020	FA F83200575	418,48		418,48
013759 AC9	22/11/2021	FA F83211285	424,54		424,54
014060 AC10	01/01/2022	FA F83211478	427,33		427,33
014529 AC11	24/01/2022	FA F83220084	430,13		430,13
014773 AC12	28/03/2022	FA F83220311	443,28		443,28

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
015255 AC13	22/04/2022	FA F83220433	455,66		455,66
015187 AC14	23/05/2022	FA F83220563	441,30		441,30
015355 AC15	20/06/2022	FA F83220647	442,09		442,09
015921 AC16	24/08/2022	FA F83220893	454,45		454,45
017473 AC17	28/02/2023	FA F83230225	123,59		123,59
019295 SOLDE	27/11/2023	FA F83231360	6 081,14		6 081,14
D305 Autres honoraires techniques			1 620,00		1 620,00
M2021-048 Modification feux carrefour Av. de l'Europe - GERTRUDE			1 620,00		1 620,00
013243 AC1	10/09/2021	FA BOD 2021septF016	1 620,00		1 620,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			1 155 204,92	-75 000,00	1 080 204,92
E113 Enfouissement ligne à HT			1 087 967,00	-75 000,00	1 012 967,00
16-01315 Enfouissement ligne haute tension - RTE			1 275 935,00		1 275 935,00
004037 AC1	07/12/2016	FA 90051609	62 000,00		62 000,00
004267 AC2	01/02/2017	FA 90052549	13 652,00		13 652,00
008003 AC3	30/04/2019	FA 90058811	25 583,00		25 583,00
011219 AC4	21/10/2020	FA 90062256	352 410,00		352 410,00
013987 AC5	20/12/2021	FA 90065282	822 290,00		822 290,00
016165 AC 6	30/09/2022	FA 1	-37 968,00		-37 968,00
016949 ERR TIERS REMBT C.EYSINES	30/09/2022	ANNUL AC6	37 968,00		37 968,00
22-05901 Remboursement C.Eysines Enfouissement ligne haute tension - TRESOR PUBLIC			-187 968,00	-75 000,00	-262 968,00
016950 REMBT RTE AC 2022	30/09/2022	AC1	-37 968,00		-37 968,00
018980 REMBT RTE AC 2023	17/10/2023	C0002-RTE-2	-75 000,00		-75 000,00
022677 REMBT RTE AC3	24/10/2024	FA C0002-RTE-3	-75 000,00		-75 000,00
025615 REMBT RTE AC4 2025	21/08/2025	FA C0002-RTE-4		-75 000,00	-75 000,00
E115 Divers			67 237,92		67 237,92
21-04549 Participat* enfouissement lignes aériennes Rues MP/BT - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			67 237,92		67 237,92
012858 AC1	17/06/2021	TITRE 423	67 237,92		67 237,92
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			1 171 033,34	150 000,00	1 321 033,34
G101 Rémunération			1 171 033,34	150 000,00	1 321 033,34
16-01134 Rémunération aménageur 2016 - FAB			96 033,34		96 033,34
003328 REM 13/04-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-02	29 033,34		29 033,34
004063 REM 01/01-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-05	67 000,00		67 000,00
17-01472 Rémunération aménageur 2017 - FAB			134 000,00		134 000,00
004787 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-02	67 000,00		67 000,00
005225 REM 01/07-30/09/17	30/09/2017	ND 2017-05	33 500,00		33 500,00
005567 REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-08	33 500,00		33 500,00
18-02132 Rémunération aménageur 2018 - FAB			134 000,00		134 000,00
006344 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-02	67 000,00		67 000,00
006942 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-06	33 500,00		33 500,00
007250 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-12	33 500,00		33 500,00
19-02791 Rémunération aménageur 2019 - FAB			134 000,00		134 000,00
008462 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-02	67 000,00		67 000,00
008701 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-12	33 500,00		33 500,00
009211 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-22	33 500,00		33 500,00
20-03696 Rémunération aménageur 2020 - FAB			134 000,00		134 000,00
010419 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-02	67 000,00		67 000,00
011015 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-13	33 500,00		33 500,00
011683 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-24	33 500,00		33 500,00
21-04294 Rémunération aménageur 2021 - FAB			134 000,00		134 000,00
012211 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-02	33 500,00		33 500,00
012910 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-13	33 500,00		33 500,00
013466 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-24	33 500,00		33 500,00
014085 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-35	33 500,00		33 500,00
22-05219 Rémunération aménageur 2022 - FAB			134 000,00		134 000,00
014866 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-02	33 500,00		33 500,00
015350 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-13	33 500,00		33 500,00
016049 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-24	33 500,00		33 500,00
016843 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-35	33 500,00		33 500,00
23-06242 Rémunération aménageur 2023 - FAB			151 000,00		151 000,00
017800 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-02	25 250,00		25 250,00
018359 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-14	25 250,00		25 250,00
019493 REM REGUL 1523-1/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-26	62 750,00		62 750,00
019505 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-38	37 750,00		37 750,00
24-07293 Rémunération aménageur 2024 - FAB			120 000,00		120 000,00
021322 REM 01/01/24-30/06/24	25/06/2024	ND 2024-03	60 000,00		60 000,00
022569 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-15	30 000,00		30 000,00
023283 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-25	30 000,00		30 000,00
25-08214 Rémunération aménageur 2025 - FAB				150 000,00	150 000,00
024695 REM 01/01-31/03/25	13/05/2025	ND 2025-001		37 500,00	37 500,00
025058 REM 01/04-30/06/25	30/06/2025	ND 2025-12		37 500,00	37 500,00
025808 REM 01/07-30/09/25	30/09/2025	ND 2025-22		37 500,00	37 500,00
026863 REM 1/10-31/12/25	31/12/2025	ND 2025-33		37 500,00	37 500,00
H FRAIS DIVERS			55 421,48	371,72	55 793,20
H101 Communication			33 536,55		33 536,55
19-02670 TOT BAG - INSOLEUSE			820,00		820,00
007757 AC1	21/03/2019	FA #0121032019	820,00		820,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
19-02706 Prestation 23/03/2019 accueil habitants longères - LEMOINE			150,00		150,00
007805 AC1	23/03/2019	FA FBM	150,00		150,00
19-03131 Différence de règlement MDA- C0002 - MAISON DES ARTISTES			0,26		0,26
008860 ECART ARRONDI MDA 3°T2019	14/10/2019	FA 14/10/19	0,26		0,26
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - BRUNELLOT RUBEN			1 250,00		1 250,00
006408 AC1	13/07/2018	FA N°10_18	1 000,00		1 000,00
007068 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	250,00		250,00
M2017-014/MS1 Animation, Concertation, Médiation et Communication - MAISON DES			13,75		13,75
006409 COTIS SOCIALES S/ FA N°10_18	13/07/2018	BRUNELLOT	11,00		11,00
007069 AC 2	22/11/2018	FA 17_18	2,75		2,75
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - APPLICADRON			1 295,28		1 295,28
008279 AC1	01/07/2019	FA 20190013	431,76		431,76
009536 AC2	01/01/2020	FA 20190044	431,76		431,76
017219 BDC 8 AC3	01/01/2023	FA 20220047	431,76		431,76
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - BRUNELLOT RUBEN			7 465,25		7 465,25
008135 BDC 3	29/05/2019	NH 05-19	3 598,00		3 598,00
008426 BDC9	19/07/2019	NH 12_19	1 542,00		1 542,00
010475 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	257,00		257,00
016440 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	818,25		818,25
019044 BDC 16	13/10/2023	FA 004_2023	1 250,00		1 250,00
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - HAZGUI MEHDI			6 968,64		6 968,64
008127 AC1	29/05/2019	FA 2019013	2 960,64		2 960,64
010436 BDC10	23/06/2020	FA 2020016	2 960,64		2 960,64
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	1 047,36		1 047,36
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - MAISON DES ARTISTES			148,87		148,87
008143 AC1 BDC3	29/05/2019	NH 05-19	39,58		39,58
008546 BDC9	19/07/2019	NH*12-19	16,96		16,96
008547 BDC7- AC2	19/07/2019	NH*11-19	12,78		12,78
010476 BDC10	30/06/2020	FA 08/20	2,80		2,80
016460 BDC 14	26/10/2022	FA 102022	9,00		9,00
019291 BDC 16	13/10/2023	FA 004_2023	13,75		13,75
019941 BDC15 AC1	29/01/2024	FA 001-2024	16,20		16,20
020682 BDC15 AC2	13/03/2024	FA 004_2024	27,00		27,00
021026 BDC15 AC3	27/05/2024	FA 006-2024	10,80		10,80
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - PLACE			9 189,12		9 189,12
008131 BDC3	29/05/2019	NH 17/321/3	4 934,40		4 934,40
010474 BDC10	29/06/2020	FA 17/321	3 207,36		3 207,36
016433 BDC14 - AC2	28/10/2022	FA 17/321/BC14	1 047,36		1 047,36
M2017-014/MS2 Médiation travaux Carès - RICOCHET SONORE			1 963,80		1 963,80
016417 BDC14	26/10/2022	FA 2026027	1 963,80		1 963,80
M2019-030 Lot 1/BDC14 Réimpression Vademecum Eysines - BLF IMPRESSION			137,72		137,72
012691 AC1	10/06/2021	FA 37 244	138,00		138,00
021303 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC14	-0,28		-0,28
M2019-030 Lot 2/BDC21 Impression & pose d'un panneau de PD format 0,80x1,20m - MIPP			144,00		144,00
013396 AC1	30/09/2021	FA 213165	144,00		144,00
M2019-030 Lot 2/BDC31 Réimpression panneau permis de démolir - MIPP			173,23		173,23
017725 AC1	31/03/2023	FA F230975	144,00		144,00
021290 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC31	29,23		29,23
M2019-030 Lot 2/BDC36 Production et pose panneau permis de démolir - MIPP			242,68		242,68
018332 AC1	20/07/2023	FAF232158	60,00		60,00
018600 DEPLACEMENT PANNEAU PD EYSINES	31/08/2023	FA F232603	144,00		144,00
021293 REV DEF	30/07/2024	DGD BDC36	38,68		38,68
M2023-038/BDC-OPDT-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - AGESEA			5,45		5,45
020941 CONTRIBUT* 1.1% BDC-OPDT-1	22/04/2024	FA 202410	5,45		5,45
M2023-038/BDC-OPDT-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - PANIER			544,50		544,50
020741 AC1	22/04/2024	FA 202410	544,50		544,50
M2024-009 Exposition scénographique Esprit des Jalles - BON SENS			3 024,00		3 024,00
020804 SOLDE	19/04/2024	FA 00329	3 024,00		3 024,00
H103 Taxes (hors foncier): archéo...			10 070,00		10 070,00
24-07738 Redevance archéologique préventive - DDFIP VIENNE RNF			10 070,00		10 070,00
022879 TAXE ARCHEO	30/10/2024	FA POIT 24 2600020817	10 070,00		10 070,00
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			10 014,93	371,72	10 386,65
16-01036 Frais gestion bancaires 2016 - CAISSE D'EPARGNE			563,14		563,14
003087 COMM* GEST* 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	55,00		55,00
003143 REM COMM* GEST* 1TR16	07/04/2016	AV 07/04/16	-55,00		-55,00
003386 COMM* GEST* 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	55,12		55,12
003387 FRAIS VIRT 06/16	01/07/2016	FA 01/07/16	0,09		0,09
003714 COMM* GEST* 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	60,04		60,04
004127 COMM* GEST* 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	447,89		447,89
17-01508 Frais gestion bancaires 2017 - CAISSE D'EPARGNE			4 520,23		4 520,23
004553 COMM* GEST* 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	3 435,46		3 435,46
004875 COMM* GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	452,65		452,65
004956 FRAIS CONSENTMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00		10,00
005243 COMM* GEST 3TR17	30/09/2017	FA 30/09/17	363,13		363,13
005658 COMM* GEST* 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	258,99		258,99
18-02055 Frais gestion bancaires 2018 - CAISSE D'EPARGNE			1 625,13		1 625,13

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
006124 COMM* GEST* 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	236,00		236,00
006422 COMM* GEST* 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	246,99		246,99
006821 COMM* GEST* 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	496,65		496,65
007380 COMM* GEST* 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	645,49		645,49
19-02832 Frais gestion bancaires 2019 - CAISSE D'EPARGNE			209,27		209,27
008049 FRAIS ENVOI CHEQUIER	19/03/2019	FA 19/03/19	16,00		16,00
008058 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	3,71		3,71
008452 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	80,06		80,06
008914 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	109,50		109,50
20-03397 Frais gestion bancaires 2020 - CAISSE D'EPARGNE			708,04		708,04
009573 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	599,31		599,31
010207 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	34,01		34,01
010557 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	45,57		45,57
011196 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	29,15		29,15
21-04117 Frais gestion bancaires 2021 - CAISSE D'EPARGNE			1 023,94		1 023,94
011879 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	105,31		105,31
012378 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	16,61		16,61
012933 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	15,75		15,75
013489 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	32,78		32,78
014334 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	853,49		853,49
22-05281 Frais gestion bancaires 2022 - CAISSE D'EPARGNE			511,29		511,29
014969 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	151,26		151,26
015677 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	206,16		206,16
016262 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	153,87		153,87
23-05965 Frais gestion bancaires 2023 - CAISSE D'EPARGNE			417,26		417,26
017118 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	219,86		219,86
017898 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	44,84		44,84
017924 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-16,42		-16,42
018347 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	126,31		126,31
018885 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	42,67		42,67
24-06918 Frais gestion bancaires 2024 - CAISSE D'EPARGNE			436,63		436,63
019916 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24	72,23		72,23
020620 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24	138,40		138,40
021608 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24	171,46		171,46
022510 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24	54,54		54,54
25-07917 Frais gestion bancaire 2025 - CAISSE D'EPARGNE				371,72	371,72
023690 COMM GESTION 4TR24	02/01/2025	FA 02/01/25		186,12	186,12
024376 COMM GESTION 1TR25	01/04/2025	FA 01/04/25		24,82	24,82
025218 COMM GESTION 2TR25	01/07/2025	FA 01/07/25		120,16	120,16
026119 COMM GESTION 3TR25	01/10/2025	FA 01/10/25		40,62	40,62
M106 Contentieux			1 800,00		1 800,00
M2016-039 Lot 1/BDC1 Précautions convention CAIR/BRUTHER - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON			1 800,00		1 800,00
005597 BDC1	30/11/2017	NH H1711335	1 800,00		1 800,00
2 RECETTES			15 201 175,22	413 763,85	15 614 939,07
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			4 481 229,75		4 481 229,75
R101 Libre			1 759 284,64		1 759 284,64
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 759 284,64		1 759 284,64
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 759 284,64		1 759 284,64
R102 Abordable			747 881,96		747 881,96
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			747 881,96		747 881,96
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	747 881,96		747 881,96
R103 PLA1,PLUS,PLS			1 624 286,30		1 624 286,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC			458 608,50		458 608,50
17-10113 CESS* GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	458 608,50		458 608,50
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			1 165 677,80		1 165 677,80
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	1 165 677,80		1 165 677,80
R104 PSLA,Accession soc			304 747,30		304 747,30
17-01589 Cession - Ilot terrains non Batis GIRONDE HABITAT Clause Cmpt Prix fin 2019 - MELLAC			304 747,30		304 747,30
17-10113 CESS* GIRONDE HABITAT	07/06/2017	FA 07/06/17	304 747,30		304 747,30
R107 Activités			45 029,55		45 029,55
19-03164 Cession - SCCV Esprit des Jalles AA309 ex LUPINI - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			45 029,55		45 029,55
19-21974 CESSION- SCCV ESPRIT DES JALLES AA309 (LUPINI)	23/10/2019	FA 23/10/19	45 029,55		45 029,55
S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS			2 516,26	177 263,85	179 780,11
S101 Libre				116 985,45	116 985,45
25-08569 Part constructeur Ilot CA5 - AQUITANIS				116 985,45	116 985,45
25-58964 PART CONSTRUC CA5	18/11/2025	FA 2025-117-C0002		116 985,45	116 985,45
S103 PLA1,PLUS,PLS				60 278,40	60 278,40
25-08569 Part constructeur Ilot CA5 - AQUITANIS				60 278,40	60 278,40
25-58964 PART CONSTRUC CA5	18/11/2025	FA 2025-117-C0002		60 278,40	60 278,40
S107 Activités			2 516,26		2 516,26
23-06161 Participation financière parcelle BB 2728 - HAMMADACHE			2 516,26		2 516,26
23-41203 PART* FINANCIERE AC1	23/03/2023	FA 2023-43	2 516,26		2 516,26
U SUBVENTIONS			167 488,01		167 488,01
U101 Subventions			167 488,01		167 488,01
24-07166 Subvention FNAP Fouilles Archéologiques Ilot C5 - FNAP			92 488,01		92 488,01
24-52535 SUBV FOUILLE ARCHEO ILOT C5	30/01/2024	FA 30/01/24	92 488,01		92 488,01

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
24-07766 Subvention Zones commerciales CC - ANCT			75 000,00		75 000,00
24-07766 Acompte	11/12/2024		-75 000,00		-75 000,00
24-07766 Acompte	11/12/2024		75 000,00		75 000,00
24-53066 SUBV ZONES COMMERCIALES	11/12/2024	FA C0002-AC1	75 000,00		75 000,00
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			10 420 724,00	236 500,00	10 657 224,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			3 982 074,00	236 500,00	4 218 574,00
18-02225 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			3 982 074,00	236 500,00	4 218 574,00
19-19432 PART* EQUILIBRE 2019	13/05/2019	AC2	886 476,00		886 476,00
20-26782 PART* EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC3	3 095 598,00		3 095 598,00
25-58307 PART* EQUILIBRE 2025	28/10/2025	AC5		236 500,00	236 500,00
V102 Participations à la remise d'ouvrage			6 438 650,00		6 438 650,00
18-02222 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			6 438 650,00		6 438 650,00
18-15505 PART* REM OUVRAGE 2018	01/08/2018	AC1	2 200 000,00		2 200 000,00
19-19010 PART* REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2	3 302 742,00		3 302 742,00
19-19430 ANNUL PART* REM OUVRAGE 2019 ERREUR TVA	13/05/2019	AC2	-3 302 742,00		-3 302 742,00
19-19431 PART* REM OUVRAGE 2019	13/05/2019	AC2	2 416 266,00		2 416 266,00
20-26783 PART* REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC3	854 217,00		854 217,00
21-32171 PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,40		968 167,40
21-32585 REJET PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	-968 167,40		-968 167,40
21-32588 PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC4	968 167,00		968 167,00
22-39485 PART RO 2022	31/12/2022	AC1	33 557,20		33 557,20
23-41127 AVOIR	31/01/2023	AC1	-33 557,20		-33 557,20
23-41128 PART RO	31/01/2023	AC1	33 577,20		33 577,20
24-48165 REGUL IMPUT GO7 PART RO 2022	31/12/2022	AC1	-33 557,20		-33 557,20
24-48167 REGUL IMPUT GO7 AVOIR	31/01/2023	AC1	33 557,20		33 557,20
24-48169 REGUL IMPUT GO7 REGUL PART RO 2022	31/01/2023	AC1	-33 577,20		-33 577,20
W PARTICIPATIONS COMMUNALES			63 577,20		63 577,20
W101 Commune(s)			63 577,20		63 577,20
22-05899 Participation s/ les ouvrages à réaliser Commune Eysines - TRESOR PUBLIC (EYSINES)			63 577,20		63 577,20
24-48166 REGUL IMPUT GO7 PART RO	31/12/2022	AC1	33 557,20		33 557,20
24-48168 REGUL IMPUT GO7 AVOIR	31/01/2023	AC1	-33 557,20		-33 557,20
24-48170 REGUL IMPUT GO7 REGUL PART RO 2022	31/01/2023	AC1	33 577,20		33 577,20
24-51989 PART REMISE OUVRAGE VILLE AC2	24/10/2024	FA C0002 RO AC2	30 000,00		30 000,00
X PRODUITS DIVERS			65 640,00		65 640,00
X102 Refacturations			33 231,30		33 231,30
23-06183 Remboursement frais de dépens ARENAS - CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE			800,00		800,00
23-41338 REMB DEPENS ARENAS	04/04/2023	FA 04/01/23	800,00		800,00
24-06981 Remboursement préjudices travaux RTE / SPAC - WTW (GRAS SAVOYE)			32 431,30		32 431,30
24-50002 REMBT PREJUDICES TRAVX RTE/SPAC	17/05/2024	QUIT 17/05/24	32 431,30		32 431,30
X201 Produits financiers			32 408,70		32 408,70
16-01037 Rémunération compte courant 2016 - CAISSE D'EPARGNE			3 633,64		3 633,64
16-06657 REM* CPTE COURANT 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	226,93		226,93
16-07383 REM* CPTE COURANT 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	1 816,26		1 816,26
17-08511 REM* CPTE COURANT 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	1 590,45		1 590,45
19-18061 REGUL AFFECTAT* C/C	31/12/2016	2016	-3 633,64		-3 633,64
19-18062 REGUL AFFECTAT* C/C	31/12/2016	2016	3 633,64		3 633,64
17-01509 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE			3 544,33		3 544,33
17-09661 REM* CPT COURANT 1TR17	31/03/2017		560,36		560,36
17-10383 REM* CPTE COURANT 2TR17	30/06/2017		536,52		536,52
17-11594 REM* CPTE COURANT 3TR17	30/09/2017		6 865,18		6 865,18
17-11596 ANNUL ERREUR OP REM* CPTE COURANT 3TR17	30/09/2017		-6 865,18		-6 865,18
17-11612 REM* CPTE COURANT 3TR17	30/09/2017		1 261,34		1 261,34
18-12924 REM* CPTE COURANT 4TR17	31/12/2017		1 186,11		1 186,11
19-18065 REGUL AFFECTAT* COMPTE	31/12/2017		-3 544,33		-3 544,33
19-18067 REGUL C/C 2017	31/12/2017		3 544,33		3 544,33
18-02056 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE			5 092,78		5 092,78
18-14476 REM* CPTE COURANT 1TR18	03/04/2018		1 091,66		1 091,66
18-15176 REM* CPTE COURANT 2TR18	02/07/2018		1 056,73		1 056,73
18-16228 REM* CPTE COURANT 3TR18	02/10/2018		855,11		855,11
19-17822 REM* CPTE COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	2 089,28		2 089,28
19-18066 REGUL 2018	31/12/2018	FA 311218	-5 092,78		-5 092,78
19-18068 REGUL C/C 2018	31/12/2018		5 092,78		5 092,78
19-02846 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			3 478,26		3 478,26
19-19504 REM* CPTE COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	1 950,51		1 950,51
19-20538 REM* CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	113,18		113,18
19-21755 REM* CPTE COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	1 414,57		1 414,57
20-03407 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			6 180,90		6 180,90
20-23252 REM* CPTE COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	1 869,57		1 869,57
20-24901 REM* CPTE COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	1 557,75		1 557,75
20-25705 REM* CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	1 424,09		1 424,09
20-27165 REM* CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	1 329,49		1 329,49
21-04128 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE			8 375,80		8 375,80
21-28547 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	1 787,21		1 787,21
21-29734 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	2 349,32		2 349,32
21-30903 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	2 089,87		2 089,87
21-32214 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	1 453,78		1 453,78

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119369-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC A fin	Réglé TTC A fin	Réglé cum TTC A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
22-34286 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	783,48		783,48
22-34395 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT	01/01/2022	FA 01/01/22	-783,48		-783,48
22-34396 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	695,62		695,62
22-05275 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE			1 050,28		1 050,28
22-35801 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	575,49		575,49
22-36927 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	324,96		324,96
22-38159 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	149,83		149,83
22-05310 Convention de servitude RTE - RTE			949,00		949,00
22-35884 INDEMNITE SERVITUDE	01/04/2022	FA 01/04/22	949,00		949,00
23-05977 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE			103,71		103,71
23-40031 INTERETS CREDITEUR 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	84,41		84,41
23-41719 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/2023	19,30		19,30
3 AMORTISSEMENT			1 085 672,00		1 085 672,00
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			6 052,00		6 052,00
O200 Rembousement avances internes			6 052,00		6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB			3 000,00		3 000,00
19-17792 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO	22/10/2018	22/10/18	3 000,00		3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB			3 052,00		3 052,00
19-17833 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		3 052,00		3 052,00
Z TVA A REVERSER			1 079 620,00		1 079 620,00
Z102 TVA à reverser			1 079 620,00		1 079 620,00
18-02408 CA3 - TRESOR PUBLIC (CA3)			1 079 620,00		1 079 620,00
18-17028 CA3 10/2018	26/11/2018		124 114,00		124 114,00
19-22516 CA3 10/2019	27/11/2019		955 506,00		955 506,00
4 MOBILISATION			2 640 052,00		2 640 052,00
M AVANCES			2 634 000,00		2 634 000,00
M100 Avances collectivités			2 634 000,00		2 634 000,00
16-01060 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE			2 634 000,00		2 634 000,00
16-05834 AVCE TRESORERIE	31/03/2016	DDE VERSEMENT 01	1 734 000,00		1 734 000,00
17-09056 AVCE TRESORERIE	13/02/2017	DDE DE VERSMENT N°2	900 000,00		900 000,00
O AVANCES INTERNE			6 052,00		6 052,00
O100 Avances interne			6 052,00		6 052,00
18-02308 PROV BDC 7 ENC PAR C0003 BVO - FAB			3 000,00		3 000,00
18-15986 REGUL PROV* AQUITANIS DU 17/05/17	01/01/2018		3 000,00		3 000,00
18-02406 LOY C0007 ENC PAR C0002 - FAB			3 052,00		3 052,00
18-17025 C0002 ENC LOYERS C0007	04/12/2018		3 052,00		3 052,00
SOLDE			-2 122 052,43	-751 531,75	-2 873 584,18

Annexe 7

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion		
					prévues	réalisées	%
Accueil de la commune de Carès Cantinolle Mairie de Carès Cantinolle M. Martin Porc, Maire M. Triat et Jardin de Carès Cantinolle	1 - VRD	COLAS	4 ans	1 000 108,53 €	500	500	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	4 ans	507 545,20 €	200	200	100%
Mairie de Carès Cantinolle M. Martin Porc, Maire M. Triat et Jardin de Carès Cantinolle	1 - VRD et éclairage	COLAS	3 ans	849 305,64 €	455	455	100%
	2 - Espaces verts et mobilier urbain	ID VERDE	3 ans	119 709,70 €	105	105	100%
